INFORME DE INTERVENTORIA No. 23

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: MARZO 31 DE 2025

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA:	**MARZO 31 DE 2025**	**PERIODO:**	**01 AL 31 DE MARZO DE 2025**
INFORME No.	**23**		

CONTRATO: 2000.13.12.005-2022

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S	S		
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S	S		
2	CONTROL DE GARANTIAS	S	S		
2.1	SANCIONES	N	N		
3	CONTROL FINANCIERO	S	S		
4	CONTROL DE EJECUCION	S	S		
4,1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	s	S		
5	ANEXOS	S	S		
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S	S		
5.2	CONTROL DE CALIDAD	S	S		
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S	S		
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S	S		
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	S	S		
5.6	RECURSO HUMANO	S	S		
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S	S		
5.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S	S		
5.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	S	S		
5.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S	S		
6	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S	S		
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S	S		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 23	PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
PLAZO ADICIONAL: SIETE MESES	PLAZO ADICIONAL: NUEVE MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-SEPTIEMBRE-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-JUNIO-2024
FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023	FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023
FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024	FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024
PLAZO ADICIONAL: 15-ABRIL-2025	PLAZO ADICIONAL: 14-MARZO-2025
PLAZO ADICIONAL: 22 DE FEBRERO DE 2026	PLAZO ADICIONAL: 22-ENERO-2026
DATOS DE LA SUPERVISIÓN	
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	DIEGO JOSÉ CALDERÓN V.
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	HOLMES ZUÑIGA GARCIA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No.	23	PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	**SI**		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	**SI**		
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoria.	**SI**		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 23		PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

	Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
1.	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez per ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta per ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	SI		
2.	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	SI		
3.	Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI		
4.	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	SI		
5.	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI		
6.	Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos per la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	SI		
7.	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selecci6n en los plazos acordados con la Entidad.	SI		
8.	Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	SI		
9.	Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	SI		
10.	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	SI		
11.	Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	N/A		
12.	Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	SI		
13.	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativas a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No.	23	PERIODO:	01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

14.	Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la informacion relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI		
15.	Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI		
16.	Informar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A		
17.	El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripcion del contrato.	SI		
18.	El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de obra contratada por la entidad.	SI		
19.	El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos par la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	SI		
20.	Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisicion de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21.	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	SI		
22.	Estar en permanente comunicaci6n con el interventor del contrato.	SI		
23.	Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI		
24.	Disponer del personal idóneo, así coma de las recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	SI		
25.	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido par el contratante.	SI		
26.	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así coma con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 23		PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

27.	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
28.	Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	SI		
29.	Reportar la informacion relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida par el contratante.	SI		
30.	Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando par su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto excluya indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.	SI		
	Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)**	**Observaciones (iv)**
	OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRA TIVO:			
	1. informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o case fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.	SI		
	2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SI		
	3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.	SI		
	4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.	SI		
	5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelacion al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepcion de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.	SI		
	6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.	SI		
	7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les-asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No.	23		PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.	SI		
9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo caso, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.	SI		
10. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyude su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasion del contrato.	N/A		
11. Asumir por su cuenta y riesgo, el page de los salaries, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgo que se deriven de la contratacion. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio para el pago del RETEICA	SI		
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.			
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.	SI		
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoría y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.	SI		
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.	SI		
4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 23		PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	SI		
6. También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.	N/A		
7. De presentarse atraso en la programaci6n inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances acompañadas y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras.	N/A		
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.	SI		
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluacion de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, yen general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) das siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No.	23	PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y)o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	**SI**		**ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN**
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	**SI**		**ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN**
14. Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados fines y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.	**N/A**		
15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.	**SI**		
16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizara y validara, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, sino existe dicho valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**N/A**		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 23		PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.	SI		
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.	N/A		
19. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier memento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		
20. No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.	SI		
21. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.requeridos para la construccion de la obra. Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realizacion de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoría, el contratante o sus representantes.	N/A		
22. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		
23. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfeccion de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
24. Entregar al contratante los planos record de la obra.	N/A		
25. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.	N/A		
26. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoría.	SI		**ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN**
27. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratacion el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.	SI		
28. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.	SI		**ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No.	23	PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

29. Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:	**SI**		
PLAN DE TRABAJO DE OBRA			
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO	SI		
PLAN DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI		
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SI		
INFORME DE LABORES	SI		
BITÁCORA	SI		
ÍTEMS NO PREVISTOS	SI		
INFORME FINAL	N/A		
Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuacion se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serializacion Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.	**SI**		
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.	**N/A**		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	**SI**		
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá coma mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliacion y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..	**N/A**		
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante	**SI**		
En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.	**SI**		
La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.	**SI**		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 23		PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:	

El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehículos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.	SI		
Los vehículos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de transito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado tecnico-mecanico.	SI		
Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construccion así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.	SI		
Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitacion que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevenci6n. Todas las seriales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las serial luminosas deben ser de luz opaca.	SI		
Apoyar en el tramite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.	SI		
Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad domestica, etc.	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No.	23	PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

El Contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoría los resultados de los mismos.	SI		
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de direccion del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con mínimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicacion a la comunidad.	SI		
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion Municipal o a terceros	SI		

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

INFORME No. 23 | PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
SUSPENSION 1	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	30-Nov-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25
REINICIO	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25
ADICIONAL EN VALOR	$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25
PLAZO ADICIONAL	$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25
PLAZO ADICIONAL	$ 163.337.276,60	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Aug-26
Buen Manejo del Anticipo	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
SUSPENSION 1	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	30-Nov-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25
REINICIO	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25
ADICIONAL EN VALOR	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25
PLAZO ADICIONAL	$ 450.674.030,80	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25
PLAZO ADICIONAL	$ 450.647.029,80	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Aug-26
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27
SUSPENSION 1	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	31-May-27
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	30-Jun-27
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jul-27
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Sep-27
REINICIO	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-27
ADICIONAL EN VALOR	$ 81.668.638,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Sep-27
PLAZO ADICIONAL	$ 81.668.639,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15/94/2028
PLAZO ADICIONAL	$ 81.668.638,30	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Feb-29
Calidad del Servicio	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29
SUSPENSION 1	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-May-24	31-May-29

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compania Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
PLAZO ADICIONAL	$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Sep-25
PLAZO ADICIONAL	$ 6.400.645.509,80	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jul-26
Buen Manejo del Anticipo	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
PLAZO ADICIONAL	$ 8.829.624.297,90	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Sep-25
PLAZO ADICIONAL	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jul-26
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
SUSPENSION 1	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-27
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Apr-27
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-May-27
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Jun-27
REINICIO	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Jun-27
ADICIONAL EN VALOR	$ 1.600.161.378,95	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Jun-27
PLAZO ADICIONAL	$ 1.600.161.378,95	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Mar-28
PLAZO ADICIONAL	$ 1.600.161.377,45	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jan-29
Estabilidad	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
SUSPENSION 1	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	1-Mar-24	1-Mar-29

INFORME No. 23 | PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	30-Jun-24	30-Jun-29	AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	1-Apr-24	1-Apr-29
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Jul-24	31-Jul-29	AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	1-May-24	1-May-29
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
REINICIO	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	REINICIO	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
ADICIONAL EN VALOR	$ 490.011.829,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	ADICIONAL EN VALOR	$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
PLAZO ADICIONAL	$ 490.011.830,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	15-Apr-24	15-Apr-30	PLAZO ADICIONAL	$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Mar-25	14-Mar-30
PLAZO ADICIONAL	$ 490.011.829,80	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-31	PLAZO ADICIONAL	$ 9.600.968.264,70	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	22-Jan-26	22-Jan-31
Responsabilidad Civil extracontractual	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24	**Responsabilidad Civil extracontractual**	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-25
SUSPENSION 1	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-May-24	SUSPENSION 1	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Mar-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	30-Jun-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Apr-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-Jul-24	AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-May-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
REINICIO	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-24	REINICIO	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	ADICIONAL EN VALOR	$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	15-Apr-25	ADICIONAL EN VALOR	$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Mar-25
PLAZO ADICIONAL	$ 427.050.000,00	C-100012719 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	22-Feb-26	PLAZO ADICIONAL	$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	22-Jan-26

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)		Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa			
Cláusula Penal			
Caducidad			
Ninguna			

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No.	23	PERIODO:	01 AL 31 DE MARZO DE 2025

3. CONTROL FINANCIERO


3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		$ 450.674.030
Acta No. 1	31-May-23	$ 427.238.980	26,16%	$ 128.171.694	$ 299.067.286
Acta No. 2	30-Jun-23	$ 45.217.628	2,77%	$ 13.565.288	$ 31.652.340
Acta No. 3	30-Mar-24	$ 72.195.076	4,42%	$ 21.658.523	$ 50.536.553
Acta No. 4	14-Jun-24	$ 18.783.787	1,15%	$ 5.635.136	$ 13.148.651
Acta No. 5	20-Jun-24	$ 376.165.748	23,03%	$ 112.849.724	$ 263.316.024
Acta No. 6	16-Aug-24	$ 30.870.745	1,89%	$ 9.261.224	$ 21.609.521
Acta No. 7	13-Sep-24	$ 19.658.237	1,20%	$ 5.897.471	$13.760.766
Acta No. 8	30-Sep-24	$ 35.139.507	2,15%	$ 10.541.852	$24.597.655
Acta No. 9	12-Nov-24	$ 62.044.616	3,80%	$ 18.613.385	$43.431.231
Acta No. 10	2-Dec-24	$ 105.486.042	6,46%	$ 31.645.813	$73.840.229
Acta No. 11	1-Feb-25	$ 35.207.836	2,16%	$ 10.562.351	$24.645.485
Acta No. 12	13-Mar-25	$ 117.987.100	7,22%	$ 35.396.130	$82.590.970
	TOTALES	$ 1.345.995.302	82,41%	$ 403.798.591	$1.392.870.741

3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30 %)	23/12/2022	$N/A	%		$8.829.624.298
Acta No. 1	31-May-23	$8.371.066.842	26,16%	$2.511.320.053	$5.859.746.789
Acta No. 2	30-Jun-23	$886.015.856	2,77%	$265.804.757	$620.211.099
Acta No. 3	31-Jan-24	$907.712.127	2,84%	$272.313.639	$635.398.488
Acta No. 4	30-Mar-24	$503.892.952	1,57%	$151.167.886	$352.725.066
Acta No. 5	30-Apr-24	$369.286.058	1,15%	$110.785.818	$258.500.240
Acta No. 6	31-May-24	$7.371.115.364	23,03%	$2.211.334.610	$5.159.780.754
Acta No. 7	31-Jul-24	$604.131.566	1,89%	$181.239.470	$422.892.096
Acta No. 8	31-Aug-24	$385.455.620	1,20%	$115.636.686	$269.818.934
Acta No. 9	30-Sep-24	$689.009.943	2,15%	$206.702.983	$482.306.960
Acta No. 10	8-Nov-24	$1.216.561.098	3,80%	$364.968.330	$851.592.768
Acta No. 11	30-Nov-24	$2.068.353.769	6,46%	$620.506.131	$1.447.847.638
Acta No. 12	28-Feb-25	$690.349.724	2,16%	$207.104.917	$483.244.807
Acta No. 13	10-Mar-25	$2.313.472.543	7,23%	$694.041.763	$1.619.430.780
		$26.376.423.462	82,42%	$7.912.927.043	$18.463.496.419

4. CONTROL DE EJECUCION

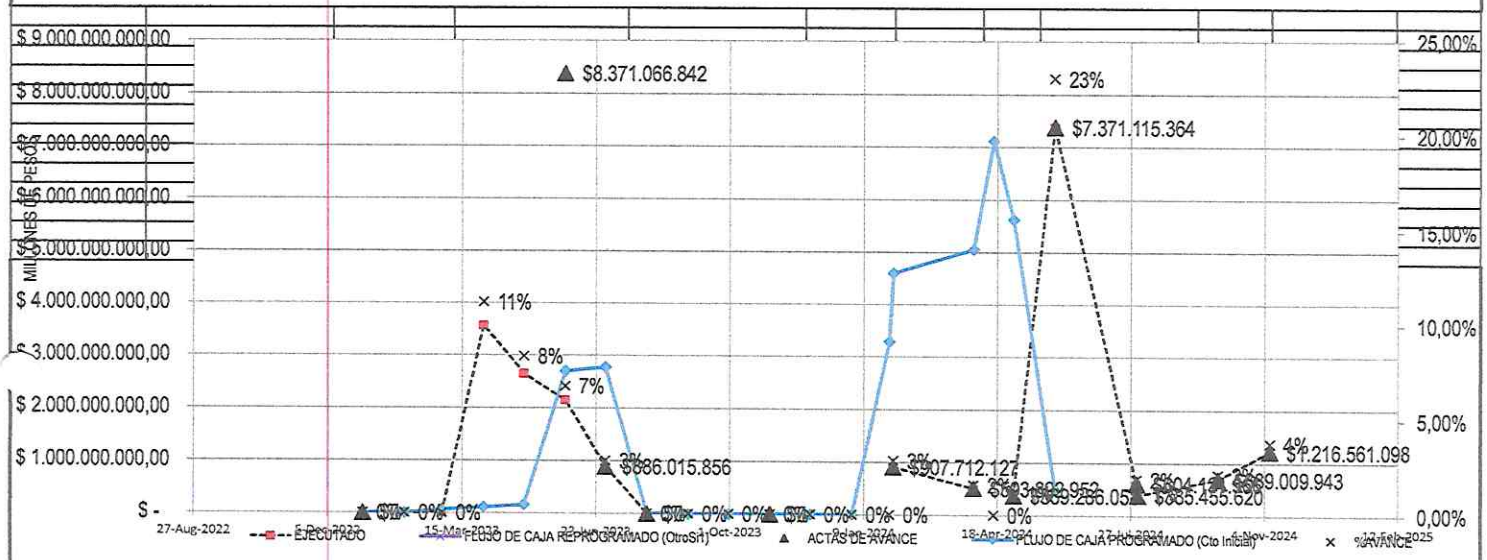

FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	$ -			$ -	0,00%
31-Jan-23	$ -		$ -		0,00%
28-Feb-23	$ 62.322.903,31		$ -		0,00%
31-Mar-23	$ 111.845.778,94		$ 3.568.952.062,00		11,15%
30-Apr-23	$ 161.373.885,25		$ 2.651.489.752,00		8,29%
31-May-23	$ 2.705.571.148,99		$ 2.150.625.028,00	$ 8.371.066.842,00	6,72%
30-Jun-23	$ 2.779.758.170,91		$ 886.015.856,00	$ 886.015.856,00	2,77%
31-Jul-23	$ -		$ -	$ -	0,00%
31-Aug-23	$ -		$ -		0,00%
30-Sep-23	$ -		$ -		0,00%
31-Oct-23	$ -		$ -	$ -	0,00%
lov-23	$ -		$ -		0,00%
Dec-23	$ -		$ -		0,00%
28-Jan-24	$ 3.291.610.390,55				0,00%
31-Jan-24	$ 4.602.351.753,97		$ 907.712.127,00	$ 907.712.127,00	2,84%
31-Mar-24	$ 5.056.692.137,71		$ 503.892.952,00	$ 503.892.952,00	1,57%
15-Apr-24	$ 7.113.749.748,65				0,00%
30-Apr-24	$ 5.630.651.827,13		$ 369.286.058,00	$ 369.286.058,00	1,15%
31-May-24	$ 487.299.803,59		$ 7.371.115.364,00	$ 7.371.115.364,00	23,03%
31-Jul-24			$ 604.131.566,00	$ 604.131.566,00	1,89%
1-Aug-24			$ 385.455.620,00	$ 385.455.620,00	1,20%
30-Sep-24			$ 689.009.943,00	$ 689.009.943,00	2,15%
8-Nov-24			$ 1.216.561.098,00	$ 1.216.561.098,00	3,80%
30-Nov-24			$ 2.068.353.769,00	$ 2.068.353.769,00	6,46%
28-Feb-25			$ 690.349.724,00	$ 690.349.724,00	2,16%
31-Mar-25			$ 2.313.472.543,00	$ 2.313.472.543,00	7,23%
	$ 32.003.227.549,00		$ 26.376.423.462,00	$ 26.376.423.462,00	82,42%

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 82,42 % (ACTIVIDADES INTERVENCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ALBANIA , INTERVENCIONES FLOCULADORES , SEDIMENTADORES EN LA PTAP GINEBRA Y SEDIMENTADORES EN LA PTAP DE GUACARÍ, INSTALACION TUBERIA 14")

6. ANEXOS

6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).

6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.

6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.

6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.

6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras dades.

6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional

6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).

6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolución

6.9 Informe del Contratista (si aplica).

6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL CONTRATO

B. ADUCCION

1. Línea De Aducción: Tubería PEAD DN 18" L: 6.0 ml
2. Caudal: 233 Lps

Estado Actual Línea de Aducción: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto

C. DESARENADOR

1. Caudal de diseño: 233 Lps

Estado Actual Desarenador: Sin ejecución.

Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto.

Se está evaluando la alternativa de reemplazar esta estructura por la implementación de Mallas COANDA la cual va estar instalada en la bocatoma.

2. CONDUCCIÓN

2.1 Tramo 1 Bocatoma – CADICA en Puente Rojo: Tubería PEAD diámetro 18" – L=3450ml

Estado Actual Tramo 1: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto.
Estado Actual: El Tramo 3, Instalación tubería PEAD diámetro 14" L: 5.738 ml, la Comunidad suspendió las obras el día 11 de Junio de 2024.

La Comunidad representada por Pro-Territorio, firmo el 18 de Diciembre de 2024, un acta de acuerdo pactado entre la Gobernación del Valle y Vallecaucana de Aguas para continuar con las obras.

Está en proceso de legalización la servidumbre con el Ingenio Pichichi, para la instalación de la tubería PEAD de 14 ".

Caseta eléctrica

Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil
Se continúan con las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica
Se instala ducto eléctrico que va alimentar el Streaming Current
Relleno con material de excavación
Se instala el sistema Streaming Current

Tanque de almacenamiento La Albania
Dimensiones
Largo: 25 mts
Ancho: 15 mts
Profundidad: 5 mts
Actividades ejecutadas:
Localización y replanteo
Chequeo de niveles de la excavación
Excavación a máquina y retiro de material sobrante de la excavación
Auxiliar vial controlando el tráfico por la salida y entrada de volquetas, en la vía de acceso a el tanque de almacenamiento
Fundición solado de limpieza
Colocación de refuerzo losa inferior
Colocación de refuerzo en muros
Espesor de losa y muros: 40 cms - 28 Mpa
Instalación de formaleta metálica para muros perimetrales y central
Instalación de formaleta metálica para para muros perimetral de caja de salida
Instalación de cinta PVC
Fundición de losa inferior y 0.5 mtrs de muro el dia Viernes 24 de Enero 2025.
Toma del Slump y muestras de concreto en la mañana y tarde
Colocación de 189 m3 de concreto premezclado
Aplicación de antisol

Retiro de formaleta metálica interior y exterior de parte inicial del muro perimetral
Inicio de colocación del acero de refuerzo de los muros perimetrales
Inicio de instalación de la formaleta metálica
Riego con agua la losa del tanque y parte del muro en la mañana y tarde
Se termina de instalar la formaleta metálica
Instalación de cinta PVC
Fundición de muros en concreto a una altura de 2.4 mtrs
Toma de muestras de concreto y slump
Retiro total de formaleta metálica
Fraguado de muro
Instalación de formaleta metálica para terminar el muro en concreto, a una altura de 1.8 mtrs
Construcción de formaletas en madera para vigas transversales vigas de 40 por 45

PTAP GUACARI

Estado Actual Sedimentador 3: En servicio
Estado Actual Sedimentador 2: En servicio
Caseta eléctrica

INFORME DE INTERVENTORÍA

INFORME No 23 | PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

Actividades ejecutadas

Realizan la excavación de las zapatas adicionales de la caseta
Retoman el armado del acero de los castillos de las columnas
Arman el acero y funden las zapatas y los pedestales de la caseta
Arman el acero de las vigas de cimentación adicionales.
Realizan el relleno con material de sitio en la zona de las zapatas
Fundición de vigas de amarre superior
Fundición de pedestales para cubierta
Colocación de ladrillo estructural
Se llevo a cabo una reunión el día 19 de Febrero de 2025 para tratar temas relacionados con la parte eléctrica de la caseta que se está construyendo, participaron Contratista, Acuavalle e Interventoría (Ing. Eléctrico Luis Mario Dávila).

COMPONENTE AMBIENTAL

relación al tema ambiental se tiene:

Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma Ginebra, se tiene que, la Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta : Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 - "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" - VIGENCIA: 23-07-2025

Permiso para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se radico ante la Secretaria de Planeación de Guacarí, pero a la fecha no se tiene respuesta. El contratista radica nuevamente oficio en las Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.

Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138117, donde informan que las vías a intervenir son del Municipio de Guacarí.

Permiso de rotura
Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:
Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.
Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra
Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Guacari, el tramo que corresponde:
Puente Amarillo a Puente Rojo.
Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRATanque de Almacenamiento

Con una capacidad de almacenamiento de 470 m3 en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas

Estado Actual: En ejecución 92 %
Tanque de almacenamiento La Albania:Actividades ejecutadas:

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

• Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:

- PTAP de Guacari: Sedimentación – Floculacion - Caseta Eléctrica
- PTAP de Ginebra: Sedimentación – Filtración - Tanque de Almacenamiento - Caseta Eléctrica
- Tanque de Almacenamiento La Albania – Ginebra

• El frente del Tramo 3 continua suspendido, se estará coordinando su inicio para Abril, por la firma de un acta con los compromisos entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y la Comunidad encabezada por Pro-territorio.
• Con el Ingenio Pichichi ya se encuentra en la etapa final de la servidumbre, se puede iniciar para Abril este tramo de tubería PEAD 14" en una L: 500 ml
• Con la Familia Saavedra - Blum ya está en proceso de servidumbre para instalar en su predio la Tubería PEAD 10" en una L: 600 ml

• Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato
• Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de pavimento siguen aún pendientes por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.
• Los trabajos de localización y replanteo en la vía del Tramo 1: CADICA a BOCATOMA, continúan sin ningún inconveniente
• Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
• Los acercamientos con los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio han mejorado el dialogo con la comunidad permitiendo que se mejore la aceptación de la obra.
• Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
• Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME 23

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - PTAP GINEBRA LA ALBANIA	• Localización y replanteo • Chequeo de niveles de la excavación • Excavación a máquina y retiro de material sobrante de la excavación • Auxiliar vial controlando el tráfico por la salida y entrada de volquetas, en la vía de acceso a el tanque de almacenamiento • Fundición solado de limpieza • Colocación de refuerzo losa inferior • Colocación de refuerzo en muros • Espesor de losa y muros: 40 cms - 28 Mpa • Instalación de formaleta metálica para muros perimetrales y central • Instalación de formaleta metálica para para muros perimetral de caja de salida • Instalación de cinta PVC • Fundición de losa inferior y 0.5 mtrs de muro el dia Viernes 24 de Enero 2025. • Toma del Slump y muestras de concreto en la mañana y tarde • Colocación de 189 m3 de concreto premezclado • Aplicación de antisol • Retiro de formaleta metálica interior y exterior de parte inicial del muro perimetral • Inicio de colocación del acero de refuerzo de los muros perimetrales • Inicio de instalación de la formaleta metálica • Riego con agua la losa del tanque y parte del muro en la mañana y tarde • Se termina de instalar la formaleta metálica • Instalación de cinta PVC • Fundición de muros en concreto a una altura de 2.4 mtrs • Toma de muestras de concreto y slump • Retiro total de formaleta metálica • Fraguado de muro • Instalación de formaleta metálica para terminar el muro en concreto, a una altura de 1.8 mtrs • Construcción de formaletas en madera para vigas transversales vigas de 40 por 45 • Fundición del último tramo de muro • Retiro de formaleta del ultimo tramo de muro • Instalación de formaleta para la fundición de losa superior • Colocación de acero de refuerzo losa superior y vigas transversales
	SEDIMENTADOR N° 3 - PTAP GINEBRA	Sedimentador 3 : En servicio
	SEDIMENTADOR N° 2 - PTAP GINEBRA	Sistema de barrelodos Módulos Tipo Colmena Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada , Pasarelas SEDIMENTADOR EN SERVICIO
	SEDIMENTADOR N° 1 - PTAP GINEBRA	Sedimentador 1: La obra civil se terminó, ya el Sub contratista Co Ingeniería, culmino la instalación del barrelodos .
	CASETA ELECTRÍCA- PTAP GINEBRA:	Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil Por motivos de lluvias constantes se suspende las labores de: Las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica Relleno con material de excavación
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GINEBRA:	Durante este período no se realizaron actividades en esta caseta, debido a que esta no está incluida en la primera reformulación
	MURO DE CONTENCIÓN - PTAP GINEBRA:	En comité de obra se decide que este muro no es necesario construirlo. El terreno es estable y no hay nigún tipo de riesgo en esta zona
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 3	• Las actividades aún se encuentran suspendidas por causa de la comunidad, desde el día 11 de junio del año 2024. El día 18 de diciembre se firma el acuerdo con la Gobernación, Valle caucana de Aguas e presentantes de la comunidad. Se espera que con la firma de este documento se pueda retomar en el frente 3 e iniciar los frentes 1 y 2.
	CASETA ELECTRÍCA - PTAP GUACARÍ:	Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil Se continúan con las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica Se instala ducto eléctrico que va alimentar el Streaming Current Relleno con material de excavación Se instala el sistema Streaming Current

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME 23

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GUACARÍ:	Caseta de Sopladores de Filtracion - Se inician las excavaciones para la ampliación
	SEDIMENTADOR N° 1 - PTAP GUACARÍ:	EN SERVICIO
	SEDIMENTADOR N° 2 - PTAP GUACARÍ:	EN SERVICIO
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 1	En este período se realizan las siguientes actividades en este tramo: • La comisión de topografía realiza levantamiento en la zona de la bocatoma • La comisión de topografía en conjunto con la interventoría, realiza batimetría en la zona donde se va construir la bocatoma y el desarenador. • El contratista continúa realizando chequeos, verificaciones, localizaciones donde se debeb hacer la intervenciones civiles en ester tramo. Tamnien se hacer revisió y se buscas posibles soluciones a los puntos criticos de la vía donde se va a instalar la tubería.
	SEDIMENTADOR N° 3 - PTAP GUACARÍ:	Retiro del sistema de sedimentación existente: tubería perforada – placas en asbesto cemento

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 23	SE ANEXA DOCUMENTO
2	INFORME No 23 DE INTERVENTORIA CON INFORME DE SST Y COMPONENTE SOCIAL	SE ANEXA DOCUMENTO

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	MARZO 31 DE 2025
MATERIAL:	CONCRETO 3000 PSI
CANTIDAD PARA PRUEBA:	
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO
LOCALIZACION:	PTAP GINEBRA Y GUACARI
LABORATORIO:	GEOZAM
NORMA - ESPECIFICACION:	INV E 410 -13 / NTC 673 / NTC 3546

ÍTEM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO (Mpa)	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1	SEDIMENTADOR 1 GINEBRA	21,8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
2	SEDIMENTADOR 1 GINEBRA	27,8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
3	TANQUE ALMACENAMIENTO ALBANIA	25,4	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	
4	SEGUNDA FUNDICION TANQUE LA ALBANIA	25,8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	
5	SEGUNDA FUNDICION TANQUE LA ALBANIA	30,4	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
6	LOSA INFERIOR FILTRO 1 PTAP GINEBRA	22,2	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	21 DIAS	
7	LOSA INFERIOR FILTRO 1 PTAP GINEBRA	16,9	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
8	LOSA INFERIOR FILTRO 1 PTAP GINEBRA	34	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	21 DIAS	
9	LOSA INFERIOR FILTRO 1 PTAP GINEBRA	31,3	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
10	PANTALLA CANALETA PTAP GINEBRA	20,9	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
11	PANTALLA CANALETA PTAP GINEBRA	15,2	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	
12	MUROS TANQUE LA ALBANIA	30,2	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
13	MUROS TANQUE LA ALBANIA	26,1	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
14	MUROS TANQUE LA ALBANIA	24,5	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	
15	MUROS TANQUE LA ALBANIA	30,5	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
16	PANTALLA CANALETA PTAP GINEBRA	20,9	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES **PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

I. LICENCIAS AMBIENTALES

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
	INFORME AMBIENTAL	INFORMACION CONSIGNADA DENTRO DE LOS INFORMES DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA ANEXOS

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	SOLICITANTE:	
2	FUENTE RECEPTORA:	
3	PTAR:	
4	ESTADO:	
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	

III.CONCESION DE AGUAS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	SOLICITANTE:	
2	FUENTE DE ABASTECIMIENTO:	
3	PTAP:	
4	ESTADO:	
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES — INFORME N° 23

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	Continúa pendiente la realización de la cartografía social.
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	En el mes de marzo de 2025 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 77.14% .
3	Programa de Información a la Comunidad	La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad por medio de las socializaciones que se han realizado en meses pasados, dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.
4	Programa de divulgación a la comunidad	En el mes de marzo no se programaron actividades de divulgación a la comunidad.
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidencia que el contratista ha cumplido con esta actividad de reuniones con la comunidad planteada en el Plan de Gestión Social.
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no se recibió PQRS de la comunidad.
7	Programa de atención al ciudadano	El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos: Martes de 08:00 am a 12m Viernes 1:00 pm a 4:00 pm, Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - corregimiento de Costa Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca. Existen dos buzones de sugerencias: El buzón de Guacarí se encuentra ubicado en Puente Rojo en el restaurante frente al balneario Chicuco. El buzón de Ginebra está ubicado en Estanco Tas- Tas, Cra 2 #5-06 en la cabecera municipal.
8	Recorridos por la Obra	En este mes de marzo se realizó recorrido de obra con los veedores de Guacarí, para mostrar los avances en la planta de tratamiento de Guacarí. • En esta reunión participaron las Veedoras Sandra Villa, Allileny Henao, y Representantes del
9	Reunión de Avance de Obra	Se evidenció que el componente social del contratista realizó la reunión informativa de avance de
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto N° 10 del Plan de Gestión Social con la
11	Vinculación de mano de obra calificada y no calificada	El contratista informó que en el mes de marzo se contrató 5 personas, de las cuales 3 son de Guacarí, una de Ginebra y una de Costa Rica.

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	ACTAS	
2	CORRESPONDENCIA	
3	VARIOS	

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 23

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
5	CVC	Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra	**OTORGADO** **Resolución 740 No. 0741 0381** **29-04-2024** Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad.
6	Planeación Municipal Ginebra	Licencia de Espacio Público	**OTORGADO** **Resolución No. 004-01 2023** **26-01-2023** "Por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público" **VIGENCIA 26-01-2025** **VIGENTE**
7	Planeación Municipal Guacarí	Licencia de Espacio Público	**OTORGADO** **Resolución No. 004-01 2023** **26-01-2023** Por la cual se expide una licencia de intervención del espacio público para desarrollar un proyecto" **VIGENCIA 03-02-2025** **VIGENTE**
8	Secretaria de Movilidad de Ginebra	Plan de Manejo de tránsito	**OTORGADO** **Resolución No. 900-50-020** **20-03-2023** "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" **VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP** **VIGENTE**
9	Secretaria de Movilidad y transporte de Guacarí	Plan de Manejo de tránsito	**OTORGADO** "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" **VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP** **VIGENTE**
10	Planeación Municipal Ginebra	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos: Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, en el tramo: Puente Amarillo a Puente Rojo.	**PENDIENTE** - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Ginebra el día 14 de agosto, en la y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024 - El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024. - *El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías* de Ginebra el día 22 de octubre de 2024.
11	Planeación Municipal Guacarí	Permiso de rotura de pavimento *Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo:* Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Placer) hasta la Planta de Guacarí.	**PENDIENTE** - Se recibe el 22 de mayo 2024 documentación por el Director del Departamento Administrativo de Planeación sobre la solicitud ante la Alcaldía de Guacarí. - "El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Guacarí el día 21 de agosto y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024" - "El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024." - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.
12	CVC	Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA En el mes de julio se realizó visita a predio de la Alcaldía de Ginebra para realizar la compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. Se está a la espera de comunicado de la CVC para aprobación del nuevo predio y su recomendación para poder realizar esta compensación.	**EN ESPERA DE RESPUESTA .** Es este periodo visitan la obra dos funcionarios de la CVC, la Ingeniera Daniel Castillo y el Técnico Segundo Fiscal para a coordinar lo relacionado con la siembra por compensación en respuesta al requerimiento realizado por ACUVALLE y en cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal de la planta de Ginebra. Pero no se pudo *hacer la visita a el predio debido a que no se dio la* autorización para la visita, se debe reprogramar

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 23

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
I. PREDIOS			
	N/A		
II. SERVIDUMBRES			
No.	**LOCALIZACION**	**DESCRIPCION**	**ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)**
	Vía a el Ingenio Pichichi K6+350 a K6+850 Matrícula inmobiliaria N° 373-112779	Dentro de las actividades que se realizaron en la obra fue la localización y replanteo del trazado de la tubería y dentro de este se tiene identificado una parte del trazado de la tubería fue planteado por un carreterable localizado dentro del predio *identificado con la matricula inmobiliaria N° 373-112779 de propiedad del Ingenio* Pichichi. Después de realizar el levantamiento topográfico se obtuvo que para continuar con el desarrollo del proyecto se requiere intervenir una longitud de 500 ml para la instalacion de tuberpia PEAD 350 MM PN 10 a una profundidad promedio de 1.45 mt.	EN TRAMITE
	Vía acceso planta de Ginebra	Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10": para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente.	FINALIZADO
III. PERMISOS			
No.	**ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO**	**DESCRIPCION**	**ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)**
1	**CVC**	• Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma desarenador, macromedidor y aducción.	**Nota 1: La Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024** **OTORGADO** Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en juridiscción del Municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca" **VIGENCIA 23-07-2025**
2	**CVC**	• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, d acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.	**AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN**
3	CVC	**PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES** El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo. Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo. Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A E.S.P radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024. Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto)	**AMBIENTAL PARA PRÓRROGA** Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 de Febrero de 2024. Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año) Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 2024 por evaluación y seguimiento para prórroga. Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de Mayo de 2024
4	CVC	Permiso de Concesión de aguas superficiales	**OTORGADO** **Resolución 0740 No. 0741 0000576** **10-07-2020** "Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" **VIGENTE**

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 23

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
2	LINA MARCELA BURITICÁ	ING. CIVIL	COORDINADORA DE PROYECTOS	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
3	GINA LEIDY LÓPEZ	ING. SANITARIA	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos oportunamente. • Elaborar los reportes y avances de obra. • Calcular las cantidades de obra ejecutada.
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS,	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
5	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos oportunamente. • Elaborar los reportes y avances de obra. • Calcular las cantidades de obra ejecutada.
6	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	• Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. • Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. • Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. • Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. • Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad.

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 23

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	• Levantamiento topográfico previo al inicio de las actividades. • Localización y replanteo de estructuras a construir. • Localización y replanteo de tuberías a instalar. • Control y chequeo de excavaciones, verificación de cotas de diseño.
8	DIANA MARCELA MURIEL FLOR	Ingeniera ambiental	INGENIERO AUX. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
9	FLOR MARÍA MARTÍNEZ	Profesional-SST	PROFESIONAL-SST	• Responsable de la ejecucion del plan de gestión SST
10	LILIBETH MORA DUARTE	Tecnóloga en obras civiles	INSPECTORA DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL
4	ANDRES FLECHAS	TOPOGRAFO	TOPÓGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROLTOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
5	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
6	JULIANA IZQUIERDO M.	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST
7	JULIAN ANDRADE	ING. CIVIL	APOYO A LA DIRECCIÓN	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
PLANTA ELECTRICA	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	ANCLAJES	
PLANTA ELECTRICA	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	ANCLAJES	
PULIDORA	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	MUROS DEL SEDIMENTADOR 2	
TALADRO	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	ANCLAJES	
TALADRO	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	ANCLAJES	
VIBRADOR	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	LOSA DE FONDO LOSA SUPERIOR TANQUE	
VIBRADOR	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	LOSA DE FONDO	
MEZCLADORA DE CONCRETO	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	LOSA DE FONDO, REALCES DE MURO	
MEZCLADORA DE CONCRETO/BOMBA DE CONCRETO	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	REALCES DE MURO TANQUE ALMACENAMIENTO LA ALBANIA	
RETROEXCAVADORA DE ORUGA	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	
VOLQUETAS	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

ITEM	ACTIVIDAD	EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA					EQUIPO UTILIZADO POR INTERVENTOR				
		Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID
1	LOCALIZACION TOPOGRAFICA	ESTACIÓN TOTAL	ESTACION TOTAL	3236	dic-24	031617					
2	LOCALIZACION TOPOGRAFICA	NIVEL AUTOMATICO	NIVEL AUTOMATICO	3556	nov-24	M312467					
3	LOCALIZACION TOPOGRAFICA	NIVEL AUTOMATICO	NIVEL AUTOMATICO	3677	Sep 17/2025	F09932					
4											
5											
6											
7											
8											

PTAP GINEBRA



FOTOGRAFÍA No.1: Sedimentador 3 : En servicio



FOTOGRAFÍA No.2: Sedimentador 2 : En servicio



FOTOGRAFÍA No.3: Sedimentador 1: El Sub contratista Colngenieria, termina la instalación del barrelodos y labores de canaletas en acero inoxidable en situ.



FOTOGRAFÍA No.4: Sedimentador 1: El Sub contratista Colngenieria, termina la instalación del barrelodos y labores de canaletas en acero inoxidable en situ.

PTAP GINEBRA - TANQUE DE ALMACENAMIENTO y TANQUE LA ALBANIA



FOTOGRAFÍA No.5: • Rellenos perimetrales: en ejecución



FOTOGRAFÍA No. 6: • Rellenos perimetrales: en ejecución



FOTOGRAFÍA No.7: caseta electrica, obra civl ejecutada,



FOTOGRAFÍA No.8: Tanque de almacenamiento La Albania Fundición Losa Superior



FOTOGRAFÍA No.9: Tanque de almacenamiento La Albania Fundición Losa Superior




FOTOGRAFÍA No. 10: Tanque de almacenamiento La Albania Fundición Losa Superior

PTAP GUACARI



FOTOGRAFÍA No. 11:
Estado Actual Floculador No.03: Se continua con la demolición de elementos en concreto-pasarelas



FOTOGRAFÍA No. 12:
Estado Actual Floculador No.03: Se continua con la demolición de elementos en concreto-pasarelas



FOTOGRAFÍA No. 13: Sedimentador No. 03:



FOTOGRAFÍA No. 14: Estado Actual Sedimentador 1: En servicio



FOTOGRAFÍA No. 15: Estado Actual Sedimentador 2: En servicio



FOTOGRAFÍA No. 16:
Caseta elèctrica: Estado Actual: En ejecución 45 %

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO | **PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONTRATO No. :	2000.13.05.003-2022	
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$	29.432.080.933,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGUACARI	
PLAZO:	22 MESES	
VALOR ANTICIPO :	30% $	8.829.624.280,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	ADMINISTRATIVOS				-	-
2	EQUIPOS	$ 1.744.905.661,00	$ -	$ 1.744.905.661,00	$ 1.744.905.661,00	$ -
3	TRANSPORTES				$ -	$ -
4	MATERIALES	$ 6.125.300.150,00	$ -	$ 5.112.500.588,00	$ 6.125.300.150,00	$ -
5	OTROS	$ 959.418.469,00	$ -	$ 948.875.806,00	$ 948.875.806,00	$ 10.542.663,00
	TOTALES	**$ 8.829.624.280,00**	**7.280.569.145,00**	**7.806.282.055,00**	**8.819.081.617,00**	**10.542.663,00**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 22 FEBRERO DE 2025

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		
	31	3	2025	HORA DE FINALIZACIÓN :		
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS			MUNICIPIO:	GINEBRA/GUACARI	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :		
CONSORCIO : REDES Y PTAPS VALLE				AVANCE DE OBRA (%)		82,40%

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
AIRE		X		
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO		X		
EMISIONES DE RUIDO		X		
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS				
OTROS:				
SUELO	**SI**	**NO**	**N/A**	
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA		X		
PROCESOS EROSIVOS		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS)		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD		X		
OTROS:				
AGUA	**SI**	**NO**	**N/A**	
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES		X		
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS		X		
OTROS:				
FLORA Y FAUNA	**SI**	**NO**	**N/A**	
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL	X			
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES		X		
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS		X		
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS		X		
AFECTACIÓN A HÁBITATS		X		
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS		X		
OTROS:				
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES	**SI**	**NO**	**N/A**	
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)	X			
OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	X			EN IMPLEMENTACION
PERMISO DE VERTIMIENTOS		X		
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	X			PENDIENTE DE AUTORIZAR EN LA ZONA BOCATOMA
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS		X		
OTROS:				
SOCIOECONÓMICO	**SI**	**NO**	**N/A**	
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	X			
ACTAS DE VECINDAD	X			
ACTAS DE RECIBO		X		
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES	X			
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS		X		
PREDIOS AFECTADOS		X		
AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		X		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA		X		
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	X			
MANO DE OBRA LOCAL	X			
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		X		
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL		X		
GESTIÓN SOCIO -PREDIAL	X			
OTROS:				
OBSERVACIONES:				

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 22 FEBRERO DE 2025

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		10	
	4	4	2025	HORA DE FINALIZACIÓN :		12	
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI		
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :			
CONSORCIO :	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)		88%	
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA:		JULIANA IZQUIERDO M.	

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.	1			Se anexan soportes de pago de seguridad social
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.	1			
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	1			En el mes marzo se presento 1 accidente, se adjunta la investigacion y reporte 0 incidentes, se reporta incapacidades por enfermedad común
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES	1			Se realiza comité del COPASS en el el mes de marzo del 2025 en el que se realiza recorrido de obra para verificar señalizacion de areas, se presentan novedades en el botiquin
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	1			Se adjunta registro fografico de las inducciones en las que se tratan los temas de politicas y objetivos SST.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	1			Se adjuntas formatos AROS para actividades de alto riesgo.
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)	1			Se diseña plan de emergencia, se designan puntos de encuentro y mantienen en las oficinas lo elementos del plan de emergencias
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA	1			
SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ZONAS	1			Se delimita la zona de excavacion
CAMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO	1			se realiaza inspeccion
EXTINTORES	1			se realiaza inspeccion
BOTIQUIN	1			se realiaza inspeccion
KIT DE DERRAMES		1		No hay uso de sustancias toxicas
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).	1			Anexo del informe
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES, IPS,POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC)	1			Se encuentra instalado en la cartelera SST
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL	1			Se revisan examenes de los subcontratistas, no se adjuntan anexos al informe
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1			Se hace seguimiento a los pendientes
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019 ESTANDARES MINIMOS.		1		Aun no adjunta la certificacion por parte de la ARL y el ministerio de trabajo del porcentaje de cumplimiento del sisteme de gestion.
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL		1		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 22 FEBRERO DE 2025

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		10	
	4	4	2025	HORA DE FINALIZACIÓN :		12	
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI		
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :			
CONSORCIO :	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)		88%	
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA:		JULIANA IZQUIERDO M.	

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS	1			Se adjunta registro fotografico
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓNES Y/O PLAN DE FORMACIÓN	1			
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN	1			Se presenta ATS para las actividades de alto riesgo
EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS	1			Se divulga las politicas SST al personal operativo subcontratista y al personal administrativo
PUNTO ECOLOGICO	1			
TOTAL	**21**	**3**	**0**	
CUMPLIMIENTO	**88%**			

OTROS:

OBSERVACIONES:

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

INFORME No. 23 DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005- 2022

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 200.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRA PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOSDE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL

INTERVENTOR
CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

SUPERVISOR
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.
DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA

DISTRITO SANTIAGO DE CALI – MARZO 2025

INFORMACION GENERAL

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933.oo) M/CTE
Valor inicial	$ 29.432.080.933.oo
Valor Adición No.01	$ 2.571.146.616.oo
Valor Total del Contrato	$ 32.003.227.549.oo
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Inicio:	Diciembre 1 de 2022
Plazo de ejecución delproyecto	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Fecha de Terminación:	Enero 1 de 2024
Fecha de suspensión No.01:	Dos meses a partir de Julio 27 de 2023
Prorroga No. 01 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Septiembre del 2023
Prorroga No. 02 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Octubre del 2023
Prorroga No. 03 a la Suspensión No.01	45 días a partir del 27 de Noviembre del 2023
Fecha de reinicio:	Enero 10 de 2024
Nueva fecha de terminación:	Junio 14 de 2024
Adicional en Tiempo No.01	Nueve (09) meses
Fecha de terminación prorroga	Marzo 14 de 2025
Adicional en Tiempo No.02	Diez (10) meses
Nueva fecha de terminación	Enero 22 de 2026

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico y financiero de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2025.

2.1 COMITÉS DE OBRA

Durante este mes se realizaro un comité de obra en componente eléctrico, al cual asistio, el contratista Consorcio Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari.

2.1.1 – Marzo 12 de 2025

Se realiza la reunión en las instalaciones de la PTAP de Guacari, durante este comité se tratan temas eléctricos de cada una de la Ptaps, tanto en Ginebra como en Guacarí.

El comité de obra se transcribe y posteriormente es compartido a los correos electrónicos de los participantes para las observaciones y comentarios.



Comité de obra componente eléctrico, con el contratista Consorcio Redes y PTAPS Valle y la interventoría Consorcio Interguacari.

2.2 COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO

A la fecha se han tramitado 13 actas parciales al contratista y el respectivo descuento del anticipo:

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		$ 29.432.080.933	
Valor adicionado:		$ 2.571.146.616	
Valor total del contrato:		$ 32.003.227.549	
Valor Acta Parcial No. 1:	$ 8.371.066.842		26,16%
Valor Acta Parcial No. 2:	$ 886.015.856		2,77%
Valor Acta Parcial No. 3:	$ 907.712.127		2,84%
Valor Acta Parcial No. 4:	$ 503.892.952		1,57%
Valor Acta Parcial No. 5:	$ 369.286.058		1,15%

Valor Acta Parcial No. 6:	$	7.371.115.364		23,03%
Valor Acta Parcial No. 7:	$	604.131.566		1,89%
Valor Acta Parcial No. 8:	$	385.455.620		1,20%
Valor Acta Parcial No. 9:	$	689.009.943		2,15%
Valor Acta Parcial No. 10:	$	1.216.561.098		3,80%
Valor Acta Parcial No. 11:	$	2.068.353.769		6,46%
Valor Acta Parcial No.12	$	690.349.724		2,16 %
Valor Acta Parcial No.13	$	2.313.472.543		7.23 %
Total, cancelado a la fecha:	**$**	**26.376.423.462**		82.42%
Saldo por ejecutar:	$	5.626.804.087		17.58%
Sumas iguales:	$	32.003.227.549	$ 32.003.227.549	100,00%

Tabla N° 1. Relación pago actas parciales de obra al contratista

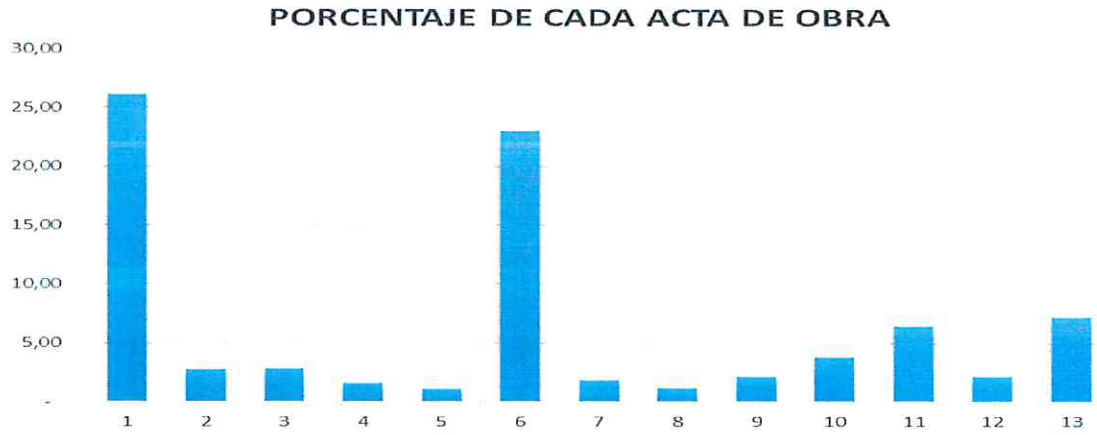


Figura N° 1. Gráfico de la relación de pagos de actas parciales contratista

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	% amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			$ 8.829.624.280	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	$ 2.511.320.053		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	$ 265.804.757		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	$ 272.313.639		3,08%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	$ 151.167.886		1,71%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	$ 110.785.818		1,25%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	$ 2.211.334.610		25,04%
Amortización acta Parcial N° 7:	31/07/2024	$ 181.239.470		2,05%
Amortización acta Parcial N° 8:	31/08/2024	$ 115.636.686		1,31%
Amortización acta Parcial N° 9:	30/09/2024	$ 206.702.983		2,34%
Amortización acta Parcial N° 10:	08/11/2024	$ 364.968.330		4,13%
Amortización acta Parcial N° 11:	30/11/2024	$ 620.506.131		7,03%

Amortización acta Parcial N° 12:	31/01/2025	$ 207.104.917		2,35%
Amortización Acta Parcial No.13	10/02/2025	$ 694.041.763		
Valor amortizado		**$ 7.912.927.043**		**89.62 %**
Saldo por amortizar:		$ 916.697.237		**10.38%**
Sumas iguales:		**$ 8.829.624.280,00**	**$ 8.829.624.280**	**100,00%**

Tabla N° 2. Relación amortización anticipo

Relación de actas parciales de la interventoría:

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		$ 1.502.246.766	
Valor adicionado:		$ 131.126.000	
Valor total del contrato:		$ 1.633.372.766	
Valor Acta Parcial No. 1:	$ 427.238.980		26,16%
Valor Acta Parcial No. 2:	$ 45.217.628		2,77%
Valor Acta Parcial No. 3:	$ 72.195.076		4,42%
Valor Acta Parcial No. 4:	$ 18.783.787		1,15%
Valor Acta Parcial No. 5:	$ 376.165.748		23,03%
Valor Acta Parcial No. 6:	$ 30.870.745		1,89%
Valor Acta Parcial No. 7:	$ 19.658.237		1,20%
Valor Acta Parcial No. 8:	$ 35.139.507		2,16%
Valor Acta Parcial No. 9:	$ 62.044.616		3,80 %
Valor Acta Parcial No. 10:	$ 105.486.042		6,46 %
Valor Acta Parcial No. 11	$ 35.207.836		2,16 %
Valor Acta Parcial No. 12	$ 117.987.100		7.22 %
Total, cancelado a la fecha:	**$ 1.345.995.302**		**82.41%**
Saldo por ejecutar:	$ 287.377.464		17.59%
Sumas iguales:	$ 1.633.372.766	$ 1.633.372.766	100,00%

Tabla N° 3. Relación de pagos actas parciales interventoría

Relación de la amortización del anticipo realizados a la interventoría:

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	Porcentaje % amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			$ 450.674.030	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	$ 128.171.694		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	$ 13.565.288		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	$ 21.658.523		4,81%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	$ 5.635.136		1,25%

Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	$	112.849.724		25,04%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	$	9.261.224		2,05%
Amortización acta Parcial N° 7:	13/09/2024	$	5.897.471		1,31%
Amortización acta Parcial N° 8:	30/09/2024	$	10.541.852		2,33%
Amortización acta Parcial N° 9:	12/11/2024	$	18.613.385		4,13%
Amortización acta Parcial N° 10:	02/12/2024	$	31.645.813		7,02%
Amortización acta Parcial N° 11:	01/31/2025	$	10.562.351		2,34%
Amortización Acta Parcial No. 12	11/03/2025	$	35.396.130		7,86%
Valor amortizado		**$**	**403.798.591**		**89.6%**
Saldo por amortizar:		$	46.875.439		10.4%
Sumas iguales:		$	450.674.030	$ 450.674.030	**100,00%**

Tabla N° 4. Relación amortización del anticipo realizados a la interventoría

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí.
Las obras que se contemplan construir son:
Bocatoma
Línea de Aducción
Desarenador
Cámara de distribución de caudal - CADICA
Viaductos
Líneas de Conducción en tubería PEAD: Tramo 1 en 18" – Tramo 2 en 10 " y Tramo 3 en 14"
Intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí´


2.3 COMPONENTE TECNICO - ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Durante el mes de Febrero de 2025, se desarrollan actividades en:

A. BOCATOMA

1. Tipo de Bocatoma: Lateral sobre el Rio Guabas
2. Caudal de Captación: 233 Lps
3. Caudal de Derivación a Guacari: 164.5 Lps
4. Caudal de Derivación a Ginebra: 68.5 Lps

Estado Actual Bocatoma: **Sin ejecución.** Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto

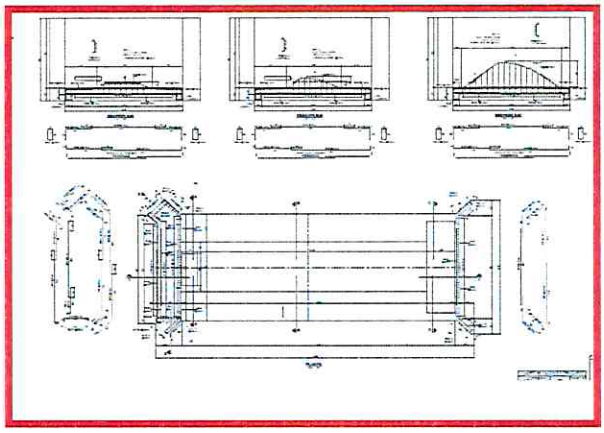

El Consultor - Ing. Carlos Valencia , envio la propuesta economica y tecnica al Contratista Consorcio Redes y Ptaps Valle, para la implementacion de una nueva tecnica que va a reemplazar la funcion del desarenador por malla **Coanda,** la cual va a estar instalada en la bocatoma**.**

Se va evaluar por la entidad contratante la viabilidad económica de la propuesta.

B. ADUCCIÓN

1. Línea De Aducción: Tubería PEAD DN 18" L: 6.0 ml
2. Caudal: 233 Lps

Estado Actual Línea de Aducción: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto


C. DESARENADOR


1. Caudal de diseño: 233 Lps

Estado Actual Desarenador: Sin ejecución.

Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto.

Se está evaluando la alternativa de reemplazar esta estructura por la implementación de Mallas COANDA la cual va estar instalada en la bocatoma.

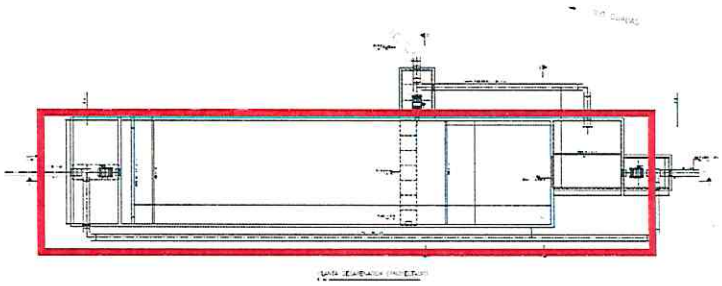




1.1 Dimensiones

Largo: 38 mts
Ancho: 8 mts
Profundidad: 5 mts

D. MACROMEDIDOR

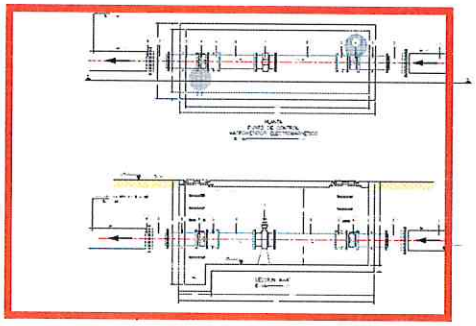


Sin ejecución.


2. CONDUCCIÓN

2.1 Tramo 1 Bocatoma – CADICA en Puente Rojo: Tubería PEAD diámetro 18" – L=3450ml

Estado Actual Tramo 1: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto.

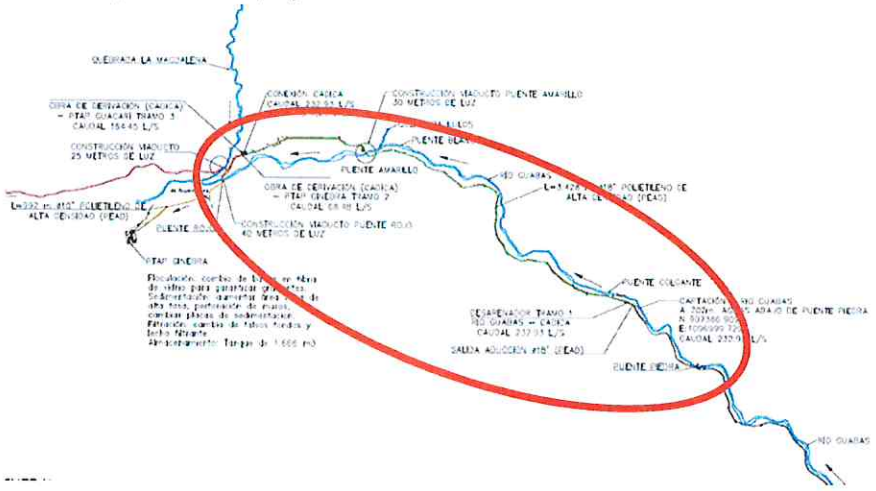

D.2 CADICA: Cámara de Distribución de caudales

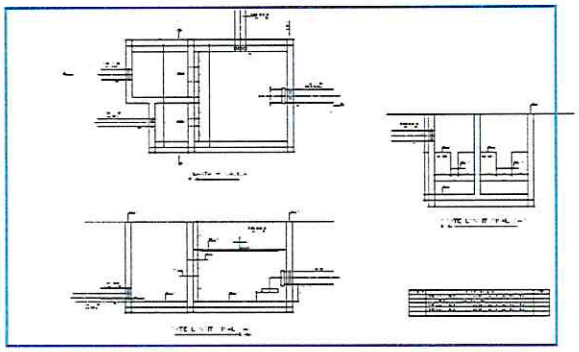

D 2.1 Dimensiones

Largo: 5.4 mts
Ancho: 3.4 mts
Profundidad: 3 mts

Estado Actual CADICA: Sin ejecución. Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto.
Nota:

Se tiene proyectado cambiar de lugar la CADICA, según la Ing. Gina López – encargada de la revisión hidráulica por parte del Contratista, es posible ubicarla aguas arriba donde está proyectada.
La revisión hidráulica donde la propone tiene el concepto favorable.
Además, hay espacio para su construcción.

Según información suministrada por la Ing. López, el alcantarillado existente está muy superficial al igual que las redes domiciliaras

Se va a evaluar de instalar ese tramo de tuberías PEAD 14" y 10", mediante perforación dirigida.

El contratista va a investigar quien es el dueño de lote donde funciona un parqueadero, sitio donde se tiene proyectado la construcción de la CADICA


D.3 Tramo 2 CADICA en Puente Rojo a PTAP Ginebra: Tubería PEAD diámetro 10" – L=1000ml


Estado Actual Tramo 2: **Sin ejecución.** Ya existe acercamiento con la Comunidad, que ha aceptado seguir con la ejecución del proyecto y la Familia Saavedra



Está en proceso de legalización la servidumbre con la Familia Saavedra – Blum, para la instalación de la tubería PEAD de 10 ".

D.4 Tramo 3 CADICA en Puente Rojo a PTAP Guacarí: Tubería PEAD diámetro 14"



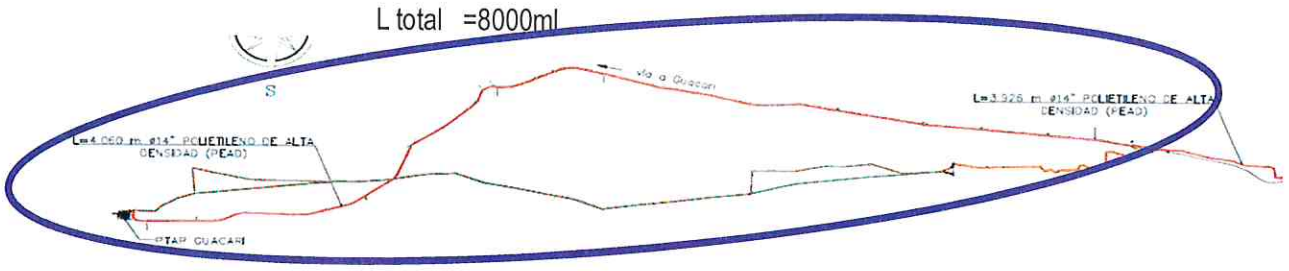

Porcentaje de Ejecución: 72 %

Estado Actual: El Tramo 3, Instalación tubería PEAD diámetro 14" L: 5.738 ml, la Comunidad suspendió las obras el día 11 de Junio de 2024.

La Comunidad representada por Pro-Territorio, firmo el 18 de Diciembre de 2024, un acta de acuerdo pactado entre la Gobernación del Valle y Vallecaucana de Aguas para continuar con las obras.

Está en proceso de legalización la servidumbre con el Ingenio Pichichi, para la instalación de la tubería PEAD de 14 ".

3. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

PTAP GINEBRA

Floculadores: Cambio de placas de AC a Fibra de Vidrio
Concluido



Sedimentadores 1 – 2 – 3 :

Actividades ejecutadas:

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas




Sedimentador 3 : En servicio



Sedimentador 2 : En servicio



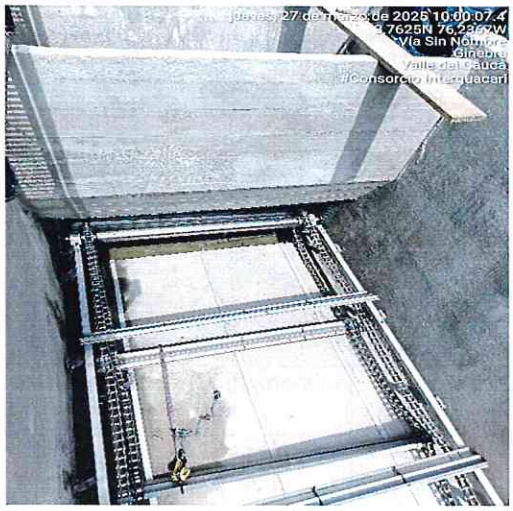

Sedimentador 1: La obra civil se terminó, ya el Sub contratista Co Ingeniería, culmino la instalación del barrelodos .

Actividades de Filtración: Demolición de canales en concreto
Retiro de material filtrante
Demolición de falso fondo
Ajuste Losa de Fondo
Sistema de sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable
Canal Falso Fondo - Leopold

Estado Actual Filtración:

- Instalación de canaleta en acero inoxidable para agua de lavado de filtro
- Instalación de niples pasamuros de sedimentador



Por ejecutar:

- Instalación de los falsos fondos Leopold
- Instalación de sistema de inyección de aire proveniente de los sopladores
- Instalación de lechos de grava
- Instalación del filtrolite

Tanque de Almacenamiento

Con una capacidad de almacenamiento de 470 m3 en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas

Estado Actual: En ejecución 92 %

Actividades por ejecutar:

- Losa superior de cámaras de entrada y salida

- Instalación de sistema de válvulas
- Instalación de tapas en láminas de alfajor para entrada a tanque
- Rellenos perimetrales: en ejecución
- Instalación tubería de desagüe
- Conexión al sistema existente



Caseta eléctrica



Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil

Por motivos de lluvias constantes se suspende las labores de:
Las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica
Rellenos con material de excavación



Caseta de Sopladores de Filtracion

- Se inician las excavaciones para la ampliación




Suministro de Sopladores



Suministro de Falsos Fondos



Tanque de almacenamiento La Albania

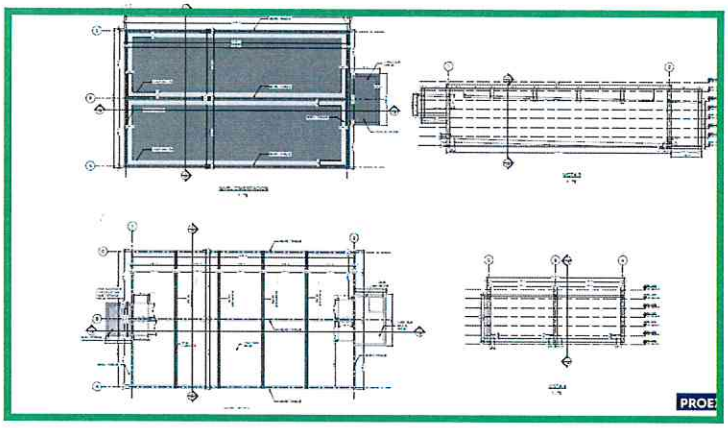

Dimensiones

Largo: 25 mts
Ancho: 15 mts
Profundidad: 5 mts

Actividades ejecutadas:

- Localización y replanteo
- Chequeo de niveles de la excavación
- Excavación a máquina y retiro de material sobrante de la excavación

- Auxiliar vial controlando el tráfico por la salida y entrada de volquetas, en la vía de acceso a el tanque de almacenamiento
- Fundición solado de limpieza
- Colocación de refuerzo losa inferior
- Colocación de refuerzo en muros
- Espesor de losa y muros: 40 cms - 28 Mpa
- Instalación de formaleta metálica para muros perimetrales y central
- Instalación de formaleta metálica para para muros perimetral de caja de salida
- Instalación de cinta PVC
- Fundición de losa inferior y 0.5 mtrs de muro el dia Viernes 24 de Enero 2025.
- Toma del Slump y muestras de concreto en la mañana y tarde
- Colocación de 189 m3 de concreto premezclado
- Aplicación de antisol
- Retiro de formaleta metálica interior y exterior de parte inicial del muro perimetral
- Inicio de colocación del acero de refuerzo de los muros perimetrales
- Inicio de instalación de la formaleta metálica
- Riego con agua la losa del tanque y parte del muro en la mañana y tarde
- Se termina de instalar la formaleta metálica
- Instalación de cinta PVC
- Fundición de muros en concreto a una altura de 2.4 mtrs
- Toma de muestras de concreto y slump
- Retiro total de formaleta metálica
- Fraguado de muro
- Instalación de formaleta metálica para terminar el muro en concreto, a una altura de 1.8 mtrs
- Construcción de formaletas en madera para vigas transversales vigas de 40 por 45
- Fundición del último tramo de muro
- Retiro de formaleta del ultimo tramo de muro
- Instalación de formaleta para la fundición de losa superior
- Colocación de acero de refuerzo losa superior y vigas transversales












Buga-Ginebra
Ginebra
Valle del Cauca
#Consorcio Interguacari





Valle del Cauca
#Consorcio Interguacari




3,7377N 76,2564W
Buga-Ginebra
Ginebra
Valle del Cauca
#Consorcio Interguacari



Area resaltada en rojo significa fundicion en concreto

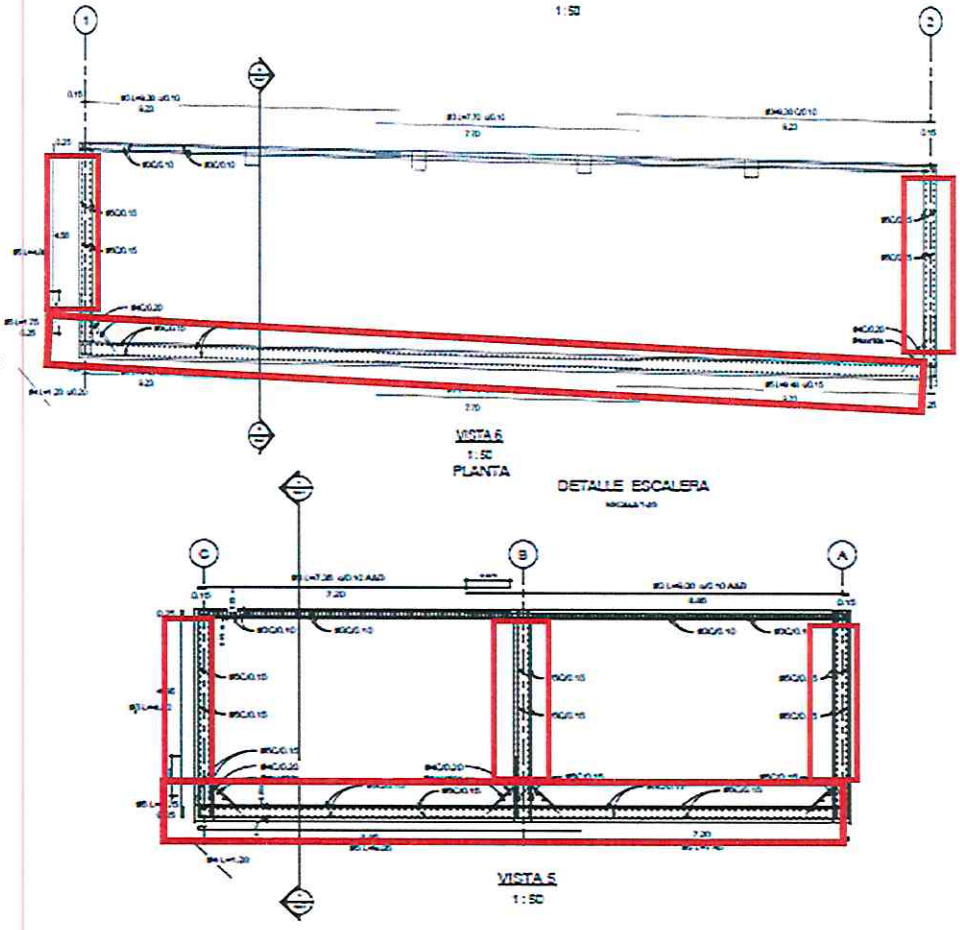

PTAP GUACARI

Floculadores: Sistema nuevo de paletas mecánicas para el primer circuito

Estado Actual Floculador:

Floculador No. 03

-Demolición de pasarelas y retiro de equipos existentes










Sedimentador 3:

- Retiro del sistema de sedimentación existente: tubería perforada – placas en asbesto cemento

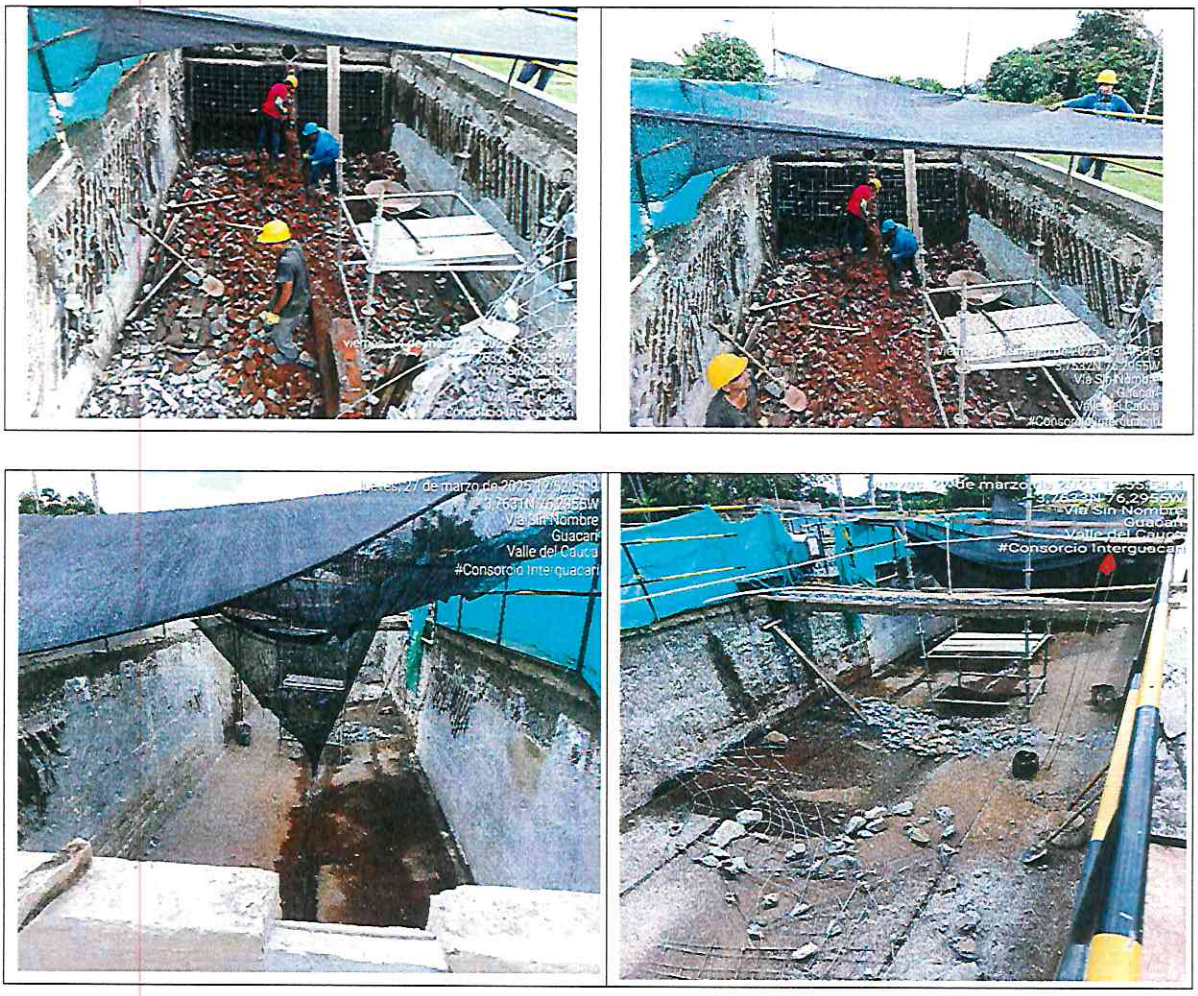

Sedimentadores 1 – 2- 3: Actividades en general:

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas

Actividades a realizar por Sedimentador:

- Ajustes de losa de fondo en concreto
- Impermeabilización de muros
- Instalación de la estructura metálica y los módulos sedimentadores tipo colmena
- Instalación de las tres cerchas en acero inoxidable que soportaran las canaletas
- Instalación de las canaletas de reparto en acero inoxidable.
- Instalación de la estructura metálica de la pasarela y los pasamanos

- Instalación válvula mariposa de diámetro 4" para evacuar los lodos
- Instalación de las válvulas existentes de diámetro 4"
- Ajustes para iniciar las pruebas y puesta en marcha del barrelodos con personal de Acuavalle

Estado Actual Sedimentador 1: En servicio



Estado Actual Sedimentador 2: En servicio



Filtración: Canal Falso Fondo - Leopold
Ajuste Losa de Fondo
Sistema de sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable

Estado Actual Filtración: Sin ejecución

Suministro de falsos fondos – Son seis unidades (Sistema A – Sistema B)



Suministro de sopladores -Son dos unidades



Suministro de material filtrante



Caseta eléctrica

Estado Actual: En ejecución 30 %

Actividades ejecutadas

- Realizan la excavación de las zapatas adicionales de la caseta
- Retoman el armado del acero de los castillos de las columnas
- Arman el acero y funden las zapatas y los pedestales de la caseta
- Arman el acero de las vigas de cimentación adicionales.
- Realizan el relleno con material de sitio en la zona de las zapatas
- Fundición de vigas de amarre superior
- Fundición de pedestales para cubierta
- Colocación de ladrillo estructural



Se llevo a cabo una reunión el día 12 de Marzo de 2025 para tratar temas relacionados con la parte eléctrica de la caseta que se está construyendo, participaron Contratista e Interventoría (Ing. Eléctrico Luis Mario Dávila).



2.3 COMPONENTE AMBIENTAL

Con relación al tema ambiental se tiene:

- Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma Ginebra, se tiene que, la Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta : Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 - "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" - VIGENCIA: 23-07-2025

- Permiso para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se radico ante la Secretaria de Planeación de Guacarí, pero a la fecha no se tiene respuesta. El contratista radica nuevamente oficio en las Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.

- Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138117, donde informan que las vías a intervenir son del Municipio de Guacarí.

  - Permiso de rotura
    Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:

    Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.
    Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra

  - Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Guacari, el tramo que corresponde:

  – Puente Amarillo a Puente Rojo.

  - Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA

    En el siguiente cuadro se registran los permisos, que se han solicitado, los que se han otorgado y los que estan en proceso de ejecución:

ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
CVC	• Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma, desarenador, macromedidor y aducción.	**Nota 1: La Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024** **OTORGADO** Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca" **VIGENCIA 23-07-2025**

CVC	• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.	**AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN**
CVC	**PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES** El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo. Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo. Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A E.S.P radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024. Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto)	**AMBIENTAL PARA PRÓRROGA** Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 de Febrero de 2024. Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año) Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 2024 por evaluación y seguimiento para prórroga. Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de Mayo de 2024
CVC	Permiso de Concesión de aguas superficiales	**OTORGADO Resolución 0740 No. 0741 0000576 10-07-2020**"Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" **VIGENTE**
CVC	Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra	**OTORGADO** **Resolución 740 No. 0741 0381** **29-04-2024** Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad.
Planeación Municipal Ginebra	Licencia de Espacio Público	**OTORGADO** **Resolución No. 004-01 2023** **26-01-2023** "Por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público" **VIGENCIA 26-01-2025** **VIGENTE**
ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	**DESCRIPCION**	**ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)**
Planeación Municipal Guacarí	Licencia de Espacio Público	**OTORGADO** **Resolución No. 004-01 2023** **26-01-2023** Por la cual se expide una licencia de intervención del espacio público para desarrollar un proyecto" **VIGENCIA 03-02-2025**

		VIGENTE
Secretaria de Movilidad de Ginebra	Plan de Manejo de tránsito	**OTORGADO** **Resolución No. 900-50-020** **20-03-2023** "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" **VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP VIGENTE**
Secretaria de Movilidad y transporte de Guacarí	Plan de Manejo de tránsito	**OTORGADO** "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" **VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP VIGENTE**
Planeación Municipal Ginebra	**Permiso de rotura pavimento** Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos: Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, en el tramo: Puente Amarillo a Puente Rojo.	**PENDIENTE** - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Ginebra el día 14 de agosto, en la y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024 - El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024. - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra el día 22 de octubre de 2024.
Planeación Municipal Guacarí	Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo: Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Placer) hasta la Planta de Guacarí.	**PENDIENTE** - Se recibe el 22 de mayo 2024 documentación por el Director del Departamento Administrativo de Planeación sobre la solicitud ante la Alcaldía de Guacarí. - "El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Guacarí el día 21 de agosto y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024" - "El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024." - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.
CVC	Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRAEn el mes de julio se realizó visita a predio de la Alcaldía de Ginebra para realizar la compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. Se está a la espera de comunicado de la CVC para aprobación del nuevo predio y su recomendación para poder realizar esta compensación.	**EN ESPERA DE RESPUESTA** . Es este periodo visitan la obra dos funcionarios de la CVC, la Ingeniera Daniel Castillo y el Técnico Segundo Fiscal para a coordinar lo relacionado con la siembra por compensación en respuesta al requerimiento realizado por ACUVALLE y en cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal de la planta de Ginebra. Pero no se pudo hacer la visita a el predio debido a que no se dio la autorización para la visita, se debe reprogramar

2.4.1 Disposición de residuos sobrantes de obra:

El contratista cuenta con dos sitios autorizados para la disposición de estos residuos:

- El relleno sanitario en el corregimiento de Presidente en el Municipio de San Pedro. Este cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CVC
- Servi Transportes López y Recuperación Ambiental S.A.S, en el Municipio de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m3 para disposición final de RCD avalado por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
- Como el tanque de la PTAP de Ginebra se debe rellenar debido a que el diseño inicial tenía una sección mayor, el material sobrante de las excavaciones del tramo 3 se está llevando a la planta y se está aprovechando este material para hacer el relleno.

2.4 PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PMT

En este período el contratista continua la actividad de fundición con concreto premezclado para el tanque de almacenamiento.

- El contratista las señales informativas móviles
- Se cuenta con un auxiliar vial para controlar la salida y el ingreso de las volquetas



Señal movil – indicando entrada y salida de mixer



Señal movil – indicando entrada y salida de mixer

2.5 INCONVENIENTES QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Desde que se inició la ejecución del proyecto se ha tenido situaciones que han impedido el correcto desarrollo de los trabajos en la mayoría de los frentes, en este momento solo se está trabajando en las plantas de tratamiento de agua potable de Ginebra y Guacarí, estas plantas se están haciendo adecuaciones en los tanques sedimentadores, en el siguiente cuadro, se resumen las actividades que se encuentran suspendidas:

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	ESTRUCTURA	ESTADO
Aprovechamiento forestal en la bocatoma	Bocatoma, desarenador, macromedidor	Pendiente visita CVC

Permiso de ocupación de cauce	Bocatoma	Pendiente visita CVC
Servidumbre Ingenio Pichichi K5+350 a K5+850	Tubería de conducción – Tramo 3	Ya el Ingenio Pichichi aprobó. Pendiente legalización de la escritura
Permiso por parte de la señora Blum, para la instalación de tubería PEAD 10" , llegada a la PTAP de Ginebra	Tubería de conducción tramo 2	Ya se adjudicó el contrato para Realizar la instalación de la tubería en el predio de la señora Blum – Pendiente la servidumbre por parte de la Familia Saavedra-Blum para dar inicio a la instalación de la tubería
Rediseño de las estructuras en la zona de los viaductos	Viaductos	Suspendido – Vallecaucana
Actividades del tramo 3 suspendidas, por comunidad, no están de acuerdo con la ejecución del proyecto	Línea de conducción tramo 3	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación
Inicio a trabajar en la bocatoma, desarenador y CADICA	Bocatoma-desarenador-CADICA	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación
Por la problemática social que se tiene con los habitantes de la zona rural, no se ha podido dar inicio a las actividades que comprenden el tramo 1. Esto viene desde el año 2023 y hoy no se ha resuelto esta situación	Línea de conducción tramo 1	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación

Tabla 7: Inconvenientes presentados que impiden la ejecución de los trabajos

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto
Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto
Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad
Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la comunidad
Aspecto No. 5: Reuniones con la comunidad
Aspecto No. 6: Programa de atención a la comunidad
Aspecto No. 7: Programa de atención al ciudadano

Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra
Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra
Aspecto No. 10: Conformación del comité de veeduría ciudadana
Aspecto No. 11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: Realizar las actividades pertinentes de acuerdo al Plan de Gestión Social, que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el consorcio Redes y Ptaps Valle.

- **Aspecto No. 01: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto.**

  Acciones Desarrolladas:

  Continúa pendiente la realización de la cartografía social.

- **Aspecto No. 02: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto**
  Objetivo: Garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

  Acciones Desarrolladas:

  En el mes de marzo de 2025 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 77.14%

Hasta ahora se han realizado las siguientes actas:

Regaderos - Ginebra :	15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo:	6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda:	23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra:	7 actas de inicio
Sector Albania:	2 actas de vecindad
	1 acta de entorno

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	54	16	77.14%

Tabla N° 1 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado

Se evidenció que el componente social del contratista realizó las siguientes actividades:

Se visitó al Ing. José Luis Salcedo – Secretario de Planeación de Ginebra, para informarle que la Dra. María Fernanda Martínez se reunió con el señor Engelberto Moreno – Inspector de Policía del sector rural, para hacerle seguimiento a la solicitud de apoyar al Consorcio Redes y Ptaps Valle, en buscar solución al asentamiento irregular en el sector donde se construirá la bocatoma.

El señor Engelberto Moreno – Inspector de Policía del sector rural, informó que dará respuesta escrita a la solicitud, sin embargo, comunicó que realizó la visita de seguimiento a la solicitud, se entrevistó con el señor Jairo Morales (arenero), propietario del asentamiento irregular y realizó un acta de compromiso con el señor para que en el momento en que se empiece las obras retirará la construcción irregular, manifestó que el señor solicitó que lo tengan en cuenta como ayudante de la obra o vigilante.



Foto N°1. Visita al Ing. Jose Luis Salcedo – Secretario de Planeación de Ginebra

- **Aspecto No. 03 : Programa de Información a la Comunidad**

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad por medio de las socializaciones que se han realizado en meses pasados, dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.

- **Aspecto No. 04 : Programa de divulgación a la comunidad**

Acciones Desarrolladas:

En el mes de marzo no se programaron actividades de divulgación a la comunidad.

- **Aspecto No. 05: Reuniones con la comunidad**

Acciones Desarrolladas:

La interventoría evidencia que el contratista ha cumplido con esta actividad de reuniones con la comunidad planteada en el Plan de Gestión Social.

- **Aspecto No.06: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

Objetivo: Informar y divulgar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, compresión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

- **Programa de atención a la comunidad**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no se recibió PQRS de la comunidad.

Se realizó seguimiento a las vallas informativas ubicadas en las vías principales de ingreso de los dos municipios de Ginebra y Guacarí, brindando la información sobre el contrato.



Foto N°2. Punto de Atención a la Comunidad

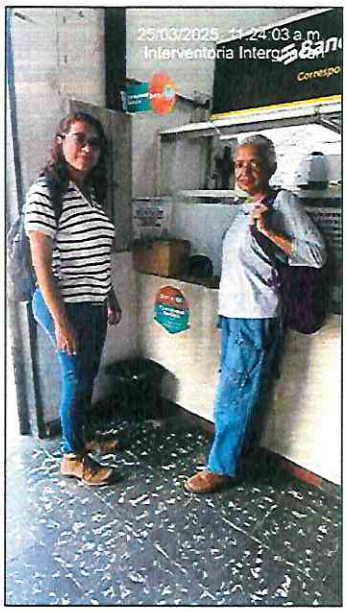


Foto N°3. Seguimiento Buzón de sugerencias de Ginebra



Foto N°4.Seguimiento Buzón de Puente Rojo



Foto N°5. Cartelera Informativa





Foto N°6. Valla informativa en Guacarí

Foto N°7. Valla informativa en Ginebra

- **Aspecto No. 07 : Programa de atención al ciudadano**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos:
Martes de 08:00 am a 12m
Viernes 1:00 pm a 4:00 pm,
Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - corregimiento de Costa Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca.

Existen dos buzones de sugerencias: El buzón de Guacarí se encuentra ubicado en Puente Rojo en el restaurante frente al balneario Chicuco.
El buzón de Ginebra está ubicado en Estanco Tas- Tas, Cra 2 #5-06 en la cabecera municipal.

NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA
María Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	calle 11 # 4-37 tercer piso. edificio La Piscina barrio El Centro corregimiento Costa Rica municipio Ginebra.

Tabla N° 2 Información atención a la comunidad

- **Aspecto No.08: Recorridos por la Obra**

Acciones Desarrolladas:

En este mes de marzo se realizó recorrido de obra con los veedores de Guacarí, para mostrar los avances en la planta de tratamiento de Guacarí.

- En esta reunión participaron las Veedoras Sandra Villa, Allileny Henao, y Representantes del Contratista e Interventoría.
- El Ingeniero Darío Flórez – Residente de Obra del Consorcio Redes y Ptaps Valle, informó sobre las actividades que se han desarrollado en la PTAP y mostró en el recorrido el funcionamiento de los barrelodos, explicó el recorrido del agua, muestra los sedimentadores y su funcionamiento e informa que la idea es terminar el otro sedimentador antes de Semana Santa para comenzar con la instalación y ensamblaje del barrelodo.





Foto N°8. Recorrido de obra Planta Guacarí *Foto N°9. Recorrido de obra Planta Guacarí*

- **Aspecto No. 09. Reunión de avances de obra**

El contratista debe realizar las reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y organismos de control. Hasta el momento no se han solicitado.

Acciones Desarrolladas:

Se evidenció que el componente social del contratista realizó la reunión informativa de avance de obra con los veedores ciudadanos del municipio de Guacarí, la reunión con los veedores de Ginebra fue aplazada por falta de quorum.

- La interventoría social participó y evidenció la realización del comité de veeduría del municipio de Guacarí, en donde el Ing. Darío Flórez informó sobre las actividades realizadas hasta el momento.
- En esta reunión participaron las Veedoras Sandra Villa y Allileny Henao, y Representantes del Contratista e Interventoría.



Foto N°10. Invitación a la reunión de comité de veeduría de Guacarí



Foto N°11. Reunión comité de veeduría Guacarí

- No fue posible la realización del comité de veeduría del municipio de Ginebra, por falta de quorum, esta reunión fue aplazada.

- **Aspecto No.10: Conformación del comité de veeduría ciudadana.**

Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto N° 10 del Plan de Gestión Social con la conformación de los dos comités de veeduría ciudadana en los dos municipios de Guacarí y Ginebra.

Se realizó la reunión mensual del comité de veeduría de Guacarí correspondiente al mes de marzo de 2025.

Se visitó al Dr. Adolfo Tigreros - personero municipal de Ginebra, para hacerle seguimiento a la solicitud de admitir un miembro suplente en el comité de veeduría de Ginebra.

El Dr. Adolfo Tigreros - Personero Municipal de Ginebra informó que ya está lista la respuesta donde informa que se debe citar a asamblea general para modificar temporalmente los estatutos de la veeduría, para el ingreso de la señora Yuri Liceth Gallego como suplente de la señora Eliana Tascón quien se encuentra fuera del país.



Foto N°12. Visita a la Personería Municipal

Reunión de seguimiento de las actividades de Gestión Social

Se participó en la reunión de seguimiento de las actividades de Gestión Social, con la Dra. María Fernanda Martínez – Residente Social del contratista, y la Dra. Dileth Rios – Coordinadora componente social de Vallecaucana de Aguas.

En esta reunión se informó de la reunión de Comité de Veeduría del municipio de Guacarí y recorrido de obra el día 20 de marzo de 2025.

La Dra. Dileth Rios – Coordinadora componente social de Vallecaucana de Aguas, solicitó la instalación de una cartelera informativa en un sitio estratégico para mantener informada a la comunidad.

La Dra. Dileth Rios – Coordinadora componente social de Vallecaucana de Aguas, compartió modelo de la cartelera informativa.

Se informó que se aplazó el comité de veeduría de Ginebra por falta de quorum, quedando aplazado para dentro de 2 semanas.



Foto N°13. Reunión de seguimiento Gestión Social Gestión Social



Foto N°14 Reunión de seguimiento

COMITÉS TÉCNICOS

En el mes de marzo el componente social asistió al comité del 18 de marzo que fue suspendido.

Las demás reuniones que se realizaron de comité técnico fueron para tratar temas puntuales del aspecto técnico.

Las actividades del componente social se informaron en la reunión del componente social.

- **Aspecto No.11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada**

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los dos municipios de Guacarí y Ginebra, especialmente del área de influencia de la obra.

Acciones Desarrolladas:

El contratista informó que en el mes de marzo se contrató el siguiente personal:

PERSONAL VINCULADO DE LA ZONA								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	ZONA		
			Ingreso	Retiro		COSTA RICA	GINEBRA	GUACARÍ
1	Ober Pino Vega	15.272.172	03/02/25		Oficial			X
2	Samuel Pino	1.113.068.392	03/02/25	08/03/25	Ayudante			X
3	Julián Castaño	14.651.816	01/03/23		Conductor	X		
4	Mauricio Domínguez	6.325.625	15/03/25		Vigilante			X
5	Michael Rodríquez	1.112.970.073	15/03/25		Vigilante		X	

CONCLUSIONES

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades realizadas relacionadas con este componente en el mes de marzo de 2025.
- Durante este mes de marzo de 2025, se continuó evidenciando que el contratista está desarrollando su Plan de Gestión Social.
- El Punto de Atención a la comunidad durante el mes de marzo de 2025 prestó la atención en los horarios establecidos, durante este mes no se recibió PQRS.
- En este mes de marzo se cumplió con la reunión mensual de avance de obra con, el comité de Ginebra fue aplazado por falta de quorum. el equipo de veeduría ciudadana de Guacarí
- Se cumplió con recorrido de obra con el equipo de veeduría ciudadana de Guacarí del mes de marzo de 2025.
- Se ha contado con el acompañamiento de las personerías municipales y funcionarios de las dos alcaldías para la realización de las reuniones informativas de los comités de veeduría ciudadana.
- La comunidad se percibe receptiva, han permitido realizar los recorridos y visitas al área de Puente Rojo, han mostrado disposición para permitir el libre desarrollo de la obra.

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

CONSORCIO INTERGUACARI, a través de la gestión de la supervisión en campo, garantizará la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas durante la ejecución de sus labores, para lo cual se tendrá en cuenta que:

- Los trabajadores reciban la formación adecuada para el trabajo que se espera de ellos
- Se apliquen las medidas de seguridad en el trabajo.
- Se realicen las afiliaciones al sistema de Riesgos profesionales.

2. OBJETIVO

Presentar el alcance del proyecto y mostrar la gestión de **CONSORCIO REDES Y PTAS VALLE**, referente a temas de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de la obra en el mes del **1 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025.**

3. ALCANCE

El presente informe verifica las actividades aplicadas por todo el personal que realiza labores en campo, referente a seguridad, salud en el trabajo, considerando las actividades durante el mes, y así y la ejecución en los diferentes puntos de trabajo.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DIARIAS	OBSERVACIONES GENERALES
Verificación de condiciones de salud	Antes de iniciar la ejecución del proyecto se realiza verificación de condiciones de salud a los ingenieros y personal de apoyo para identificar y/o controlar cualquier anomalía que pueda afectar o poner en riesgo la salud y las actividades a ejecutar. Mantener las zonas de aguas estancadas, fumigadas y con cloro para evitar la propagación del mosquito **Aedes aegypti,** responsable del Dengue, Sika y Chicunguña
Verificación de la zona de trabajo y herramientas	Antes de iniciar las actividades, los trabajadores verifican las condiciones del área de trabajo, al igual que el estado de las herramientas a utilizar.
Uso de Elementos de Protección personal	Antes de iniciar las labores, los trabajadores hacen uso de los EPP, haciéndose responsable de su autocuidado y el de sus compañeros, en este periodo se entrega dotación al personal nuevo.
Delimitación del área de trabajo, Orden y aseo	Antes de iniciar cualquier actividad, se delimita el área de trabajo, se solicitó instalar cinta como barrera de protección, para evitar cualquier caída en las excavaciones.
Diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo en alturas	Antes de iniciar cualquier actividad, se realiza un análisis del área y los riesgos a los que están expuestos y que se deben intervenir, por esta razón se solicita como adjunto al informe del contratista ATS de las actividades de alto riesgo y permisos en alturas, para las actividades que lo requieran.

	Gestión de actividades de alto riesgo marzo 2025: Instalación de estivos sobre plataforma Desmonte y armado de andamios con instalación de cerchas, corte de pines y resane de muros, limpieza interior del tanque Retiro de válvulas, escarificación y repello de paredes Fundición con concreto de los muros en los tanques Retiro de láminas sedimentador No 3 Instalación de platinas de desgaste perforación de canaletas Excavación manual Armado de andamios y fundición de muros Instalación de barre lodos sedimentador # 1 Fundición de losa en filtro # 1 Reparación sedimentador # 3 Excavación manual para instalación de redes eléctricas Instalación de formaletas Montaje de barre lodos

Exámenes médicos ocupacionales	Durante el mes de MARZO se verifica el cumplimiento del programa de medicina preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar el estado integral de todos los colaboradores. En este periodo se verifican exámenes médicos por parte de los contratistas.

Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias	En el periodo de MARZO se mantienen las condiciones óptimas de los elementos de atención a emergencias, y las señalizaciones en oficina y obra, se implementan rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Política y objetivos del SG-SST.	En este periodo de MARZO se realizan inducción y reinducción sobre las políticas SST, medio ambiente, sustancias psicoactivas, reglamento de higiene y seguridad industrial, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Actualización curso de trabajo en alturas	En este periodo no se realizaron actualizaciones en cursos de alturas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

VISITAS DEL PROYECTO	
	
Verificacion elementos de protecccion personal	Inspeccion locativa
	
Inspeccion de Herramientas de trabajo	Inspeccion locativa
	

Las CHARLAS realizadas en el mes de Marzo describen a continuación:

5.1 CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.

DESCRIPCIÓN	Número de asistentes/ Capacitaciones	Dirigido a
Uso adecuado de Epp, actos y condiciones inseguras en áreas de trabajo	13	TRABAJADORES
Riesgos y peligros en obra	8	TRABAJADORES
Lesiones inflamatorias por sobre esfuerzos	10	TRABAJADORES
Recomendaciones para fundición de muros	8	FORMATOS ATS
Importancia de las pausas activas	8	TRABAJADORES
Conciencia de seguridad	6	TRABAJADORES
Trabajo en equipo autocuidado y cuidado mutuo	9	TRABAJADORES
Riesgos locativos	7	TRABAJADORES
Importancia del uso del barbuquejo durante el desarrollo de las actividades	7	TRABAJADORES
Uso adecuado de equipo contra caídas	8	TRABAJADORES
Riesgo locativo desplazarse con precaución	7	TRABAJADORES

5.2 INSPECCIÓN

En el presente mes se han realizado las siguientes inspecciones:

ITEM	INSPECCIÓN	HALLAZGOS	No. INSPECCIONES	
			PROGRAMADAS	REALIZADAS
1	Inspección de EPP	Revisión de las condiciones y el estado de los elementos de protección personal	POR ACTIVAD	03-2025
2	Inspecciones locativas (contenedores, excavaciones campamento y oficina)	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	03-2025
3	Inspección de herramientas (Pulidora, taladro de mano, mezclador)	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	03-2025
4	Inspecciones de extintores, botiquín y camillas	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	03-2025

5.3 INDICADORES DE AUSENTISMO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDICADOR	
• Número de atenciones médicas comunes reportadas • Días perdidos	2 50
• Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas • Días perdidos	0 2
Incidentes	0
Accidentes	1

Se reporta un accidente de trabajo para el colaborador **Pibe Vente Sinisterra** CC. 4782622 el día 13 de marzo de 2025, estaba realizando el trabajo en el andamio y se resbala, causándole golpes con la estructura, el colaborador portaba todos sus elementos de protección personal.

a. VERIFICACION PERSONAL Y CONTRATISTA EN OBRA.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE								
No.	MBRE	CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		RGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Aldo Gutiérrez	79.699.673	N/A		Consorciado	Sura	Sura	Colpensiones
2	Carlos Andrés Leyva	89.008.184	N/A		irector de la Obra	Sura	Sura	Protección
3	Lina Marcela Buriticá	42.136.662	01/12/22		Coordinadora de proyectos	S.O.S.	Sura	Colpensiones
4	Gina Leidy López	1.144.140.957	17/02/23		Residente Obra	S.O.S.	Sura	Porvenir
5	Ana Fernanda Rosero Cajigas	36.759.739	17/01/24		Ing. Presupuesto	Sanitas	Sura	Colpensiones
6	Lilibeth Mora Duarte	1.083.008.701	22/01/24		nspectora de obra	N.EPS	Sura	Porvenir
7	Flor María Martínez	31.644.927	25/02/23		Profesional SST	S.O.S.	Sura	Colpensiones
8	Darío Enrique Flórez	1.026.277.221	05/02/24		Residente Obra	Sura	Sura	Colfondos

9	Ana Milena Martínez	1.144.081.242	05/02/24		Aux administrativa	Sanitas	Sura	Colpensiones
10	Diana Marcela Echavarría	31.658.574	01/02/23		Ingeniera Ambiental	N EPS	Sura	Colpensiones
11	María Fernanda Martínez	38.856.496	05/01/23		Profesional social	Sura	Sura	Colpensiones
12	Vanessa Estrada Wilson	29.676.981	01/08/24		Ing. Ambiental	Sura		Colpensiones
13	Rodrigo Preciado	16.550.802	05/03/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
14	José Hilder López	7.551.673	11/03/24		Almacenista	Sanidad	Sura	N/A
15	Yeison Castellanos	1083008367	11/06/24		Inspector obra	Coosalud	Sura	Porvenir
16	Jorge Aponte	1.112.098.988	02/09/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
17	Mauricio Fernando Soto	14.652.613	14/11/24		Ayudante obra	SOS	Sura	Porvenir
18	Jorge Hernán Ocampo Cortez	9.858.689	26/11/24		Ayudante obra	Emssanar	Sura	Porvenir
19	Michel David Echeverri	1.112.956.399	15/01/25	15-03-25	Ayudante obra	N EPS	Sura	Colpensiones
20	Johana Martínez	31.655.641	24/02/25	17-03-25	Prof. SST	N EPS	Sura	Protección

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA								
No.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Jimmy Sinisterra	14.636.383	24/01/23		Topógrafo	S.O.S.	Colmena	Protección
2	Jeiner Andrés Bustos Echeverri	.097.401.400	07/02/24		Topógrafo	Salud total	Positiva	Porvenir
3	laime Ernesto Martínez	.112.970.271	01/11/24		Cadenero	N EPS	positiva	Porvenir

PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS								
	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	GSS		
			Ingreso	tiro		S	L	AFP
1	María Orlenis Campiño	1.112.966.233	02/04/24		Vigilante nocturno	N EPS	Sura	Porvenir
2	Brayan Alexander Navarrete	1.010.151.246	01/08/24		Vigilante nocturno	Emssanar	Sura	Colfondos
3	Jenny Mabel Bedoya	1.006.248.479	29/06/24		ilante fin de semana	smed salud	Sura	Colfondos
4	Claudia Janeth Campiño	1.112.957.058	28/12/24		Vigilante nocturno	Sura	Sura	Porvenir
5	Mauricio Domínguez Plaza	6.325.625	15/03/25		Vigilante nocturno	smed salud	Sura	Porvenir
6	chael Rodríguez Cobo	1.113.630.799	15/03/25		ilante fin de semana	N EPS	Sura	Porvenir

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS								
.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Oscar Ignacio Carabalí	16.277.004	8/04/24		Maestro	Salud Total	Colmena	Colpensiones
2	Diego Andrés Cruz	1.090.463.618	1/11/24		Ing. Aux	N EPS	Colmena	Porvenir
3	Brayan Enrique Restrepo	1.113.679.286	4/12/24		Ayudante	N EPS	Colmena	Porvenir
4	Hamilton Castillo	1.113.627.264	7/12/24	5/02/25	Oficial	SOS	Colmena	Porvenir
5	Haminton Galiano	1.113.652.339	7/12/24		Oficial	Emssanar	Colmena	Protección
6	aicol Stiven Valencia	1.006.308.185	3/01/25		Ayudante	Emssanar	Colmena	Porvenir

7	Luis Ángel Ardila	80.164.498	)7/02/25		Maestro	Salud Total	Colmena	Porvenir
8	Javier Stiven Cortez	1.114.838.910	4/02/25		Ayudante	Emssanar	Colmena	Protección
9	Jeins Cortes Domínguez	1.114.832.209	4/02/25		Ayudante		Colmena	Porvenir
10	Stiven Alberto Loaiza	1.193.380.674	4/02/25		Ayudante	N EPS	Colmena	Porvenir
11	Miguel Agudelo	1.112.969.996	)8/03/25	4/03/25	Ayudante	N EPS	Colmena	Porvenir
12	James Rodríguez	14.651.026	)8/03/25		Ayudante	N EPS	Colmena	Porvenir
13	Johany Velasco	14.641.390	)8/03/25		Ayudante	Emsanar	Colmena	Colpensiones
14	Jhon Eider Giraldo	1.113.679.548	1/03/25		Ayudante	Emsanar	Colmena	Porvenir
15	antiago Pérez Agudelo	1.114.240.636	1/03/25		Ayudante	N EPS	Colmena	Colpensiones

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS								
No.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	P
1	Jhon Fredy Rincón Marín	13.629.201	09/12/24		Armador	Comfenalco	Sura	tección
2	Luis Miguel Montaño	14.835.053	30/08/24		Ayudante	SOS	Sura	rvenir
3	Diego Valor	16.861.728	06/08/24		Soldador	N EPS	Sura	pensiones
4	Carlos Andrés Castro	1114.832.403	01/11/24		Ayudante	SOS	Sura	rvenir
5	Juan Diego Castro	14.813.332	01/11/24		Ayudante	N EPS	Sura	rvenir
6	Brayan Andrés García	13.641.466	01/11/24		Armador	Comfenalco	Sura	pensiones
7	Jonathan Rivera	43.952.917	17/01/25		Ayudante	SOS	Sura	rvenir
8	José Elías Murillo	14.814.934	09/12/24		Soldador	N EPS	Sura	rvenir

PERSONAL INGENIERIA AMSO SAS								
	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		S	L	P
1	Robinson Sinisterra Panameño	94.442.503	07/01/25		Maestro	Sanitas	Sura	Colfondos
2	Waldino Ríos Palacios	.133.606.323	07/01/25		Oficial	SOS	Sura	Porvenir
3	Rubén Darío Zorrilla	94.382.330	07/01/25		Ayudante		Sura	Colpensiones
4	Pibe Sinisterra	4.782.622	07/01/25		Oficial	alud Total	Sura	Porvenir
5	Eduar Enrique Canizalez	94.468.200	07/01/25		Oficial	N EPS	Sura	Porvenir

6	Javier Angulo Sinisterra	.111.773.371	13/01/25		Oficial	SOS	Sura	Colfondos
7	Luis Carlos Cobo	1.006.258.209	26/02/25	22/03/25	Ayudante	Emsanar	Sura	porvenir
8	Nasly Leonor Arango	66.656.370	17/01/25		Inspector SST	N EPS	Sura	Porvenir
9	Edwar Alberto Mina	.006.186.943	10/02/25		Ayudante	N EPS	Sura	Protección
0	Yimmy Sinisterra Celorio	94.443.411	17/02/25		Ayudante	N EPS	Sura	Porvenir

ERSONAL SAMUEL MARQUINEZ								
No.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	P
1	Over Pino Vega	15.272.172	02/25	/03/25	Oficial	Emssanar	Sura	rvenir
2	Samuel Eliab Pino	13.068.392	02/25	/03/25	Ayudante	Emssanar	Sura	pensiones
3	Edwin Samir Aragón	43.933.685	02/25		Técnico Electricista	N EPS	Sura	rvenir
4	Samuel Marquínez	006.184.448	02/25		Ing. electricista		Sura	

ERSONAL WATER APPLICATIONS AND SOLUTIONS WAS SAS								
No.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	P
1	Guillermo León González	14.797.442	01/25		supervisor	SURA	Positiva	rvenir
2	Fernando Lara	44.166.667	02/25		Analista ingeniería	SURA	Positiva	pensiones
3	Cristian Quintero	44.179.864	02/25		Analista ingeniería	SOS	Positiva	otección

4	Carlos Arnulfo García Mejía	70.852.473	01/25		Ayudante	Emssanar	Positiva	Ipensiones

Fuente de elaboración: Informe de contratista, Martínez Flor 03-2025 SST **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**

5.5 REALIZACIÓN DE SIMULACROS

El contratista adjunto informe de evacuación.

6. MANEJO AMBIENTAL

6.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RCD

El aprovechamiento de los Residuos De Construcción Y Demolición - RCD se plantea con dos alternativas: reutilizar en obra o transportarlos a centros de acopio temporales o centros de aprovechamiento. Los centros de aprovechamiento planteados como alternativa implican, generalmente, una tercerización de los RCD. Por otro lado, un gran o mediano generador puede pensar en la construcción de centros de acopio temporales, de tal manera que se cuente con una zona de acopio donde se reúnan los RCD aprovechables que no se utilizaron en su totalidad en las obras para ser utilizado.

Las obras civiles, en la mayoría de las etapas constructivas, generan escombros, residuos de materiales de diferentes tamaños (virutas, polvillo de corte, piezas de cerámica, etc.), residuos tóxicos y algunos contaminantes orgánicos que son conocidos como residuos de construcción y demolición (RCD) y han de ser correctamente tratados para minimizar la contaminación y potenciar su aprovechamiento, y así favorecer el entorno social y el posible ecosistema involucrado. Igualmente, la interventoría realiza control a las volquetas y máquinas usadas en obra, verificando los siguientes documentos:

- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica
- Póliza daños a terceros

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	CERTIFICADO
Madera	No reporta	N/A
Chatarra	No reporta	N/A
Material de Excavación RCD		
Residuos Aprovechables y no Aprovechables	No reporta	N/A.
Teja PVC otros	No se genera	N/A

6.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO:

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga mediante los mantenimientos preventivos.

Actividad que se supervisa por medio de las inspecciones que se realizan periódicamente.

- ❖ Señalización, cerramientos provisionales y aislamiento en de los sitios de trabajo.

6.3 INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

TIPO DE MATERIAL	FECHA	CANTIDAD
Inspección de seguridad y ambiente (orden y aseo)	Semanal	

6.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	MARCA SERIE - PLACA
Equipos de topografía	Estación – Nivel	NIKON SNDWAY
Retroexcavadora Llantas	1	CAT
Retroexcavadora orugas	1	HYUNDAI R130SNPRO 2024
Volquetas	1	(UFK231)
Taladro demoledor	3	
Pulidora	2	DELWAT
Sierra circular para corte de madera	1	
Planta Generadora 6.5	2	ELITE- NUEVA
Motobomba 2 pulgadas	1	BARNES
Motobomba 3 pulgadas	1	
Mezcladora de concreto	2	TOOLCRAFT
Vibrador eléctrico	3	BOSCH 2.8 HP-NUEVO

Taladros manuales	3	
Martillo demoledor	1	SIEFKEN
Rotomartillo	1	SIEFKEN
Buggy	7	Herragro- Toolcraft
Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, machete, destornillador, alicate)		

- ✓ Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
- ✓ Se adjuntan permisos de trabajo para tareas de alto riesgo trabajos en alturas, y trabajos en caliente.
- ✓ Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- ✓ Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.
- ✓ Se reporta ausentismo por enfermedad común de 50 días para el profesional SST y obrero y dos días por accidente de trabajo leve.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:

- PTAP de Guacari: Sedimentación – Floculacion - Caseta Eléctrica
- PTAP de Ginebra: Sedimentación – Filtración - Tanque de Almacenamiento - Caseta Eléctrica
- Tanque de Almacenamiento La Albania – Ginebra

- El frente del Tramo 3 continua suspendido, se estará coordinando su inicio para Abril, por la firma de un acta con los compromisos entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P y la Comunidad encabezada por Pro-territorio.
- Con el Ingenio Pichichi ya se encuentra en la etapa final de la servidumbre, se puede iniciar para Abril este tramo de tubería PEAD 14" en una L: 500 ml
- Con la Familia Saavedra - Blum ya está en proceso de servidumbre para instalar en su predio la Tubería PEAD 10" en una L: 600 ml

- Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato

- Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de pavimento siguen aún pendientes por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.
- Los trabajos de localización y replanteo en la vía del Tramo 1: CADICA a BOCATOMA, continúan sin ningún inconveniente
  - Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
  - Los acercamientos con los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio han mejorado el dialogo con la comunidad permitiendo que se mejore la aceptación de la obra.
  - Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
  - Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.

Atentamente,

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio Interguacarí
Interventoría
