MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3 EPMSC NEIVA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRÁ, se encuentra ubicado en el Kilómetro 2 vía a Bogotá, Chiquinquirá – Boyacá.

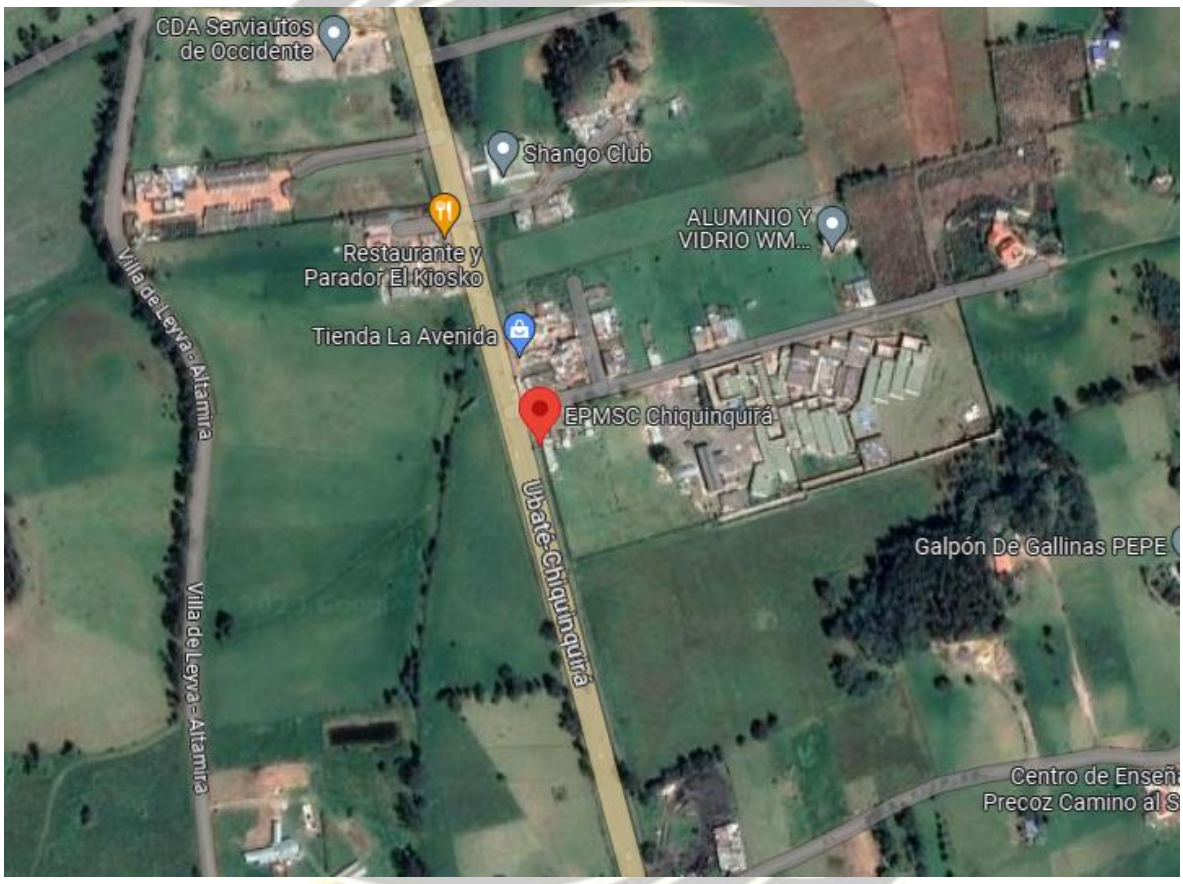

Localización geográfica EPMSC Chiquinquirá (Boyacá). Fuente Google maps.

MARVALL

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – CHIQUINQUIRÁ

FOTO # 1	FOTO # 2
	
FECHA DE LA FOTO: 29 agosto de 2023	FECHA DE LA FOTO: 29 agosto de 2023
UBICACIÓN: Reservorio existente captación de aguas lluvias	UBICACIÓN: Reservorio existente captación de aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Inspección del reservorio existente (dimensiones y estado actual).	DESCRIPCIÓN: Inspección del reservorio existente (dimensiones y estado actual).

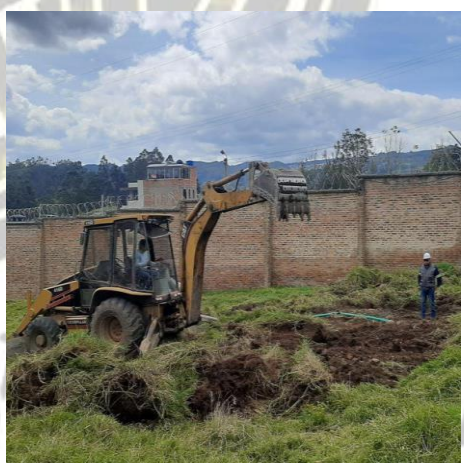
FOTO # 3	FOTO # 4
	
FECHA DE LA FOTO: 31 agosto de 2023	FECHA DE LA FOTO: 31 agosto de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Descapote de capa vegetal.	DESCRIPCIÓN: Descapote de capa vegetal.

FOTO # 5	**FOTO # 6**
	
FECHA DE LA FOTO: 31 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 31 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque No 1 de almacenamiento	DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque No 1 de almacenamiento

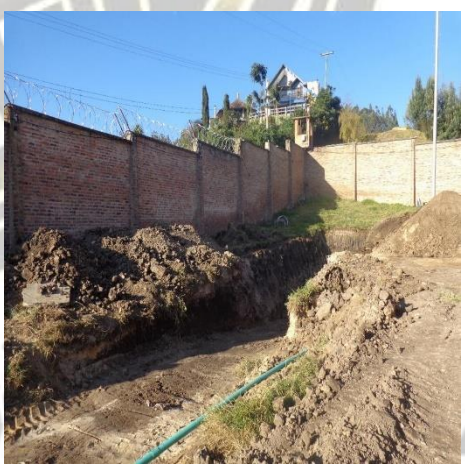
FOTO # 7	**FOTO # 8**
	
FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque No 1 de almacenamiento y tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque No 1 de almacenamiento y tubería 18”

FOTO # 9	**FOTO # 10**
	
FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Retiro de concertina	DESCRIPCIÓN: Retiro de concertina

FOTO # 11	**FOTO # 12**
	
FECHA DE LA FOTO: 02 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 02 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Retiro de capa vegetal y material excavado	DESCRIPCIÓN: Retiro de capa vegetal y material excavado

FOTO # 13	**FOTO # 14**
	
FECHA DE LA FOTO: 02 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 02 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Acopio	UBICACIÓN: Acopio
DESCRIPCIÓN: Descargue de material de excavación en zona de acopio	DESCRIPCIÓN: Descargue de material de excavación en zona de acopio

FOTO # 15	**FOTO # 16**
	
FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque de almacenamiento	DESCRIPCIÓN: Retiro de material de excavación

FOTO # 17	**FOTO # 18**
	
FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque de almacenamiento	DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque de almacenamiento

FOTO # 19	**FOTO # 20**
	
FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Entrada volquetas	UBICACIÓN: Entrada volquetas
DESCRIPCIÓN: Daño en tubería	DESCRIPCIÓN: Daño en tubería

FOTO # 21	FOTO # 22
	
FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Entrada volquetas	UBICACIÓN: Entrada volquetas
DESCRIPCIÓN: Reparación daño de tubería	DESCRIPCIÓN: Lleno de excavación por daño en tubería

FOTO # 23	FOTO # 24
	
FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Campamento	DESCRIPCIÓN: Dotación

FOTO # 25	**FOTO # 26**
	
FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación	DESCRIPCIÓN: Retiro material de excavación

FOTO # 27	**FOTO # 28**
	
FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Acopio	UBICACIÓN: Acopio
DESCRIPCIÓN: Descargue material de excavación en lugar de acopio	DESCRIPCIÓN: Descargue material de excavación en lugar de acopio

FOTO # 29	**FOTO # 30**
	
FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Retiro de concertina	DESCRIPCIÓN: Corte con pulidora y demolición manual

FOTO # 31	**FOTO # 32**
	
FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Demolición de muro	DESCRIPCIÓN: Demolición de muro

FOTO # 33	FOTO # 34
	
FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 05 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Cerramiento preventivo	DESCRIPCIÓN: Señalización de excavación

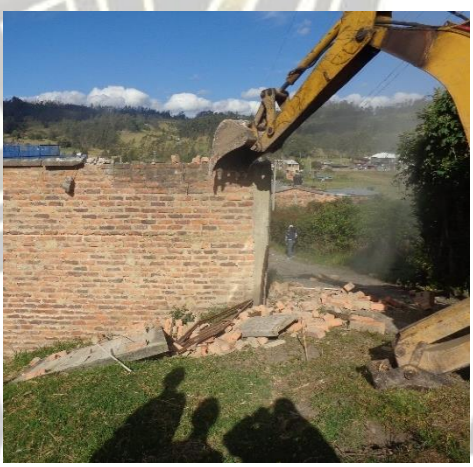
FOTO # 35	FOTO # 36
	
FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Demolición garita	DESCRIPCIÓN: Demolición garita

FOTO # 37	FOTO # 38
	
FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Demolición de muro	DESCRIPCIÓN: Demolición de muro

FOTO # 39	FOTO # 40
	
FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Desmonte puerta provisional	DESCRIPCIÓN: Desmonte puerta provisional

FOTO # 41	FOTO # 42
	
FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Desmonte puerta provisional	DESCRIPCIÓN: Desmonte puerta provisional

FOTO # 43	FOTO # 44
	
FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 06 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Cerramiento provisional	DESCRIPCIÓN: Señalización de excavación

FOTO # 45	FOTO # 46
	
FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Demolición de viga cimentación de muro	DESCRIPCIÓN: Demolición de viga cimentación de muro

FOTO # 47	FOTO # 48
	
FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación para zapatas	DESCRIPCIÓN: Excavación para zapatas

FOTO # 49	FOTO # 50
	
FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación de zapatas	DESCRIPCIÓN: Excavación de zapatas

FOTO # 51	FOTO # 52
	
FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque	DESCRIPCIÓN: Retiro material de excavación

FOTO # 53	FOTO # 54
	
FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación	DESCRIPCIÓN: Reparación daño en tubería

FOTO # 55	FOTO # 56
	
FECHA DE LA FOTO: 08 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 08 septiembre de 2023
UBICACIÓN: SST	UBICACIÓN: SST
DESCRIPCIÓN: Capacitación de personal	DESCRIPCIÓN: Capacitación de personal

FOTO # 57	FOTO # 58
	
FECHA DE LA FOTO: 08 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 08 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación y retiro de escombros demolición viga cimentación	DESCRIPCIÓN: Corte de acero de refuerzo de viga de cimentación

FOTO # 59	FOTO # 60
	
FECHA DE LA FOTO: 08 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 08 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Demolición parte inferior muro perimetral	DESCRIPCIÓN: Demolición parte inferior muro perimetral

FOTO # 61	**FOTO # 62**
	
FECHA DE LA FOTO: 08 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 08 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Demolición viga de cimentación de muro	DESCRIPCIÓN: Excavación de zapatas

FOTO # 63	**FOTO # 64**
	
FECHA DE LA FOTO: 09 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 09 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación para zapatas	DESCRIPCIÓN: Excavación para zapatas

FOTO # 65	FOTO # 66
	
FECHA DE LA FOTO: 11 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 11 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Campamento	UBICACIÓN: Campamento
DESCRIPCIÓN: Descargue de tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Descargue de tubería 18”

FOTO # 67	FOTO # 68
	
FECHA DE LA FOTO: 11 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 11 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación de zapatas	DESCRIPCIÓN: Retiro material de excavación

FOTO # 69	**FOTO # 70**
	
FECHA DE LA FOTO: 12 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 12 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tanque No 1 de almacenamiento aguas lluvias	UBICACIÓN: Proyección para tubería
DESCRIPCIÓN: Excavación	DESCRIPCIÓN: Excavación

FOTO # 71	**FOTO # 72**
	
FECHA DE LA FOTO: 12 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 12 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Desmonte de concertina	DESCRIPCIÓN: Desmonte de concertina

FOTO # 73	**FOTO # 74**
	
FECHA DE LA FOTO: 12 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 12 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Corte en muro con pulidora	DESCRIPCIÓN: Desmonte de cámaras y luminarias

FOTO # 75	**FOTO # 76**
	
FECHA DE LA FOTO: 13 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 13 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Proyección tubería	UBICACIÓN: Proyección tubería
DESCRIPCIÓN: Excavación	DESCRIPCIÓN: Corte de tubería

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de agosto del 2023 y el 13 de septiembre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

MIERCOLES 16 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

Mediante oficio 005 se solicitan las observaciones y modificaciones de los diseños de conducción de aguas lluvias suministrado por el contratista.

SABADO 25 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

Se envía oficio OFI 014 para solicitar permiso de ingreso del personal de obra a las instalaciones a intervenir dentro del centro penitenciario.

SABADO 26 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

Mediante correo electrónico se recibe aprobación de orden de servicio G1-001.
Se envía oficio OFI 017 solicitando aclaraciones en el diseño de conducción de aguas lluvias.

SABADO 27 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

Mediante oficio OFI 019 se reitera la solicitud de los diseños de conducción de aguas lluvias por parte de los profesionales de la USPEC.

LUNES 28 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

El residente de obra llega a Chiquinquirá con el fin de buscar persona de la zona y realizar cotizaciones de material con el fin de agilizar los procesos y darles tiempo a los

profesionales de la USPEC de enviar los diseños del sistema de conducción de aguas lluvias.

MARTES 29 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

Se realiza recorrido en el establecimiento penitenciario en compañía del director del establecimiento Germán Adolfo Marroquín, el teniente Ramirez y la interventoría, donde se revisan las dimensiones y condiciones del tanque de recolección de aguas lluvias existente el cual tiene 2,10 m de diámetro y 4,50 m de profundidad por lo cual se plantea realizar un tanque de 6x4 m con una profundidad de 4m para recibir , debido a esto se toma medida desde el muro colapsado hasta zona de canchas de futbol donde se podría ubicar el tanque de almacenamiento dando una distancia de aproximadamente 300 m.

Se establece iniciar el día 31 de agosto con las excavaciones para posterior construcción del primer tanque de almacenamiento.

El director solicitó que los escombros de las demoliciones los dejen en el establecimiento para reutilizarlos.

MIERCOLES 30 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

Se envía documentación para el trámite del permiso de ingreso del personal de obra, las afiliaciones y la maquinaria requerida.

Mediante oficio OFI 020 se relaciona el personal que ingresará a partir del 31 de agosto:

- José Santos Caicedo Cortes 1.083.887.747
- Luis Alfonso Triviño Gomez 79.163.300

Mediante oficio OFI 022 se envía Orden de Servicio para la aprobación de las actividades para la demolición de 15m del muro perimetral.

JUEVES 31 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

Mediante oficio OFI 023 se relaciona el personal para permiso de ingreso:

- Ginna Karina Serrano Cañas (Profesional SST) 1.005.362.502
- José Santos Caicedo Cortes 1.083.887.747
- Luis Alfonso Triviño Gomez 79.163.300
- Francelides Sánchez (Operario maquinaria) 79.168.063

Se realiza descapote de capa vegetal en zona y se procede con la excavación del terreno con la máquina. En el proceso de excavación nos encontramos con el paso de tubería eléctrica por lo cual se debe realizar desviación de dicha acometida.

VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se continúa con la actividad de excavación del terreno y se realiza inspección por parte de los técnicos eléctricos para verificación de afectaciones al encontrar tubería eléctrica en el proceso de excavación y evaluar la novedad de la desviación de la acometida.

SABADO 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se Cuenta con nuevo personal en obra:

- Jorge Humberto Sánchez León conductor de volqueta roja QFW 530 de Villavicencio.
- Ginna Karina Serrano Cañas

Se realiza carreteo de material extraído a lugar de acopio.

LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se continúa con excavación para tanque de recolección de aguas lluvias, retiro de concertina en muro de cerramiento perimetral.

MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se continúa con la excavación para el taque de recolección de guas lluvias, acopio de material de excavación, se empieza el retiro de red eléctrica y de cámaras de vigilancia.

MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se realiza corte con pulidora para dilatar el muro de cerramiento perimetral, se continua con trabajo de excavación y acopio de material en el lugar autorizado por la dirección del establecimiento.

En la reunión realizada por videoconferencia, se manifiesta a supervisión e interventoría la imperiosa necesidad de suministrar los diseños definitivos tanto del muro de cerramiento perimetral, como del sistema de recolección de aguas lluvias, toda vez que al momento no se cuenta con éste, lo que ha generado un descontrol en la programación de obras.

JUEVES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se da inicio a la demolición del muro de cerramiento perimetral, se continúa con trabajo de excavación y movimiento de tierras para tanque de recolección de aguas lluvias.

Se informa a la dirección del establecimiento que no es posible resguardar la integridad física de la garita existente, puesto que esta presenta un gran deterioro y es un riesgo para nuestros trabajadores.

VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se continua con la demolición de muro y retiro de escombros al lugar autorizado por la dirección del establecimiento.

Se recibe visita por parte del ingeniero Anuar (apoyo a la supervisión).

SABADO 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se continúa con la demolición del muro de cerramiento perimetral, retiro de escombros y demolición de viga de cimentación existente.

Mediante correo electrónico se reciben los diseños definitivos del muro de cerramiento perimetral y una parte de los diseños para recolección de aguas lluvias.

Dichos diseños suministrados no comprenden los diseños del tanque de recolección tanto de entrada como de finalización.

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se recibe en obra la tubería Novafort de 18”, se realiza su descargue y acopio, también se recibe material de rio, acero y cemento que serán utilizados para la construcción de la cimentación.

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se continúa con trabajo de excavación para tanque de almacenamiento de aguas lluvias y se da inicio a la excavación para la cimentación del muro de cerramiento (zapatas y viga).

se realiza cerramiento perimetral provisional y se realiza aseo de las áreas.

MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se continúa con trabajos de excavación y movimiento de tierras para tanque de recolección de aguas lluvias.

Se procede a la instalación de concreto de limpieza para zapatas.

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

ORDENES DE SERVICIO ORIGINALES Y SOPORTES DE RECIBO POR CORREO

ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL G1-001

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

Gmail **Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>**

ORDEN DE SERVICIO (EPMSC CHIQUINQUIRA)

3 mensajes

Hekaterina Vivas Rojas <hekaterina.vivas@uspec.gov.co> 26 de agosto de 2023, 11:49
Para: Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co>, Fernando Alberto Medina Maestre <fernando.medina@uspec.gov.co>, d.pinilla@marvall.com.co, gerencia@marvall.com.co, uspec382.2022@gmail.com
Cc: Edgar Andres Bosiga Becerra <edgar.bosiga@uspec.gov.co>, Jorge Alejandro Almonacid Barriga <jorge.almonacid@uspec.gov.co>, Julia Yanira Bautista Sanchez <julia.bautista@uspec.gov.co>, Rafael Alberto Garcia Garcia <rafael.garcia@uspec.gov.co>

Cordial saludo.

Por medio de la presente anexo la Orden de Servicio de la intervención a realizar en el establecimiento EPMSC CHIQUINQUIRA, y así dar inicio de la misma el 28 de agosto de 2023.

Agradezco la atención prestada, quedó atenta.

ODS EPMSC CHIQUINQUIRA .pdf
1159K

Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co> 26 de agosto de 2023, 15:28
Para: Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>, anuar.avila@uspec.gov.co
Cc: gerencia@marvall.com.co

Pereira, 26 de agosto de 2023

USPEC-CTO-303-2022

Arquitecto
RICARDO MANSILLA B.
Coordinador de interventoría
Bogotá D.C.

ASUNTO:CTO-303-2022 Recibo de ODS Chiquinquirá aprobada

Cordial saludo

Mediante la presente confirmamos que fue recibida la ODS CHIQUINQUIRÁ firmada por las partes y aclaramos que Marvall no admite la cancelación de ninguna Orden de Servicio posterior a su aprobación.

Quedamos atento a cualquier inquietud,

Cordialmente
Ing Daniela Pinilla Ticora
MARVALL SAS
[El texto citado está oculto]

OFI 016 CTO-303-2022 - RECIBO ODS 01 CHIQUINQUIRA APROBADA.pdf
247K

Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com> 29 de agosto de 2023, 12:36
Para: anuar.avila@uspec.gov.co
Cc: gerencia@marvall.com.co, Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>

Buenas tardes

Arq. Jorge Alejandro Almonacid
Subdirector de construcción y conservación

Envío comunicado relacionado al asunto para su conocimiento y fines pertinentes.
Cordialmente,

Arq. Ricardo Mansilla B.
Coordinador de Interventoría
Cel 3112648806

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría y Construcción de Obras Civiles.
NIT. 900.581.578-1

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

20230829 INTER-COOR-USPEC-382-0355 G1.pdf
80K

OFI 016 CTO-303-2022 - RECIBO ODS 01 CHIQUINQUIRA APROBADA.pdf
247K

Gmail **Daniela Pinilla <daniepin96@gmail.com>**

CTO-303-2022 Solicitud aprobación ODS CPMS Chiquinquirá

Anuar Jahir Avila Florez <anuar.avila@uspec.gov.co> 18 de septiembre de 2023, 16:36
Para: Felipe Martinez <gerencia@marvall.com.co>, proyectos@marvall.com.co, Daniela Pinilla <d.pinilla@marvall.com.co>, Coordinacion Uspec382 <uspec382.2022@gmail.com>
Cc: Rafael Alberto Garcia Garcia <rafael.garcia@uspec.gov.co>, Alexander Aragon Torrealba <alexander.aragon@uspec.gov.co>, Hekaterina Vivas Rojas <hekaterina.vivas@uspec.gov.co>, Edgar Andres Bosiga Becerra <edgar.bosiga@uspec.gov.co>, Julia Yanira Bautista Sanchez <julia.bautista@uspec.gov.co>, Sandra Liliana Montañez Lopez <sandra.montanez@uspec.gov.co>, Sandra Patricia Perdomo Varon <sandra.perdomo@uspec.gov.co>, Paula Adiela Toro Albarracin <paula.toro@uspec.gov.co>

Bogotá D.C., septiembre 18 de 2023

Señor (es)
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
NIT.900.581.578-1
OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
Representante Legal
gordillogog@hotmail.com
Cra. 11 No.147-76 Ofc. 301
Ciudad

MARVALL SAS
NIT.900.907.274-1
LUIS FELIPE MARTINEZ ARENAS
C.C. 1.093.214.733
gerencia@marvall.com.co
Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
Pereira, Risaralda

REFERENCIA: *CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 303-2022 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, Grupo 1".*

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE APROBACIÓN ODS G1-001 y ODS G1-015 CPMS CHIQUINQUIRÁ; MEDIANTE OFICIO INTER-COOR-USPEC-382-0354 y INTER-COOR-USPEC-382-0384.

Cordial Saludo:

Mediante los oficios INTER-COOR-USPEC-382-0354 y INTER-COOR-USPEC-382-0384 donde la Interventoría GORDILLO & ASOCIADOS SAS, revisó, verificó y aprobó el informe de diagnóstico y todos los documentos soporte para la aprobación de los documentos soporte presentado por la empresa contratista MARVALL SAS a través de los comunicados OFI 016 y OFI 032; En ese sentido la supervisión de la USPEC se permite detallar lo siguiente:

OFICIO DE INTERVENTORÍA	OFICIO DEL CONTRATISTA	ORDEN DE SERVICIO	ESTABLECIMIENTO	FECHA DE INICIO
INTER-COOR-USPEC-382-0354	OFI 016	G1-001	EPMSC CHIQUINQUIRA	14-08-2023
INTER-COOR-USPEC-382-0384	OFI 032	G1-015	EPMSC CHIQUINQUIRA	15-09-2023

Por parte de la Supervisión del Contrato de Interventoría de la Referencia la entidad se permite generar la aprobación de la ODS señalada el cuadro relacionado en los oficios señalados y de acuerdo a las obligaciones convenidas con la Interventoría la empresa Gordillo y Asociados SAS - Cto. USPEC-CTO-382-2022, y en tal sentido se señala que la Interventoría está en la obligación de realizar la aprobación de la totalidad de los documentos necesarios para la aprobación de los pagos, siendo las Ordenes de Servicio los soportes de las Actas Parciales de obra, requisito de obligatorio cumplimiento para el trámite de las mismas y es preciso reiterar que es obligación de la Interventoría, realizar la aprobación de las Ordenes de Servicio generadas por los contratistas de obra y velar por el cumplimiento de las mismas, tal como lo define el Manual de Supervisión e Interventoría de la USPEC, el cual forma parte integral del contrato 382-2022, El "Interventor: Persona natural o jurídica contratada por la USPEC, para ejercer la representación de la Entidad ante el contratista y que está encargada de hacer el seguimiento técnico del contrato. Dada la naturaleza del objeto contractual y los proyectos que ejecuta la entidad, el control que ejerce el interventor puede incluir el seguimiento administrativo, financiero, legal y ambiental, por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato y a las obligaciones del contratista." Se adjunta Manual de Supervisión e Interventoría.

Todos los documentos deberán ser verificados y aprobados por el interventor y aceptado por ella supervisor/a de la USPEC, debidamente firmados para su aprobación y posterior pago.

En todo caso, será obligación y responsabilidad de la Interventoría gestionar junto con el contratista la atención de emergencias en los ERON que sean parte del alcance de intervención del contrato.

Sin otro particular y para los fines pertinentes.

Atentamente,

---ORIGINAL FIRMADO---A

El vie, 15 sept 2023 a las 16:19, Paula Adiela Toro Albarracin (<paula.toro@uspec.gov.co>) escribió:

Paula Adiela Toro Albarracin
Secretaria
Dirección de Infraestructura
paula.toro@uspec.gov.co
Teléfono: +57 60(1) 7430274
Av. Calle 26 No 69 - 76
Edificio Elemento, pisos 12, 13 y 14 - Torre 4 Agua.
Bogotá, D. C., Colombia
www.uspec.gov.co

El jue, 14 sept 2023 a las 12:41, Anuar Jahir Avila Florez (<anuar.avila@uspec.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito solicitar la aprobación y firma de las siguientes ODS para la ejecución del Contrato de Atención Primaria 303 de 2022. Se envía con el VoBo, de la Arq. Hekaterina Vivas Rojas.

Se adjunta:

- ODS - G1-015 CHIQUINQUIRÁ - DEMOLICIÓN MURO PERIMETRAL 15m, debidamente firmada.

[El texto citado está oculto]



[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

E-2023-005953 RESPUESTA A SOLICITUD DE APROBACIÓN ODS G1-001 y ODS G1-015 CPMS CHIQUINQUIRÁ.pdf
257K

ODS - G1-015 CHIQUINQUIRA - DEMOLICION MURO PETRIMETRAL 15m _Firmada.pdf
1109K

ODS G1-001 EPMSC CHIQUINQUIRA_Firmada OK.pdf
1159K

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En la etapa constructiva del proyecto se utilizan las siguientes herramientas y equipos.

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	SINCEL	HERRAMIENTA
3	MARTILLO	HERRAMIENTA
4	PULIDORA	HERRAMIENTA
5	TALADRO	HERRAMIENTA
6	PALAS	HERRAMIENTA
7	BUGGY	HERRAMIENTA
8	BARRA	HERRAMIENTA
9	RETROECAVADORA	MAQUINARIA
10	VOLQUETA	MAQUINARIA

MARVALL

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

HORARIOS DE TRABAJO

HORAS LABORADAS MES DE AGOSTO							
SEMANA 0							
DIAS	14	15	16	17	18	19	20
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE AGOSTO							
SEMANA 0							
DIAS	21	22	23	24	25	26	27
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE							
SEMANA 1							
DIAS	28	29	30	31	1	2	3
HORAS	0	0	0	8	8	5	0
TOTAL HORAS SEMANA						21	

HORAS LABORADAS MES DE SEPTIEMBRE							
SEMANA 2							
DIAS	4	5	6	7	8	9	10
HORAS	8	8	8	8	8	5	0
TOTAL HORAS SEMANA						45	

HORAS LABORADAS MES DE SEPTIEMBRE							
SEMANA 3							
DIAS	11	12	13	14	15	16	17
HORAS	8	8	8				
TOTAL HORAS SEMANA						24	

TOTAL HORAS DEL MES
90

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

ANEXO No 1 COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA

Bitácora mantenimiento instalaciones

Ciudad: Chiquinquirá Boyacá

EPMSC Chiquinquirá

Contrato: USPEC-CTO-303-2022

"Atención Primaria por el sistema de manto aplicable a la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del orden nacional - ERON a cargo INPEC, Grupo 1"

Marden

Powered by CamScanner

Lugar: EPMSC CHIGUINQUIRÁ

Fecha: Agosto 02 del 2023

Actividad: Visita diagnóstico

Se realiza visita al establecimiento con el fin de gestionar e identificar las necesidades de dota que deberán ser atendidas en donde se evidencia lo siguiente:

- Caida de sección de muro de cerramiento perimetral a causa de inundaciones por lluvias
- Manejo de aguas lluvias a caja principal.

Se realiza acta de visita con respectivas firmas por parte de integrantes del INPEC, USPEC, Interventoria y por Miguel Loaiza y el Ing. Luis Carlos Alvarez de MARVALL SAS

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall

Fecha: Agosto 03 del 2023

Actividad: Actividades administrativas

En oficina de Marvall SAS se adelantan labores de recopilacion de informacion con respecto a actividades a Marden

Powered by CamScanner

realizar en los frentes de trabajo priorizados por el establecimiento penitenciario.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 04 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Se adelantan labores de recopilación de información y de registro fotográfico obtenido de la visita al centro penitenciario para elaboración posterior del informe diagnóstico, balance y órdenes de servicio con las actividades generadas de las necesidades observadas y solicitadas.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 05 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Se da inicio a elaboración de informe diagnóstico con el

Marden

siguiente contenido:

1. Introducción
2. Generalidades del contrato
3. Identificación de actividades a ejecutar dentro del establecimiento
4. Diagnóstico realizado por el contratista
5. Registro fotográfico
6. Propuesta Solución a implementar

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 08 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Se continua con la elaboracion del informe diagnóstico y con la recopilacion de información para posterior aprovechamiento en la elaboración del balance de obra.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 01 del 2023
Actividad Actividades administrativas

Se finaliza la elaboracion del informe diagnóstico por

Marde

Powered by CamScanner

cual a continuación se da inicio a la elaboración del balance de obra donde se identifican las actividades o ítems que permitan su ejecución en la base de datos suministrada por la USITEC (anexo 7).

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Manuall
Fecha: Agosto 10 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

En oficina de Manuall, se inicia la elaboración del balance de obra teniendo en cuenta las actividades a realizar en el establecimiento penitenciario.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Manuall
Fecha: Agosto 11 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Se continúan con labores administrativas realizando balance

de obra de acuerdo a un presupuesto estimado de dinero para atender el mantenimiento de este establecimiento penitenciario. Mediante OFI 001 se envía informe diagnóstico con OBS 01 correspondiente a actividades de excavación.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Manuall
Fecha: Agosto 12 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Se continúa con labores administrativas realizando balance de obra de acuerdo a un presupuesto estimado de dinero para atender el mantenimiento de este establecimiento penitenciario

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Manuall
Fecha: Agosto 14 del 2023
Actividad: Actividades administrativas.

Se realizan ajustes en diseño de conducción de agu

Powered by CamScanner

lluvias hacia tanque o reservorio para presentacion en reunión con miembros del personal de la USPEC.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente de Obra

Lugar: USPEC - Bogotá
Fecha: Agosto 15 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

En reunión entre profesionales de la USPEC, apoyo a la supervisión y Marvall (Ing Felipe Martinez, Ing Miguel Loaiza y Ing Daniela Pinilla), se presentó el diseño de conducción de aguas lluvias elaborado por Marvall el cual debido a que no cuenta con un caudal de aguas lluvias aforó unas modificaciones por parte de la USPEC:

- Cambio de cajas de inspección 2.0X 2.0X 1.0 m por Pozo de inspección
- Inclusión de filtro francés en zona de descarnes y en cercanías de las cajas de inspección ubicadas en el predio colindante.
- El filtro francés debe contar con una conexión directa mediante tubería al tanque de almacenamiento.

Marden

Por lo cual mediante ofi 005 se solicitó formalmente la remisión del diseño con las modificaciones realizadas.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: USPEC - Bogotá
Fecha: Agosto 16 del 2023
Actividad: Actividades administrativa

Mediante oficio OFI 003 se solicita la inclusión del nivel 4 de atención para optimizar las actividades y por ende disminuir el número de OTS. Además, se solicita la inclusión de 27 items que no se encuentran en la base de datos contractual de la regional central.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Powered by CamScanner

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 17 del 2023
Actividad: Actividades administrativas.

Se entabla comunicación con el arq. Daniel Munar (Profesional grupo de presupuestos) y se reenvía oficio remisorio donde se solicita la inclusión de 27 ítems No Previstos y la inclusión del nivel de atención 4.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 18 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Nos encontramos a la espera del diseño de conducción de aguas lluvias, la aprobacion de la ODS 001 y de los No previstos.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 21 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Se envia con oficio remisorio OFI 007 informe mensual del 14 de julio al 13 de agosto.
Nos encontramos a la espera del diseño de conducción de aguas lluvias, la aprobación de la ODS 001 y de los No Previstos.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente de Obra

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 22 del 2023
Actividad: Actividades administrativas.

Se solicita información con respecto al diseño de conducción de aguas lluvias en el grupo de WhatsAPP "Grupo Reg CENTRAL CTO-303-2022 UOPEC-MARVALL". No se recibe respuesta alguna por parte de los profesionales de la UOPE

CamScanner
Powered by

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 23 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Se realiza Comité de Seguimiento con Soporte de acta No 45 en donde se refiera la importancia de contar con los diseños para dar inicio a las actividades en el Centro Penitenciario a lo cual apoyo a la Supervisión dice entregar los diseños el día Viernes 25, a lo cual el arq. Alejandro Almonacid se compromete a tener listos los diseños a más tardar el martes 29.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 24 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Se realiza reunión virtual en presencia de apoyo a supervisión, profesionales de presupuestos de la USPEC en interventoría, donde se expone lo siguiente:

- Se solicitó mesa de trabajo para revisión de ítems

No Previstos ya que la aprobación principal es por parte de la supervisión de la USPEC.

- Algunos ítems presentados son de una base de datos de la USPEC
- Nivel de atención 4 para atención de CDS.

La USPEC solicita se presente mediante correo electrónico la siguiente documentación:

- Presentación de No Previstos
- APU de ítems que no se encuentren en la base de la USPEC
- Aval técnico de NP presentados en otro contrato con la USPEC
- Bases de datos de donde se tomaron algunos ítems

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar Marvall
Fecha: Agosto 25 del 2023
Actividad Actividades administrativas

Mediante oficio OFI 014 se envía solicitud de permiso de ingreso con las respectivas cédulas

CamScanner
Powered by

Nos encontramos a la espera del diseño de conducción de aguas lluvias, la aprobación de los No Previstos y la aprobación de la ODS.

Ing Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 26 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Mediante correo electrónico a las 11:49 am se recibe Orden de Servicio con firmas de las partes involucradas para dar inicio de la misma el 28 de agosto
Se envía oficio OFI 017 formalizando las modificaciones que plantearon los profesionales de la USPEC y solicitando nuevamente los diseños en la mayor brevedad posible.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Marden

Lugar: Marvall - Chiquinquirá
Fecha: Agosto 28 del 2023
Actividad: Actividades administrativas y gestionamiento personal en obra.

Mediante oficio OFI 018 se solicita la fase (información) en que se encuentra la aprobación de los No Previstos o las observaciones que a la fecha han impedido su aprobación.
El residente de obra llega a Chiquinquirá con el fin de buscar personal de la zona ya que la mayoría de trabajadores relacionados en OFI 014 no se presentaron a trabajar. También se realizan las cotizaciones del material con el fin de agilizar los procesos mientras se realizan los diseños del sistema de conducción de aguas lluvias por parte de los profesionales de la USPEC.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Marvall - Chiquinquirá
Fecha: Agosto 29 del 2023
Actividad: Actividades administrativas - recorrido inspección tanque almacenamiento existente.

Mediante oficio OFI 019 se reitera la solicitud de diseños

Mar

Powered by CamScanner

de conducción de aguas lluvias ya que fué el plazo máximo estipulado por la Supervisión para su envío.
Se realiza recorrido en el establecimiento Penitenciario en compañía del director del establecimiento Germán Adolfo Marroquín, el teniente Ramírez y la interventoría, donde se revisan las dimensiones y condiciones en las que se encuentra el tanque de recolección de aguas lluvias existente, el cual tiene 2.10 m de diámetro y 4.50 m de profundidad por lo cual se plantea realizar un tanque de 6x4 m con una profundidad de 4m para recibir las aguas lluvias.
Por la ubicación del tanque que se plantea realizar se toma la medida desde el muro colapsado hasta zona de canchas de futbol donde se podría ubicar dando una distancia de aprox 300 m.
Se establece iniciar el día 31 de agosto con las excavaciones para posterior construcción del primer tanque de almacenamiento.
El director solicitó que los escombros de las demoliciones los dejen en el establecimiento para rectilizarlos.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Marden

Lugar: Marvall
Fecha: Agosto 30 del 2023
Actividad: Actividades administrativas

Mediante oficio OFI 020 se relaciona el personal que ingresará a partir del 31 de agosto.
Mediante oficio OFI 022 se envía Orden de Servicio respecto a la demolición de 15 m del muro Perimetral se realiza mediante correo electrónico el anal técnico de los análisis de Precios unitarios No Previstos
Nos encontramos a la espera del diseño de conducción de aguas lluvias, la aprobacion de la ODS de demolición de los 15 m de muro Perimetral.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Chiquinquirá
Fecha: Agosto 31 del 2023
Actividad: Descapote capa vegetal y excavación del terreno para tanque almacenamiento No 1.

Mediante Oficio OFI 023 se relaciona el personal q ingresará a dota a partir del 01 de Septiembre

Powered by CamScanner

Se da inicio al descapote de capa vegetal, con el siguiente Personal en obra:

- José Santos Caceda Cottes 1.083.887.747.
- Luis Alfonso Tiviño Gomez 79.163.300
- Juan Gabriel Pinto Santos 1.049.206.773
- Santiago Blanco Castañeda 79.503.942
- Francelides Sánchez (Conductor maquinaria cat 416 d modelo 2006)

En el proceso de excavación del terreno con maquina nos encontramos con el paso de tubería eléctrica correspondiente a las torres de reflectores. Se debe realizar la desviación de dicha acometida.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Chiquinquirá
Fecha: Septiembre 01 del 2023
Actividad: Excavación y Verificación afectaciones por tubería eléctrica encontrada.

Se continua con la actividad de excavación del terreno y se realiza la inspección Por Parte de los técnicos:

- Celso Uriel Castellanos Torres 7.315.150

Marden

- Victor Rabl Ruiz Rocha 7.301.966

Para Verificacion de afectaciones al encontral tubería eléctrica en el proceso y evalual la novedad de la desviación de la acometida. Nos encontramos a la espera de los diseños por Parte de los Profesionales de la USPEC Se realizá tetrio de 35 'm de Concretina muro Perimetral.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Lugar: Chiquinquirá
Fecha: Septiembre 02 del 2023
Actividad: Excavaciones, acopio y demás actividades Preliminares.

Se cuenta con nuevo Personal en obra:

- Jorge Humberto Sanchez León (Conductor Volqueta roja QFW-530 de Villavicencio)
- Ginna Karina Serrano Cañas 1.005.362.502

Se realiza carreteo de material extraido a lugar de acopio.

Ing. Luis Carlos Alvarez
Residente Obra

Marden

CamScanner
Powered by

Lugar : Chiquinquira.

Fecha : Septiembre 04 - 2023

Actividades: Se continua con excavacion para tanque de recoleccion de aguas lluvias, retiro de concertina en muro de cerramiento perimetral.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO

RESIDENTE DE OBRA.

Lugar: chiquinquira

Fecha : 05- 09- 2023

Actividades : Se continua con la excavacion para el tanque de recoleccion de aguas lluvias, acopio de material de excavacion. Se empieza el retiro de red electrica y de camaras de vigilancia.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ

RESIDENTE DE OBRA.

Lugar : Chiquinquira.

Fecha : 06 - 09 - 2023

Actividades : Se realiza corte con polidora para dilatar el muro de cerramiento perimetral, se continua con trabajo de excavacion y acopio de material en el lugar autorizado por la direccion de el establesimento.

• En la reunion realizada por video conferencia. Se manifesta a funsionarios tanto de la uspec (SUPERVISION E INTERVENTORIA) la imperiosa necesidad de suministrar los diseños definitivos tanto del muro de cerramiento perimetral, como el de el sistema de recoleccion de aguas lluvias, toda vez que al momento no se cuenta con éste material generando así un descontrol en la programacion de obras.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO

RESIDENTE DE OBRA.

CamScanner
Powered by

Lugar : chiquinquira.
Fecha : 07-09-2023
Actividades: Se da inicio a la demolision del muro de cerramiento perimetral, se continuan con trabajo de excavacion y movimiento de tierras para tanque de recoleccion de aguas lluvias.
- Se informa a la direccion de el establesimiento que no es posible. resguardar la integridad fisica de la garita existente, toda vez que su deterioro y riesgo que representa a los trabajadores lo imposibilita.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar : Chiquinquira
Fecha : 08-09-2023
Actividades: Se continua con la demolision de muro y retiro de escombros al lugar autorizado por la direccion del establesimiento.
- Se recibe visita por parte del ingeniero Anuar Avila.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO
RESIDENTE DE OBRA.

Marden

Lugar : chiquinquira.
Fecha : 09-09-2023
Actividades: Se continua con la demolsion de muro de cerramiento perimetral, retiro de escombros y demolision de viga de simentacion existente A la fecha, nos es suministrado, via correo electronico los diseños definitivos del muro de cerramiento perimetral, y parte de los diseños para recoleccion de aguas lluvias, no contiene los diseños del tanque de recoleccion tanto de entrada, como de finalizacion.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar : chiquinquira.
Fecha : 11-09-2023
Actividades: Se hace recepsion de tuberia novafort de 18" y se acopia material de HIO, ACERO y cemento que sera utilizado para las cimentaciones.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA.

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

Powered by CamScanner

Lugar: Chiquinquira.
Fecha: 12-09-2023
Actividades: Se continua con trabajo de excavacion para tanque de almacenamiento de aguas lluvias y se da inicio a la excavacion para la simentacion de muro de cerramiento (zapatas, vigas).
Se realiza cerramiento perimetral provicional.
Se hace orden y aseo de las areas.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar: chiquinquira.
Fecha: 13-09-2023
Actividades: Se continua con trabajo de excavacion y mobimiento de tierras. para tanque de recolleccion de aguas lluvias.
Se procede a la instalacion de concreto de limpieza para zapatas.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar: Chiquinquira.
Fecha: 14-09-2023
Actividades: continuacion de trabajo de excavacion de mobimento de tierras para el tanque de almacenamiento de aguas lluvias,
se inician trabajos de excavacion de sanjado para instalacion de tuberia novafort de 18".

ING LUIS CARLOS ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar: chiquinquira.
Fecha: 15-09-2023
Actividades: Se da inicio a la instalacion de concreto siclopeo en zapatas, Se continua con la demolision del muro faltante, y retiro de escombros, se da inicio al corte, figurado y amarre de acero para zapatas

ING LUIS CARLOS ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

Lugar : chiyonquira
Fecha : 16-09-2023
Actividades: se procede con la fondasion de zapatas, se continua con figurado de acero para zapatas faltantes, e instalacion de concreto de limpieza para zapatas.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar : Chiquinquira.
Fecha : 18-09-2023
Actividades. Se procede con fundasion de zapatas. Se acopia material y se termina de. replantear el terreno para el tanque de almacenamiento de aguas lluvias

ING LUIS CARLOS ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA.

LUGAR : CHIQUNQUIRA.
FECHA : 19-09-2023
Actividades : instalacion de concreto de limpieza para las vigas de cimentacion de muro perimetral, se inicia excavacion. de zapatas faltantes, y demolision de vigas y zapatas del muro existente.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ
RESIDANTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3 EPMSC – GIRARDOT


CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Girardot, se localiza en el municipio de Girardot el departamento de Cundinamarca en la Cl. 38 #3-28, Barrio Diamante.

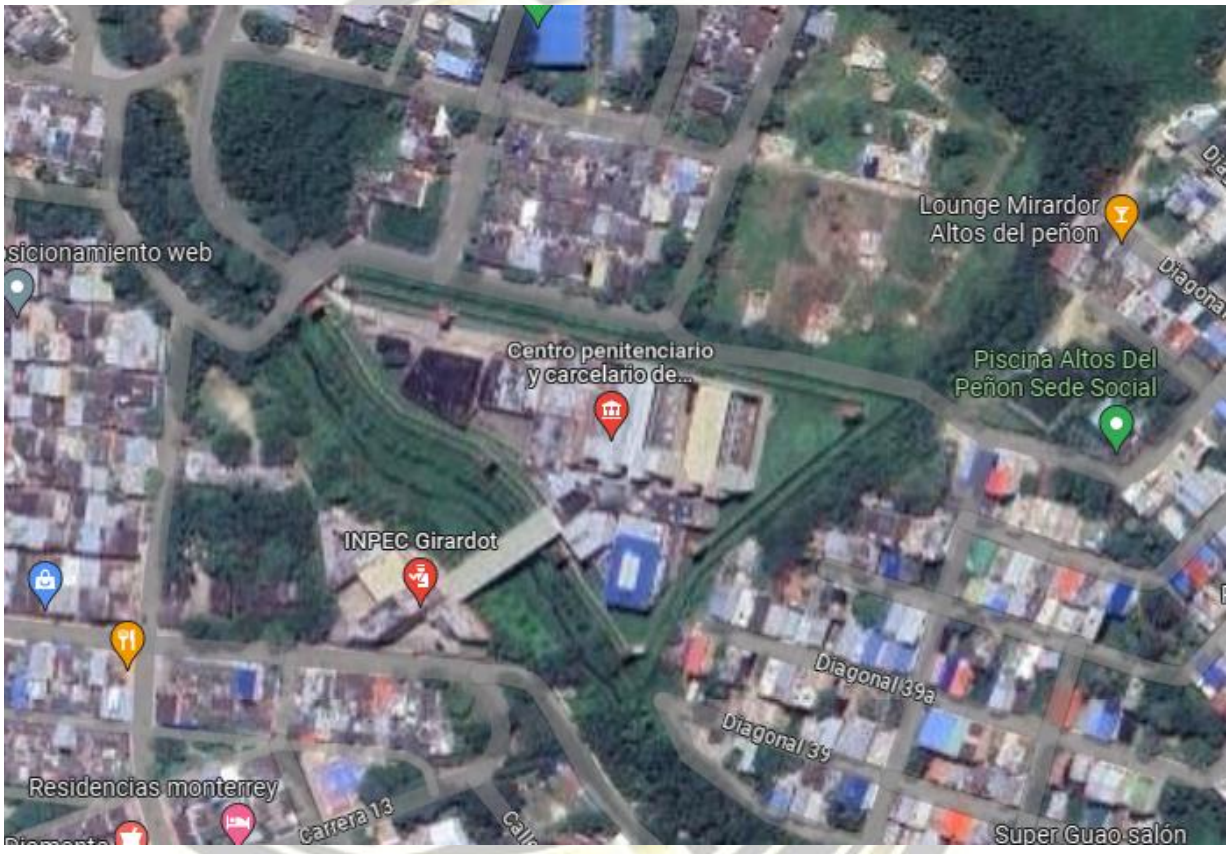

Localización geográfica EPMSC Girardot (Cundinamarca). Fuente Google maps

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – GIRARDOT

No se cuenta con registro fotográfico debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día jueves 03 de agosto.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de agosto del 2023 y el 13 de septiembre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

LUNES 14 DE AGOSTO DEL 2023

Clima DESPEJADO

Se envía informe diagnóstico de la visita realizada al centro penitenciario.
Se recibe contestación por parte de interventoría en donde se informa que se hará revisión integral de los diagnósticos de cada establecimiento, no se hará revisión parcial.

MIERCOLES 23 DE AGOSTO DEL 2023

Clima DESPEJADO

Se realiza envío de informe diagnóstico y ordenes de servicio para su revisión mas no para su aprobación.

JUEVES 24 DE AGOSTO DEL 2023

Clima DESPEJADO

Se recibe aprobación de algunas ordenes de servicio por parte de interventoría, pero no por parte de supervisión, sin embargo, se solicita que no sean aprobadas aún.

MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima DESPEJADO

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0367 se reciben aprobación por parte de la interventoría.

Mediante correo electrónico la supervisión solicita el ajuste de las ODS al nuevo formato y realizar el cambio del supervisor del contrato para firma del ing. Rafael Alberto García García.

VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima DESPEJADO

Mediante correo electrónico la interventoría hace envío del nuevo formato para actualización de las ODS.

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima DESPEJADO

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0385se recibe solicitud de presentación de las ODS devueltas por cambio de formato y cambio de firma de supervisor del contrato.

MARVALL

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día jueves 03 de agosto.

MARVALL

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3 EPMSC – RM VILLAVICENCIO


CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio, se localiza en la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta en Cra. 6 No. 3 - 160.

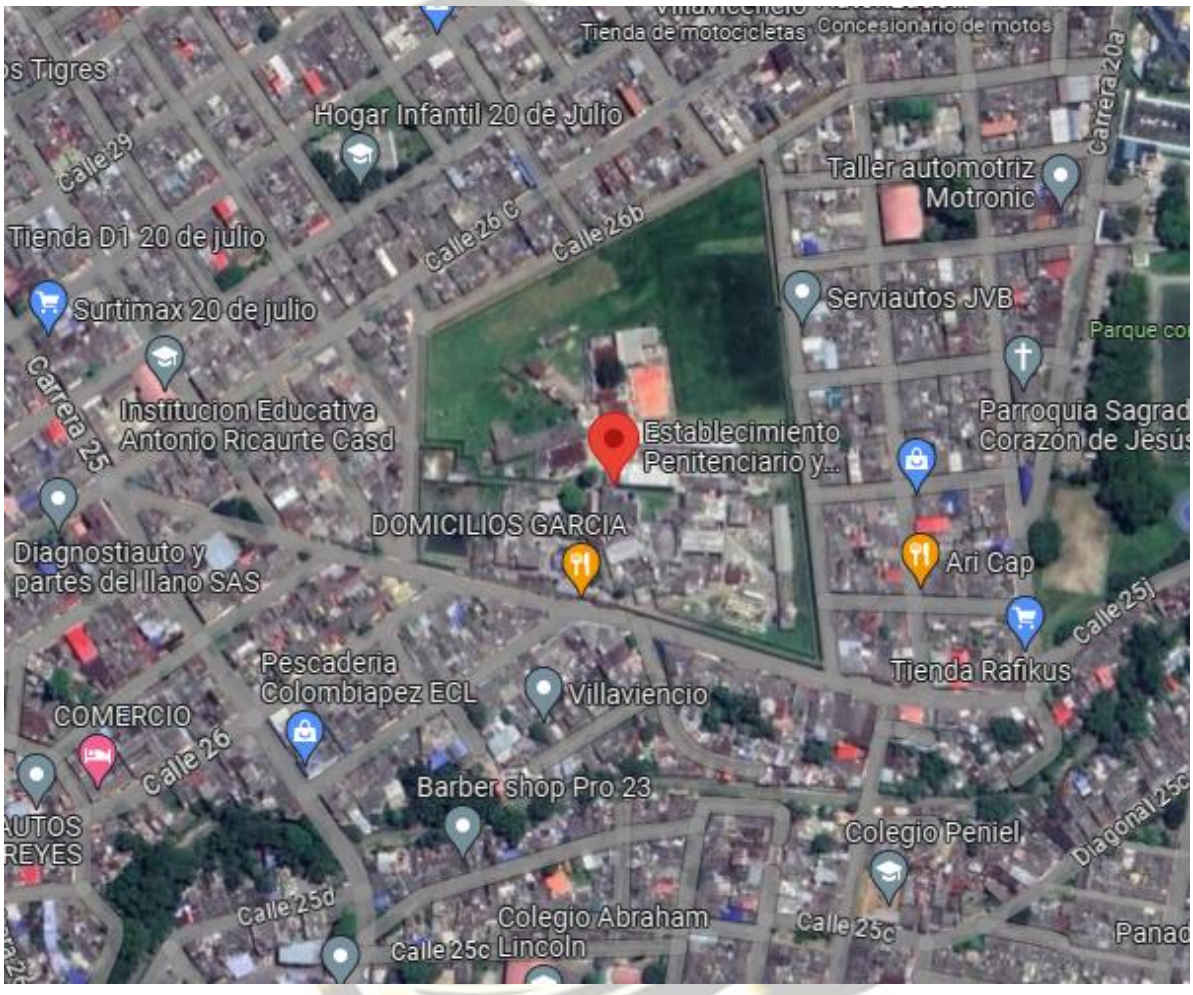

Localización geográfica EPMSC - RM Villavicencio (Meta). Fuente Google maps.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC - RM VILLAVICENCIO

FOTO # 1	FOTO # 2
	
FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Subestación	UBICACIÓN: Subestación
DESCRIPCIÓN: Cambio de transformador alquilado por transformador definitivo de 400 kva.	DESCRIPCION: Cambio de transformador alquilado por transformador definitivo de 400 kva.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2023 al 14 de septiembre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

JUEVES 31 DE AGOSTO DEL 2023

Clima soleado

Mediante oficio OFI 024 se solicita permiso de ingreso para el día viernes 01 de septiembre de personal de obra para realizar el cambio del transformador alquilado de 200 kva al alquiler de un transformador de 400 kva.

VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se hace presencia en el centro penitencia con el fin de realizar cambio de transformador de 200 kva el cual se encuentra desde el día de la atención de la emergencia al ser el único disponible, por un transformador de 400 kva.

MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima soleado

Se envía informe diagnóstico de Villavicencio para fines informativos.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En la etapa constructiva del proyecto se utilizan las siguientes herramientas y equipos.

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	ALICATES	HERRAMIENTA
3	PINZAS	HERRAMIENTA
4	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	HERRAMIENTA
5	JUEGO DE RACHE	HERRAMIENTA
6	MARTILLO DE GOMA	HERRAMIENTA
7	MARTILLO DE UÑA	HERRAMIENTA
8	SINCEL	HERRAMIENTA
9	PUNTERO	HERRAMIENTA
10	PONCHADORA HIDRAULICA	HERRAMIENTA
11	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	EQUIPO
12	ASPIRADORA INDUSTRIAL	EQUIPO
13	HIDROLAVADORA INSDUSTRIAL	EQUIPO
14	COMPUTADOR PORTATIL	EQUIPO
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

HORARIOS DE TRABAJO

HORAS LABORADAS MES DE AGOSTO							
SEMANA 0							
DIAS	14	15	16	17	18	19	20
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE AGOSTO							
SEMANA 0							
DIAS	21	22	23	24	25	26	27
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE							
SEMANA 0							
DIAS	28	29	30	31	1	2	3
HORAS	0	0	0	0	1	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						1	

HORAS LABORADAS MES DE SEPTIEMBRE							
SEMANA 0							
DIAS	4	5	6	7	8	9	10
HORAS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						0	

HORAS LABORADAS MES DE SEPTIEMBRE							
SEMANA 1							
DIAS	11	12	13	14	15	16	17
HORAS	0	0	0				
TOTAL HORAS SEMANA						0	

TOTAL HORAS DEL MES
1

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3 CEPAMSEB COMBITA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE, se encuentra ubicado en la vereda Río Frío - Municipio de Rivera, Kilómetro 15 vía Neiva – Rivera, Huila.



Ubicación CPAMSEB COMBITA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de julio del 2023 y el 13 de agosto del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

JUEVES 31 DE AGOSTO DEL 2023

Clima DESPEJADO

Mediante oficio OFI 021 se solicita permiso de ingreso para el día viernes 01 de septiembre al centro penitenciario con el fin de realizar visita diagnóstica de la emergencia.

VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Clima DESPEJADO

Se realiza presencial con personal capacitado en caldera en donde se hacen unos ajustes a la caldera y ésta enciende. Posteriormente mediante oficio OFI 025 se deja constancia de las intervenciones realizadas y la medida provisional frente a la problemática.

MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023


Clima DESPEJADO

Se realiza envío de informe diagnóstico de la visita realizada el viernes 01 de septiembre.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC COMBITA.

FOTO # 1	FOTO # 2
	
FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Caldera Combita	UBICACIÓN: Caldera Combita

FOTO # 3	FOTO # 4
	
FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Quemador caldera	UBICACIÓN: Tablero de control caldera

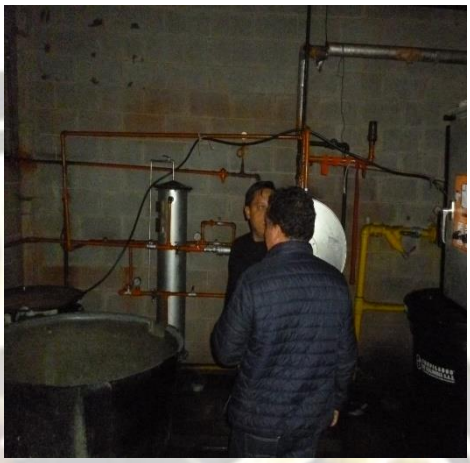FOTO # 5	FOTO # 6
	
FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 01 septiembre de 2023
UBICACIÓN: Tubería caldera	UBICACIÓN: Tubería caldera
