FOTO # 45	FOTO # 46
	
FECHA DE LA FOTO: 02 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 02 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación para tubería de 18”	DESCRIPCIÓN: Encofrado vigas de cimentación y vigas de contrapeso

FOTO # 47	FOTO # 48
	
FECHA DE LA FOTO: 02 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 02 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Desencofrado de columnas	DESCRIPCIÓN: Acero de columnas

FOTO # 49	FOTO # 50
	
FECHA DE LA FOTO: 02 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 02 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Cama de arena para colocación de tubería de 18”	DESCRIPCIÓN: Cama de arena para colocación de tubería de 18”

FOTO # 51	FOTO # 52
	
FECHA DE LA FOTO: 03 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 03 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Acero de columnas	DESCRIPCIÓN: Formaleta de columnas para vaciado de concreto

FOTO # 53	FOTO # 54
	
FECHA DE LA FOTO: 03 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 03 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Desencofrado de columnas	DESCRIPCIÓN: Instalación de bloques de concreto

FOTO # 55	FOTO # 56
	
FECHA DE LA FOTO: 03 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 03 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Instalación de tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Instalación tubería 18”

FOTO # 57	FOTO # 58
	
FECHA DE LA FOTO: 04 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Cama de arena	DESCRIPCIÓN: Instalación bloques de concreto

FOTO # 59	FOTO # 60
	
FECHA DE LA FOTO: 04 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Columnas y vigas de cimentación	DESCRIPCIÓN: Instalación tubería

FOTO # 61	**FOTO # 62**
	
FECHA DE LA FOTO: 04 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Instalación bloques de concreto	DESCRIPCIÓN: Encofrado de columnas

FOTO # 63	**FOTO # 64**
	
FECHA DE LA FOTO: 05 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 05 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Instalación tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Instalación tubería 18”

FOTO # 65	**FOTO # 66**
	
FECHA DE LA FOTO: 05 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 05 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Instalación bloques de concreto	DESCRIPCIÓN: Viga de cimentación

FOTO # 67	**FOTO # 68**
	
FECHA DE LA FOTO: 05 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 05 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Instalación acero viga de cimentación	DESCRIPCIÓN: Cama de arena

FOTO # 69	**FOTO # 70**
	
FECHA DE LA FOTO: 06 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 06 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Solado de limpieza pozos inspección	DESCRIPCIÓN: Instalación de bloques de concreto

FOTO # 71	**FOTO # 72**
	
FECHA DE LA FOTO: 06 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 06 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Columnas	DESCRIPCIÓN: Columnas

FOTO # 73	**FOTO # 74**
	
FECHA DE LA FOTO: 06 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 06 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Instalación tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Instalación tubería 18”

FOTO # 75	**FOTO # 76**
	
FECHA DE LA FOTO: 07 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Instalación tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Instalación tubería 18”

FOTO # 77	**FOTO # 78**
	
FECHA DE LA FOTO: 07 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Instalación de tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Instalación bloque de concreto

FOTO # 79	**FOTO # 80**
	
FECHA DE LA FOTO: 07 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Vaciado de vigas de cimentación	DESCRIPCIÓN: Acero

FOTO # 81	**FOTO # 82**
	
FECHA DE LA FOTO: 09 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 09 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Pozos de inspección	DESCRIPCIÓN: Grouting de dovelas

FOTO # 83	**FOTO # 84**
	
FECHA DE LA FOTO: 09 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 09 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación para tubería de 18”	DESCRIPCIÓN: Instalación de tubería de 18”

FOTO # 85	**FOTO # 86**
	
FECHA DE LA FOTO: 09 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 09 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación para tubería de 18”	DESCRIPCIÓN: Pozos de inspección

FOTO # 87	**FOTO # 88**
	
FECHA DE LA FOTO: 10 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 10 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación para tubería de 18”	DESCRIPCIÓN: Grouting de dovelas

FOTO # 89	**FOTO # 90**
	
FECHA DE LA FOTO: 10 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 10 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Instalación bloques de concreto	DESCRIPCIÓN: Acero viga intermedia

FOTO # 91	**FOTO # 92**
	
FECHA DE LA FOTO: 10 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 10 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Pozos de inspección	DESCRIPCIÓN: Acero viga intermedia

FOTO # 93	**FOTO # 94**
	
FECHA DE LA FOTO: 11 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 11 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Mampostería y revoque de pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Excavación para pozo de inspección

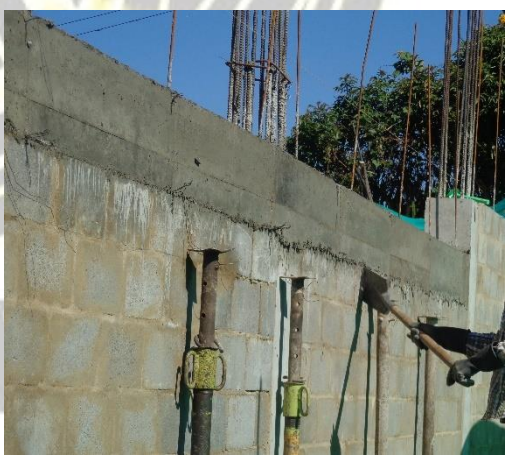
FOTO # 95	**FOTO # 96**
	
FECHA DE LA FOTO: 11 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 11 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Acero para sección de viga aérea	DESCRIPCIÓN: Desencofrado sección de viga aérea

FOTO # 97	**FOTO # 98**
	
FECHA DE LA FOTO: 12 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 12 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Encofrado de sección de viga aérea	DESCRIPCIÓN: Vaciado concreto de sección de viga aérea

FOTO # 99	**FOTO # 100**
	
FECHA DE LA FOTO: 12 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 12 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Solado de limpieza de pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Lleno de excavación realizada para instalación de tubería de 18”

FOTO # 101	**FOTO # 102**
	
FECHA DE LA FOTO: 12 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 12 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Instalación de bloques de concreto	DESCRIPCIÓN: Mampostería de pozo de inspección

FOTO # 103	**FOTO # 104**
	
FECHA DE LA FOTO: 13 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 13 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Revoque interno pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Mampostería de pozo de inspección

FOTO # 103	**FOTO # 104**
	
FECHA DE LA FOTO: 13 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 13 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Encofrado de sección de viga aérea	DESCRIPCIÓN: Instalación de bloques de concreto

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En la etapa constructiva del proyecto se utilizan las siguientes herramientas y equipos.

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	SINCEL	HERRAMIENTA
3	MARTILLO	HERRAMIENTA
4	PULIDORA	HERRAMIENTA
5	TALADRO	HERRAMIENTA
6	PALAS	HERRAMIENTA
7	BUGGY	HERRAMIENTA
8	BARRA	HERRAMIENTA
9	RETROECAVADORA	MAQUINARIA
10	VOLQUETA	MAQUINARIA

MARVALL

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

HORARIOS DE TRABAJO

HORAS LABORADAS MES DE SEPTIEMBRE							
SEMANA 0							
DIAS	11	12	13	14	15	16	17
HORAS	0	0	0	8	8	5	0
TOTAL HORAS SEMANA						21	

HORAS LABORADAS MES DE SEPTIEMBRE							
SEMANA 0							
DIAS	18	19	20	21	22	23	24
HORAS	8	8	8	8	8	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						40	

HORAS LABORADAS MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE							
SEMANA 1							
DIAS	25	26	27	28	29	30	1
HORAS	8	8	8	8	8	5	5
TOTAL HORAS SEMANA						50	

HORAS LABORADAS MES DE OCTUBRE							
SEMANA 2							
DIAS	2	3	4	5	6	7	8
HORAS	8	8	8	8	8	5	0
TOTAL HORAS SEMANA						45	

HORAS LABORADAS MES DE OCTUBRE							
SEMANA 3							
DIAS	9	10	11	12	13	14	15
HORAS	8	8	8	8	8	0	0
TOTAL HORAS SEMANA						40	

TOTAL HORAS DEL MES
196

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

ANEXO No 4. COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3 EPMSC – GIRARDOT


CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Girardot, se localiza en el municipio de Girardot el departamento de Cundinamarca en la Cl. 38 #3-28, Barrio Diamante.

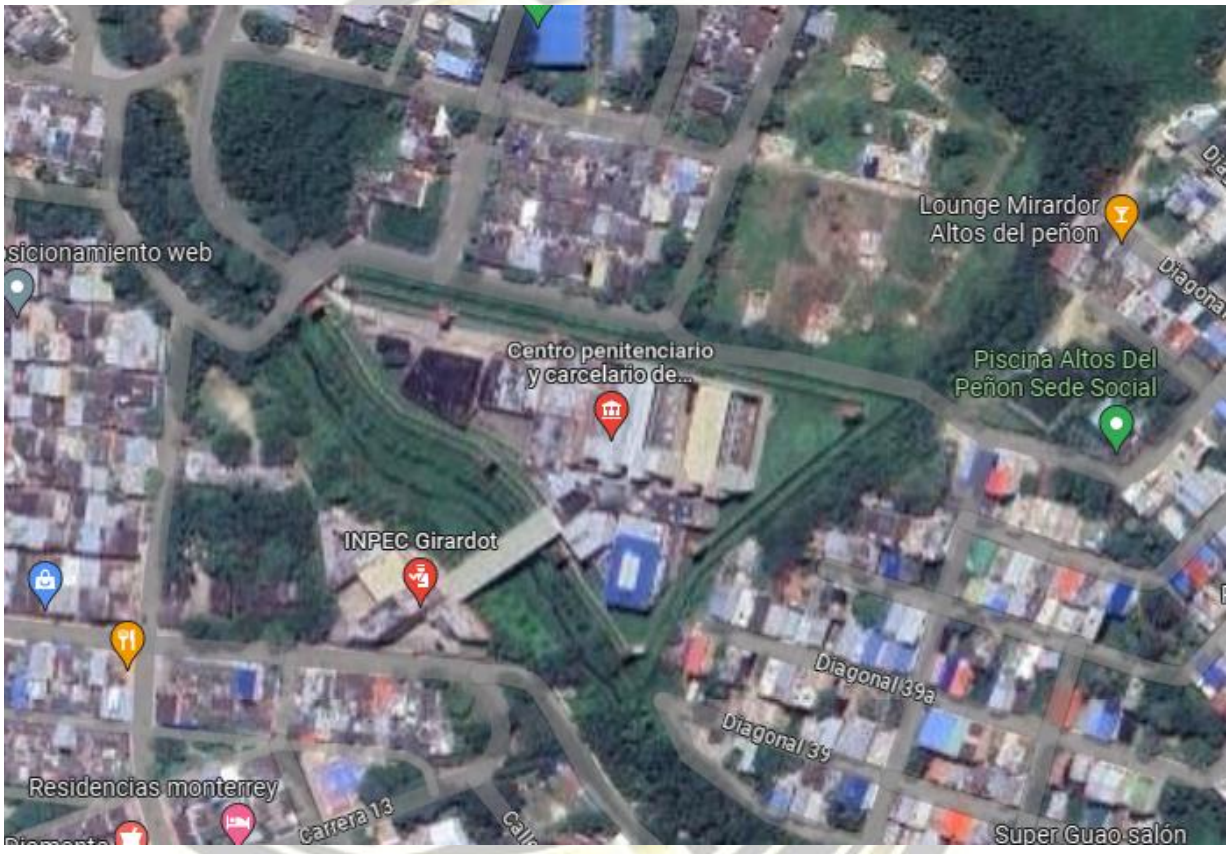

Localización geográfica EPMSC Girardot (Cundinamarca). Fuente Google maps

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de septiembre del 2023 y el 13 de octubre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Se envían orden de servicio corregida: ODS GIRARDOT – Instalación tableros y transferencias a interventoría para su revisión y firma de aprobación.

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 2023

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0422, interventoría solicita aprobación de ordenes de servicio G1-013 Y G1-014, puesto que se revisó, verificó y aprobó el informe de obra con la documentación requerida.

MARTES 10 DE OCTUBRE DEL 2023

Se recibe correo por parte de supervisión con las siguientes observaciones:

- El ítem 8.1.1.9 habla de su sistema de bombeo de 7,5 H.P (1 titular +1 Suplencia), es decir, es un sistema con dos bombas de 7,5 H.P y se incluyen 4 unidades.
- El ítem 8.1.1.9. Dice" Incluye tablero de control" pero dentro del presupuesto se incluyen 2 unidades del ítem 10.2.3.45 que se refiere a tableros de control para bombas.

MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2023

Interventoría mediante correo manifiesta que las observaciones realizadas por los profesionales de la uspec son totalmente válidas. Sin embargo, estas ODS son un presupuesto inicial el cual puede tener modificaciones en el transcurso de la ejecución, se da claridad que esta ODS iniciales son para ingresar a ejecutar y lo que realmente se le reconocerá al contratista de obra será revisado en sitio por el personal de interventoría. Las ODS están sujetas a mayores y menores cantidades e incluso a ítems no previstos y actividades que no se hayan contemplado al iniciar.

Mediante correo, se envía ODS G1-013 GIRARDOT – Instalación tableros y transferencias con la corrección en la cantidad del ítem 8.1.19. Con respecto al ítem 10.2.3.45 los tableros que se instalan son adicionales a los contemplado dentro del ítem de suministro de motobombas.

JUEVES 12 DE OCTUBRE DEL 2023

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0465, interventoría solicita aprobación de ordenes de servicio G1-013 puesto que se revisó, verificó y aprobó el informe de obra con la documentación requerida.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – GIRARDOT

No se cuenta con registro fotográfico debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día jueves 03 de agosto.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día jueves 03 de agosto.

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3 EPMSC – RM VILLAVICENCIO


CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio, se localiza en la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta en Cra. 6 No. 3 - 160.

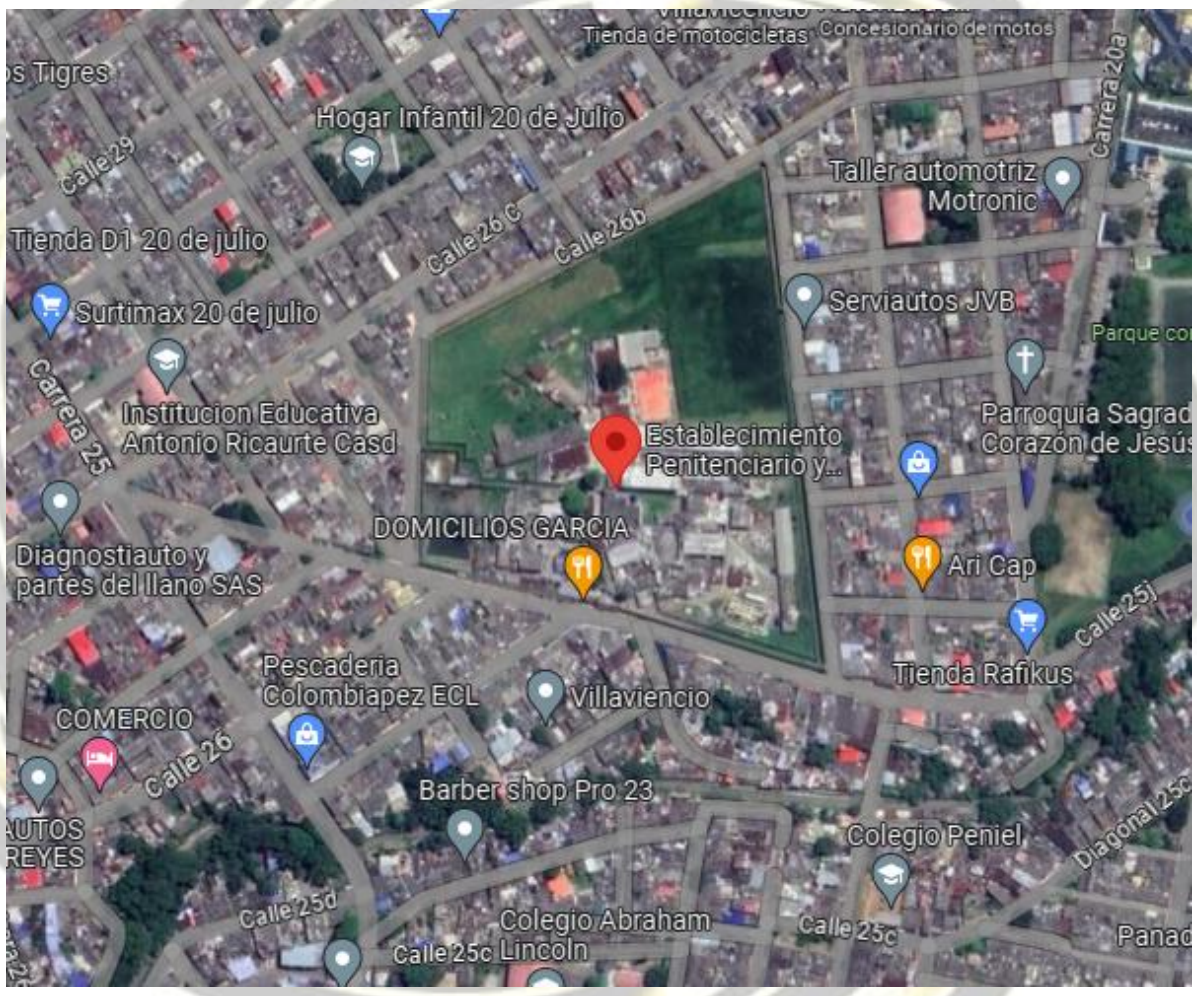

Localización geográfica EPMSC - RM Villavicencio (Meta). Fuente Google maps.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 13 de agosto del 2023 al 14 de septiembre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Mediante correo se envía informe diagnóstico de Villavicencio de la atención de la emergencia inmediata presentada en el establecimiento debido a fallas en el fluido eléctrico.

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0391, interventoría envía observaciones a informe diagnóstico, en el cual presenta:

- Esta interventoría no realizará revisiones parciales de la información para aprobación de las ordenes de servicio.
- Para temas informativos el informe debía ser enviado a la supervisión del contrato.

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 045, se realiza solicitud de aprobación de plan de actividades para definir si se realiza el mantenimiento del transformador que se encuentra dañado o el suministro de un nuevo transformador con las características del transformador retirado.

Se envía informe de atención de la emergencia, con los conceptos de los técnicos eléctricos.

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Se recibe correo de supervisión con las siguientes observaciones:

- Se requiere de una evaluación técnica del daño del transformador propiedad del establecimiento.
- Presentar una propuesta con alcance, presupuesto y tiempos de entrega.
- Definir elementos técnicos como el cable XLPE, que verificación o prueba se realizó para determinar su daño**.**

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 057 se da respuesta a las observaciones realizadas a la solicitud presentada en el oficio OFI 045.

Mediante oficio OFI 060, se realiza la solicitud de revisión y aprobación de ordenes de servicio, adicionalmente se envía un cronograma para tener en cuenta el orden de su aprobación.

Mediante oficio OFI 061, se realiza solicitud de inclusión de ítems no previstos para la ejecución de actividades en el establecimiento penitenciario de Villavicencio.

LUNES 02 DE OCTUBRE DEL 2023

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC-382-0430 por parte de interventoría, se reciben observaciones de las ODS presentadas en donde se establecen que las ordenes de servicio 1, 3 y 4 no son aprobadas por contar con ítems no previstos.

Adicionalmente, interventoría solicita la presentación del informe diagnóstico para dar aprobación a la ODS con ítems contractuales. Por lo cual se envía informe mediante correo electrónico.

Mediante oficio INTER-COOR-USPEC382-0432, la interventoría solicita la aprobación de la ODS G1-035 VILLAVICENCIO después de realiza su revisión, verificación y posterior aprobación del informe de obra con la documentación requerida.

MIERCOLES 04 DE OCTUBRE DEL 2023

Supervisión envía un correo con la aprobación de a ODS G1-032 EPMSC RM VILLAVICENCIO – Fallo en el sistema de alimentación eléctrico principal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC - RM VILLAVICENCIO

No se cuenta con registro fotográfico debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día jueves 10 de agosto.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día jueves 10 de agosto.

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 3 CEPAMSEB COMBITA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD EL BARNE, se encuentra ubicado en el kilómetro 17 vía Tunja Paipa, en el municipio de Cómbita en el departamento de Boyacá.



Ubicación CPAMSEB COMBITA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de septiembre del 2023 y el 13 de octubre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 061 se solicita la inclusión de ítems no previstos para la ejecución de las actividades pertinentes en el establecimiento penitenciario.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC COMBITA.

No se cuenta con registro fotográfico debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día viernes 01 de septiembre.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

RELACION PERSONAL EMPLEADO

No se cuenta con relación de herramientas y equipos debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día viernes 01 de septiembre.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día viernes 01 de septiembre.

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

ANEXO 5. COMUNICACIONES ENVIADAS

ANEXO 6. COMUNICACIONES RECIBIDAS
