MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL No 5

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – GIRARDOT 56
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 57
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA..... 58
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia..... 58
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS..... 59
HORARIOS DE TRABAJO..... 60
INFORME MENSUAL DE OBRA No 5 EPMSC – RM VILLAVICENCIO 61
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO..... 62
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – RM VILLAVICENCIO 63
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 64
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA..... 67
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia..... 67
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS..... 68
HORARIOS DE TRABAJO..... 69
INFORME MENSUAL DE OBRA No 5 CEPAMSEB COMBITA 70
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO..... 71
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 72
REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC COMBITA..... 74
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA..... 80
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia..... 80
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS..... 81
HORARIOS DE TRABAJO..... 82
INFORME MENSUAL DE OBRA No 5 CPAMSM BOG..... 83
UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO..... 84
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 85
REGISTRO FOTOGRÁFICO RM BUEN PASTOR..... 87
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA..... 90
Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia..... 90

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ***91***
HORARIOS DE TRABAJO ***92***
ANEXOS DE INFORME MENSUAL ***93***
COMUNICACIONES ***93***
COMUNICACIONES ENVIADAS ***94***
COMUNICACIONES RECIBIDAS ***95***

MARVALL

INTRODUCCIÓN

El siguiente proyecto busca realizar las actividades necesarias para, **“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.** de los centros carcelarios correspondientes al USPEC.

El proyecto deberá ejecutarse de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, así como el resultado de los diagnósticos de la infraestructura, los capítulos técnicos y los apéndices adjuntos, la minuta del contrato, y a las políticas de la Entidad asociadas a la conservación y el mantenimiento de la infraestructura.

En consecuencia, los contratos atenderán de manera inmediata, emergencias de infraestructura y requerimientos, derivados de eventos imprevisibles por condiciones climáticas, mecánicas, accidentales y de deterioro excesivo de materiales, siempre y cuando su alcance se enmarque en “Intervenciones de Atención Primaria”.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME MENSUAL UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS "USPEC"	
Informe No:	**005**
Periodo del Informe:	14/10/2022 al 13/11/2022
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022
OBJETO:	No. USPEC-CTO-303-2022, Cuyo Objeto: "ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR:	$ 1.646.179.966,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS:	**CUMPLIMIENTO:** Mediante la cual se ampara el cumplimiento general del contrato, por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) meses más o hasta su liquidación.
	CALIDAD DE LOS BIENES: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor indicado en el presente Contrato, con una vigencia de un (1) año, contado a partir de la entrega de la obra a entera satisfacción.
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor indicado en el presente Contrato, con una vigencia de cinco (5) años, contado a partir de la entrega de la obra a entera satisfacción.
	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la vigencia del contrato y por tres (3) años más.
	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Mediante la cual EL CONTRATISTA garantiza la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a terceros, en cuantía equivalente a 5% con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:	OTRO SI #1 Prórroga hasta el 31 de marzo del 2023 OTRO SI #2 Prórroga hasta el 30 de junio del 2023
FECHA DE SESIÓN DEL CONTRATO:	27 de junio de 2023
MODIFICACIONES CONTRACTUALES:	OTRO SI #3 Prórroga hasta el 30 de septiembre del 2023 OTRO SI #4 Prórroga hasta el 30 de diciembre del 2023
ESTADO DE LAS ACTAS DE PAGO PARCIAL:	N/A
VALOR DE LAS ACTAS PAGADAS:	$0
VALOR DE LAS ACTAS EN TRAMITE:	ACTA #1 $ 376.786.631,24

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 5 EPMSC NEIVA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


"ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1".

14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO

EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EPMSC NEIVA, se encuentra ubicado en la vereda Río Frío - Municipio de Rivera, Kilómetro 15 vía Neiva – Rivera, Huila.

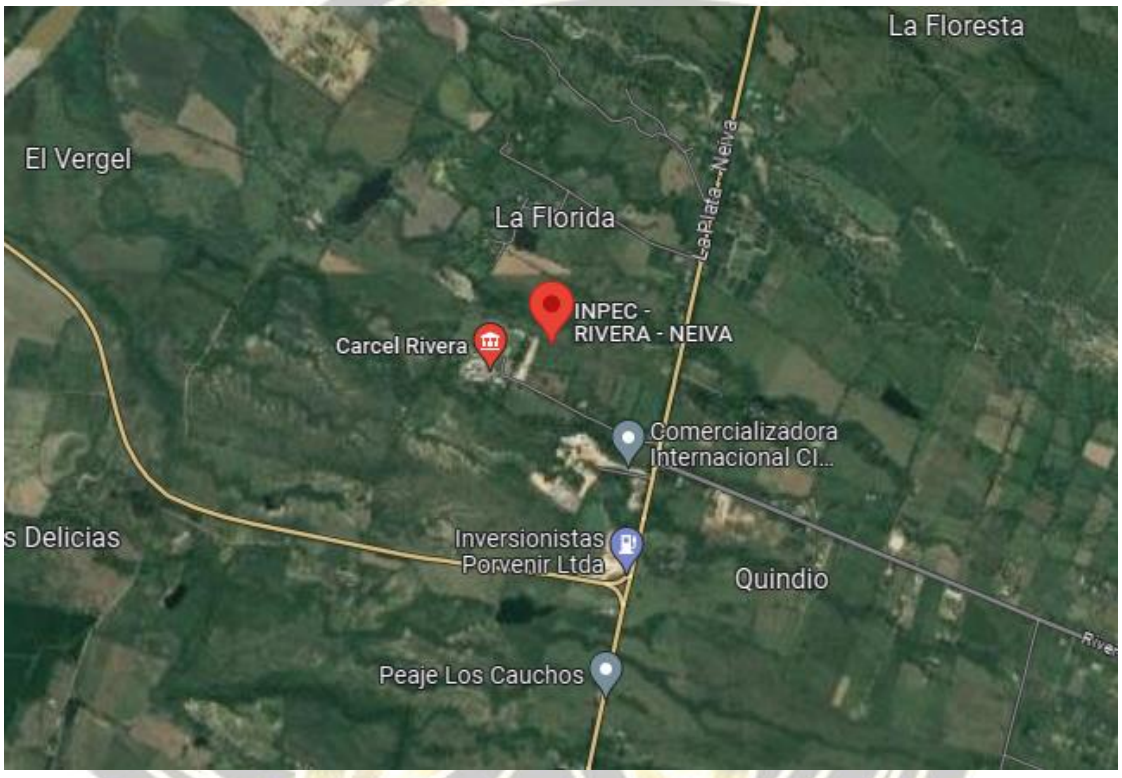

Ubicación EPMSC NEIVA.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día sábado 22 de julio.

MARVALL

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de octubre del 2023 y el 13 de noviembre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DEL 2023

Mediante correo electrónico, supervisión hace envío de aprobación de todos los documentos soporte y de las ordenes de servicio presentadas mediante oficio OFI 043:

- G1-009 Preliminares AL 2A
- G1-019 Redes hidrosanitarias AL 2A
- G1-032 Enchapes y aparatos sanitarios AL 2A
- G1-018 Preliminares AL 3A
- G1-020 Redes hidrosanitarias AL 3A
- G1-033 Enchapes y aparatos sanitarios AL 3A
- G1-016 Preliminares AL 2B
- G1-010 Redes hidrosanitarias AL 2B
- G1-021 Enchapes y aparatos sanitarios AL 2B
- G1-017 Preliminares AL 3B
- G1-011 Redes hidrosanitarias AL 3B
- G1-034 Enchapes y aparatos sanitarios AL 3B
- G1-012 Preliminares y red hidráulica
- G1-022 Enchapes y manto asfáltico

JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2023

Mediante correo, interventoría realiza ajuste a la numeración de las ordenes de servicio. En donde se evidencia que la ODS G1-032 ya se encuentra asignada en una ODS de Villavicencio por lo cual, se le asigna el consecutivo G1-035.

SÁBADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Se remite oficio OFI 098 solicitando la suspensión de las ordenes de servicio aprobadas de EPMSC NEIVA, ya que, debido a los inconvenientes y demoras presentadas a lo largo del presente contrato, nos vemos en la necesidad de restructurar y ajustar nuestro tiempo y personal de obra mediante la generación de una nueva programación.

MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Mediante correo, interventoría solicita el alcance al comunicado 098 donde se detallen las razones de la suspensión de las ODS aprobadas a la fecha.

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC NEIVA

No se cuenta con registro fotográfico debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día sábado 22 de julio.

MARVALL

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 5 COBOG PICOTA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO

EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÁ - 'LA PICOTA', se encuentra ubicado en el Kilómetro 5 vía Usme – Bogotá, Cundinamarca.

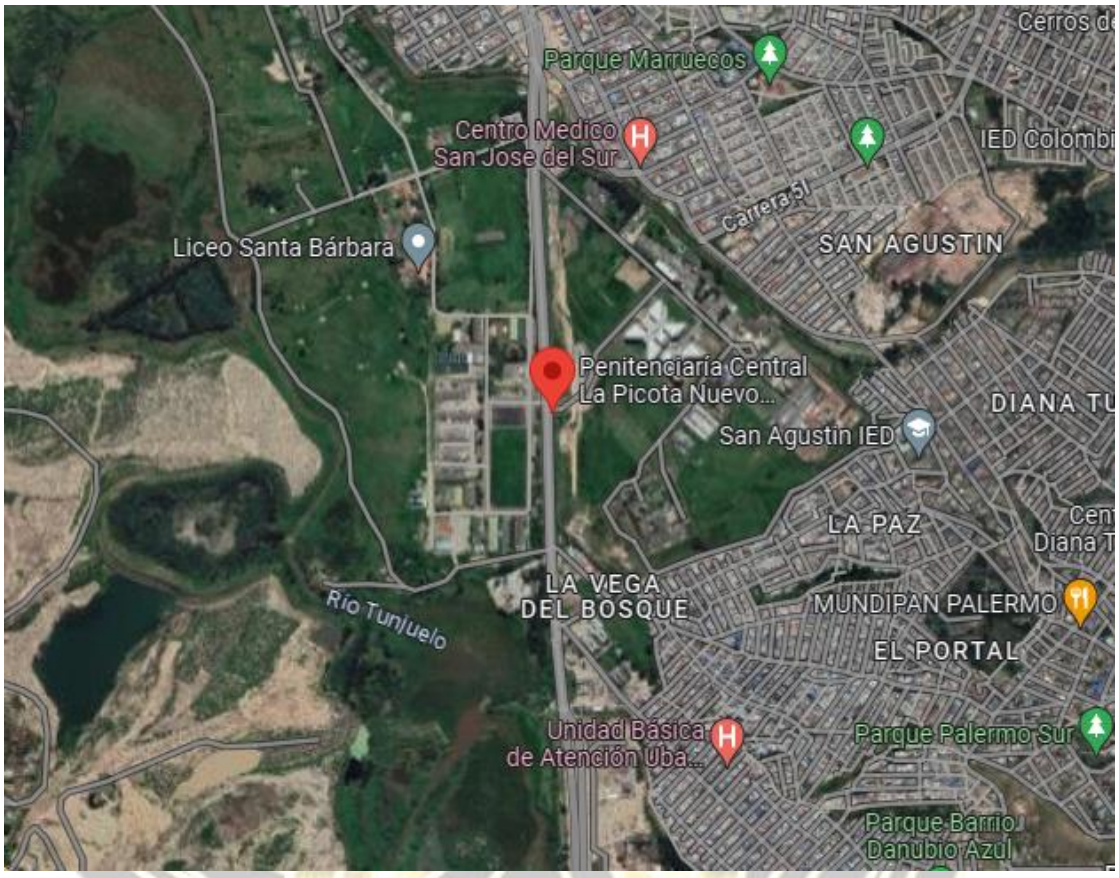

Ubicación COBOG PICOTA.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día lunes 24 de julio.

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL

REGISTRO FOTOGRÁFICO COBOG PICOTA

No se cuenta con registro fotográfico debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día lunes 24 de julio.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de octubre del 2023 y el 13 de noviembre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

JUEVES 19 DE OCTUBRE DEL 2023

Mediante oficio OFI 043, se presentan las ODS de Picota actualizadas de acuerdo a formato suministrado por la USPEC, debido a cambio del director de infraestructura y del formato. Adicionalmente, se anexa una tabla donde se organizan dichas órdenes de servicio, de acuerdo a los frentes y actividades a ejecutar teniendo en cuenta el nivel de atención 3 que corresponde a 12 días calendario según lo establecido en el anexo técnico del contrato.

Mediante correo electrónico, supervisión solicita enviar oficio por parte de interventoría y el consecutivo de las ordenes de servicio adjuntas.

Se recibe oficio INTER-COOR-USPEC-382-0468 por parte de interventoría, donde se establece que la ODS de Mantenimiento de tableros generales y bancos de condensadores hay ítems que no concuerda la descripción ni el valor unitario aprobado por la USPEC en el paquete de ítems No Previstos.

Se envía correo con la ODS de Mantenimiento de tableros generales y bancos de condensadores, corregida de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría.

MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2023

Se recibe correo electrónico por parte de supervisión, en donde se envían ODS G1-038 y G1-024 firmadas y aprobadas.

MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DEL 2023

Se recibe correo electrónico por parte de supervisión, en donde se envían ODS G1-031 y G1-037 firmadas y aprobadas.

SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Se remite oficio OFI 098 solicitando la suspensión de las ordenes de servicio aprobadas de COBOG PICOTA, ya que, debido a los inconvenientes y demoras presentadas a lo largo del presente contrato, nos vemos en la necesidad de restructurar y ajustar nuestro tiempo y personal de obra mediante la generación de una nueva programación.

MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Se recibe correo por parte de interventoría, donde queda a la espera de definición alcance del comunicado enviado donde sea más detallada la razón de suspensión de las ordenes de servicio aprobadas a la fecha.

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 5 CPMS CHIQUINQUIRA

CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022


“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTABLECIMIENTO

LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE CHIQUINQUIRÁ, se encuentra ubicado en el Kilómetro 2 vía a Bogotá, Chiquinquirá – Boyacá.

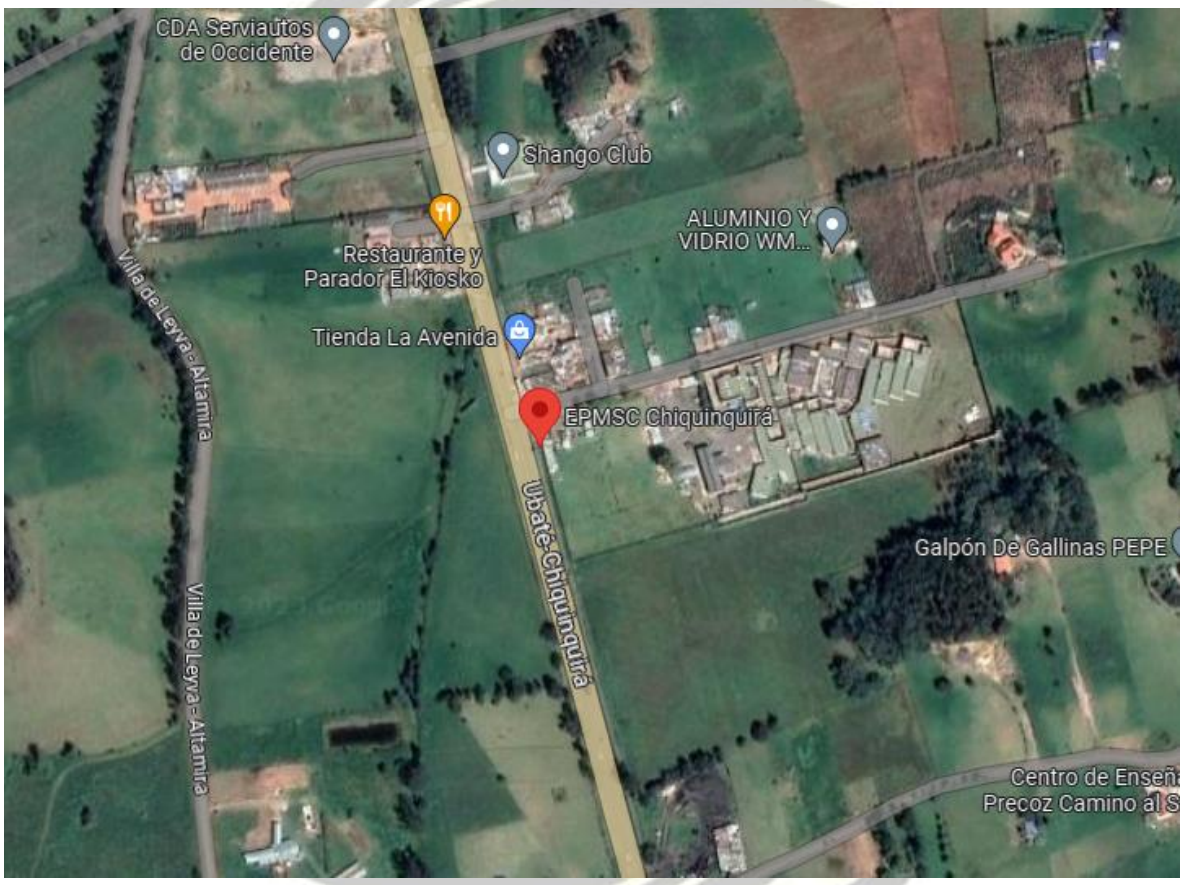

Localización geográfica EPMSC Chiquinquirá (Boyacá). Fuente Google maps.

MARVALL

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – CHIQUINQUIRÁ

FOTO # 1	FOTO # 2
	
FECHA DE LA FOTO: 14 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 14 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Acero y encofrado de viga intermedia	DESCRIPCIÓN: Encofrado de viga intermedia

FOTO # 3	FOTO # 4
	
FECHA DE LA FOTO: 17 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 17 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Lleno de zanja para instalación tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Acero de viga intermedia

FOTO # 5	FOTO # 6
	
FECHA DE LA FOTO: 18 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 18 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción de aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Revoque externo de pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Flejes de columnas

FOTO # 7	FOTO # 8
	
FECHA DE LA FOTO: 19 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 19 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación para tanque No 1 de almacenamiento y tubería 18”	DESCRIPCIÓN: Acero de vigas intermedias

FOTO # 9	**FOTO # 10**
	
FECHA DE LA FOTO: 19 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 19 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Revoque interno de pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Lleno de zanja para tubería de 18”

FOTO # 11	**FOTO # 12**
	
FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Desencofrado de columnas	DESCRIPCIÓN: Desencofrado de columnas

FOTO # 13	FOTO # 14
	
FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Desencofrado de vigas intermedias	DESCRIPCIÓN: Desencofrado de vigas intermedias

FOTO # 15	FOTO # 16
	
FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Acero de tapa para pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Acero para tapa de pozo de inspección

FOTO # 17	FOTO # 18
	
FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Acero de columnas	DESCRIPCIÓN: Construcción muro en bloque de concreto

FOTO # 19	FOTO # 20
	
FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 20 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Leno costado de pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Media caña interna de pozo de inspección

FOTO # 21	**FOTO # 22**
	
FECHA DE LA FOTO: 21 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 21 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Acero para caja de pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Encofrado de columnas

FOTO # 23	**FOTO # 24**
	
FECHA DE LA FOTO: 23 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 23 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Descapote para cañuelas	DESCRIPCIÓN: Continuación pegado bloque en concreto

FOTO # 25	**FOTO # 26**
	
FECHA DE LA FOTO: 23 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 23 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Dovelas y grafiles en muro de bloque en concreto	DESCRIPCIÓN: Encofrado de columnas y vigas aéreas

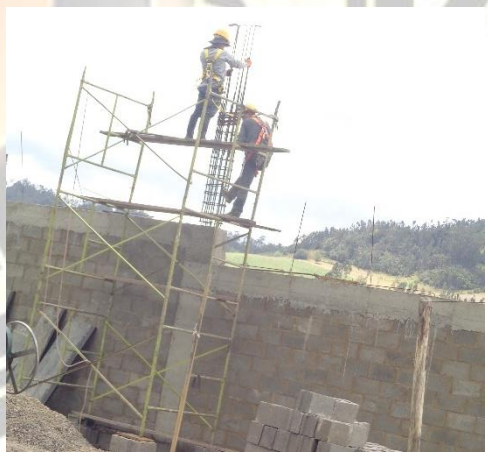
FOTO # 27	**FOTO # 28**
	
FECHA DE LA FOTO: 24 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 24 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Descargue de bloque en concreto	DESCRIPCIÓN: Armado acero de columnas

FOTO # 29	**FOTO # 30**
	
FECHA DE LA FOTO: 24 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 24 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Encofrado de columnas	DESCRIPCIÓN: Descapote para cañuelas

FOTO # 31	**FOTO # 32**
	
FECHA DE LA FOTO: 25 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 25 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Vaciado de concreto en columnas	DESCRIPCIÓN: Excavación de cañuelas

FOTO # 33	**FOTO # 34**
	
FECHA DE LA FOTO: 25 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 25 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación para última zapata	DESCRIPCIÓN: Preparación de concreto

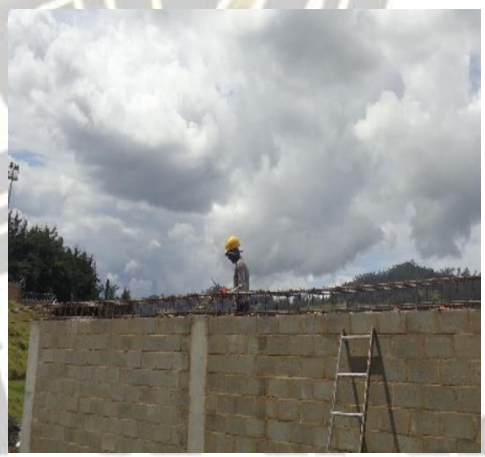
FOTO # 35	**FOTO # 36**
	
FECHA DE LA FOTO: 26 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 26 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación para cañuelas	DESCRIPCIÓN: Acero de viga intermedia

FOTO # 37	FOTO # 38
	
FECHA DE LA FOTO: 26 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 26 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Acero zapata y vaciado concreto, acero de columnas, acero de vigas de cimentación, encofrado y vaciado de concreto	DESCRIPCIÓN: Pozo de inspección en mampostería

FOTO # 39	FOTO # 40
	
FECHA DE LA FOTO: 27 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 27 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Encofrado de viga de cimentación y armado acero de columna	DESCRIPCIÓN: Armado acero de columna y vaciado viga de cimentación

FOTO # 41	**FOTO # 42**
	
FECHA DE LA FOTO: 27 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 27 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Construcción pozo de inspección	DESCRIPCIÓN: Revoque interno de pozo de inspección

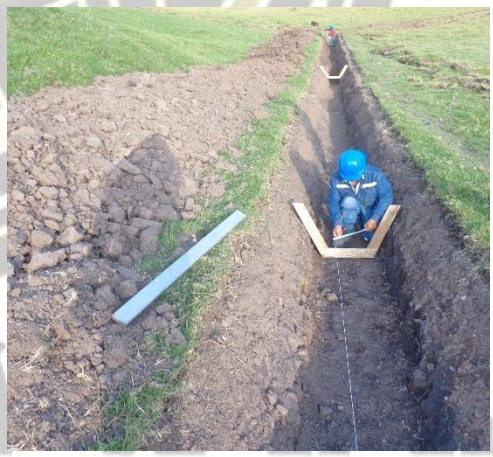
FOTO # 43	**FOTO # 44**
	
FECHA DE LA FOTO: 27 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 27 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción guas lluvias
DESCRIPCIÓN: Construcción muro perimetral con bloque de concreto	DESCRIPCIÓN: Excavación cañuelas de acuerdo a diseños suministrados por profesionales de la USPEC

FOTO # 45	**FOTO # 46**
	
FECHA DE LA FOTO: 30 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 30 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Desencofrado viga de cimentación y columna	DESCRIPCIÓN: Construcción muro en bloque de concreto

FOTO # 47	**FOTO # 48**
	
FECHA DE LA FOTO: 30 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 30 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Instalación de geotextil y afirmado en cañuelas	DESCRIPCIÓN: Instalación de malla en cañuelas

FOTO # 49	**FOTO # 50**
	
FECHA DE LA FOTO: 30 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 30 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Concreto en cañuelas	DESCRIPCIÓN: Concreto cañuelas

FOTO # 51	**FOTO # 52**
	
FECHA DE LA FOTO: 31 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 31 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas luvias
DESCRIPCIÓN: Excavación para cañuelas	DESCRIPCIÓN: Malla para cañuelas

FOTO # 53	**FOTO # 54**
	
FECHA DE LA FOTO: 31 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 31 octubre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Excavación para posterior instalación de tubería de 18”	DESCRIPCIÓN: Construcción de muro en bloque de concreto

FOTO # 55	**FOTO # 56**
	
FECHA DE LA FOTO: 31 octubre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 31 octubre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Dovelas en muro	DESCRIPCIÓN: Grouting para dovelas

FOTO # 57	FOTO # 58
	
FECHA DE LA FOTO: 01 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 01 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Geotextil y afirmado para cañuelas	DESCRIPCIÓN: Concreto para cañuelas

FOTO # 59	FOTO # 60
	
FECHA DE LA FOTO: 01 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 01 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Acero para viga intermedia	DESCRIPCIÓN: Construcción de muro en bloque de concreto

FOTO # 61	**FOTO # 62**
	
FECHA DE LA FOTO: 02 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 02 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Desencofrado de viga intermedia	DESCRIPCIÓN: Afirmado de cañuelas

FOTO # 63	**FOTO # 64**
	
FECHA DE LA FOTO: 02 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 02 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Concreto de cañuelas	DESCRIPCIÓN: Acero y encofrado de vigas intermedias

FOTO # 65	FOTO # 66
	
FECHA DE LA FOTO: 03 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 03 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Excavación de cañuelas	DESCRIPCIÓN: Excavación de cañuelas

FOTO # 67	FOTO # 68
	
FECHA DE LA FOTO: 03 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 03 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Preparación de concreto	DESCRIPCIÓN: Concreto para vigas intermedias

FOTO # 69	FOTO # 70
	
FECHA DE LA FOTO: 04 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 04 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Cañuelas	DESCRIPCIÓN: Concreto para vigas intermedias

FOTO # 71	FOTO # 72
	
FECHA DE LA FOTO: 07 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN: Instalación geotextil para cañuelas	DESCRIPCIÓN: Excavación cañuelas

FOTO # 73	FOTO # 74
	
FECHA DE LA FOTO: 07 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 07 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Muro perimetral	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Acero de viga intermedias	DESCRIPCIÓN: Construcción muro en bloque de concreto

FOTO # 75	FOTO # 76
	
FECHA DE LA FOTO: 08 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 08 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Muro perimetral
DESCRIPCIÓN: Empozamiento de agua en excavación para tanque almacenamiento	DESCRIPCIÓN: Vaciado de concreto en vigas intermedias

FOTO # 75	**FOTO # 76**
	
FECHA DE LA FOTO: 08 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 08 noviembre de 2023
UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias	UBICACIÓN: Conducción aguas lluvias
DESCRIPCIÓN:	DESCRIPCIÓN:

FOTO # 75	**FOTO # 76**
	
FECHA DE LA FOTO: 09 noviembre de 2023	FECHA DE LA FOTO: 09 noviembre de 2023
UBICACIÓN:	UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN:	DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de octubre del 2023 y el 13 de noviembre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

SABADO 14 DE OCTUBRE DEL 2023

Se avanzan con trabajos de construcción de muro perimetral en bloque en concreto, se continúa con amarre de acero, encofrado y fundición de viga intermedia. Se avanza con trabajos de construcción de pozos de inspección y llenado manual de las excavaciones laterales de dichos pozos.

MARTES 17 DE OCTUBRE DEL 2023

Amarre de acero, encofrado y fundición de viga intermedia. Se continúa con la construcción de pozos de inspección e instalación de tubería de 18". Además, se continúa con el llenado de la excavación.

MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DEL 2023

Continuación de trabajos de amarre de acero, encofrado y fundición de viga aérea, amarre de acero de columnas de segundo nivel.

Se avanza con la construcción de pozo de inspección.

NOTA: Por motivo de lluvias, se está derrumbando el talud superior de la excavación del tanque.

JUEVES 19 DE OCTUBRE DEL 2023

Se realizan excavaciones para fundición de pozos, encofrado y fundición de columnas. Se continua con la construcción del muro en bloque de concreto.

Se realiza recorrido con residente de interventoría para revisión de cantidades de acuerdo a las memorias de cálculo.

VIERNES 20 DE OCTUBRE DEL 2023

Se realiza reconocimiento a la obra de alcantarillado en compañía del director del establecimiento, contratista, interventoría y por parte de la USPEC el Ing. Carlos Céspedes, donde se observan los adelantos en cuanto a la reparación de muros y pozos de inspección.

El tanque de almacenamiento esta a la espera del diseño por parte de la USPEC para definir su dimensión y así proceder a su construcción de manera urgente, ya que de acuerdo a su estado puede presentar afectación al poste de alumbrado perimetral por deslizamiento del talud.

SABADO 21 DE OCTUBRE DEL 2023

Se realiza amarre de acero, encofrado y fundición de vigas intermedias. Instalación de bloque en concreto en segundo nivel de muro perimetral.

Construcción de tapa de pozo de inspección.

LUNES 23 DE OCTUBRE DEL 2023

Se realiza amarre de acero, encofrado y fundición de columnas de segundo nivel.

Se inician trabajos de descapote y excavación manual para cañuelas de recolección de aguas lluvias.

MARTES 24 DE OCTUBRE DEL 2023

Amarre de acero, encofrado y fundición de columnas de segundo nivel, instalación de bloque de concreto de segundo nivel.

Se continúa con excavación manual para fabricación de cañuelas, llegada y descargue de bloque para terminación del muro de cerramiento.

Demolición de parte faltante del muro anterior.

MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DEL 2023

Fundición de columnas de segundo nivel, fundición de concreto ciclópeo de zapata esquinera, fundición de dovela de segundo tramo, amarre de 5 m de viga de coronación.

Perfilado de zapata y viga de cimentación. Descapote y excavación para cañuelas.

JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2023

Construcción de tercer pozo de inspección en mampostería, perfilación de cañuelas, encofrado para vigas aéreas y construcción de muro en bloque de concreto.

VIERNES 27 DE OCTUBRE DEL 2023

Fundición de viga de cimentación, continuación de construcción de muros en bloque de concreto, vigas aéreas, perfilación de cañuelas y construcción de pozo de inspección en mampostería.

SABADO 28 DE OCTUBRE DEL 2023

Desencofrado de viga, fundición de viga esquinera, continuación con la construcción de muro en bloque de concreto.

Se termina la construcción de pozo de inspección en mampostería y se continúa con la perfilación de cañuelas.

LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2023

Encofrado de columna de segundo nivel.

Terminación de pantalla en muro de bloque en concreto. Inicio con concreto de cañuelas.

MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2023

Perfilación de cañuelas y continuación de concreto de las mismas.

Inicio en construcción de muro en bloque de concreto en la primera parte de la esquina del muro, se realiza fundición de 2 columnas de la parte superior.

MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Amarre de acero de segundo nivel de dos pantallas, se continúa con la fundición de cañuelas y la terminación del muro en bloque de concreto de la pantalla esquinera.

JUEVES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Terminación de amarre de acero de viga esquinera, continuidad con la construcción de la segunda pantalla en bloque de concreto, encofrado de viga y continuación de fundición de cañuelas.

VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Amarre de columnas de segundo nivel, encofrado de las mismas y terminación de colocación de bloques en concreto de segundo nivel.

Se continúa con la perfilación y fundición de cañuelas.

SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Se realiza desencofrado de columnas y vigas, perfilación de cañuelas y traslado de material al área de trabajo.

MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Construcción de 2 pantallas en bloque de concreto del lado izquierdo y 2 al lado derecho, amarre de vigas para segunda pantalla, perfilación de cañuelas y fundición manual de las mismas.

MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Terminación de acabado de columna, fundición de viga intermedia, fundición de columna intermedia esquinera, amarrado de columna, perfilación y fundición de cañuelas.

JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Amarre de acero para 2 vigas, encofrado, fundición de las dos vigas aéreas.

Perfilación y preparación de molde para fundir cañuela.

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Se realiza visita con el acompañamiento del señor procurador para cierre de acción constitucional de tutela 2022-0050.

Se realiza recorrido de obra y medición en conjunto con residente de obra, se evidencia actividades realizadas: Excavación manual, perfilación del terreno para fundición de cañuelas.

Al día de hoy se cuenta con 82,7 ml de cañuelas fundidas, se continúa con construcción de muro de cerramiento, encofrado de columnas, amarre de acero para vigas y columnas.

SABADO 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Con respecto a la anotación realizada en bitácora por el Ing. Céspedes de la USPEC, la interventoría manifiesta que, sobre la visita programada con el procurador, no se tenía conocimiento de hora y fecha de la visita. Además, se resalta que como interventoría se ha realizado la inspección y acompañamiento frecuente a las actividades ejecutadas.

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

ORDENES DE SERVICIO ORIGINALES

ORDEN DE SERVICIO ORIGINAL G1-039 Muro cerramiento

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

MARVALL

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

En la etapa constructiva del proyecto se utilizan las siguientes herramientas y equipos.

ITEM	NOMBRE	TIPO
1	DESTORNILLADORES	HERRAMIENTA
2	SINCEL	HERRAMIENTA
3	MARTILLO	HERRAMIENTA
4	PULIDORA	HERRAMIENTA
5	TALADRO	HERRAMIENTA
6	PALAS	HERRAMIENTA
7	BUGGY	HERRAMIENTA
8	BARRA	HERRAMIENTA
9	RETROECAVADORA	MAQUINARIA
10	VOLQUETA	MAQUINARIA

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

HORARIOS DE TRABAJO

HORAS LABORADAS MES DE OCTUBRE							
SEMANA 1							
DIAS	9	10	11	12	13	14	15
HORAS	0	0	0	0	0	4	0
TOTAL HORAS SEMANA						4	

HORAS LABORADAS MES DE OCTUBRE							
SEMANA 2							
DIAS	16	17	18	19	20	21	22
HORAS	0	8	8	8	8	4	0
TOTAL HORAS SEMANA						36	

HORAS LABORADAS MES DE OCTUBRE							
SEMANA 3							
DIAS	23	24	25	26	27	28	29
HORAS	8	8	8	8	8	4	0
TOTAL HORAS SEMANA						44	

HORAS LABORADAS MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE							
SEMANA 4							
DIAS	30	31	1	2	3	4	5
HORAS	8	4	8	8	8	4	0
TOTAL HORAS SEMANA						40	

HORAS LABORADAS MES NOVIEMBRE							
SEMANA 5							
DIAS	6	7	8	9	10	11	12
HORAS	8	8	8	8	8	4	0
TOTAL HORAS SEMANA						44	

TOTAL HORAS DEL MES
168

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

ANEXO No 1 COPIA DE LA BITÁCORA DE OBRA

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

Lugar : CHIQUINQUIRA

Fecha : 13 - 10 - 2023

Actividades : Se AVANZA con trabajos de mamposteria. Se fabrican 2 pantallas, se continua con el amarre de acero, encofre y fundacion de viga aerea. Por otra parte se avanza con la fabricacion de muñon.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ

Residente de obra.

Lugar : Chiquinquira.

Fecha : 14 - 10 - 2023

Actividades : Se avanza con trabajos de mamposteria. de muro perimetral, Se continua con amarre de acero, encofrado y fundacion de viga intermedia, se avanza con trabajos de construccion de muñon y llenado de excavacion. la cual se hace de manera manual.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO

Residente de obra.

Marden

Lugar : chiquinquira
Fecha : 17-10-2023.
Actividades: Amarre de acero, encofrado y fundacion de viga intumedra, continuamos con la construccion de manjoll e instaluvon de tubaria de 18"
y se continua con el llenado de la excavacion.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO
Residente de obra.

Lugar : chiquinquira.
Fecha: 18-10-2023.
Actividades: Continuamos con trabajos de amarre de acero encofrado y fundacion de viga aerea,
amarre de acero de columnas de segundo nivel.
se avanza con la construccion de manjoll.
NOTA: por motivo de lluvias, se está derumbando el talud superior de la excavacion del tanque.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO
RESIDENTE DE OBRA.

Lugar : Chiquinquira.
Fecha: 19-10-2023
ACTIVIDADES: Se Realizan Excavaciones para Fundición de pozos, Encofrado y fundición de Columnas, se enderezo Construcción de muro, se realizó Recorrido en conjunto para Revisión de Cantidades de menores. Mayuy Rivera
INTERVENTORÍA

20-10-2023.
Actividad se realiza reconocimiento. de la obra. de alcantarillado en compañía del director del establecimiento contratista 314 junto con la interventoria y por parte de la uspec el ing. Carlos Cespedes donde. se observa los (adelantos) adelantos. encontrados Reparacion muro pozos. el tanque de almacenamiento. se esta a la espera del diseño por parte de la uspec para definir su dimencion y asi proceder a su construccion. de manera urgente de acuerdo a su estado. puede

Presentar afectación al poste de alumbrado perimetral por deslizamiento del talud.

Ing. Paola Cobos
USPEC

20/10/23 Se Realiza Recorrido en Compañía del director del establecimiento, Representante apoyo supervisión de la USPEC, Contratista e interventoría. Se solicitan nuevamente a supervisión la entrega de diseños del tanque de Almacenamiento. Se evidencian actividades de Relleno en tubería de Alcantarillado, se Continúa con Construcción del muro perimetral. Maryury Rivera
INTERVENTORÍA

Lugar: Chiquinquira.
Fecha: 21-10-2023.
Actividades: armare de acero, encofrado y fundacion de viga intermedia, instalacion de mamposteria. en muro perimetral segundo nivel.
construccion de loza de corona de pozos de inspeccion.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO.
Residente de Obra.

Lugar: Chiquinquira.
Fecha: 23-10-2023.
Actividades: armare de acero, encofrado y fundacion de columnas segundo nivel.
Se inician trabajos de descapote y excavacion manual para canuelas de recoleccion de aguas lluvias.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO
RESIDENTE DE OBRA.

Powered by CamScanner

Lugar : Chiquinquira.
Fecha : 24-10-2023.
Actividades : amarre de acero, encofrado y fundacion de columnas segundo nivel; instalacion de mamposteria, pantallas segundo nivel.
se continue con excavacion manual. para fabricacion de cañetas, llega el exedente de blogue para terminar el muro, se demole esquinero delante. del muro anterior.

ING LUIS CARLOS ALVAREZ PINTO
Residente de obra

Lugar: Chiquinquira
fecha: 26-10-2023
Actividades: fundicion de columnas segundo tramo, fundicion ciclopeo zapata esquinera, fundacion dovela segundo tramo, amarre 5 metros de viga corona, perfilada zapata y viga de cimentacion escapote y escabacion de cunetas.

ING. Luis Carlos Alvarez.
Residente de obra.

Lugar: Chiquinquira.
fecha: 26-10/2023.
Actividades: mamposteria de 3 mano/ol. perfilada de las cunetas, encofrado para viga aerea, mamposteria en pantallas.

ING Luis Carlos Alvaret.
Residente de obra

Lugar: Chiquinquira
fecha: 27/10/2023
Actividad: fundacion viga de simentación de la segunda viga aerea. mamposteria primera pantalla a mano izquierda. perfilacion de cunetas, mamposteria 3 mano/.

Powered by CamScanner

ING Luis Carlos Alvaret Pinto.
Residente de obra

Lugar: Chiquinquira
fecha: 28-10-2023
Actividad: desencofrado de la viga, fundación viga esquinera, contruida con el muro, mampostria en pantallas, Terminación de mampostria 3 mantol, pelfilada de conetas.

ING Luis carlos Alvarez.
Residente de obra

Lugar: Chiquinquira
fecha: 30-10-2023
Actividad: Encofrado de columna # 2. Terminación de pantalla mampostria de pare, inicio mampostria de conetas.

ING. Luis Carlos Alvaret Pinto
Residente de obra.

Lugar: Chiquinquira
fecha: 31-10-2023
Actividades: Perfilación de conetas continuida de mamposteria de las conetas. Inicio mamposteria en primera pare esquinera, fundación de 2 columnas parte de arriba

ING Luis Carlos Alvares Pinto
Residente de obra

Lugar: Chiquinquira
fecha: 01-11-2023
Actividades: Amarre de acero segundo nivel de dos pantallas, continuida de mamposteria de conetas, terminacio de mampostria de pantalla esquinera.

Powered by CamScanner

ING Luis Carlos Alvarez
Residente de obra.

Lugar: Chiquinquira
fecha: 02-11-2023
Actividad: Terminación amarre de acero viga esquinera. Continuida de mamposteria en la Segunda Pantalla, encofrado de viga, continuidad, de fundacion de conetas:

ING Luis Carlos Alvarez.
Residente de obra.

Lugar: Chiquinquira
fecha: 03-11-2023
Actuvida: amarre de columnas. Segundo nivel, encofrado de las mismas. Terminacion mamposteria pantalla Segundo nivel, continuida con la canaleta, perfilada y fundicion.

ING Luis Carlos Alvarez Pinto
Residente de obra.

03/NOV/23
PERSONAL OBRA: 7 trabajadores, 1 Inspector SST.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se Realiza Amarre de acero para Columnas, encofrado de Columnas y Fundicion de vigas y Columnas segundo nivel, se evidencia segundo Nivel de mamposteria muro de cerramiento, Excavacion manual para Canaletas, Fundicion de Canaletas, se evidencio Fundicion de tapas de manjol.

Manuel Rivera
INTERVENTORIA

Lugar: Chiquinquira.
04/Nov/2023
Actividad: Desencofrar Columna y viga Subir material al area de trabajo. perfilacion de conetas.

Powered by CamScanner

ING Luis Carlos Alvarez
Residente de obra.

Lugar: Chiquinquira
fecha: 07/11/2023
Actividad: mamposteria 2 pantalla lado izquierdo mamposteria 2 pantalla lado derecho, amarre de viga para Segunda pantalla, perfilacion de cunetas manual para fundida.

ING Luis carlos Alvarez.
Residente de obra

Lugar: Chiquinquira
fecha: 08/11/2023
Actividad: Terminacion acabado de columna, fundicion de viga intermedia, fundicion de columna intermedia esquinera, amarrado de columna, perfilada de cuneta, fundicion de esta misma.

ING Luis Carlos Alvarez Pinto
Residente de obra.

Lugar: Chiquinquira
fecha: 09/11/2023
Actividad. Amarre de Acero para 2 vigas, encofrado, fundicion de las dos vigas aereas, perfilada, preparacion de molde para fundir canaleta. Adelanto del tramo del mismo.

ING Luis Carlos Alvarez
Residente de obra

Lugar: Chiquimula
Fecha: 10-11-2023

Se realiza visita con el acompañamiento del señor Procurador para cierre acción Constitucional de tutela 2022-0050. Para el cierre de la misma Procura visita a las obras de construcción de muro y al Cantarrillado de aguas lluvias Se pone en evidencia la falta del personal de interventoría a Sabiendas de la inspección Judicial Con la orista del Sr Procurador Doctor Pablo Alberto Villaseñor Galvez quien Solicito. Su acompañamiento y Presencia.

Hace Presencia a las 12:30

En la visita se define la disposición final del agua Pluvial tanto del tanque de almacenamiento el cual será dispuesto en el canal de aguas lluvias municipal
Se hace la observación que el cargamento debe de quedar confinado de acuerdo a las pendientes que Posee
El señor Sub director manifiesta el inconformismo de los aguas y se le explica que es por falta de recurso.

10/11/2023 Se Realiza Recorrido en obra y medición en conjunto con Residente de Obra, se evidencia actividades Realizadas; Excavación manual y Perfilada de terreno para fundición de Cuneta 82.7 ml de Cunetas fundidas, Mamposteria en muro de cerramiento, encofrado de Columnas, amarre de acero para vigas y Columnas.

Maryury Rivera
INTERVENTORIA

Libro Medio Oficio 80 H.
Libro Medio Oficio 80 H.
Powered by CamScanner

N/23 Con Respecto a la anotación hecha anteriormente por el Ing. Céspedes de la UOPEC, esta interventoría manifiesta que sobre esta visita programada con el procurador, no nos fue manifestada mediante oficio, correo electrónico u otro medio, por tanto no se tenía conocimiento de hora y fecha de la visita, Cabe Resaltar que como interventoría se ha venido Realizando la inspección y acompañamiento Regando a las actividades ejecutadas.

Mayra Rivera.
INTERVENTORÍA

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 5 EPMSC – GIRARDOT


CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Girardot, se localiza en el municipio de Girardot el departamento de Cundinamarca en la Cl. 38 #3-28, Barrio Diamante.

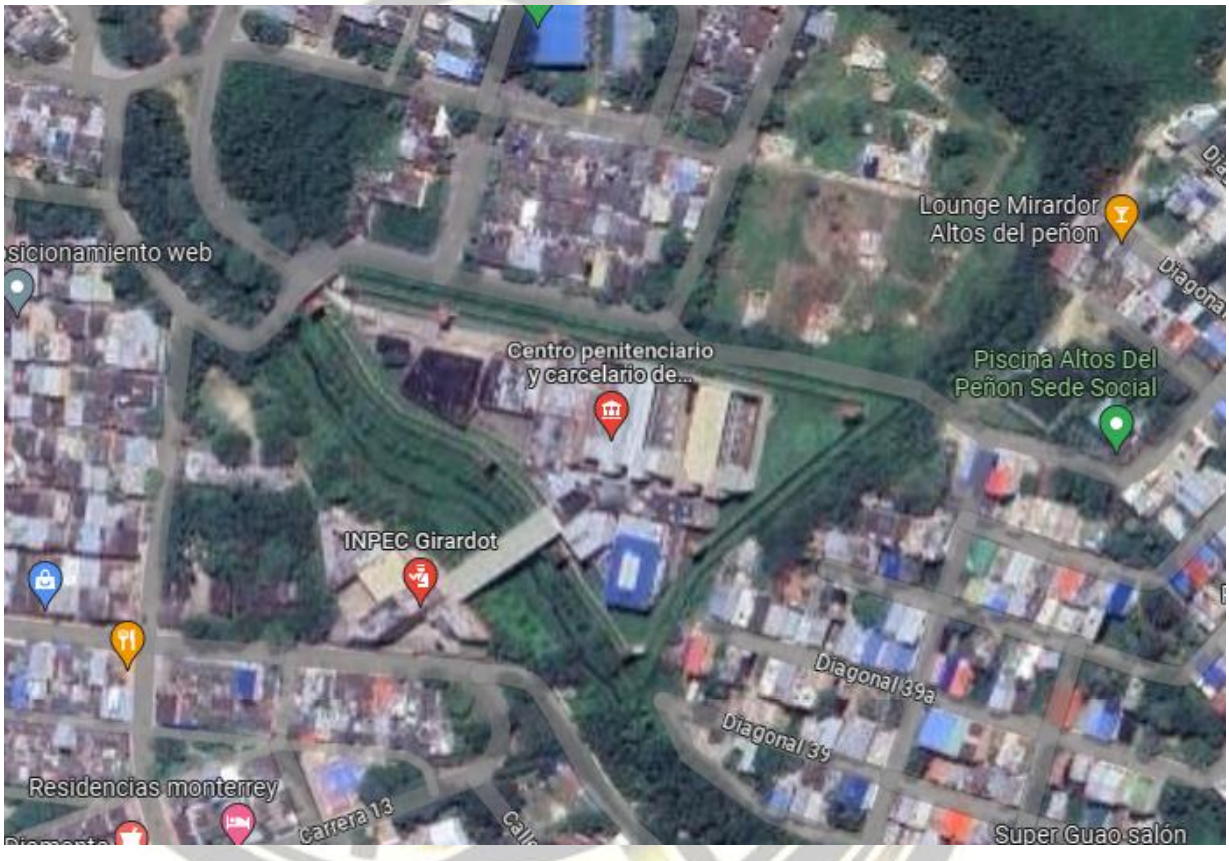

Localización geográfica EPMSC Girardot (Cundinamarca). Fuente Google maps

MARVALL

REGISTRO FOTOGRÁFICO EPMSC – GIRARDOT

No se cuenta con registro fotográfico debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día jueves 03 de agosto.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo comprendido entre el 14 de octubre del 2023 y el 13 de noviembre del 2023 se realizan las actividades descritas a continuación:

MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DEL 2023

Mediante correo electrónico se recibe aprobación de ordenes de servicio de EPMSC Girardot:

- ODS G1-013 GIRARDOT – Instalación tableros y transferencias
- ODS G1-014 GIRARDOT – Elementos eléctricos

SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Se remite oficio OFI 098 solicitando la suspensión de las ordenes de servicio aprobadas de EPMSC GIRARDOT, ya que, debido a los inconvenientes y demoras presentadas a lo largo del presente contrato, nos vemos en la necesidad de restructurar y ajustar nuestro tiempo y personal de obra mediante la generación de una nueva programación.

MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Se recibe correo por parte de interventoría, donde queda a la espera de definición alcance del comunicado enviado donde sea más detallada la razón de suspensión de las ordenes de servicio aprobadas a la fecha.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O PLAN DE CONTINGENCIA.

Durante esta etapa de ejecución no se implementan medidas correctivas ni plan de contingencia.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

No se cuenta con relación de herramientas y equipos debido a que las Ordenes de Servicio no han sido aprobadas y, por ende, no se ha realizado el ingreso de Marvall a las instalaciones del centro penitenciario posterior a la visita diagnóstico realizada el día jueves 03 de agosto.

MARVALL

HORARIOS DE TRABAJO

No se cuenta con personal en obra por lo tanto no se relacionan horarios de trabajos. Los trabajos administrativos llevado a cabo para este frente fueron ejecutados en horario de Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

MARVALL

MARVALL S.A.S
Una empresa de FELMIG Group
900.907.274-1

INFORME MENSUAL DE OBRA No 5 EPMSC – RM VILLAVICENCIO


CONTRATO DE OBRA No. CTO-303-2022

“ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL-ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1”.

Carrera 11 # 48-126 Barrio Maraya
57 (6) 341 37 38 – 317 893 98 11
Pereira – Risaralda - Colombia

UBICACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO

El establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio, se localiza en la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta en Cra. 6 No. 3 – 160.

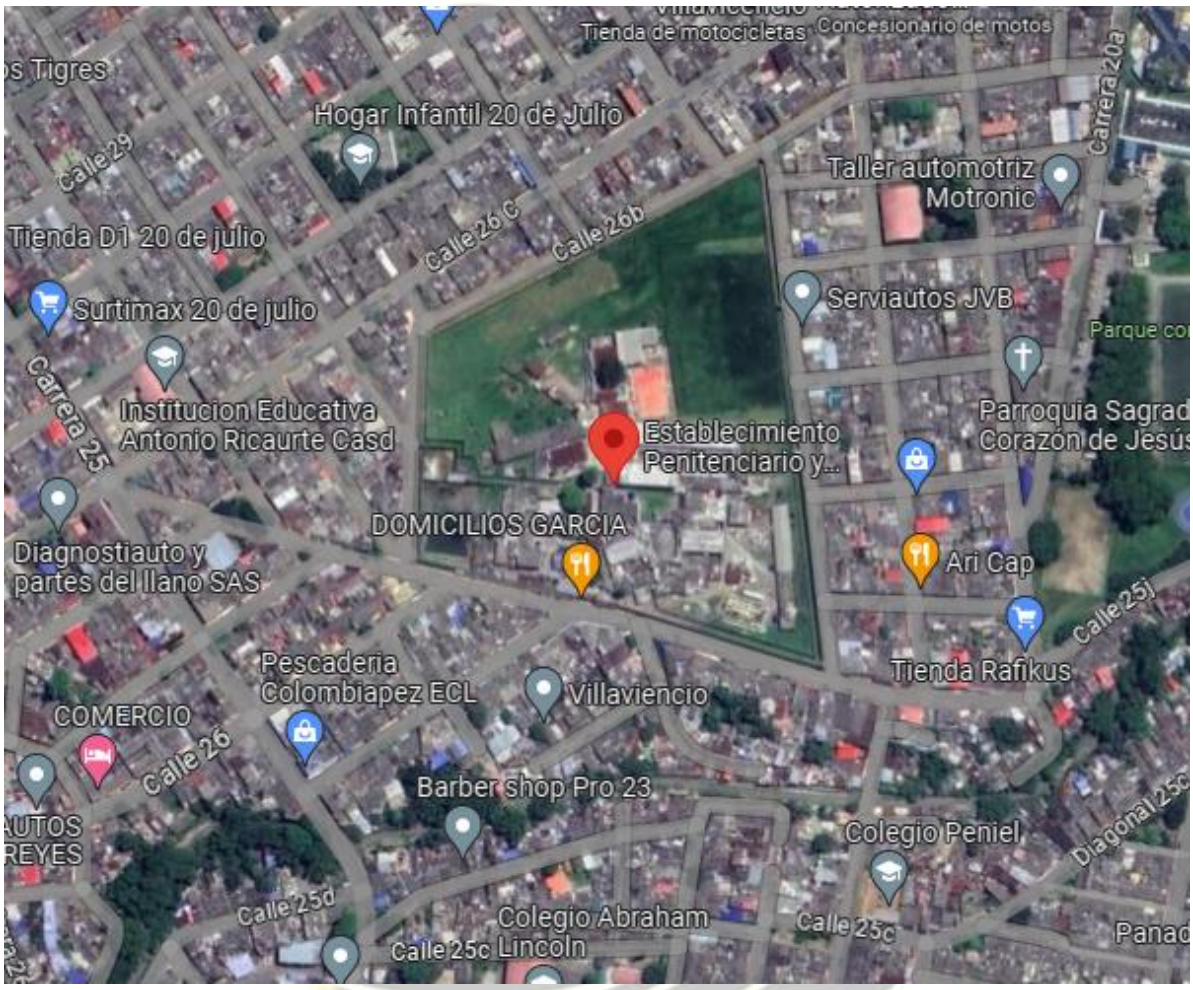

Localización geográfica EPMSC – RM Villavicencio (Meta). Fuente Google maps.
