Acta Consecutivo No.	062	**Lugar y Fecha**	SANTIAGO DE CALI, 6 DE DICIEMBRE DE 2024
Asunto	ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 040		
Oficina Productora	INTERVENTORÍA		
Hora Inicio	10:00 AM	**Hora Finalización**	10:30 AM
Ausentes			

Orden del día:

1. Presentación personal de los asistentes.
2. Desglose de los temas de comité.
3. Compromisos.

Desarrollo:

1. Presentación personal de los asistentes:
My. Víctor Julio Caita, Jefe de Área de Revisión y Supervisión - DIFRA.
Teniente. Yeimy Marcela Ríos Rodríguez, Área de Revisión y Supervisión - DIFRA.
Arq. Jairo Villamizar, Director de Obra LAM Construcciones.
Arq. Felipe Ríos, Residente de Obra LAM Construcciones.
Ing. Andrés Martínez, Coordinador Administrativo LAM Construcciones.
Ing. Luis Aguirre, Auxiliar de Ingeniería LAM Construcciones.
Arq. César Rúales, Arq. Asesor LAM Construcciones.
Arq. Eduardo Acero Cajigas, Director de Interventoría Mario de Jesús Gil.
Ing. Juan Guillermo Gil, Gerente de Interventoría Mario de Jesús Gil.
Ing. Alejandro Collazos, Residente 1 Interventoría Mario de Jesús Gil.
Arq. Sebastián Betancourth Castaño Residente 2 Interventoría Mario de Jesús Gil.

2. Desglose de los temas del comité.

2.1 Supervisión del Contrato Alojamientos Cadetes EMAVI, Te. Yeimy Ríos, realiza la exposición de los indicadores de avance financiero del proyecto, tanto del porcentaje programado con valor de 81,71% (equivalente a $5.741'559.130); como el porcentaje ejecutado, cuyo valor es de 50,08% (equivalente a $3.519'147.116).
Lo anterior, significa un atraso de obra del -31,63%. Además, se da una descripción de las actividades ejecutadas durante la semana, para el edificio 2: pañetes, estuco y pintura para muros internos y externos, enchapes para muros y pisos en baños, instalación de estructura y láminas de cielo raso en pvc, reparación y ajuste de cómodas metálicas, instalación de estructura metálica para cubierta en policarbonato, instalación de luminarias internas, instalación de anclajes en acero inoxidable; y para el edificio 1: mampostería de muros internos en piso 2, fundición de columnetas y dinteles con concreto producido en obra, instalación de refuerzo para dinteles en vanos de ventanas, pañetes en muros internos y armado de formaleta para escalera de emergencia.

2.2 Supervisión posteriormente, expone lo referente al anticipo. El valor del anticipo es de $2.251'685.951 de los cuales, de acuerdo con el Plan de Manejo de Anticipo se ha hecho todos los desembolsos por valor de $2.251'685.951,00 (100%) así: el primero, que fue destinados a compra de materiales por valor de $360.269.752,00, alquiler de equipos con un valor de $315.236.033,14 y pagos de mano de obra por valor de $112.584.297,55; el segundo desembolso para compra de materiales con valor de $312.453.842,76, el tercero para pagos de salarios de mano de obra con un valor de $112'584.297,55; el anticipo No. 4 destinado a compra de materiales con un valor de $108'912.555,0; el quinto para pago de mano de obra cuyo valor es de $202'651.735,59, el sexto para pago de mano de obra con un valor de $112'584.297,55; el séptimo, fue correspondiente al rubro de Mano de Obra por un valor de $211'932.811,01; el octavo, por valor de $159'595.371,00 correspondiente también al rubro de mano de obra y el noveno, que fue destinado al rubro

de compra de materiales por un valor de $119'038.231,14; finalmente, el Décimo desembolso fue hecho por un valor correspondiente a $123'842.727,21 para el rubro de Subcontratos de ejecución de obra.

2.3 Supervisión (Teniente Yeimy Ríos) también expone los valores del balance de obra que se encuentra en fase de conciliación entre las partes. Hasta la fecha del presente informe, se tienen conciliados los capítulos del 1 al 28 del presupuesto, así como también los NPs que se incluirán en el Modificatorio No. 4. Se aclara además que, faltando conciliar unos 10 ítems, se tiene hasta el momento un valor conciliado de $6.487'655.987,85 lo que significa un saldo a favor de la Entidad por valor de $539'157.066,13.

2.4 Supervisión (Teniente Yeimy Ríos) añade que: Otras consideraciones para el comité, quiero aclarar que el 5 de diciembre se recibió por parte del contratista el envío y el comprobante de la transferencia de los rendimientos financieros al Tesoro Nacional y asimismo informa que se solicitó la liquidación de la fiducia. Entonces, de acuerdo con lo indicado, este trámite tiene una demora de más o menos 45 días hábiles aproximadamente. El segundo punto que quiero tocar en el comité es que el lunes 2 de diciembre se realizó con el personal contratista de interventoría y con el arquitecto diseñador una reunión por Teams con el fin de revisar la novedad presentada con las divisiones de acero inoxidable de las baterías sanitarias. Se pensó en colocar una cinta alrededor de las uniones de las divisiones y puertas, sin embargo, no fue viable. Esta semana se solicitaron unos vídeos y fotos internos de la cabina para la verificación del espacio por parte del arquitecto diseñador y pues, sin embargo, una vez visto el detalle por el arquitecto pues manifiesta que estas juntas primeramente pueden ser un poco pues como un foco de infección y en este espacio pues por la limpieza está junta con el tiempo puede causar como el agua se filtra al interior también pues que puede provocar el deterioro y tercero pues estéticamente así la línea se encuentra de la misma altura pues no se ve bien en la ecuación del espacio entonces por eso quiero traerlo este tema comité tercero los pagos de obra interventoría del corte número 10 se encuentran en trámite de firmas de la ordenación del gasto atentos a la fecha límite pues para erradicar el paquete de cuentas por pagar el cuarto punto es que recordará el personal de obra interventoría que la otra semana sin falta pues debemos radicar los documentos del modificador y pues también asimismo constituir la respectiva reserva y pues esto no se le puede o sea no nos podemos atrasar con los tiempos de realizar este trámite y lo quinto punto es que hoy por un motivo de ceremonia de ascenso a subtenientes solamente se puede trabajar hasta las 14 horas pues por la orden del comandante de la unidad eso es lo que tengo por parte de la supervisión.
- DIFRA (My. Julio Caita) listo con respecto al modificatorio para qué fecha está pendiente o está listo el paquete completo de radicación.
- Supervisión (Teniente Yeimy Ríos) mi Mayor para la otra semana ya lo vamos a tener listo para constituir una de la reserva mi mayor a la otra semana ya lo vamos a tener listo.

2.5 DIFRA (My. Julio Caita) yo tengo una duda cuando ustedes vienen y muestran un balance que tenemos como 500 millones a favor pendiente de todavía conciliar quién está a cargo de eso quien de la interventoría está a cargo de ese balance porque tengo una duda ustedes quitan los capítulos que le faltan por conciliar o eso se ha movido entre un 5 y un 10 por ciento lo digo es porque usted debe tener lista la variable porque la idea no es reducir ni nada sino de saber qué se va a hacer con el recurso pero mi duda es que estamos hablando de 500 millones es que finalmente se van a dejar de ejecutar o sea no hay una vez se concilia es porque hay mayores y menores pero van a llegar a afectar a ese nivel.
- Contratista (Ing. Andrés Martínez) que pena Mayor, como me le va Mayor, mire el tema es que con el ejercicio que se hace con el balance es que pues entrega la cifra es la cifra que está votando en ese momento el balance en el momento sin haber digamos conciliado o haber llegado de acuerdo a las cantidades con de las actividades que entonces que entonces el tema es que ya cuando no se entreguen o se concilian ahí si se entregan las digamos la verdadera cantidad o el verdadero valor realmente cuál es la situación con los 500 millones ahorita según la diferencia hay 300 de 500 millones con lo que la interventoría está

mencionando nosotros tenemos otra cifra menor pero por qué porque en nuestra cifra en nuestro balance ya estamos incorporando los a las actividades no previstas que se van a incorporar con este modificatorio que viene adicionalmente otras actividades que en su momento cuando se hizo la adición se bajaron a cero por la entidad para para pues para poder balancear el contrato y que en este momento ya pueden que son contractuales y que se pueden volver a reactivar lo que es la fibra óptica y otras actividades que inicialmente se habían bajado a cero entonces nosotros estamos proponiendo en nuestro balance reactivar estas actividades algunas para poder pues poder ejecutar las actividades que inicialmente estaban contractuales y poder completar por lo menos el componente de fibra óptica con esto con estos datos la idea de nosotros cerrarlo con la interventoría y pues ya definir obviamente también con la venida de la entidad con respecto a estas nuevas digamos revivir estas cantidades que inicialmente estaban en cero la idea es hacer eso en esta semana y ya la otra semana tener ya el valor del mismo.

- DIFRA (My. Julio Caita) listo le agradezco la proactividad que tienen tan increíble pero ya dime antes de que la levanten usted tiene que ir y presentar oficialmente el balance a favor y llevarle como alternativa lo que aquí está proponiendo el ingeniero si eso no lo vayan a hacer hasta que la ordenación diga que sí porque si la ordenación no libera está para que no pierdan el tiempo porque es que yo sí es y hoy estamos haciendo la constitución de reserva y todos me están hablando de 20 de favor de 60 por mucho escuchado 75 pero ustedes en 500 y pico yo digo esperes que están quitando el capítulo completo no ya tienen ustedes el plan b que está perfecto un plan b pero o sea entiendo hoy la cifra oficial a favor si son 539 cuando ustedes hablan de conciliar esa vaina se va a mover por mucho 500 o 550 si llega a subir o llega a bajar pero va a estar alrededor de ese comportamiento a que es que tenemos para incorporar lo que nos habían quitado será otra variable pero la cifra aterrizada es más o menos esa que están presentando es así
- Contratista (Ing. Andrés Martínez) no señor porque hacen falta el componente de NPs que digamos estaban contractuales en este momento nos hacen falta unos capítulos y unas actividades que están dentro del balance que no hemos terminado de conciliar que la idea es terminar de conciliar hoy a más tardar mañana

- Interventoría (Arq. Eduardo Acero) mayor buenos días buenos días el tema es el siguiente nosotros estamos haciendo inicialmente el ejercicio de lo que tenemos contractual porque yo tengo que partir de ahí para saber cómo usted lo está diciendo y lo está manifestando qué recurso me sobra lo que está diciendo el ingeniero Andrés también es cierto nos hace falta unos ítems y en especial unos no previstos pues que la idea es poderlos conciliar pero pues digamos que necesitamos de las dos voluntades porque si no vamos a salir de esto cierto porque no nos podemos parar por ese entonces si no de ahí para allá.
DIFRA (My. Julio Caita) acláreme algo señor usted una vez revisado el balance contractual ustedes pusieron cero por ejemplo voy a poner un ejemplo a las puertas me quitó las puertas del contrato y es que abajo van a ir las puertas en el np, pero van a ir a un precio adecuado y su respuesta no eso sí su respuesta no entonces ese saldo está a favor y necesitamos unos ítems nuevos.

- Interventoría (Ing. Guillermo Gil) no lo que pasa es que hay unas actividades que sufrieron unos cambios y esas son las más pero no es no es a gran modo ahora lo que dice el ingeniero Andrés es cierto hay unas actividades que inicialmente estaban proyectadas pero después enviaron a cero la idea es poderlas volver a incorporar dentro del balance sí para que digamos el edificio quede completo ahora ahí habría si yo pienso no sé sugiero que cuando nosotros ya tengamos este ejercicio por lo menos las actividades no previstas que son que son nuevas o que tuvieron que hacerse cambio le pongo un ejemplo mayor por ejemplo en la lámpara la lámpara como no se conseguía pues tocó otra lámpara entonces obviamente se mandó esa cantidad a cero la contractual y pues tocó generar un nuevo ítem para esa para la misma lámpara porque la luminaria no estaba si me hago entender mayor entonces la idea es hacer ese ejercicio y como lo dice el contratista el ingeniero Andrés pues obviamente sentarnos y tener la propuesta ustedes para que ustedes la bueno porque la idea es poder cerrar el valor del contrato mayor.

- DIFRA (My. Julio Caita) para poder terminar el ejercicio entonces entiendo en conclusión o ese es mi saldo y a favor del proyecto que tenemos plan a plan b plan c y que tenemos por un plan de por revisar todavía algo listo estamos supremamente claros pero hoy después de haber hecho un barrio oficial faltando unos capítulos por ahora nos da eso que hay un plan a que es obligatorio que la ordenación prima para la ordenación y es darle prioridad al cerramiento el cerramiento es algo que es una urgencia que hay un plan b y es incorporar parte de lo que se haya anulado en el momento de la edición eso es algo que ya define la ordenación del gasto eso depende de varias variables eso depende cuando se hizo todo obra y se retiraron equipos entonces pasamos a hacer un rubro sólo de obra ya no existen los equipos hoy si era para comprar peras ya solamente dejaron papas ya no pueden comprar peras a menos de que la ordenación autorice tendríamos que hacer un cambio al uso del rubro y tendría un procedimiento administrativo eso no se puede llegar a plantear hoy porque no hay plata de equipos es una variable que hay que presentarla pero la decisión la ordenación vuelve y juega no lo dejo aquí claro sobre todo el panorama y cómo funciona esto ya pasa a ser ahora una cadena pues tal es primero de lo que tienen hoy esos 500 entiendo ya y mi todo es por plata todo nos está sobrando por plata el primer plan es obra y hay que presentarlo así cuál es la obra que se va a adicionar o se reduce o se ejecuta la obra el primer el primer plan el siguiente plan es mire una vez hecha toda la obra me sobró todavía plata me autorizan cambiarla por el rubro y eso ya lo llevará usted antes en el ante de fin ante dije es de que también se ve anular y hacer un cambio en el contrato y después volver a repatriar lo que ya se hizo si eso ya usted lo analiza con su asesor jurídico y le dirán si le dirán no se atreva a hacerlo porque van a pensar que entonces queríamos maniobrar muy excesivamente en la edición pero pues ya lo analizan a fondo si la ordenación asume el riesgo y dice que sí pues sí lo harán en su momento si la ordenación dice no yo con eso no voy pues no se puede hacer y buscarán más obra que es lo que hoy tienen para hacer obra hasta ahí estoy claro, hay algo más que sea para tratar aquí por parte de la supervisión.
- Supervisión (Teniente Yeimy Ríos) no tengo mi mayor no sé si el personal de obra e interventoría

2.6 Contratista (Arq. Jairo Villamizar) Mayor, no, de obra fue muy claro ya Mayor, lo único que, como dijo el ingeniero Andrés Martínez pues no me parece prudente en estas en estos comités decir que faltan que sobran 500 millones de pesos habiendo todavía tanta obra por ejecutar y por incorporar cosas dentro del dentro de la ejecución de la obra que son íntegros contractuales, pero ya no seguimos y seguimos entonces en contacto con respecto a este tema.
- DIFRA (My. Julio Caita) listo sino también quiero dejar claro que la teniente también es clara diciendo no mi mayor es que definitivamente cuando hablan de nps es que hay que hacer los nps habla de un ante jardín un jardín habla de ciertos elementos
- Contratista (Arq. Jairo Villamizar) que no mayores que no mayor caita qué pena es que los nps ya están listos falta es conciliarlos y además dentro de digamos de lo que no ha incorporado la interventoría son unos equipos que son de fibra óptica y otros más que son contractuales que en su momento se fueron a ceros por digamos por el contrato, pero es que estamos hablando de cosas contractuales.
- DIFRA (My. Julio Caita) cambiamos el uso del rubro o sea ya usted perdió la tarjeta de crédito que le permitía comprar equipos y tiene sólo la de obra y tiene un riesgo gigante que lo juzguen por volver a pedir otra tarjeta de crédito para que el banco se la pueda que no se la dé.
- Contratista (Arq. Jairo Villamizar) lo importante mayor es que los recuerde que siempre lo que buscan es que las cosas queden funcionales.
- DIFRA (My. Julio Caita) eso le decía es que si ustedes hoy me dicen que es que el equipo no quedó entonces no se debe haber hecho la edición y nos van a clavar eso fue lo primero que le dije porque ya y me está llorando por el cerramiento y mayor que es que si no se hace el cerro yo le dije entonces con los 30 metros no se hubiera podido adicionar.

2.7 Contratista (Arq. Jairo Villamizar) porque no hubiera sido muy sincero usted y vamos a ver muy claro acá es que yo como constructor siempre he estado en contra de que semanalmente se digan por ejemplo

es que eso no está bien hace un mes y medio que sobran 550 millones hace tres semanas para acá que ya no eran doscientos de 550 sino 275 soluciones en la interventoría yo nunca leí un dato después que no eran 275 sino 250 la semana pasada 125 y volvemos a los 500 millones pero como cómo se puede dar una cifra de esas es que aquí no hubo un concurso de que cuánta plata sobra no aquí lo importante digamos que se tenga que conciliar la cosa porque estos comités aparte que quedan grabados quedan unas actas y la presentación queda ahí.
- DIFRA (My. Julio Caita) arquitecto a mí me preocupa y se lo digo usted yo no sé ustedes que están colocando cada vez que pagan en el balance o sea no sé cuál es la cifra que ponen en el balance no sé qué ponen en el informe porque no está mal mostrar plata eso es gestión de la supervisión y de la interventoría una buena medición algo pero es lo que sí está mal la variación tan gigante que ocurre por semana sí porque entonces el control no sé si hay una no sé ojo con lo que han escrito ojo como se muestra la información vuelve y juega hoy debería dar un medio.
- Contratista (Arq. Jairo Villamizar) porque si estoy de acuerdo con el sentido que si no o si no mayores aquí diríamos se haríamos cortes semanales porque tres días aquí conciliando un avance semanal pues la idea de hacer es un corte de un corte semanal porque no estamos haciendo para mi concepto tal
- DIFRA (My. Julio Caita) invito Yeimy para que entre ocho días tengan la cifra ya cerrada o sea ya la cifra oficial porque es que ya tienen que sacar el oficio ya tiene que sacar el oficio entonces hagan esa tarea y aterricen esa vaina porque nos vamos a meter en pleitos y ahora revisa todos los informes.


2.8 Interventoría (Ing. Guillermo Gil) yo complementar todo lo que se está hablando y de pronto no estoy a la verdad pues dentro de la interventoría ya tenemos unas reuniones esa semana y pues digamos que hablamos no se mantenga frente a ese tema puntualmente el balance a la verdad yo no estoy de acuerdo con lo que es el dinero Andrés que no que ahorita nos sentamos y en la otra semana lo tenemos pronto en enero hoy pronto falla en febrero no es que se contrató hoy el contacto de acá al 31 de diciembre una prórroga tramitándose por la verdad para mí eso para más tardar el lunes tenemos que tener ese balance ya cerrado ya y necesitamos la el trabajo más comunal entre la interventoría y el contratista para cerrar ese tema ya la verdad nosotros no podemos seguir dando tumbos con ese tema ese balance pues yo también en la parte estoy de acuerdo con el arquitecto Jairo que no deberíamos estar dando unas cifras y que cada ocho días cambian la verdad eso no nos deja bien parados pero entonces necesitamos que entre el equipo de obra el equipo de contratista que tenemos unos equipos con varios profesionales interdisciplinarios se siente ni eso que él hizo entre hoy y mañana para que el lunes lo podamos estar entregando la entidad porque es que ese plazo se va a vencer y no tenemos el balance mire que no se conectó él y el 8 días llegó y me parece que fue súper receptivo y fue súper positivo con la obra pero la única llamada de atención que nos hizo fue precisamente con este balance de abajo de hace ocho días a hoy no sé si nosotros podamos decir cuántos y avanzó pero la realidad es que hoy no lo tenemos el equipo de trabajo que se siente con el equipo de interventoría en obra y tenemos el mañana.
- Contratista (Ing. Andrés Martínez) que pena con lo que está mencionando, pero nosotros como equipo estado prestos a sentarnos a hacer cualquier balance inclusive después de la jornada laboral cinco de la tarde sábados inclusive si toca venir un domingo se hace pero pues la verdad pues ya es con temas del equipo de interventoría acá que nos manifiestan que se puede trabajar después de las cinco de la tarde o los sábados y eso pero nosotros siempre hemos estado dispuestos a trabajar pero las personas
- Interventoría (Ing. Guillermo Gil) yo no pretendo que esto se resuelva acá que dijeron que me hicieron eso para concluir es que no estoy de acuerdo en lo que dijo Andrés que no es el etc
- DIFRA (My. Julio Caita) en el comité no buscó culpables
- Interventoría (Ing. Guillermo Gil) tranquila, y la verdad es eso, no quiero mirar si el contratista en la interventoría pues acá todos tenemos maneras diferentes de trabajar pero yo no ya yo esperaría que al menos una o dos personas del contratista terminada esta reunión se sienten a trabajar en eso la verdad no espero que lo hagan a las cinco o a las siete de la noche nosotros en ese contrato le hemos invertido mucho tiempo de nuestras familias todos yo mismo el equipo de interventoría pero la idea no se sentaron a las

cinco de la tarde a las siete de la noche la verdad tenemos una jornada laboral y tenemos que sentarnos Andrés entonces la idea es que termina ese comité nos dispongamos para hacer eso
- Contratista (Ing. Andrés Martínez) no señores, que lo que le digo no significa que nosotros arrancamos a trabajar a las cinco de la tarde nosotros trabajamos durante toda la jornada verificando balance ya lo que pasa es que a las cinco de la tarde nos dan las siete u ocho de la noche veces acá en el mismo contenedor trabajando y seguimos trabajando de largo después de las cinco, así como ustedes han tenido un gran esfuerzo nosotros también y venimos los domingos venimos los festivos y trabajamos entonces
- DIFRA (My. Julio Caita) perdón qué pena con los dos digamos que eso es netamente gerencial si eso lo tratarán un comité técnico la conclusión es que el día lunes el balance y que llegue acompañado de los documentos para que inicie la modificación listos y ya tranquilos ya ustedes allá internamente se dicen sus cosas y si no quien se esfuerza más quien se puede yo creo que la nómina no les va a subir ni les va a bajar aquí lo que necesito es el resultado de por dios listo que trabajen en común acuerdo y que lleguen al acuerdo definitivo listo algo adicional para el comité.
- Interventoría (Ing. Guillermo Gil) yo tenía dos preguntas mayores, la primera pues que le entendí a la teniente que el acta 10 se ha seguido a cuentas por pagar, pero no sé si están cuentas por pagar o digamos una interpretación si efectivamente va a estar pues dentro del pacto o para desembolsar yo el acta 10 y lo otro es el acta 11 pues y que ella pues inicialmente de hecho que es para cuentas por pagar, pero preguntar cuáles son los trámites es para la reserva.
- DIFRA (My. Julio Caita) habíamos dicho hablando de esfuerzos hablando de esfuerzos nosotros nos hemos esforzado también demasiado estamos en un gobierno del cambio en donde decirle a usted que dar plata en diciembre no se lo garantice sí hoy con seguridad le puedo decir que en su papel dice si hay la posibilidad les paguen en diciembre ojalá les paguen en diciembre sí pero nos dijeron desde financiero oiga en diciembre y ponerle al ladito cuentas por pagar porque no sabemos si ponen o no ponen plata y normalmente la ponían el primero del mes y hoy es 5 y no hay plata entonces a eso a eso nos referimos no sabemos si sí no sabemos si no el año pasado la mayoría de contratos todos los anticipos se constituyeron en reserva porque no llegó la plata del 31 entonces por eso es el miedo financiero y dice si ellos se van a dar un tiempo límite y si ven que definitivamente no van a poner plata o no llegan a poner plata por parte del ministerio que es un problema nivel país pues ya definitivamente se constituye en reserva y se generan cuentas por pagar listo.

- Interventoría (Ing. Guillermo Gil) listo Mayor y el tema del acta 11 cual sería la fecha.
- DIFRA (My. Julio Caita) para el 20 de diciembre para que esté tramitado y este trabajo en la misma situación hizo el vector a volver a eso listo perfecto si no es más a todos muchas gracias.
- Interventoría (Arq. Eduardo Acero) pues yo solo quería decir una cosa mayor que pena y todos ellos y yo sí quiero decir es que si no ojalá no pase, pero la idea es que con los NP que se vienen los podamos conciliar, pero si no se da ese evento pues de si no hay la posibilidad de conciliarlo pues yo creo que lo remitiríamos a la supervisión.

2.9 DIFRA (My. Julio Caita) comenta que, Sí tanto Interventoría como Supervisión, deben procurar realizar los trámites para pagos con la mayor celeridad, debido a que se están presentando irregularidades por parte del Estado en los tiempos de pago. Sugiere celeridad en la entrega a la Entidad de los paquetes de pago aprobados por la Supervisión.



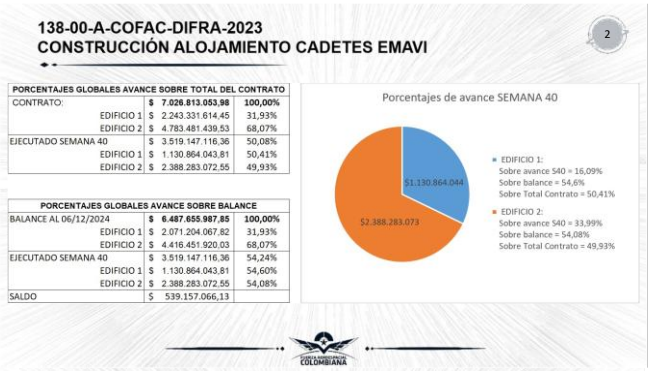









Actividad	Responsable	Fecha Entrega

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	Comité de Obra No. 041		
Fecha – Hora	Viernes, trece (6) de diciembre de 2024.	**Lugar**	Reunión Virtual.

FIRMAS,

Firma y Posfirma
TENIENTE, YEIMY RIOS
Supervisor Proyecto DIFRA.

Firma y Posfirma
ARQ. EDUARDO ACERO
Director de Interventoría

Firma y Posfirma
ING. ALEJANDRO COLLAZOS
Residente 1 de Interventoría.

Firma y Posfirma
Arq. SEBASTIAN BETANCOURTH.
Residente 2 de Interventoría.

Firma y Posfirma
ARQ. JAIRO VILLAMIZAR
Rep. Legal y Director de Obra.

Firma y Posfirma
ARQ. FELIPE RÍOS
Residente de Obra.

