GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE PAGO No. 03	**Codigo**: HS-FO-10 **Versión:** 02 **Fecha Modificación:** 05/06/2019

Acta No. 03	Corte: 28/03/2025	Fecha: 4/04/2025	Página de:
Contrato No.: LP-SV-010-2024--04102024-1376	Contratista: CONSORCIO HJ&E	Objeto: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS).	Municipio: La Dorada
Fecha Iniciación: 21/10/2024			Interventor: CONSORCIO CMCPV10-0824
Fecha Vencimiento inicial: 20/05/2025			
Fecha Suspensión: N/A			
Fecha Reiniciación: N/A			
Fecha Vencimiento final: 20/05/2025			
Plazo inicial: 7 MESES	Plazo Adicional: N/A	Valor Adición: N/A	Supervisor: ESTEBAN DIAZ OSORIO

				CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA							
Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
1	**EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES**															
1,01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN	m2	1.504	2.729,16	4.104.656,64	-17,02	2.712,14	4.079.056	1.344,00	2.021.376	0,00	0	0,00%	1.344,00	2.021.376	49,25%
1,02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	m2	2.289	2.729,16	6.247.047,24	0,00	2.729,16	6.247.047	1.344,00	3.076.416	0,00	0	0,00%	1.344,00	3.076.416	49,25%
1,03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	3.220	1.821,72	5.865.938,40	0,00	1.821,72	5.865.938	222,00	714.840	265,00	853.300	14,55%	487,00	1.568.140	26,73%
2	**EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS**															
2,01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	20.390	491,76	10.027.023,10	0,00	491,76	10.027.023	164,01	3.344.164	0,00	0	0,00%	164,01	3.344.164	33,35%
2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	20.390	199,47	4.067.223,89	0,00	199,47	4.067.224	45,57	929.172	48,72	993.401	24,42%	94,29	1.922.573	47,27%
2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	3.657	1.916,60	7.009.014,51	0,00	1.916,60	7.009.015	720,51	2.634.905	240,17	878.302	12,53%	960,68	3.513.207	50,12%
2,04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	m3	27.392	649,44	17.789.597,29	0,00	649,44	17.789.597	37,10	1.016.243	231,70	6.346.726	35,68%	268,80	7.362.969	41,39%
NP 3	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	m3	80.000	0,00	0,00	1.027,18	1.027,18	82.174.400	0,00	0	1.027,18	82.174.400		1.027,18	82.174.400	
5	**CONSTRUIR CIMENTACIÓN**															
5,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	346.099	245,88	85.099.133,61	0,00	245,88	85.099.134	114,52	39.635.257	9,66	3.343.316	3,93%	124,18	42.978.573	50,50%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
6	CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO															
6,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	66.092	2.444,73	161.577.096,67	0,00	2.444,73	161.577.097	811,30	53.620.440	384,30	25.399.156	15,72%	1.195,60	79.019.596	48,91%
6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	30.131	2.310,21	69.608.937,51	0,00	2.310,21	69.608.938	876,84	26.420.066	298,32	8.988.680	12,91%	1.175,16	35.408.746	50,87%
6,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	31.135	3.079,14	95.869.023,90	0,00	3.079,14	95.869.024	1.012,83	31.534.463	351,89	10.956.095	11,43%	1.364,72	42.490.558	44,32%
6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	19.183	3.314,55	63.583.012,65	0,00	3.314,55	63.583.013	1.224,67	23.492.845	502,65	9.642.335	15,16%	1.727,32	33.135.180	52,11%
6,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	19.005	2.444,73	46.462.094,08	0,00	2.444,73	46.462.094	811,30	15.418.757	384,30	7.303.622	15,72%	1.195,60	22.722.379	48,91%
6,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	40.315,57	310.752.386,43	0,00	40.315,57	310.752.386	17.973,20	138.537.425	1.173,20	9.043.026	2,91%	19.146,40	147.580.451	47,49%
6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	4.020,00	30.986.197,00	0,00	4.020,00	30.986.197	2.616,64	20.169.061	-47,26	-364.280	-1,18%	2.569,38	19.804.781	63,91%
6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	Kg	7.708	11.407,55	87.929.414,67	0,00	11.407,55	87.929.415	3.913,00	30.161.404	814,52	6.278.320	7,14%	4.727,52	36.439.724	41,44%
7	INSTALAR MAMPOSTERIA															
7,01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	24.942	5.087,08	126.881.924,42	-5.087,08		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	59.750	0,00	0,00	3.208,94	3.208,94	191.734.105	1.981,43	118.390.443	467,45	27.930.138		2.448,88	146.320.581	
8	INSTALAR CUBIERTA															
8,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	62.276	2.736,00	170.387.136,00	-2.736,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	45.000	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00	123.120.000	742,14	33.396.300	139,86	6.293.700		882,00	39.690.000	
8,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	32.136	2.705,22	86.934.949,92	0,00	2.705,22	86.934.950	881,64	28.332.383	123,63	3.972.974	4,57%	1.005,27	32.305.357	37,16%
8,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	ml	467.706	228,00	106.636.968,00	0,00	228,00	106.636.968	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
8,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM. CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. d/ 0.50 m.	ml	201.845	484,50	97.793.902,50	0,00	484,50	97.793.903	39,14	7.900.213	0,00	0	0,00%	39,14	7.900.213	8,08%
8,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	42.182	342,00	14.426.244,00	0,00	342,00	14.426.244	114,00	4.808.748	12,00	506.184	3,51%	126,00	5.314.932	36,84%
8,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	78.293	57,00	4.462.701,00	0,00	57,00	4.462.701	19,00	1.487.567	2,00	156.586	3,51%	21,00	1.644.153	36,84%
NP.4	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS	un	60.000	0,00	0,00	63,00	63,00	4.980.000	0,00	0	63,00	3.780.000		63,00	3.780.000	
9	**CONSTRUIR ACABADOS**															
9,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	63.211	517,45	32.708.279,11	0,00	517,45	32.708.279	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	39.739	237,69	9.445.562,91	0,00	237,69	9.445.563	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	65.248	123,92	8.085.403,15	0,00	123,92	8.085.403	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	m2	21.008	646,38	13.579.151,04	0,00	646,38	13.579.151	204,06	4.286.892	193,20	4.058.746	29,89%	397,26	8.345.638	61,46%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
9,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	16.777	390,91	6.558.229,96	0,00	390,91	6.558.230	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
9,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	29.972	646,38	19.373.301,36	0,00	646,38	19.373.301	204,06	6.116.086	0,00	0	0,00%	204,06	6.116.086	31,57%
9,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1.80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	un	241.033	57,00	13.738.881,00	0,00	57,00	13.738.881	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10	**INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA**															
10,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	un	236.320	114,00	26.940.480,00	0,00	114,00	26.940.480	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	169.596	114,00	19.333.944,00	0,00	114,00	19.333.944	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
10,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	440.414	114,00	50.207.196,00	0,00	114,00	50.207.196	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11	**INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS**															
11,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	372.181	57,00	21.214.317,00	0,00	57,00	21.214.317	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	39.927	57,00	2.275.839,00	0,00	57,00	2.275.839	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.1X0.04m.	ml	16.320	62,70	1.023.264,00	0,00	62,70	1.023.264	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
11,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	218.509	57,00	12.455.013,00	0,00	57,00	12.455.013	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
11,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE	un	1.215.583	57,00	69.288.231,00	0,00	57,00	69.288.231	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12	**EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS**															
12,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4"	un	51.352	114,00	5.854.128,00	0,00	114,00	5.854.128	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	un	44.753	456,00	20.407.368,00	0,00	456,00	20.407.368	152,00	6.802.456	16,00	716.048	3,51%	168,00	7.518.504	36,84%
12,03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5.	ml	10.231	1.368,00	13.996.008,00	0,00	1.368,00	13.996.008	0,00	0	147,00	1.503.957	10,75%	147,00	1.503.957	10,75%
12,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".	un	30.802	114,00	3.511.428,00	0,00	114,00	3.511.428	19,00	585.238	2,00	61.604	1,75%	21,00	646.842	18,42%
12,05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	449.546	57,00	25.624.122,00	0,00	57,00	25.624.122	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	56.658	342,00	19.377.036,00	0,00	342,00	19.377.036	114,00	6.459.012	82,00	4.645.956	23,98%	196,00	11.104.968	57,31%
12,07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	94.334	57,00	5.377.038,00	0,00	57,00	5.377.038	19,00	1.792.346	9,00	849.006	15,79%	28,00	2.641.352	49,12%
12,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	ml	20.230	456,00	9.224.880,00	0,00	456,00	9.224.880	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	36.256	570,00	20.665.920,00	0,00	570,00	20.665.920	136,80	4.959.821	64,80	2.349.389	11,37%	201,60	7.309.210	35,37%
12,11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	24.439	171,00	4.179.069,00	0,00	171,00	4.179.069	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	80.380	342,00	27.489.960,00	-148,00	194,00	15.593.720	0,00	0	28,00	2.250.640	8,19%	28,00	2.250.640	8,19%
12,13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	30.432	342,00	10.407.744,00	0,00	342,00	10.407.744	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	un	45.516	114,00	5.188.824,00	0,00	114,00	5.188.824	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	140.287	57,00	7.996.359,00	0,00	57,00	7.996.359	19,00	2.665.453	9,00	1.262.583	15,79%	28,00	3.928.036	49,12%
12,16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm	un	212.725	57,00	12.125.325,00	0,00	57,00	12.125.325	19,00	4.041.775	9,00	1.914.525	15,79%	28,00	5.956.300	49,12%
12,17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ml	157.661	201,78	31.812.836,58	-201,78		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
12,18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	14.616	125,40	1.832.846,40	0,00	125,40	1.832.846	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13	**EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS**															

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
13,01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	90.906	684,00	62.179.704,00	-57,00	627,00	56.998.062	0,00	0	154,00	13.999.524	22,51%	154,00	13.999.524	22,51%
13,02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	100.722	171,00	17.223.462,00	0,00	171,00	17.223.462	0,00	0	42,00	4.230.324	24,56%	42,00	4.230.324	24,56%
13,03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	66.655	342,00	22.796.010,00	0,00	342,00	22.796.010	0,00	0	84,00	5.599.020	24,56%	84,00	5.599.020	24,56%
13,04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	71.093	114,00	8.104.602,00	0,00	114,00	8.104.602	0,00	0	28,00	1.990.604	24,56%	28,00	1.990.604	24,56%
13,05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA	un	83.522	342,00	28.564.524,00	0,00	342,00	28.564.524	0,00	0	84,00	7.015.848	24,56%	84,00	7.015.848	24,56%
13,06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	un	296.798	57,00	16.917.486,00	0,00	57,00	16.917.486	0,00	0	14,00	4.155.172	24,56%	14,00	4.155.172	24,56%
13,07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	21.592	399,00	8.615.208,00	0,00	399,00	8.615.208	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR	ml	32.466	969,00	31.459.554,00	-969,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	408.977	57,00	23.311.689,00	0,00	57,00	23.311.689	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,10	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	116.195	57,00	6.623.115,00	-57,00		0	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
13,1.	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8	un	230.497	57,00	13.138.329,00	0,00	57,00	13.138.329	0,00	0	0,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%
NP.5	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un	124.200	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.6	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un	276.600	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.7	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un	148.250	0,00	0,00	0.00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
NP.8	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TGC	ml	62.200	0,00	0.00	0,00		0	0,00	0	0,00	0		0,00	0	
COSTO DIRECTO					2.516.530.616,84			2.534.271.074		686.136.692		271.078.927			957.215.619	
ADMINISTRACIÓN		27,76%			698.588.899			703.513.650		190.471.546		75.251.510			265.723.056	
IMPREVISTOS		2,00%			50.330.612			50.685.421		0	Ver NOTA	19.144.312			19.144.312	
UTILIDAD		5,00%			125.826.531			126.713.554		34.306.835		13.553.946			47.860.781	
AIU		34,76%			874.746.042			880.912.625		224.778.381		107.949.768			332.728.149	
IVA SOBRE UTILIDAD		19%			23.907.041			0		0		0			0	
VALOR TOTAL PROYECTO					3.415.183.700			3.415.183.699		910.915.073		379.028.695			1.289.943.768	
REALIZAR PGIO - PAPSO		0,8774499%			29.966.526			29.966.526		8.170.428		3.148.182			11.318.610	0

Item	Descripción	Unid.	Vr. Unitario	CONTRATO INICIAL		MAYORES Y MENORES CANTIDADES			Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
				Cantidad	Vr. Total	Cantidad	Cant. Acum.	Vr. Total	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	% Ejec.	Cantidad	Valor Parcial	Ejecutado
COSTO TOTAL					3.445.150.226			3.445.150.225		919.085.501		382.176.877			1.301.262.378	
RETENCION PARA LIQUIDACION (N/A)										0		0			0	
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA												382.176.877				

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY 382.176.877

NOTA: En la presente Acta se pagan los imprevistos de esta y las anteriores actas tomando como base el costo directo del (Acumulado Acta Anterior + Presente Acta)

RESUMEN CONTRATO		
Valor Contrato		3.445.150.226
Valor Acta No. 01	364.006.512	
Valor Acta No. 02	555.078.989	
Valor Acta No. 03	382.176.877	
Saldo Contrato	2.143.887.848	
SUMAS IGUALES	3.445.150.226	3.445.150.226

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo		0
Amortización Acta No. 01	0	
Amortización Acta No. 02	0	
Amortización Acta No. 03	0	
Saldo Anticipo	0	
SUMAS IGUALES	0	0

HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CEBALLOS C.
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

GOBERNACION DE CALDAS

ACTA CONVENIO DE PRECIOS DE OBRAS NO PREVISTAS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA No 02

FECHA:	**21/02/2025**
CONTRATO №:	**04102024-1376 / LP-SV-010-2024 / CO1.PCCNTR.6730931**
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS)
FECHA INICIO:	21/10/2024
PLAZO (MESES O DiAS):	7 MESES
VALOR:	$ 3.445.150.226
OTRO Sl No 1 PRORROGA	**N/A**

En el Municipio de Manizales, Caldas a los veintiun (21) dias del mes de febrero de 2025 se reunieron, El ordenaqdor del gasto Dr Jorge William Ruiz Ospina como Secretario de Vivienda y Territorio, el Ingeniero ESTEBAN DIAZ OSORIO como Supervisor del contrato de interventoria, el Ingeniero CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES representante del CONSORCIO CMCPV10-0824, el Interventor del contrato y el Ingeniero HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO, Representante del CONSORCIO HJ&E como contratista constructor, con el fin de convenir las obras no previstas en el contrato número 04102024-1376

Los items a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP.3	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	m3	$ 80.000	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoría con el fin de optimizar el suministro, transporte, instalacion y compactación mecánica del material de relleno, requerido para el desplante de las viviendas
NP.4	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS	un	$ 60.000	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoría con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalacion de teja plastica en los patios, y tomando el precio mas óptimo del mercado en cuanto a este material

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JAIME GIRALDO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: ESTEBAN DIAZ OSORIO
SUPERVISOR CONTRATO

FIRMA
NOMBRE: JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA
SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS
GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS - SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

ANALISIS CUADRILLA (MANO DE OBRA)	Prestaciones	Salario mes	Salario+presta (mes)	Salario + presta (dia)
Ayudante	61,54%	$ 1.423.500	$ 2.299.522	$ 76.651,00
Oficial	61,54%	$ 2.847.000	$ 4.599.044	$ 153.301,00
CUADRILLA 1 OF + 2 AY				$ 306.603

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
NP.3	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO**	**m3**	**COSTO DIRECTO**		**$ 80.000**
	MATERIALES				
	SUMINISTRO Y TRANSPORTE MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO	M3	1,3	$ 35.714	$ 46.429
	EQUIPO				
	MINIRETRO	HR	0,08	$ 150.000	$ 12.000
	CILINDRO	HR	0,08	$ 150.000	$ 12.000
	HERRAMIENTA MENOR	M3	1	$ 292	$ 292
	TRANSPORTE				
	PLANCHON PARA TRANSPORTE MINIRETRO Y CILINDRO	GLB	1	$ 3.147	$ 3.147
	MANO DE OBRA				
	CUADRILLA 1 OF + 2 AY	dia	0,02	$ 306.603	$ 6.132
					$ 80.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
NP.4	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS**	**un**	**COSTO DIRECTO**		**$ 60.000**
	MATERIALES				
	SUMINISTRO TEJA PLASTICA #5	UN	1	$ 38.590	$ 38.590
	EQUIPO				
	HERRAMIENTA MENOR Y AMARRAS	GLB	1	$ 660	$ 660
	ANDAMIOS	UN	2	$ 300	$ 600
	TRANSPORTE				
	TRANSPORTE TEJA PLASTICA HASTA LA DORADA	UN	1	$ 6.659	$ 6.659
	MANO DE OBRA				
	CUADRILLA 1 OF + 2 AY	dia	0,044	$ 306.603	$ 13.491
					$ 60.000

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

COTIZACIONES

La Dorada, Caldas, 13 de febrero del 2025

REF. Cotización

Señor: HECTOR JAIME GIRALDO **Nit: 10251459**

Dirección: Tel.

De acuerdo a sus requerimientos damos a conocer la descripción y precios de nuestros productos:


1	Viaje afirmado o recebo		$ 350.000
1	Viaje de relleno		$ 250.000
1	Viaje de piedra sobrante para vias		$ 200.000

Quedamos atentos a su pronta solicitud para tener el gusto de atenderlos.

Atentamente,

DARIO LAGUNA VILLANUEVA

C.C. 10.179.397 La Dorada
Cel. 320 767 14 41
Correo: dariolaguna54@hotmail.com

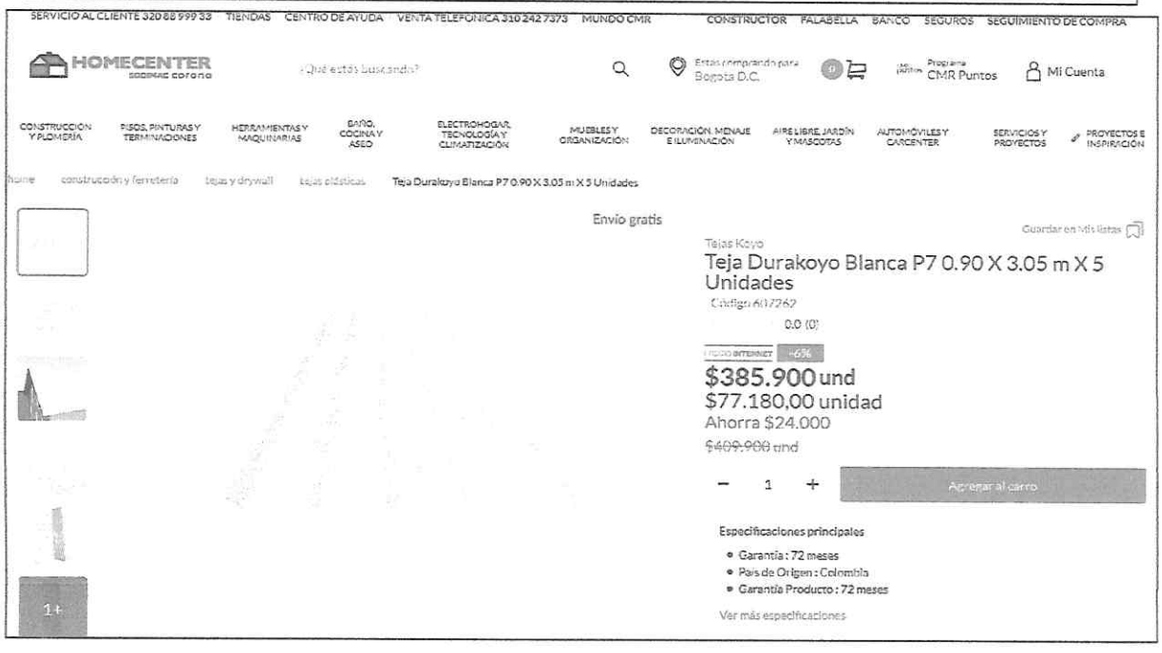

GOBERNACION DE CALDAS

ACTA CONVENIO DE PRECIOS DE OBRAS NO PREVISTAS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA No 03

FECHA:	18/03/2025
CONTRATO №:	04102024-1376 / LP-SV-010-2024 / CO1.PCCNTR.6730931
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS)
FECHA INICIO:	21/10/2024
PLAZO (MESES O DíAS):	7 MESES
VALOR:	$ 3.445.150.226
OTRO SI No 1 PRORROGA	N/A

En el Municipio de Manizales Caldas a los diez y ocho (18) dias del mes de marzo de 2025 se reunieron, El ordenaqdor del gasto Dr Jorge William Ruiz Ospina como Secretario de Vivienda y Territorio, el Ingeniero ESTEBAN DIAZ OSORIO, Supervisor del contrato de Interventoria, el Ingeniero CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES representante del CONSORCIO CMCPV10-0824, el Interventor del contrato de obra y el Ingeniero HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO, Representante del CONSORCIO HJ&E como contratista constructor, con el fin de convenir las obras no previstas en el contrato número 04102024-1376
Los items a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
NP.5	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un	$ 124.200	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoría con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalación de las cajas Herméticas para el medidor monofásico en sitio, y tomando el precio mas óptimo del mercado en cuanto a este material.
NP.6	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un	$ 276.600	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoría con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalación del tubo de realce de acometida electrica en 1" y tomando el precio mas óptimo del mercado para el tubo y el Capacete en 1".
NP.7	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un	$ 148.250	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoría con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalación del tubo de realce de acometida electrica en 3/4" y tomando el precio mas óptimo del mercado para el tubo y el Capacete en 3/4".
NP.8	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TGC	ml	$ 62.200	Actividad requerida en la ejecución de la obra y avalada por la interventoría con el fin de optimizar el suministro, transporte e instalación de la malla para sistema puesta atierra en sitio, y tomando el precio mas óptimo del mercado para el conductor de cobre No 4 y el conector tipo TGC.

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: ESTEBAN DIAZ OSORIO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA
SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS
GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

GOBERNACION DE CALDAS - SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

ANALISIS CUADRILLA (MANO DE OBRA)	Prestaciones	Salario básico mes	Salario+presta (mes)	Salario + presta (dia)
1 Ayudante	63,50%	$ 1.423.500	$ 2.327.423	$ 77.581,00
1 Técnico Electricista	63,50%	$ 2.847.000	$ 4.654.845	$ 155.162,00

CUADRILLA TIPO 4 (4 Ayu) (jornal +prest)			dia	$ 310.324,00
CUADRILLA TIPO 5 (1 Tec + 1 Ayu)			dia	$ 232.743,00

NP.5	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un	COSTO DIRECTO $ 124.200		
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	MATERIALES				
	CAJA HERMETICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO ANTIFRAUDE	un	1,00	$ 48.184,00	$ 48.184,00
	Terminal pvc conduit 3/4"	un	1,00	$ 2.000,00	$ 2.000,00
	Prensa estopa 1"	un	1	$ 6.500,00	$ 6.500,00
	Equipos y herramientas para energía	global	2,7	$ 2.500,00	$ 6.750,00
	TRANSPORTE				
	TRANSPORTE LOCAL	Un	0,2	$ 2.000,00	$ 400,00
	MANO DE OBRA				
	CUADRILLA TIPO 5 (1 Tec + 1 Ayu)	día	0,26	$ 232.743,00	$ 60.366,00
				$ -	$ 124.200

NP.6	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un	COSTO DIRECTO $ 276.600		
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	MATERIALES				
	Tubo rigido IMC 1"	ml	3,5	$ 25.296,00	$ 88.536,00
	Union IMC 1"	un	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00
	Capacete IMC 1"	un	1	$ 14.600,00	$ 14.600,00
	Guaya de acero 1/8"	un	8	$ 3.000,00	$ 24.000,00
	Grillete para guaya de acero 1/8"	un	4	$ 3.000,00	$ 12.000,00
	Cancamo cerrado con anclaje	un	2	$ 8.000,00	$ 16.000,00
	Terminal IMC 1"	un	1	$ 2.664,00	$ 2.664,00
	Equipos y herramientas para energía	global	5	$ 300,00	$ 1.500,00
	TRANSPORTE				
	TRANSPORTE LOCAL	Un	1,5	$ 4.000,00	$ 6.000,00
	MANO DE OBRA				
	TECNICO + AYUDANTE	día	0,47	$ 232.743,00	$ 108.300,00
					$ 276.600

NP.7	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un	COSTO DIRECTO $ 148.250		
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR PARCIAL
	MATERIALES				
	Tubo rigido IMC 3/4"	ml	1,5	$ 23.050,00	$ 34.575,00
	Capacete imc 3/4"	und	1	$ 13.500,00	$ 13.500,00
	Terminal IMC 3/4"	und	0,4	$ 2.500,00	$ 1.000,00
	Equipos y herramientas para energia	global	5	$ 300,00	$ 1.500,00
	TRANSPORTE				
	TRANSPORTE LOCAL	Un	0,535	$ 5.000,00	$ 2.675,00
	MANO DE OBRA				
	TECNICO + AYUDANTE	día	0,41	$ 232.743,00	$ 95.000,00
					$ 148.250

NP.8	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TGC	ml	COSTO DIRECTO $ 62.200		
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	MATERIALES				
	Cable de cobre N° 4 AWG desnudo	ml	1	$ 14.275,00	$ 14.275,00
	Conector para puesta a tierra TGC	un	0,20	$ 18.625,00	$ 3.725,00
	Tuberia conduit PVC DB de 1/2"	m	0,20	$ 2.000,00	$ 400,00
	Camara de inspeccion de 30 x 30 cm	global	0,17	$ 120.000,00	$ 20.400,00
	Equipos y herramientas para energía	global	0,8	$ 2.500,00	$ 2.000,00
	TRANSPORTE				
	TRANSPORTE LOCAL	Un	0,10	$ 4.000,00	$ 400,00
	MANO DE OBRA				
	TECNICO + AYUDANTE	día	0,09	$ 232.743,00	$ 21.000,00
					$ 62.200

FIRMA
NOMBRE: HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO
CONSORCIO HJ&E
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
CONSORCIO CMCPV10-0824
INTERVENTOR


COTIZACIONES

ELECTRIFICADORA CAPITAL

Buscar producto...

caja para 1 medidor monofasico tipo lonchera >

CAJA PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO TIPO LONCHERA

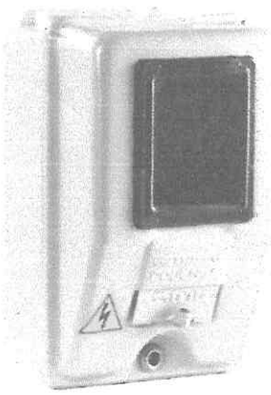

$56.639

Precio Sujeto a Disponibilidad

1 Agregar

SKU : CJ-1MED-MFS
Categoria : Cajas y Armarios Para Medidor

Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 185 mm x 300 mm x 150 mm

Material: Lamina de acero cold rolled

Calibre: 20

Grado de proteccion: IK 10 / IP 44

Característica de la pintura Electrostática: GRIS RAL 7032

Pregúntale a un Asesor

Comparte

Edelco
¡Productos eléctricos confiables!

Contactenos

Iniciar Sesión | Registro | Inicio | Nosotros | Tienda | Promociones | Asistencia | 0 Productos

Certificados

Home / Catalogo / CAJA P/MEDIDOR 1 CUENTA MONOFASICO POLICARBONATO PEQUEÑA



CAJA P/MEDIDOR 1 CUENTA MONOFASICO POLICARBONATO PEQUEÑA

$48.184


IVA INCLUIDO

1 disponibles

AÑADIR AL CARRITO

Añadir a la lista de deseos

INTERNACIONAL DE
ELÉCTRICOS ILUMINACIÓN S.A.S.



Compartir

Tubo Galvanizado 1 IMC

REF: 2499

$ 80.000 * IVA incluido


Diámetro real en mm: 29.54
Peso: 3.06 Kg
Espesor pared: 0.057
Longitud de tubo: 3 m




HOMECENTER
CMR Puntos
Mi Cuenta
home
construcción y ferretería
electricidad
tubería eléctrica emt y pvc
emt, tubos y accesorios
Capacete Emt 1
Guardar en Mis listas
Proeléctricos
Capacete Emt 1Pulg
Código 290280
0.0 (0)
$14.600 und
Satisfacción Garantizada
Ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogotá D.C.
Despacho a domicilio
ver fechas
Ver condiciones


home
construcción y ferretería
electricidad
tubería eléctrica emt y pvc
emt, tubos y accesorios
Capacete Emt 3/4
Guardar en Mis listas
Proeléctricos
Capacete Emt 3/4Pulg
Código 290279
0.0 (0)
$13.500 und
Satisfacción Garantizada
Ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales, embalaje original y no ser un producto sobre pedido, modificado o a la medida. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 6013077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Entrega en Bogotá D.C.
Envío a domicilio
Retiro en tienda
Disponibilidad en tienda

INTERNACIONAL DE
ELÉCTRICOS ILUMINACIÓN S.A.S.

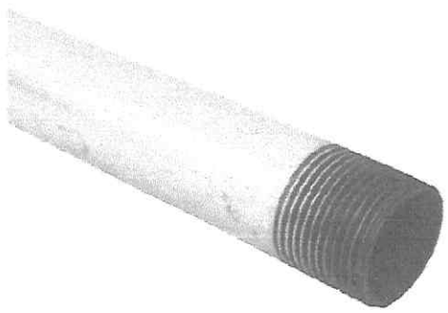

Compartir

Tubo Galvanizado 3/4 IMC

REF: 5142

$ 73.000 * IVA Incluido

Diámetro real en mm: 23.42
Peso: 2.08 Kg
Espesor pared: 0.049
Longitud de tubo: 3 m

Tel: +(57)314 4043530

INTER ELECTRICAS


BUSCAR

COP $

Cuenta

Categorías

Inicio > Tubería Metálica Y Pvc > Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3-4 Pulgadas x 3 mts Con Union UNION

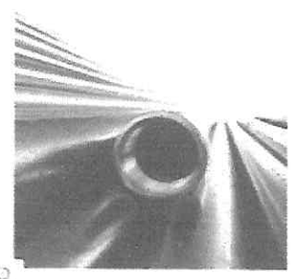







Tubo Metalico IMC Conduit Galvanizado de 3-4 Pulgadas x 3 mts Con Union UNION

$ 69.150

Marca TUBO METAL

Código Interno : 74800304027474800310P234


PRODUCTO DISPONIBLE

Unidad de medida: Unidad

Peso : 5.1700 kg

Dimensiones : Anchura 0.0700 Mts. – Altura 0.0700 Mts. – Profundidad 3.0000 Mts.


CONTÁCTANOS (+57) 318 6749230 - PBX: (604) 5132221/4809540
NUESTRAS SEDES
CERTIFICADOS RETIE
Mi Cuenta
ELECTROGERVEMOS
RETIRAR EN TIENDA
ENVÍO GRATIS MOTO
ENVÍO GRATIS CARRO
ENVÍOS NACIONA
Compra por categoría
Cables Y Alambres
Equipos Y Herramientas
Equipos Medición
Energía Solar
Ferretería
Herrajes
Iluminación
Protección Y Control
Sistemas Puesta A Tierra
Sistemas De Canalización
Tableros Cajas Y Gabinetes
Ultraterminal
Voz Datos Y Video
CB4D - Cable De Cobre N°4 AWG 7 Hilos Desnudo Procables Nexans
$15.814
Impuestos incluidos
Cantidad
1
Agregar al carrito
DISPONIBLES
Descripción
Detalles Del Producto
Rating

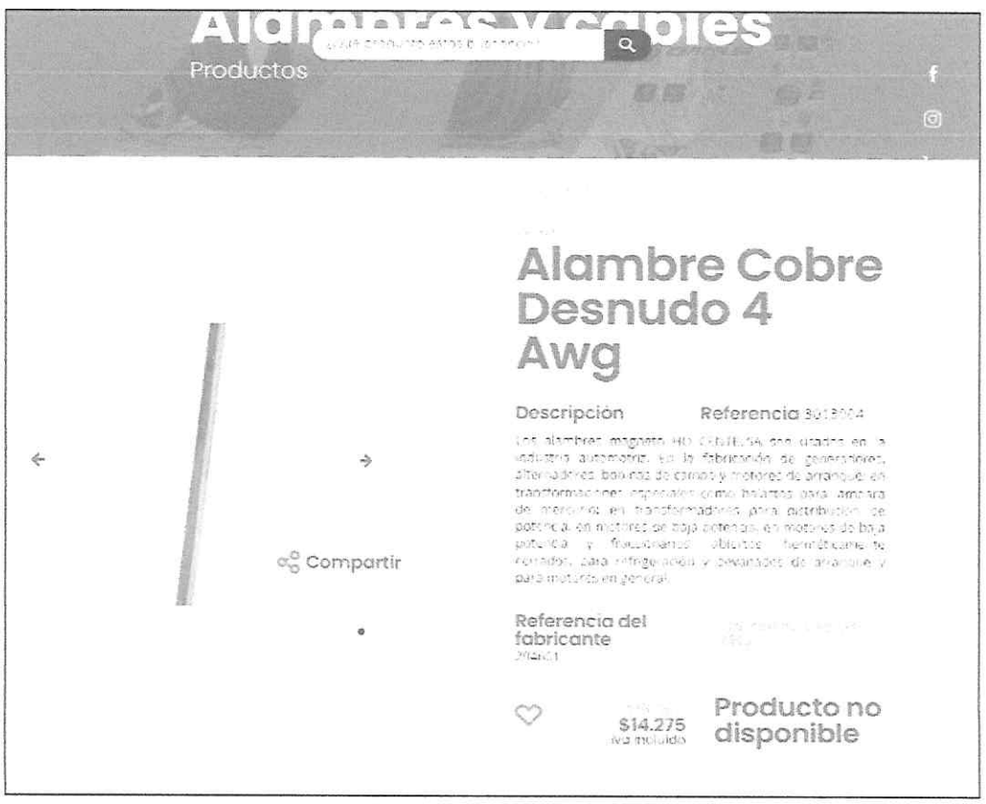
Productos
Alambre Cobre Desnudo 4 Awg
Descripción
Referencia
Compartir
Referencia del fabricante
$14.275
iva incluido
Producto no disponible

FYEEL com.co

BUSCAR

Tel:

(57)3143456990

Inicio >

Conector Transversal de Puesta a Tierra Tipo TGC 5-8-6 AWG

Escribe una reseña

$ 21.500



Código Interno :

En stock

Peso :

Dimensiones : **Anchura** **Altura**

Profundidad

Cantidad

1

AGREGAR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **1,03** **REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS** **UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	10,00			10,00	10,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	6,00			6,00	16,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	6,00			6,00	22,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	6,00			6,00	28,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	6,00			6,00	34,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	26,00			26,00	60,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	6,00			6,00	66,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	6,00			6,00	72,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	26,00			26,00	98,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	6,00			6,00	104,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	6,00			6,00	110,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	6,00			6,00	116,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	6,00			6,00	122,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	10,00			10,00	132,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	8,00			8,00	140,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	6,00			6,00	146,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	6,00			6,00	152,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	6,00			6,00	158,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	6,00			6,00	164,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	6,00			6,00	170,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	22,00			22,00	192,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	20,00			20,00	212,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	6,00			6,00	218,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	6,00			6,00	224,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	6,00			6,00	230,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	6,00			6,00	236,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	6,00			6,00	242,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	23,00			23,00	265,00	(2da vez Sobre el perimetro del lote)
							0,00	265,00	
							0,00	265,00	
							TOTAL PRE-ACTA	**265,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**2,02**	**REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	1,20	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	2,40	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	3,60	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	4,80	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	6,00	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	7,20	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	8,40	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	9,60	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	10,80	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	12,00	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	13,20	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	14,40	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	15,60	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	16,80	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	18,00	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	19,20	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	20,40	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	21,60	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	22,80	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	24,00	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	1,20	1,00	1,00	1,20	25,20	Ver anexo 1 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	28,56	Ver anexo 2 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	31,92	Ver anexo 2 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	35,28	Ver anexo 2 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	38,64	Ver anexo 2 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	42,00	Ver anexo 2 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	45,36	Ver anexo 2 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	3,36	1,00	1,00	3,36	48,72	Ver anexo 2 ACTA 03
							0,00	48,72	
							0,00	48,72	
							TOTAL PRE-ACTA	**48,72**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,03 **REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	34,31	1,00		34,31	34,31	Ver anexo 3 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	34,31	1,00		34,31	68,62	Ver anexo 3 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	34,31	1,00		34,31	102,93	Ver anexo 3 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	34,31	1,00		34,31	137,24	Ver anexo 3 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	34,31	1,00		34,31	171,55	Ver anexo 3 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	34,31	1,00		34,31	205,86	Ver anexo 3 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	34,31	1,00		34,31	240,17	Ver anexo 3 ACTA 03
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
							0,00	240,17	
						TOTAL PRE-ACTA		**240,17**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **2,04** **REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)** **UNIDAD** **m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	9,60	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	19,20	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	28,80	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	38,40	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	48,00	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	57,60	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	67,20	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	76,80	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	86,40	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	96,00	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	105,60	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	115,20	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	124,80	Area lote x profundidad
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	134,40	Area lote x profundidad
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	144,00	Area lote x profundidad
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	153,60	Area lote x profundidad
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	163,20	Area lote x profundidad
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	172,80	Area lote x profundidad
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	182,40	Area lote x profundidad
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	192,00	Area lote x profundidad
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	201,60	Area lote x profundidad
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	4,30	1,00	1,00	4,30	205,90	Ver anexo 4 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	4,30	1,00	1,00	4,30	210,20	Ver anexo 4 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	4,30	1,00	1,00	4,30	214,50	Ver anexo 4 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	4,30	1,00	1,00	4,30	218,80	Ver anexo 4 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	4,30	1,00	1,00	4,30	223,10	Ver anexo 4 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	4,30	1,00	1,00	4,30	227,40	Ver anexo 4 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	4,30	1,00	1,00	4,30	231,70	Ver anexo 4 ACTA 03
							0,00	231,70	
							0,00	231,70	
							TOTAL PRE-ACTA	**231,70**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.3** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO** **UNIDAD** **m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-D-CASA 3	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	73,37	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 4	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	146,74	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 5	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	220,11	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 6	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	293,48	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 7	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	366,85	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 8	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	440,22	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 9	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	513,59	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 14	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	586,96	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 15	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	660,33	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 16	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	733,70	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 17	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	807,07	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 18	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	880,44	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 19	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	953,81	Lleno h=0.94m
27	3	G-M-D-CASA 20	1,00	13,00	6,00	0,94	73,37	1.027,18	Lleno h=0.94m
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
							0,00	1.027,18	
						TOTAL PRE-ACTA		**1.027,18**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**5,01**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	1,38	1,00	1,00	1,38	1,38	Ver anexo 5 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	1,38	1,00	1,00	1,38	2,76	Ver anexo 5 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	1,38	1,00	1,00	1,38	4,14	Ver anexo 5 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	1,38	1,00	1,00	1,38	5,52	Ver anexo 5 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	1,38	1,00	1,00	1,38	6,90	Ver anexo 5 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	1,38	1,00	1,00	1,38	8,28	Ver anexo 5 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	1,38	1,00	1,00	1,38	9,66	Ver anexo 5 ACTA 03
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
							0,00	9,66	
						TOTAL PRE-ACTA		**9,66**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,01**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	42,70	1,00		42,70	42,70	Ver anexo 6 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	42,70	1,00		42,70	85,40	Ver anexo 6 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	42,70	1,00		42,70	128,10	Ver anexo 6 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	42,70	1,00		42,70	170,80	Ver anexo 6 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	42,70	1,00		42,70	213,50	Ver anexo 6 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	42,70	1,00		42,70	256,20	Ver anexo 6 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	42,70	1,00		42,70	298,90	Ver anexo 6 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	42,70	1,00		42,70	341,60	Ver anexo 6 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	42,70	1,00		42,70	384,30	Ver anexo 6 ACTA 03
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
						TOTAL PRE-ACTA		**384,30**	

CONTRATISTA

V° Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	-0,39			-0,39	-0,39	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	-0,39			-0,39	-0,78	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	-0,39			-0,39	-1,17	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	-0,39			-0,39	-1,56	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	-0,39			-0,39	-1,95	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	-0,39			-0,39	-2,34	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	-0,39			-0,39	-2,73	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	-0,39			-0,39	-3,12	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	-0,39			-0,39	-3,51	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	-0,39			-0,39	-3,90	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	-0,39			-0,39	-4,29	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	-0,39			-0,39	-4,68	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	-0,39			-0,39	-5,07	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	-0,39			-0,39	-5,46	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	-0,39			-0,39	-5,85	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	-0,39			-0,39	-6,24	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	-0,39			-0,39	-6,63	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	-0,39			-0,39	-7,02	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	-0,39			-0,39	-7,41	Ver anexo 7 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	5,97			5,97	-1,44	Ver anexo 8 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	5,97			5,97	4,53	Ver anexo 8 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	41,97			41,97	46,50	Ver anexo 9 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	41,97			41,97	88,47	Ver anexo 9 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	41,97			41,97	130,44	Ver anexo 9 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	41,97			41,97	172,41	Ver anexo 9 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	41,97			41,97	214,38	Ver anexo 9 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	41,97			41,97	256,35	Ver anexo 9 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	41,97			41,97	298,32	Ver anexo 9 ACTA 03
							0,00	298,32	
							0,00	298,32	
						TOTAL PRE-ACTA		**298,32**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,03**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	0,51			0,51	0,51	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	0,51			0,51	1,02	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	0,51			0,51	1,53	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	0,51			0,51	2,04	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	0,51			0,51	2,55	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	0,51			0,51	3,06	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	0,51			0,51	3,57	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	0,51			0,51	4,08	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	0,51			0,51	4,59	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	0,51			0,51	5,10	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	0,51			0,51	5,61	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	0,51			0,51	6,12	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	0,51			0,51	6,63	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	0,51			0,51	7,14	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	0,51			0,51	7,65	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	0,51			0,51	8,16	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	0,51			0,51	8,67	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	0,51			0,51	9,18	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	0,51			0,51	9,69	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	0,51			0,51	10,20	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	0,51			0,51	10,71	Ver anexo 10 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	48,74			48,74	59,45	Ver anexo 11 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	48,74			48,74	108,19	Ver anexo 11 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	48,74			48,74	156,93	Ver anexo 11 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	48,74			48,74	205,67	Ver anexo 11 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	48,74			48,74	254,41	Ver anexo 11 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	48,74			48,74	303,15	Ver anexo 11 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	48,74			48,74	351,89	Ver anexo 11 ACTA 03
							0,00	351,89	
							0,00	351,89	
						TOTAL PRE-ACTA		**351,89**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,04**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	-0,24			-0,24	-0,24	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	-0,24			-0,24	-0,48	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	-0,24			-0,24	-0,72	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	-0,24			-0,24	-0,96	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	-0,24			-0,24	-1,20	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	-0,24			-0,24	-1,44	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	-0,24			-0,24	-1,68	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	-0,24			-0,24	-1,92	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	-0,24			-0,24	-2,16	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	-0,24			-0,24	-2,40	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	-0,24			-0,24	-2,64	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	-0,24			-0,24	-2,88	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	-0,24			-0,24	-3,12	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	-0,24			-0,24	-3,36	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	-0,24			-0,24	-3,60	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	-0,24			-0,24	-3,84	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	-0,24			-0,24	-4,08	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	-0,24			-0,24	-4,32	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	-0,24			-0,24	-4,56	Ver anexo 12 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	37,69			37,69	33,13	Ver anexo 13 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	37,69			37,69	70,82	Ver anexo 13 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	61,69			61,69	132,51	Ver anexo 14 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	61,69			61,69	194,20	Ver anexo 14 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	61,69			61,69	255,89	Ver anexo 14 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	61,69			61,69	317,58	Ver anexo 14 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	61,69			61,69	379,27	Ver anexo 14 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	61,69			61,69	440,96	Ver anexo 14 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	61,69			61,69	502,65	Ver anexo 14 ACTA 03
							0,00	502,65	
							0,00	502,65	
						TOTAL PRE-ACTA		**502,65**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **6,06** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM** **UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	42,70	1,00		42,70	42,70	Ver anexo 15 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	42,70	1,00		42,70	85,40	Ver anexo 15 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	42,70	1,00		42,70	128,10	Ver anexo 15 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	42,70	1,00		42,70	170,80	Ver anexo 15 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	42,70	1,00		42,70	213,50	Ver anexo 15 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	42,70	1,00		42,70	256,20	Ver anexo 15 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	42,70	1,00		42,70	298,90	Ver anexo 15 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	42,70	1,00		42,70	341,60	Ver anexo 15 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	42,70	1,00		42,70	384,30	Ver anexo 15 ACTA 03
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
							0,00	384,30	
						TOTAL PRE-ACTA		**384,30**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,07**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-30,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-60,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-90,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-120,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-150,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-180,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-210,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-240,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-270,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-300,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-330,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-360,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-390,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-420,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-450,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-480,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-510,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-540,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-570,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-600,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	-30,00	1,00		-30,00	-630,00	Ver anexo 16 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	257,60	1,00		257,60	-372,40	Ver anexo 17 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	257,60	1,00		257,60	-114,80	Ver anexo 17 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	257,60	1,00		257,60	142,80	Ver anexo 17 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	257,60	1,00		257,60	400,40	Ver anexo 17 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	257,60	1,00		257,60	658,00	Ver anexo 17 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	257,60	1,00		257,60	915,60	Ver anexo 17 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	257,60	1,00		257,60	1.173,20	Ver anexo 17 ACTA 03
							0,00	1.173,20	
							0,00	1.173,20	
						TOTAL PRE-ACTA		**1.173,20**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**6,08**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2**	**UNIDAD**	**Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	8,72	1,00		8,72	8,72	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	8,72	1,00		8,72	17,44	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	8,72	1,00		8,72	26,16	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	8,72	1,00		8,72	34,88	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	8,72	1,00		8,72	43,60	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	8,72	1,00		8,72	52,32	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	8,72	1,00		8,72	61,04	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	8,72	1,00		8,72	69,76	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	8,72	1,00		8,72	78,48	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	8,72	1,00		8,72	87,20	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	8,72	1,00		8,72	95,92	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	8,72	1,00		8,72	104,64	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	8,72	1,00		8,72	113,36	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	8,72	1,00		8,72	122,08	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	8,72	1,00		8,72	130,80	Ver anexo 18 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	-92,49	1,00		-92,49	38,31	Ver anexo 19 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	-92,49	1,00		-92,49	-54,18	Ver anexo 19 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	-92,49	1,00		-92,49	-146,67	Ver anexo 19 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	-92,49	1,00		-92,49	-239,16	Ver anexo 19 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	-92,49	1,00		-92,49	-331,65	Ver anexo 19 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	-92,49	1,00		-92,49	-424,14	Ver anexo 19 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	53,84	1,00		53,84	-370,30	Ver anexo 20 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	53,84	1,00		53,84	-316,46	Ver anexo 20 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	53,84	1,00		53,84	-262,62	Ver anexo 20 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	53,84	1,00		53,84	-208,78	Ver anexo 20 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	53,84	1,00		53,84	-154,94	Ver anexo 20 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	53,84	1,00		53,84	-101,10	Ver anexo 20 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	53,84	1,00		53,84	-47,26	Ver anexo 20 ACTA 03
							0,00	-47,26	
							0,00	-47,26	
						TOTAL PRE-ACTA		**-47,26**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **6,09** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD** **Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-10,72	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-21,44	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-32,16	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-42,88	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-53,60	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-64,32	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-75,04	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-85,76	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-96,48	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-107,20	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-117,92	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-128,64	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-139,36	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	-10,72	1,00		-10,72	-150,08	Ver anexo 21 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	68,90	1,00		68,90	-81,18	Ver anexo 22 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	68,90	1,00		68,90	-12,28	Ver anexo 22 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	68,90	1,00		68,90	56,62	Ver anexo 22 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	68,90	1,00		68,90	125,52	Ver anexo 22 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	68,90	1,00		68,90	194,42	Ver anexo 22 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	68,90	1,00		68,90	263,32	Ver anexo 22 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	68,90	1,00		68,90	332,22	Ver anexo 22 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	68,90	1,00		68,90	401,12	Ver anexo 23 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	68,90	1,00		68,90	470,02	Ver anexo 23 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	68,90	1,00		68,90	538,92	Ver anexo 23 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	68,90	1,00		68,90	607,82	Ver anexo 23 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	68,90	1,00		68,90	676,72	Ver anexo 23 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	68,90	1,00		68,90	745,62	Ver anexo 23 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	68,90	1,00		68,90	814,52	Ver anexo 23 ACTA 03
							0,00	814,52	
							0,00	814,52	
						TOTAL PRE-ACTA		**814,52**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.1**	**SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**	**UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes	.	# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	0,31	1,00		0,31	0,31	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	0,31	1,00		0,31	0,62	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	0,31	1,00		0,31	0,93	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	0,31	1,00		0,31	1,24	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	0,31	1,00		0,31	1,55	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	0,31	1,00		0,31	1,86	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	0,31	1,00		0,31	2,17	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	0,31	1,00		0,31	2,48	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	0,31	1,00		0,31	2,79	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	0,31	1,00		0,31	3,10	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	0,31	1,00		0,31	3,41	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	0,31	1,00		0,31	3,72	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	0,31	1,00		0,31	4,03	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	0,31	1,00		0,31	4,34	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	0,31	1,00		0,31	4,65	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	0,31	1,00		0,31	4,96	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	0,31	1,00		0,31	5,27	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	0,31	1,00		0,31	5,58	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	0,31	1,00		0,31	5,89	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	0,31	1,00		0,31	6,20	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	0,31	1,00		0,31	6,51	Ver anexo 24 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	11,82	1,00		11,82	18,33	Ver anexo 25 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	11,82	1,00		11,82	30,15	Ver anexo 25 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	87,46	1,00		87,46	117,61	Ver anexo 26 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	87,46	1,00		87,46	205,07	Ver anexo 26 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	87,46	1,00		87,46	292,53	Ver anexo 26 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	87,46	1,00		87,46	379,99	Ver anexo 26 ACTA 03
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	87,46	1,00		87,46	467,45	Ver anexo 26 ACTA 03
							0,00	467,45	
							0,00	467,45	
						TOTAL PRE-ACTA		**467,45**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**NP.2**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	2,94			2,94	2,94	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	2,94			2,94	5,88	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	2,94			2,94	8,82	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	2,94			2,94	11,76	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	2,94			2,94	14,70	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	2,94			2,94	17,64	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	2,94			2,94	20,58	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	2,94			2,94	23,52	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	2,94			2,94	26,46	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	2,94			2,94	29,40	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	2,94			2,94	32,34	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	2,94			2,94	35,28	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	2,94			2,94	38,22	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	2,94			2,94	41,16	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	2,94			2,94	44,10	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	2,94			2,94	47,04	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	2,94			2,94	49,98	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	2,94			2,94	52,92	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	2,94			2,94	55,86	Faltante en cubierta, correas cobrado en acta 02
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	42,00			42,00	97,86	Cubierta, correas
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	42,00			42,00	139,86	Cubierta, correas
							0,00	139,86	
							0,00	139,86	
							0,00	139,86	
							0,00	139,86	
							0,00	139,86	
							0,00	139,86	
							0,00	139,86	
							0,00	139,86	
							0,00	139,86	
						TOTAL PRE-ACTA		**139,86**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**8,02**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD**	**m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-1,11	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-2,22	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-3,33	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-4,44	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-5,55	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-6,66	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-7,77	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-8,88	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-9,99	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-11,10	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-12,21	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-13,32	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-14,43	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-15,54	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-16,65	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-17,76	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-18,87	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	-1,11	1,00		-1,11	-19,98	Ver anexo 27 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	47,87	1,00		47,87	27,89	Ver anexo 28 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	47,87	1,00		47,87	75,76	Ver anexo 28 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	47,87	1,00		47,87	123,63	Ver anexo 28 ACTA 03
							0,00	123,63	
							0,00	123,63	
							0,00	123,63	
							0,00	123,63	
							0,00	123,63	
							0,00	123,63	
							0,00	123,63	
							0,00	123,63	
							0,00	123,63	
						TOTAL PRE-ACTA		**123,63**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**8,05**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	6,00			6,00	6,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	6,00			6,00	12,00	Cubierta
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
							0,00	12,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**12,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**8,06**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	**UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	1,00	Cubierta, claraboya baño
27	3	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	2,00	Cubierta, claraboya baño
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**2,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.4** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS** **UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	3,00				3,00	3,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 4	3,00				3,00	6,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 5	3,00				3,00	9,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 6	3,00				3,00	12,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 7	3,00				3,00	15,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 8	3,00				3,00	18,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 9	3,00				3,00	21,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 10	3,00				3,00	24,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 11	3,00				3,00	27,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 12	3,00				3,00	30,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 13	3,00				3,00	33,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 14	3,00				3,00	36,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 15	3,00				3,00	39,00	Cubierta
27	3	G-M-F CASA 16	3,00				3,00	42,00	Cubierta
27	3	P-M-G-CASA 4	3,00				3,00	45,00	Cubierta
27	3	P-M-G-CASA 5	3,00				3,00	48,00	Cubierta
27	3	P-M-G-CASA 6	3,00				3,00	51,00	Cubierta
27	3	P-M-G-CASA 7	3,00				3,00	54,00	Cubierta
27	3	P-M-G-CASA 8	3,00				3,00	57,00	Cubierta
27	3	P-M-G-CASA 9	3,00				3,00	60,00	Cubierta
27	3	P-M-G-CASA 10	3,00				3,00	63,00	Cubierta
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
							0,00	63,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**63,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**9,06**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.**	**UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	9,20	1,00		9,20	9,20	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	9,20	1,00		9,20	18,40	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	9,20	1,00		9,20	27,60	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	9,20	1,00		9,20	36,80	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	9,20	1,00		9,20	46,00	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	9,20	1,00		9,20	55,20	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	9,20	1,00		9,20	64,40	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	9,20	1,00		9,20	73,60	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	9,20	1,00		9,20	82,80	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	9,20	1,00		9,20	92,00	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	9,20	1,00		9,20	101,20	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	9,20	1,00		9,20	110,40	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	9,20	1,00		9,20	119,60	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	9,20	1,00		9,20	128,80	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	9,20	1,00		9,20	138,00	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	9,20	1,00		9,20	147,20	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	9,20	1,00		9,20	156,40	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	9,20	1,00		9,20	165,60	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	9,20	1,00		9,20	174,80	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	9,20	1,00		9,20	184,00	Ver anexo 29 ACTA 03
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	9,20	1,00		9,20	193,20	Ver anexo 29 ACTA 03
							0,00	193,20	
							0,00	193,20	
							0,00	193,20	
							0,00	193,20	
							0,00	193,20	
							0,00	193,20	
							0,00	193,20	
							0,00	193,20	
							0,00	193,20	
						TOTAL PRE-ACTA		**193,20**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	8,00				8,00	8,00	Puntos de baño, cocina y patio
27	3	G-M-F CASA 16	8,00				8,00	16,00	Puntos de baño, cocina y patio
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
							0,00	16,00	
						TOTAL PRE-ACTA		16,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 12,03 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5. **UNIDAD ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	7,00			7,00	7,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	7,00			7,00	14,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	7,00			7,00	21,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	7,00			7,00	28,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	7,00			7,00	35,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	7,00			7,00	42,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	7,00			7,00	49,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	7,00			7,00	56,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	7,00			7,00	63,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	7,00			7,00	70,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	7,00			7,00	77,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	7,00			7,00	84,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	7,00			7,00	91,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	7,00			7,00	98,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00	7,00			7,00	105,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00	7,00			7,00	112,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00	7,00			7,00	119,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00	7,00			7,00	126,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00	7,00			7,00	133,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00	7,00			7,00	140,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00	7,00			7,00	147,00	Red a Baño, cocina y patio ropas
							0,00	147,00	
							0,00	147,00	
							0,00	147,00	
							0,00	147,00	
							0,00	147,00	
							0,00	147,00	
							0,00	147,00	
							0,00	147,00	
							0,00	147,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**147,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **12,04** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".** **UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	1,00	En el baño
27	3	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	2,00	En el baño
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
							0,00	2,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**2,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**12,06**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES**	**UNIDAD**	**un**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	1 patio de ropas
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00				1,00	13,00	1 patio de ropas
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00				1,00	14,00	1 patio de ropas
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00				1,00	15,00	1 patio de ropas
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00				1,00	16,00	1 patio de ropas
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00				1,00	17,00	1 patio de ropas
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00				1,00	18,00	1 patio de ropas
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00				1,00	19,00	1 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 15	7,00				7,00	26,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
27	3	G-M-F CASA 16	7,00				7,00	33,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
27	3	P-M-F-CASA 1	7,00				7,00	40,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
27	3	P-M-F-CASA 2	7,00				7,00	47,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
27	3	P-M-F-CASA 3	7,00				7,00	54,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
27	3	P-M-F-CASA 4	7,00				7,00	61,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
27	3	P-M-F-CASA 5	7,00				7,00	68,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
27	3	P-M-F-CASA 6	7,00				7,00	75,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
27	3	P-M-F-CASA 7	7,00				7,00	82,00	2 en baño + 1 cocina + 4 patio de ropas
							0,00	82,00	
							0,00	82,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**82,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**12,07**	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES**	**UNIDAD**	**un**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	1,00	Sanitario
27	3	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	2,00	Sanitario
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00				1,00	3,00	Sanitario
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00				1,00	4,00	Sanitario
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00				1,00	5,00	Sanitario
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00				1,00	6,00	Sanitario
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00				1,00	7,00	Sanitario
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00				1,00	8,00	Sanitario
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00				1,00	9,00	Sanitario
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**9,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **12,09** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"** **UNIDAD** **ml**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	7,20			7,20	7,20	Red entre cajas de inspeccion
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	7,20			7,20	14,40	Red entre cajas de inspeccion
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	7,20			7,20	21,60	Red entre cajas de inspeccion
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	7,20			7,20	28,80	Red entre cajas de inspeccion
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	7,20			7,20	36,00	Red entre cajas de inspeccion
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	7,20			7,20	43,20	Red entre cajas de inspeccion
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	7,20			7,20	50,40	Red entre cajas de inspeccion
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	7,20			7,20	57,60	Red entre cajas de inspeccion
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	7,20			7,20	64,80	Red entre cajas de inspeccion
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
							0,00	64,80	
						TOTAL PRE-ACTA		**64,80**	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	12,12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UNIDAD	un

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	1 Canal delantera
27	3	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-G-CASA 4	1,00				1,00	15,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-G-CASA 5	1,00				1,00	16,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-G-CASA 6	1,00				1,00	17,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-G-CASA 7	1,00				1,00	18,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-G-CASA 8	1,00				1,00	19,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-G-CASA 9	1,00				1,00	20,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-G-CASA 10	1,00				1,00	21,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00				1,00	22,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00				1,00	23,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00				1,00	24,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00				1,00	25,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00				1,00	26,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00				1,00	27,00	1 Canal delantera
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00				1,00	28,00	1 Canal delantera
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
						TOTAL PRE-ACTA		28,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **12,15** **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm** **UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	1,00	Caja de inspeccion patio
27	3	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	2,00	Caja de inspeccion patio
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00				1,00	3,00	Caja de inspeccion patio
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00				1,00	4,00	Caja de inspeccion patio
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00				1,00	5,00	Caja de inspeccion patio
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00				1,00	6,00	Caja de inspeccion patio
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00				1,00	7,00	Caja de inspeccion patio
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00				1,00	8,00	Caja de inspeccion patio
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00				1,00	9,00	Caja de inspeccion patio
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**9,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 12,16 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm **UNIDAD un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	1,00	Caja de inspeccion entrada
27	3	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	2,00	Caja de inspeccion entrada
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00				1,00	3,00	Caja de inspeccion entrada
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00				1,00	4,00	Caja de inspeccion entrada
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00				1,00	5,00	Caja de inspeccion entrada
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00				1,00	6,00	Caja de inspeccion entrada
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00				1,00	7,00	Caja de inspeccion entrada
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00				1,00	8,00	Caja de inspeccion entrada
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00				1,00	9,00	Caja de inspeccion entrada
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
							0,00	9,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**9,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**13,01**	**SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	11,00				11,00	11,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 4	11,00				11,00	22,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 5	11,00				11,00	33,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 6	11,00				11,00	44,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 7	11,00				11,00	55,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 8	11,00				11,00	66,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 9	11,00				11,00	77,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 10	11,00				11,00	88,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 11	11,00				11,00	99,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 12	11,00				11,00	110,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 13	11,00				11,00	121,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 14	11,00				11,00	132,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 15	11,00				11,00	143,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
27	3	G-M-F CASA 16	11,00				11,00	154,00	2 Alcoba 1, 3 Alcoba 2, 3 en sala, 3 cocina,
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
							0,00	154,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**154,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**13,02**	**SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.**	**UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	3,00				3,00	3,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 4	3,00				3,00	6,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 5	3,00				3,00	9,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 6	3,00				3,00	12,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 7	3,00				3,00	15,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 8	3,00				3,00	18,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 9	3,00				3,00	21,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 10	3,00				3,00	24,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 11	3,00				3,00	27,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 12	3,00				3,00	30,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 13	3,00				3,00	33,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 14	3,00				3,00	36,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 15	3,00				3,00	39,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
27	3	G-M-F CASA 16	3,00				3,00	42,00	1 en Baño, 1 en Cocina, 1 en Patio
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
							0,00	42,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**42,00**	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10 Versión: 02 Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **13,03** **SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO** **UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	6,00				6,00	6,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 4	6,00				6,00	12,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 5	6,00				6,00	18,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 6	6,00				6,00	24,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 7	6,00				6,00	30,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 8	6,00				6,00	36,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 9	6,00				6,00	42,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 10	6,00				6,00	48,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 11	6,00				6,00	54,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 12	6,00				6,00	60,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 13	6,00				6,00	66,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 14	6,00				6,00	72,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 15	6,00				6,00	78,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 16	6,00				6,00	84,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**84,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**13,04**	**SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL**	**UNIDAD**	**un**	

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	2,00				2,00	2,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 4	2,00				2,00	4,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 5	2,00				2,00	6,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 6	2,00				2,00	8,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 7	2,00				2,00	10,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 8	2,00				2,00	12,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 9	2,00				2,00	14,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 10	2,00				2,00	16,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 11	2,00				2,00	18,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 12	2,00				2,00	20,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 13	2,00				2,00	22,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 14	2,00				2,00	24,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 15	2,00				2,00	26,00	En sala
27	3	G-M-F CASA 16	2,00				2,00	28,00	En sala
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
							0,00	28,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**28,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**13,05**	**SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA**	**UNIDAD** **un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	6,00				6,00	6,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 4	6,00				6,00	12,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 5	6,00				6,00	18,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 6	6,00				6,00	24,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 7	6,00				6,00	30,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 8	6,00				6,00	36,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 9	6,00				6,00	42,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 10	6,00				6,00	48,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 11	6,00				6,00	54,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 12	6,00				6,00	60,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 13	6,00				6,00	66,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 14	6,00				6,00	72,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 15	6,00				6,00	78,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
27	3	G-M-F CASA 16	6,00				6,00	84,00	2 en Alcobas, 1 Baño, 1 cocina, 1 en Sala, 1 patio
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
							0,00	84,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**84,00**	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

GOBIERNO DE CALDAS	PREACTA	Codigo: HS-FO-10
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 05/06/2019

ACTA 03

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	**13,06**	**SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)**	**UNIDAD**	**un**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		Unidad (Un)	N/A	N/A	N/A	Unidad (un)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00				1,00	1,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 4	1,00				1,00	2,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 5	1,00				1,00	3,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 6	1,00				1,00	4,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 7	1,00				1,00	5,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 8	1,00				1,00	6,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 9	1,00				1,00	7,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 10	1,00				1,00	8,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 11	1,00				1,00	9,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 12	1,00				1,00	10,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 13	1,00				1,00	11,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 14	1,00				1,00	12,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 15	1,00				1,00	13,00	En cocina
27	3	G-M-F CASA 16	1,00				1,00	14,00	En cocina
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
							0,00	14,00	
						TOTAL PRE-ACTA		**14,00**	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 1	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

INTERVENTOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,02 **REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD m3**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,20	0,30	0,10	0,22	0,22	Eje 3-4 entre A-D
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	0,60	0,30	0,10	0,02	0,24	Eje 1-3 entre B-C
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	2,86	0,30	0,10	0,09	0,33	Eje 1-3 entre B-C
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	1,30	0,30	0,10	0,04	0,37	Eje 3-4 entre D-E
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	0,60	0,30	0,10	0,02	0,39	Eje 3-4 entre D-E
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	1,45	0,30	0,10	0,04	0,43	Eje 3-4 entre D-E
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	0,42	0,30	0,10	0,01	0,44	Eje 3-4 entre D-E
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	0,60	0,60	0,70	0,25	0,69	cajas de inspeccion de 60x40
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	0,80	0,80	0,80	0,51	1,20	cajas de inspeccion de 60x60
		G-M-F CASA 8					0,00	1,20	
		G-M-F CASA 7					0,00	1,20	
		G-M-F CASA 6					0,00	1,20	
		G-M-F CASA 5					0,00	1,20	
		G-M-F CASA 4					0,00	1,20	
		G-M-F CASA 3					0,00	1,20	
		P-M-G-CASA 4					0,00	1,20	
		P-M-G-CASA 5					0,00	1,20	
		P-M-G-CASA 6					0,00	1,20	
		P-M-G-CASA 7					0,00	1,20	
		P-M-G-CASA 8					0,00	1,20	
		P-M-G-CASA 9					0,00	1,20	
		P-M-G-CASA 10					0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
							0,00	1,20	
						TOTAL PRE-ACTA		1,20	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 2
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	2,02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,20	0,30	0,60	1,30	1,30	Eje 3-4 entre A-D
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	0,60	0,30	0,60	0,11	1,41	Eje 1-3 entre B-C
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	2,86	0,30	0,60	0,51	1,92	Eje 1-3 entre B-C
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	1,30	0,30	0,60	0,23	2,15	Eje 3-4 entre D-E
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	0,60	0,30	0,60	0,11	2,26	Eje 3-4 entre D-E
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	1,45	0,30	0,60	0,26	2,52	Eje 3-4 entre D-E
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	0,42	0,30	0,60	0,08	2,60	Eje 3-4 entre D-E
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	0,60	0,60	0,70	0,25	2,85	caja de inspecion de 40x40
27	3		1,00	0,80	0,80	0,80	0,51	3,36	caja de inspecion de 60x60
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							0,00	3,36	
							TOTAL PRE-ACTA	3,36	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 3	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	2,03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	2,29	2,55		5,84	5,84	Eje 1-3 entre A-B
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	0,95	1,63		1,55	7,39	Eje 1-3 entre B-C
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	0,95	0,62		0,59	7,98	Eje 1-3 entre B-C
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	3,54	2,55		9,03	17,01	Eje 1-3 entre C-E
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	3,54	2,55		9,03	26,04	Eje 3-4 entre A-C
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	2,32	2,55		5,92	31,96	Eje 3-4 entre C-D
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	0,92	2,55		2,35	34,31	Eje 3-4 entre D-E
		P-M-F-CASA 7					0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							0,00	34,31	
							TOTAL PRE-ACTA	34,31	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 4
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 2,04 **REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)** **UNIDAD** m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	8,00	6,00	0,20	9,60	9,60	area lote x profundidad
27	3	P-M-G-CASA 4	-1,30	7,98	0,30	0,30	-0,93	8,67	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-G-CASA 5	-1,30	7,98	0,30	0,30	-0,93	7,74	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-G-CASA 6	-1,30	7,98	0,30	0,30	-0,93	6,81	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-G-CASA 7	-1,30	0,95	0,30	0,30	-0,11	6,70	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-G-CASA 8	-1,30	2,55	0,30	0,30	-0,30	6,40	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-G-CASA 9	-1,30	2,55	0,30	0,30	-0,30	6,10	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-G-CASA 10	-1,30	2,55	0,30	0,30	-0,30	5,80	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,30	2,55	0,30	0,30	-0,30	5,50	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,30	2,55	0,30	0,30	-0,30	5,20	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,30	2,55	0,30	0,30	-0,30	4,90	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,30	2,55	0,30	0,30	-0,30	4,60	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,30	2,55	0,30	0,30	-0,30	4,30	Descuento cobrado acta 2
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							0,00	4,30	
							TOTAL PRE-ACTA	4,30	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 5	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM 5,01	**SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.**	UNIDAD m3

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	Profundidad (m)	Unidad (m3)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	-1,00	7,98	0,30	0,30	-0,72	-0,72	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-F-CASA 1	-1,00	7,98	0,30	0,30	-0,72	-1,44	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-F-CASA 2	-1,00	7,98	0,30	0,30	-0,72	-2,16	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-F-CASA 3	-1,00	0,95	0,30	0,30	-0,09	-2,25	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-F-CASA 4	-1,00	2,55	0,30	0,30	-0,23	-2,48	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-F-CASA 5	-1,00	2,55	0,30	0,30	-0,23	-2,71	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-F-CASA 6	-1,00	2,55	0,30	0,30	-0,23	-2,94	Descuento cobrado acta 2
27	3	P-M-F-CASA 7	-1,00	2,55	0,30	0,30	-0,23	-3,17	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,00	2,55	0,30	0,30	-0,23	-3,40	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,00	2,55	0,30	0,30	-0,23	-3,63	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,00	2,55	0,30	0,30	-0,23	-3,86	Descuento cobrado acta 2
27	3		-1,00	2,55	0,30	0,30	-0,23	-4,09	Descuento cobrado acta 2
27	3		1,00	7,98	0,30	0,40	0,96	-3,13	Eje 1 entre A-E
27	3		1,00	7,98	0,30	0,40	0,96	-2,17	Eje 3 entre A-E
27	3		1,00	7,98	0,30	0,40	0,96	-1,21	Eje 4 entre A-E
27	3		1,00	0,95	0,30	0,40	0,11	-1,10	Eje 2 entre B-C
27	3		1,00	2,55	0,30	0,40	0,31	-0,79	Eje A entre 1-3
27	3		1,00	2,55	0,30	0,40	0,31	-0,48	Eje A entre 3-4
27	3		1,00	2,55	0,30	0,40	0,31	-0,17	Eje B entre 1-3
27	3		1,00	2,55	0,30	0,40	0,31	0,14	Eje C entre 1-3
27	3		1,00	2,55	0,30	0,40	0,31	0,45	Eje C entre 3-4
27	3		1,00	2,55	0,30	0,40	0,31	0,76	Eje D entre 3-4
27	3		1,00	2,55	0,30	0,40	0,31	1,07	Eje E entre 1-3
27	3		1,00	2,55	0,30	0,40	0,31	1,38	Eje E entre 3-4
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
							0,00	1,38	
						TOTAL PRE-ACTA		1,38	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 6
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	2,82	2,56		7,22	7,22	Eje A-B entre 1-3
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	2,82	3,78		10,66	17,88	Eje A-C entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	1,90	1,10		2,09	19,97	Eje B-C entre 1-2
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	0,80	1,34		1,07	21,04	Eje B-C entre 2-3
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	2,82	3,84		10,83	31,87	Eje C-E entre 1-3
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	2,82	2,56		7,22	39,09	Eje C-D entre 3-4
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	2,82	1,28		3,61	42,70	Eje D-E entre 3-4
		P-M-F-CASA 5					0,00	42,70	
		P-M-F-CASA 6					0,00	42,70	
		P-M-F-CASA 7					0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							TOTAL PRE-ACTA	42,70	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 7	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM 6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	-3,00	0,75			-2,25	-2,25	Eje 1,3,4 con eje B cobrado acta 2
27	3	G-M-F CASA 3	-3,00	1,03			-3,09	-5,34	Eje 1,3,4 con eje C cobrado acta 2
27	3	G-M-F CASA 4	3,00	0,99			2,97	-2,37	Eje 1,3,4 con eje C
27	3	G-M-F CASA 5	3,00	0,66			1,98	-0,39	Eje 1,3,4 con eje B
		G-M-F CASA 6					0,00	-0,39	
		G-M-F CASA 7					0,00	-0,39	
		G-M-F CASA 8					0,00	-0,39	
		G-M-F CASA 9					0,00	-0,39	
		G-M-F CASA 10					0,00	-0,39	
		G-M-F CASA 11					0,00	-0,39	
		G-M-F CASA 12					0,00	-0,39	
		G-M-F CASA 13					0,00	-0,39	
		G-M-F CASA 14					0,00	-0,39	
		P-M-G-CASA 4					0,00	-0,39	
		P-M-G-CASA 5					0,00	-0,39	
		P-M-G-CASA 6					0,00	-0,39	
		P-M-G-CASA 7					0,00	-0,39	
		P-M-G-CASA 8					0,00	-0,39	
		P-M-G-CASA 9					0,00	-0,39	
		P-M-G-CASA 10					0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
							0,00	-0,39	
						TOTAL PRE-ACTA		-0,39	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 8
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	3,00	0,66			1,98	1,98	Eje 1,3,4 con eje B Columna Cuchilla
27	3	G-M-F CASA 15	3,00	0,99			2,97	4,95	Eje 1,3,4 con eje C Columna Cuchilla
27	3	G-M-F CASA 16	3,00	0,34			1,02	5,97	Eje 1,3,4 con eje D Columna Cuchilla
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
							0,00	5,97	
						TOTAL PRE-ACTA		5,97	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 9
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	3,00	0,66			1,98	1,98	Eje 1,3,4 con eje B Columna Cuchilla
27	3	P-M-F-CASA 1	3,00	0,99			2,97	4,95	Eje 1,3,4 con eje C Columna Cuchilla
27	3	P-M-F-CASA 2	3,00	0,34			1,02	5,97	Eje 1,3,4 con eje D Columna Cuchilla
27	3	P-M-F-CASA 3	15,00	2,40			36,00	41,97	confinamiento muros de VC a VA
		P-M-F-CASA 4					0,00	41,97	
		P-M-F-CASA 5					0,00	41,97	
		P-M-F-CASA 6					0,00	41,97	
		P-M-F-CASA 7					0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							0,00	41,97	
							TOTAL PRE-ACTA	41,97	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 10
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,03 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	8,28			8,28	8,28	Eje 1 entre A-E
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	8,28			8,28	16,56	Eje 3 entre A-E
27	3	G-M-F CASA 14	1,00	8,28			8,28	24,84	Eje 4 entre A-E
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	1,34			1,34	26,18	Eje 2 entre B-C
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	2,82			2,82	29,00	Eje A entre 1-3
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	2,82			2,82	31,82	Eje A entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	2,82			2,82	34,64	Eje B entre 1-3
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	2,82			2,82	37,46	Eje C entre 1-3
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	2,82			2,82	40,28	Eje C entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	2,82			2,82	43,10	Eje D entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	2,82			2,82	45,92	Eje E entre 1-3
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	2,82			2,82	48,74	Eje E entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	-48,23			-48,23	0,51	menos ANEXO 10 Acta 02 ó ANEXO 5 Acta 01
		G-M-F CASA 6					0,00	0,51	
		G-M-F CASA 4					0,00	0,51	
		P-M-G-CASA 4					0,00	0,51	
		P-M-G-CASA 5					0,00	0,51	
		P-M-G-CASA 6					0,00	0,51	
		P-M-G-CASA 7					0,00	0,51	
		P-M-G-CASA 8					0,00	0,51	
		P-M-G-CASA 9					0,00	0,51	
		P-M-G-CASA 10					0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
							0,00	0,51	
						TOTAL PRE-ACTA		0,51	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 11	

CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,03 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	8,28			8,28	8,28	Eje 1 entre A-E
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	8,28			8,28	16,56	Eje 3 entre A-E
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	8,28			8,28	24,84	Eje 4 entre A-E
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	1,34			1,34	26,18	Eje 2 entre B-C
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	2,82			2,82	29,00	Eje A entre 1-3
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	2,82			2,82	31,82	Eje A entre 3-4
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	2,82			2,82	34,64	Eje B entre 1-3
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	2,82			2,82	37,46	Eje C entre 1-3
27	3		1,00	2,82			2,82	40,28	Eje C entre 3-4
27	3		1,00	2,82			2,82	43,10	Eje D entre 3-4
27	3		1,00	2,82			2,82	45,92	Eje E entre 1-3
27	3		1,00	2,82			2,82	48,74	Eje E entre 3-4
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							0,00	48,74	
							TOTAL PRE-ACTA	48,74	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 12
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,04 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. **UNIDAD** ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	4,18			4,18	4,18	Viga cinta Eje 1,3 entre C-E
27	3	G-M-F CASA 3	-1,00	3,02			-3,02	1,16	Menos tramo viga cinta Eje 4 entre C-D
27	3	G-M-F CASA 4	-1,00	2,40			-2,40	-1,24	Menos columneta h= 2,40 muro cocina
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	1,00			1,00	-0,24	Columneta muro cocina comedor
		G-M-F CASA 6					0,00	-0,24	
		G-M-F CASA 7					0,00	-0,24	
		G-M-F CASA 8					0,00	-0,24	
		G-M-F CASA 9					0,00	-0,24	
		G-M-F CASA 10					0,00	-0,24	
		G-M-F CASA 11					0,00	-0,24	
		G-M-F CASA 12					0,00	-0,24	
		G-M-F CASA 13					0,00	-0,24	
		G-M-F CASA 14					0,00	-0,24	
		P-M-G-CASA 4					0,00	-0,24	
		P-M-G-CASA 5					0,00	-0,24	
		P-M-G-CASA 6					0,00	-0,24	
		P-M-G-CASA 7					0,00	-0,24	
		P-M-G-CASA 8					0,00	-0,24	
		P-M-G-CASA 9					0,00	-0,24	
		P-M-G-CASA 10					0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
							0,00	-0,24	
						TOTAL PRE-ACTA	-0,24		

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 13
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	3,00	4,41			13,23	13,23	Viga cinta Eje 1,3,4 entre A-C
27	3	G-M-F CASA 15	3,00	4,18			12,54	25,77	Viga cinta Eje 1,3 entre C-E
27	3	G-M-F CASA 16	2,00	1,20			2,40	28,17	Alfajia Eje A entre 1-3 ventana alc 1
27	3		1,00	0,90			0,90	29,07	Alfajia Eje A 3-4 Puerta sala
27	3		2,00	1,20			2,40	31,47	Alfajia Eje A 3-4 ventana sala
27	3		1,00	1,82			1,82	33,29	Alfajia Eje C 3-4 muro cocina
27	3		1,00	0,90			0,90	34,19	Alfajia Eje D 3-4 Puerta cocina
27	3		2,00	1,00			2,00	36,19	Alfajia Eje D 3-4 Ventana cocina
27	3		2,00	1,10			2,20	38,39	Alfajia Eje 3 entre D-E Ventana alc 2
27	3		1,00	0,70			0,70	39,09	Alfajia Eje 2 entre B-C Puerta baño
27	3		-1,00	2,40			-2,40	36,69	Menos columneta h= 2,40
27	3		1,00	1,00			1,00	37,69	Columneta muro cocina comedor
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
							0,00	37,69	
						TOTAL PRE-ACTA		37,69	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	**ANEXO # 14**
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	6,04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	UNIDAD	ml

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	N/A	N/A	Unidad (ml)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	3,00	4,41			13,23	13,23	Viga cinta Eje 1,3,4 entre A-C
27	3	P-M-F-CASA 1	3,00	4,18			12,54	25,77	Viga cinta Eje 1,3 entre C-E
27	3	P-M-F-CASA 2	2,00	1,20			2,40	28,17	Alfajia Eje A entre 1-3 ventana alc 1
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	0,90			0,90	29,07	Alfajia Eje A 3-4 Puerta sala
27	3	P-M-F-CASA 4	2,00	1,20			2,40	31,47	Alfajia Eje A 3-4 ventana sala
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	1,82			1,82	33,29	Alfajia Eje C 3-4 muro cocina
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	0,90			0,90	34,19	Alfajia Eje D 3-4 Puerta cocina
27	3	P-M-F-CASA 7	2,00	1,00			2,00	36,19	Alfajia Eje D 3-4 Ventana cocina
27	3		2,00	1,10			2,20	38,39	Alfajia Eje 3 entre D-E Ventana alc 2
27	3		1,00	0,70			0,70	39,09	Alfajia Eje 2 entre B-C Puerta baño
27	3		9,00	2,40			21,60	60,69	Columnetas h= 2,40
27	3		1,00	1,00			1,00	61,69	Columneta muro cocina comedor
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							0,00	61,69	
							TOTAL PRE-ACTA	61,69	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 15
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,06 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM | **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	2,82	2,56		7,22	7,22	Eje A-B entre 1-3
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	2,82	3,78		10,66	17,88	Eje A-C entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	1,90	1,10		2,09	19,97	Eje B-C entre 1-2
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	0,80	1,34		1,07	21,04	Eje B-C entre 2-3
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	2,82	3,84		10,83	31,87	Eje C-E entre 1-3
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	2,82	2,56		7,22	39,09	Eje C-D entre 3-4
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	2,82	1,28		3,61	42,70	Eje D-E entre 3-4
		P-M-F-CASA 5					0,00	42,70	
		P-M-F-CASA 6					0,00	42,70	
		P-M-F-CASA 7					0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							0,00	42,70	
							TOTAL PRE-ACTA	42,70	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 16	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM 6,07 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD** Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	-12,00	1,20	1,00		-14,40	-14,40	Columna Eje D(de viga a cuchilla)cobrado en acta 2
27	3	G-M-F CASA 16	-12,00	1,60	1,00		-19,20	-33,60	Columna Eje B (de viga a cuchilla)cobrado en acta 2
27	3	G-M-F CASA 15	-12,00	2,00	1,00		-24,00	-57,60	Columna Eje C (de viga a cuchilla)cobrado en acta 2
27	3	G-M-F CASA 14	12,00	0,39	1,00		4,68	-52,92	Columna Eje D (de viga a cuchilla)
27	3	G-M-F CASA 13	12,00	0,79	1,00		9,48	-43,44	Columna Eje B (de viga a cuchilla)
27	3	G-M-F CASA 12	12,00	1,12	1,00		13,44	-30,00	Columna Eje C (de viga a cuchilla)
		G-M-F CASA 11					0,00	-30,00	
		G-M-F CASA 10					0,00	-30,00	
		G-M-F CASA 9					0,00	-30,00	
		G-M-F CASA 8					0,00	-30,00	
		G-M-F CASA 7					0,00	-30,00	
		G-M-F CASA 6					0,00	-30,00	
		G-M-F CASA 5					0,00	-30,00	
		G-M-F CASA 4					0,00	-30,00	
		G-M-F CASA 3					0,00	-30,00	
		P-M-G-CASA 10					0,00	-30,00	
		P-M-G-CASA 9					0,00	-30,00	
		P-M-G-CASA 8					0,00	-30,00	
		P-M-G-CASA 7					0,00	-30,00	
		P-M-G-CASA 6					0,00	-30,00	
		P-M-G-CASA 5					0,00	-30,00	
		P-M-G-CASA 4					0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							0,00	-30,00	
							TOTAL PRE-ACTA	-30,00	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 17	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,07 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD** Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	6,00	5,88	1,00		35,28	35,28	VA Eje 1,3,4 entre A-C
27	3	P-M-F-CASA 1	6,00	3,42	1,00		20,52	55,80	VA Eje 1,3,4 entre C-E
27	3	P-M-F-CASA 2	6,00	2,50	1,00		15,00	70,80	VA Eje 1,3,4 entre A-B
27	3	P-M-F-CASA 3	6,00	6,80	1,00		40,80	111,60	VA Eje 1,3,4 entre B-E
27	3	P-M-F-CASA 4	6,00	4,56	1,00		27,36	138,96	VA Eje A,C,E entre 1-3
27	3	P-M-F-CASA 5	6,00	2,46	1,00		14,76	153,72	VA Eje A,C,E entre 3-4
27	3	P-M-F-CASA 6	6,00	2,46	1,00		14,76	168,48	VA Eje A,C,E entre 1-3
27	3	P-M-F-CASA 7	6,00	4,56	1,00		27,36	195,84	VA Eje A,C,E entre 3-4
27	3		4,00	1,74	1,00		6,96	202,80	VA Eje 2 Entre B-C
27	3		4,00	3,40	1,00		13,60	216,40	VA Eje B entre 1-3
27	3		4,00	3,40	1,00		13,60	230,00	VA Eje D entre 3-4
27	3		12,00	0,39	1,00		4,68	234,68	Columna Eje D (de viga a cuchilla)
27	3		12,00	0,79	1,00		9,48	244,16	Columna Eje B (de viga a cuchilla)
27	3		12,00	1,12	1,00		13,44	257,60	Columna Eje C (de viga a cuchilla)
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
							0,00	257,60	
						TOTAL PRE-ACTA		257,60	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 18	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	2,00	5,50	0,56		6,16	6,16	Eje 1 Entre A-C Viga Cinta
27	3	G-M-F CASA 16	2,00	5,50	0,56		6,16	12,32	Eje 3 Entre A-C Viga Cinta
27	3	G-M-F CASA 15	2,00	5,50	0,56		6,16	18,48	Eje 4 Entre A-C Viga Cinta
27	3	G-M-F CASA 14	2,00	4,78	0,56		5,35	23,83	Eje 1 Entre C-E Viga Cinta
27	3	G-M-F CASA 13	2,00	4,78	0,56		5,35	29,18	Eje 3 Entre C-E Viga Cinta
27	3	G-M-F CASA 12	2,00	4,78	0,56		5,35	34,53	Eje 4 Entre C-D Viga Cinta
27	3	G-M-F CASA 11	2,00	1,40	0,56		1,57	36,10	Eje A Entre 1-3 alfajias ventana alcoba 1
27	3	G-M-F CASA 10	2,00	1,40	0,56		1,57	37,67	Eje A Entre 3-4 alfajias ventana sala
27	3	G-M-F CASA 9	2,00	1,20	0,56		1,34	39,01	Eje D entre 3-4 Alfajias ventana cocina
27	3	G-M-F CASA 8	2,00	1,30	0,56		1,46	40,47	Eje 3 Entre D-E Alfajias ventana alcoba 2
27	3	G-M-F CASA 7	2,00	2,00	0,56		2,24	42,71	Eje C Entre 3-4 Alfajia muro cocina
27	3	G-M-F CASA 6	2,00	2,10	0,56		2,35	45,06	Eje 1 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3	G-M-F CASA 5	2,00	2,10	0,56		2,35	47,41	Eje 3 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3	G-M-F CASA 4	2,00	2,10	0,56		2,35	49,76	Eje 4 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3	G-M-F CASA 3	2,00	1,80	0,56		2,02	51,78	Eje 1 Entre C-E Viga Cinta Anclaje correas
27	3	P-M-G-CASA 4	2,00	1,80	0,56		2,02	53,80	Eje 3 Entre C-E Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	1,80	0,56		2,02	55,82	Eje 4 Entre C-D Viga Cinta Anclaje correas
27	3		-1,00	45,12	1,00		-45,12	10,70	Menos ANEXO 17 Acta 02 Viga cinta + Alfajias
27	3		-1,00	1,98	1,00		-1,98	8,72	Menos mayor unidad cobrada en Acta 2
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
							0,00	8,72	
						TOTAL PRE-ACTA		8,72	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 19	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,08 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	2,00	5,50	0,56		6,16	6,16	Eje 1 Entre A-C Viga Cinta
27	3	P-M-G-CASA 5	2,00	5,50	0,56		6,16	12,32	Eje 3 Entre A-C Viga Cinta
27	3	P-M-G-CASA 6	2,00	5,50	0,56		6,16	18,48	Eje 4 Entre A-C Viga Cinta
27	3	P-M-G-CASA 7	2,00	4,78	0,56		5,35	23,83	Eje 1 Entre C-E Viga Cinta
27	3	P-M-G-CASA 8	2,00	4,78	0,56		5,35	29,18	Eje 3 Entre C-E Viga Cinta
27	3	P-M-G-CASA 9	2,00	4,78	0,56		5,35	34,53	Eje 4 Entre C-D Viga Cinta
27	3	P-M-G-CASA 10	2,00	1,40	0,56		1,57	36,10	Eje A Entre 1-3 alfajias ventana alcoba 1
27	3		2,00	1,40	0,56		1,57	37,67	Eje A Entre 3-4 alfajias ventana sala
27	3		2,00	1,10	0,56		1,23	38,90	Eje A Entre 3-4 alfajias puertas entrada
27	3		2,00	1,20	0,56		1,34	40,24	Eje D entre 3-4 Alfajias ventana cocina
27	3		2,00	1,10	0,56		1,23	41,47	Eje D entre 3-4 Alfajias puerta cocina
27	3		2,00	1,30	0,56		1,46	42,93	Eje 3 Entre D-E Alfajias ventana alcoba 2
27	3		2,00	0,90	0,56		1,01	43,94	Eje 2 Entre B-C Alfajia Puerta baño
27	3		2,00	2,00	0,56		2,24	46,18	Eje C Entre 3-4 Alfajia muro cocina
27	3		2,00	2,10	0,56		2,35	48,53	Eje 1 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	2,10	0,56		2,35	50,88	Eje 3 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	2,10	0,56		2,35	53,23	Eje 4 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	1,80	0,56		2,02	55,25	Eje 1 Entre C-E Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	1,80	0,56		2,02	57,27	Eje 3 Entre C-E Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	1,80	0,56		2,02	59,29	Eje 4 Entre C-D Viga Cinta Anclaje correas
27	3		-1,00	1,98	1,00		-1,98	57,31	correcion columneta muro cocina
27	3		-3,32	45,12	1,00		-149,80	-92,49	Menos mayor unidad cobrada en ANEXO 17 Acta 02
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
							0,00	-92,49	
						TOTAL PRE-ACTA		-92,49	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 20	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	2,00	5,50	0,56		6,16	6,16	Eje 1 Entre A-C Viga Cinta
27	3	P-M-F-CASA 1	2,00	5,50	0,56		6,16	12,32	Eje 3 Entre A-C Viga Cinta
27	3	P-M-F-CASA 2	2,00	5,50	0,56		6,16	18,48	Eje 4 Entre A-C Viga Cinta
27	3	P-M-F-CASA 3	2,00	4,78	0,56		5,35	23,83	Eje 1 Entre C-E Viga Cinta
27	3	P-M-F-CASA 4	2,00	4,78	0,56		5,35	29,18	Eje 3 Entre C-E Viga Cinta
27	3	P-M-F-CASA 5	2,00	4,78	0,56		5,35	34,53	Eje 4 Entre C-D Viga Cinta
27	3	P-M-F-CASA 6	2,00	1,40	0,56		1,57	36,10	Eje A Entre 1-3 alfajias ventana alcoba 1
27	3	P-M-F-CASA 7	2,00	1,40	0,56		1,57	37,67	Eje A Entre 3-4 alfajias ventana sala
27	3		2,00	1,20	0,56		1,34	39,01	Eje D entre 3-4 Alfajias ventana cocina
27	3		2,00	1,30	0,56		1,46	40,47	Eje 3 Entre D-E Alfajias ventana alcoba 2
27	3		2,00	2,00	0,56		2,24	42,71	Eje C Entre 3-4 Alfajia muro cocina
27	3		2,00	2,10	0,56		2,35	45,06	Eje 1 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	2,10	0,56		2,35	47,41	Eje 3 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	2,10	0,56		2,35	49,76	Eje 4 Entre A-C Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	1,80	0,56		2,02	51,78	Eje 1 Entre C-E Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	1,80	0,56		2,02	53,80	Eje 3 Entre C-E Viga Cinta Anclaje correas
27	3		2,00	1,80	0,56		2,02	55,82	Eje 4 Entre C-D Viga Cinta Anclaje correas
27	3		-1,00	1,98	1,00		-1,98	53,84	correcion columneta muro cocina
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
							0,00	53,84	
						TOTAL PRE-ACTA		53,84	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 21	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,09 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2** **UNIDAD Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	34,00	1,03	0,25		8,76	8,76	VC eje 1 entre A-E
27	3	G-M-F CASA 16	34,00	1,03	0,25		8,76	17,52	VC eje 3 entre B-C
27	3	G-M-F CASA 15	34,00	1,03	0,25		8,76	26,28	VC eje 4 entre C-D
27	3	G-M-F CASA 14	5,00	1,03	0,25		1,29	27,57	VC eje 2 entre B-C
27	3	G-M-F CASA 13	13,00	1,03	0,25		3,35	30,92	VC eje B entre 1-3
27	3	G-M-F CASA 12	13,00	1,03	0,25		3,35	34,27	VC eje D entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 11	26,00	1,03	0,25		6,70	40,97	VC eje A entre 1-4
27	3	G-M-F CASA 10	26,00	1,03	0,25		6,70	47,67	VC eje C entre 1-4
27	3	G-M-F CASA 9	26,00	1,03	0,25		6,70	54,37	VC eje E entre 1-4
27	3	G-M-F CASA 8	345,00	0,51	0,25		43,99	98,36	15 Columnas x 23 flejes
27	3	G-M-F CASA 7	120,00	0,17	0,25		5,10	103,46	10 columnetas x 12 flejes
27	3	G-M-F CASA 6	67,00	0,55	0,25		9,21	112,67	VA eje 1 entre A-E
27	3	G-M-F CASA 5	67,00	0,55	0,25		9,21	121,88	VA eje 3 entre A-E
27	3	G-M-F CASA 4	67,00	0,55	0,25		9,21	131,09	VA eje 4 entre A-E
27	3	G-M-F CASA 3	20,00	0,55	0,25		2,75	133,84	VA eje B entre 1-2
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	140,44	VA eje A entre 1-4
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	147,04	VA eje C entre 1-4
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	153,64	VA eje E entre 1-4
27	3		10,00	0,55	0,25		1,38	155,02	VA eje 2 entre B-C
27	3		20,00	0,55	0,25		2,75	157,77	VA eje D entre 3-4
27	3		6,00	0,51	0,25		0,77	158,54	Eje D con eje 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		12,00	0,51	0,25		1,53	160,07	Eje B Con 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		15,00	0,51	0,25		1,91	161,98	Eje C con 1.3.4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	162,24	Eje A entre 1-2 alfajias ventana alcoba 1
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	162,50	Eje A entre 3-4 alfajias ventana sala
27	3		9,00	0,17	0,25		0,38	162,88	Eje C entre 3-4 Alfajia muro cocina
27	3		5,00	0,17	0,25		0,21	163,09	Eje D entre 3-4 Alfajias ventana cocina
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	163,35	Eje 3 entre D-E Alfajias ventana alcoba 2
27	3		66,00	0,17	0,25		2,81	166,16	Viga cinta Eje 1,3,4 entre A-C Frontal
27	3		63,00	0,17	0,25		2,68	168,84	Viga cinta Eje 1,3 entre C-E Posterior
27	3		-1,00	173,03	1,00		-173,03	-4,19	Menos ANEXO 8 Acta 01 VC+VA, Col y columnetas
27	3		-1,00	6,53	1,00		-6,53	-10,72	Menos ANEXO 18 Acta 02 Col cuchillas + Alfajias
							0,00	-10,72	
							0,00	-10,72	
							0,00	-10,72	
							0,00	-10,72	
							0,00	-10,72	
							0,00	-10,72	
							0,00	-10,72	
							0,00	-10,72	
						TOTAL PRE-ACTA		-10,72	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 22	
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376	
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.	
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E	
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824	

ITEM	6,09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	UNIDAD	Kg

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (plg)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	34,00	1,03	0,25		8,76	8,76	VC eje 1 entre A-E
27	3	P-M-G-CASA 4	34,00	1,03	0,25		8,76	17,52	VC eje 3 entre B-C
27	3	P-M-G-CASA 5	34,00	1,03	0,25		8,76	26,28	VC eje 4 entre C-D
27	3	P-M-G-CASA 6	5,00	1,03	0,25		1,29	27,57	VC eje 2 entre B-C
27	3	P-M-G-CASA 7	13,00	1,03	0,25		3,35	30,92	VC eje B entre 1-3
27	3	P-M-G-CASA 8	13,00	1,03	0,25		3,35	34,27	VC eje D entre 3-4
27	3	P-M-G-CASA 9	26,00	1,03	0,25		6,70	40,97	VC eje A entre 1-4
27	3	P-M-G-CASA 10	26,00	1,03	0,25		6,70	47,67	VC eje C entre 1-4
27	3		26,00	1,03	0,25		6,70	54,37	VC eje E entre 1-4
27	3		345,00	0,51	0,25		43,99	98,36	15 Columnas x 23 flejes
27	3		120,00	0,17	0,25		5,10	103,46	10 columnetas x 12 flejes
27	3		67,00	0,55	0,25		9,21	112,67	VA eje 1 entre A-E
27	3		67,00	0,55	0,25		9,21	121,88	VA eje 3 entre A-E
27	3		67,00	0,55	0,25		9,21	131,09	VA eje 4 entre A-E
27	3		20,00	0,55	0,25		2,75	133,84	VA eje B entre 1-2
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	140,44	VA eje A entre 1-4
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	147,04	VA eje C entre 1-4
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	153,64	VA eje E entre 1-4
27	3		10,00	0,55	0,25		1,38	155,02	VA eje 2 entre B-C
27	3		20,00	0,55	0,25		2,75	157,77	VA eje D entre 3-4
27	3		6,00	0,51	0,25		0,77	158,54	Eje D con eje 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		12,00	0,51	0,25		1,53	160,07	Eje B Con 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		15,00	0,51	0,25		1,91	161,98	Eje C con 1.3.4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	162,24	Eje A entre 1-2 alfajias ventana alcoba 1
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	162,50	Eje A entre 3-4 alfajias ventana sala
27	3		9,00	0,17	0,25		0,38	162,88	Eje C entre 3-4 Alfajia muro cocina
27	3		5,00	0,17	0,25		0,21	163,09	Eje D entre 3-4 Alfajias ventana cocina
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	163,35	Eje 3 entre D-E Alfajias ventana alcoba 2
27	3		66,00	0,17	0,25		2,81	166,16	Viga cinta Eje 1,3,4 entre A-C Frontal
27	3		63,00	0,17	0,25		2,68	168,84	Viga cinta Eje 1,3 entre C-E Posterior
27	3		-1,00	59,08	1,00		-59,08	109,76	Menos ANEXO 9 Acta 01 VC
27	3		-1,00	40,86	1,00		-40,86	68,90	Menos ANEXO 19 Acta 02 Columnas y columnetas
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
						TOTAL PRE-ACTA		68,90	

CONTRATISTA

V0.B0 INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 23	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 6,09 — **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2** — **UNIDAD Kg**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Peso (Kg/m)	Diametro (pig)	Unidad (Kg)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	34,00	1,03	0,25		8,76	8,76	VC eje 1 entre A-E
27	3	P-M-F-CASA 1	34,00	1,03	0,25		8,76	17,52	VC eje 3 entre B-C
27	3	P-M-F-CASA 2	34,00	1,03	0,25		8,76	26,28	VC eje 4 entre C-D
27	3	P-M-F-CASA 3	5,00	1,03	0,25		1,29	27,57	VC eje 2 entre B-C
27	3	P-M-F-CASA 4	13,00	1,03	0,25		3,35	30,92	VC eje B entre 1-3
27	3	P-M-F-CASA 5	13,00	1,03	0,25		3,35	34,27	VC eje D entre 3-4
27	3	P-M-F-CASA 6	26,00	1,03	0,25		6,70	40,97	VC eje A entre 1-4
27	3	P-M-F-CASA 7	26,00	1,03	0,25		6,70	47,67	VC eje C entre 1-4
27	3		26,00	1,03	0,25		6,70	54,37	VC eje E entre 1-4
27	3		345,00	0,51	0,25		43,99	98,36	15 Columnas x 23 flejes
27	3		120,00	0,17	0,25		5,10	103,46	10 columnetas x 12 flejes
27	3		67,00	0,55	0,25		9,21	112,67	VA eje 1 entre A-E
27	3		67,00	0,55	0,25		9,21	121,88	VA eje 3 entre A-E
27	3		67,00	0,55	0,25		9,21	131,09	VA eje 4 entre A-E
27	3		20,00	0,55	0,25		2,75	133,84	VA eje B entre 1-2
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	140,44	VA eje A entre 1-4
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	147,04	VA eje C entre 1-4
27	3		48,00	0,55	0,25		6,60	153,64	VA eje E entre 1-4
27	3		10,00	0,55	0,25		1,38	155,02	VA eje 2 entre B-C
27	3		20,00	0,55	0,25		2,75	157,77	VA eje D entre 3-4
27	3		6,00	0,51	0,25		0,77	158,54	Eje D con eje 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		12,00	0,51	0,25		1,53	160,07	Eje B Con 1,3,4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		15,00	0,51	0,25		1,91	161,98	Eje C con 1.3.4 Columnas Entre VA y Cuchilla
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	162,24	Eje A entre 1-2 alfajias ventana alcoba 1
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	162,50	Eje A entre 3-4 alfajias ventana sala
27	3		9,00	0,17	0,25		0,38	162,88	Eje C entre 3-4 Alfajia muro cocina
27	3		5,00	0,17	0,25		0,21	163,09	Eje D entre 3-4 Alfajias ventana cocina
27	3		6,00	0,17	0,25		0,26	163,35	Eje 3 entre D-E Alfajias ventana alcoba 2
27	3		66,00	0,17	0,25		2,81	166,16	Viga cinta Eje 1,3,4 entre A-C Frontal
27	3		63,00	0,17	0,25		2,68	168,84	Viga cinta Eje 1,3 entre C-E Posterior
27	3		-1,00	99,94	1,00		-99,94	68,90	Menos ANEXO 20 Acta 02 VC Columnas y columnetas
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
							0,00	68,90	
						TOTAL PRE-ACTA		68,90	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 24
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM	NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	UNIDAD	m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,10	2,40		17,04	17,04	Eje 1 entre A-E
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	4,94	2,40		11,86	28,90	Eje 3 entre A-D
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	1,10	1,22		1,34	30,24	Eje 3 entre D-E
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	7,10	2,40		17,04	47,28	Eje 4 entre A-D
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	1,94	2,40		4,66	51,94	Eje A entre 1-4
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	2,40	1,02		2,45	54,39	Eje A entre 1-4
27	3	G-M-F CASA 8	1,00	1,90	2,40		4,56	58,95	Eje B entre 1-2
27	3	G-M-F CASA 9	1,00	1,90	2,40		4,56	63,51	Eje C entre 1-2
27	3	G-M-F CASA 10	1,00	1,82	1,00		1,82	65,33	Eje C entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 11	1,00	0,72	2,40		1,73	67,06	Eje D entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 12	1,00	1,00	1,22		1,22	68,28	Eje D entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 13	1,00	2,82	2,40		6,77	75,05	Eje E entre 1-2
27	3	G-M-F CASA 14	3,00	3,54	0,55		5,79	80,84	Eje 1,3,4 entre A-C Cuchilla
27	3	G-M-F CASA 15	3,00	3,58	0,55		5,85	86,69	Eje 1,3 entre C-E Cuchilla
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	0,32	2,40		0,77	87,46	Eje 2 entre B-C
27	3	P-M-G-CASA 4	-1,00	75,64	1,00		-75,64	11,82	Menos Anexo 10 Acta 01
27	3	P-M-G-CASA 5	-1,00	11,51	1,00		-11,51	0,31	Menos Anexo 21 Acta 02
		P-M-G-CASA 6					0,00	0,31	Nota: Anexos 10 Act 01+21 Act 02= Anex0 23 Act 02
		P-M-G-CASA 7					0,00	0,31	
		P-M-G-CASA 8					0,00	0,31	
		P-M-G-CASA 9					0,00	0,31	
		P-M-G-CASA 10					0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							0,00	0,31	
							TOTAL PRE-ACTA	0,31	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 25	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM **NP.1** **SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)** **UNIDAD** **m2**

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,10	2,40		17,04	17,04	Eje 1 entre A-E
27	3	P-M-F-CASA 2	1,00	4,94	2,40		11,86	28,90	Eje 3 entre A-D
27	3	P-M-F-CASA 3	1,00	1,10	1,22		1,34	30,24	Eje 3 entre D-E
27	3		1,00	7,10	2,40		17,04	47,28	Eje 4 entre A-D
27	3		1,00	1,94	2,40		4,66	51,94	Eje A entre 1-4
27	3		1,00	2,40	1,02		2,45	54,39	Eje A entre 1-4
27	3		1,00	1,90	2,40		4,56	58,95	Eje B entre 1-2
27	3		1,00	1,90	2,40		4,56	63,51	Eje C entre 1-2
27	3		1,00	1,82	1,00		1,82	65,33	Eje C entre 3-4
27	3		1,00	0,72	2,40		1,73	67,06	Eje D entre 3-4
27	3		1,00	1,00	1,22		1,22	68,28	Eje D entre 3-4
27	3		1,00	2,82	2,40		6,77	75,05	Eje E entre 1-2
27	3		1,00	0,32	2,40		0,77	75,82	Eje 2 entre B-C
27	3		3,00	3,54	0,55		5,79	81,61	Eje 1,3,4 entre A-C Cuchilla
27	3		3,00	3,58	0,55		5,85	87,46	Eje 1,3-4 entre C-E Cuchilla
27	3		-1,00	75,64	1,00		-75,64	11,82	Menos Anexo 23 Acta 02
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
							0,00	11,82	
						TOTAL PRE-ACTA		11,82	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 26	

CONTRATO No: LP-SV-010-2024--04102024-1376

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO HJ&E

SUPERVISOR: CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM NP.1 — **SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)**

UNIDAD m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	7,10	2,40		17,04	17,04	Eje 1 entre A-E
27	3	P-M-F-CASA 1	1,00	4,94	2,40		11,86	28,90	Eje 3 entre A-D
27	3	P-M-F-CASA 4	1,00	1,10	1,22		1,34	30,24	Eje 3 entre D-E
27	3	P-M-F-CASA 5	1,00	7,10	2,40		17,04	47,28	Eje 4 entre A-D
27	3	P-M-F-CASA 6	1,00	1,94	2,40		4,66	51,94	Eje A entre 1-4
27	3	P-M-F-CASA 7	1,00	2,40	1,02		2,45	54,39	Eje A entre 1-4
27	3		1,00	1,90	2,40		4,56	58,95	Eje B entre 1-2
27	3		1,00	1,90	2,40		4,56	63,51	Eje C entre 1-2
27	3		1,00	1,82	1,00		1,82	65,33	Eje C entre 3-4
27	3		1,00	0,72	2,40		1,73	67,06	Eje D entre 3-4
27	3		1,00	1,00	1,22		1,22	68,28	Eje D entre 3-4
27	3		1,00	2,82	2,40		6,77	75,05	Eje E entre 1-2
27	3		1,00	0,32	2,40		0,77	75,82	Eje 2 entre B-C
27	3		3,00	3,54	0,55		5,79	81,61	Eje 1,3,4 entre A-C Cuchilla
27	3		3,00	3,58	0,55		5,85	87,46	Eje 1,3-4 entre C-E Cuchilla
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
							0,00	87,46	
						TOTAL PRE-ACTA		87,46	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 27
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 8,02 — **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** — **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	4,42	6,00		26,52	26,52	Eje A-C Entre 1-4 (Frente)
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	4,24	3,48		14,76	41,28	Eje C-E Entre 1-3 (Posterior)
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	3,09	2,61		8,06	49,34	Eje C-D Entre 3-4
27	3	G-M-F CASA 5	-1,00	0,87	1,69		-1,47	47,87	Resta Teja claraboya No 6
27	3	G-M-F CASA 6	-1,00	48,98	1,00		-48,98	-1,11	Menos Anexo 24 Acta 01
		G-M-F CASA 7					0,00	-1,11	
		G-M-F CASA 8					0,00	-1,11	
		G-M-F CASA 9					0,00	-1,11	
		G-M-F CASA 10					0,00	-1,11	
		G-M-F CASA 11					0,00	-1,11	
		G-M-F CASA 12					0,00	-1,11	
		G-M-F CASA 13					0,00	-1,11	
		G-M-F CASA 14					0,00	-1,11	
		P-M-G-CASA 5					0,00	-1,11	
		P-M-G-CASA 6					0,00	-1,11	
		P-M-G-CASA 7					0,00	-1,11	
		P-M-G-CASA 8					0,00	-1,11	
		P-M-G-CASA 9					0,00	-1,11	
		P-M-G-CASA 10					0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							0,00	-1,11	
							TOTAL PRE-ACTA	-1,11	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 28
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 8,02 **SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.** **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	4,42	6,00		26,52	26,52	Eje A-C Entre 1-4 (Frente)
27	3	G-M-F CASA 15	1,00	4,24	3,48		14,76	41,28	Eje C-E Entre 1-3 (Posterior)
27	3	G-M-F CASA 16	1,00	3,09	2,61		8,06	49,34	Eje C-D Entre 3-4
27	3	P-M-G-CASA 4	-1,00	0,87	1,69		-1,47	47,87	Resta Teja claraboya No 6
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							0,00	47,87	
							TOTAL PRE-ACTA	47,87	

CONTRATISTA

Vo.Bo INTERVENTOR

PREACTA 03	ANEXO # 29
CONTRATO No:	LP-SV-010-2024--04102024-1376
OBJETO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
CONTRATISTA	CONSORCIO HJ&E
SUPERVISOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824

ITEM 9,06 SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD. **UNIDAD** m2

Fecha medición		Frente	Medidas				Tot. medidas	Acumulado	Observaciones
Día	Mes		# Elem.	Longitud (m)	Ancho (m)	N/A	Unidad (m2)	medidas	(Actividad a la que corresponda)
27	3	APLICA EN FRENTES:	1,00	1,17	2,60		3,04	3,04	zona sanitario
27	3	G-M-F CASA 3	1,00	1,17	2,60		3,04	6,08	zona sanitario
27	3	G-M-F CASA 4	1,00	0,40	2,60		1,04	7,12	zona sanitario
27	3	G-M-F CASA 5	1,00	0,75	0,80		0,60	7,72	zona ducha
27	3	G-M-F CASA 6	1,00	0,75	0,80		0,60	8,32	zona ducha
27	3	G-M-F CASA 7	1,00	1,10	0,80		0,88	9,20	zona ducha
		G-M-F CASA 8					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 9					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 10					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 11					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 12					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 13					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 14					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 15					0,00	9,20	
		G-M-F CASA 16					0,00	9,20	
		P-M-G-CASA 4					0,00	9,20	
		P-M-G-CASA 5					0,00	9,20	
		P-M-G-CASA 6					0,00	9,20	
		P-M-G-CASA 7					0,00	9,20	
		P-M-G-CASA 8					0,00	9,20	
		P-M-G-CASA 9					0,00	9,20	
		P-M-G-CASA 10					0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
							0,00	9,20	
						TOTAL PRE-ACTA		9,20	

CONTRATISTA

Vo Bo INTERVENTOR

DEPARTAMENTO DE CALDAS

FICHA DE RADICACIÓN BANCO ÚNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y REGALÍAS

El Profesional Especializado del Banco Único de Proyectos de Inversión y Regalías, certifica que el siguiente proyecto ha sido radicado:

Proyecto: Construcción de viviendas de interés social primero tu casa en los municipios de Anserma y La Dorada, Caldas.
Sector: Vivienda, ciudad y territorio.
BPIN: 2022003170033
BPID Largo: 2022-17000-0119
BPID Corto: 220119
Aprobado: Decreto No. 496 de 13 de octubre de 2022.
Valor SGR Asignación Inversión Regional 60%: $ 3.755.758.355
Entidades privadas (ASOCAN) - Propios: $ 122.328.946
SGP Propósito General Libre Inversión – Municipio Anserma: $120.000.000
Propios – Municipio La Dorada: $919.085.859
Valor Total Proyecto: $ 4.917.173.160

Se expide en la ciudad de Manizales a los 23 días del mes de marzo del 2023.

ALFONSO REYES CARDENAS
Unidad de Inversiones Públicas y Regalías
Secretaria de Planeación Departamental

RPC No.	4500026286	**Fecha de Contabilización:**	26.09.2024
Beneficiario:	9018678551 CONSORCIO HJ&E	**Fecha Impresión:**	27.09.2024
Contrato:		**Estado Liberación:**	Contabilizado
		Página:	1 de 1

Descripción
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIMERO TU CASA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS, Lote 1

Item 1
Apropiación: 1113/2-0378/230607/7063095/I2201190 Secretaria de Planeacion SGR/ASIGNACIÓN INVERSIÓN REGIONAL 60% - DEPA/CONS VIVI NUEV RURA Y URB/
Valor: 2.526.064.367 COP
Proyecto: I.22-0119/001 Construcción de vivienda de interés soci
CDP Asociados:
3500022340
Programación PAC
SEP: 2.526.064.367

Importe total: La suma de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Nombre y Firma Solicitante	Elaboró:	Nombre y Firma Aprobador

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5625 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5625	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	2.526.064.367,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	2.526.064.367,00	**Saldo x Obligar:**	2.526.064.367,00	

TERCERO

Identificacion:	901867855	**Razon Social:**	CONSORCIO HJ&E	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	086100228237	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1053801904	**Nombre:**	JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA	**Cargo:**	SECRETARIO DE DESPACHO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.6730931	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-09-27

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	11123	**Compromiso:**	4324	**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-4001-1400-2022-00317-0033 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIMERO TU CASA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA CALDAS	Nación	AR17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-02-19	2.526.064.367,00	0,00		
Total:	2.526.064.367,00	0,00	2.526.064.367,00	2.526.064.367,00

Objeto:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIMERO TU CASA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS, LOTE 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	2.526.064.367,00	2.526.064.367,00	NINGUNO
