**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL**
(30 de diciembre de 2024)

| **CONTRATO No. IPMC-043-2024** | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | **M&T INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS**<br>NIT. 901.807.998-8<br>R/L: **FREDDY ZAMIR TELLEZ**<br>C.C No. 1.053.343.468 DE CHIQUINQUIRA |
| **SUPERVISOR** | JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA AL SERVICIO DEL SECTOR CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO** | TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | **UN (1) MES** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 10 DE ENERO DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO 1** | N/A |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | N/A |
| **VALOR INICIAL** | **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($25.723.395.00) M/CTE** |
| **VALOR ADICIONAL** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | **VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($25.723.395.00) M/CTE** |
| **FORMA DE PAGO** | Suma que el municipio cancelará de la siguiente manera:<br>pagará el valor del presente contrato, mediante actas parciales<br>previo recibo parcial y verificación del supervisor de los avances de obra.<br>Para el pago, la cuenta deberá estar acompañada de la certificación del pago de<br>obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud y |



Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| | pensiones. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a<br><br>la fecha de radicación correcta de los documentos antes mencionados junto con factura respectiva.<br><br>Todo pago está condicionado a la disponibilidad del PAC Municipal.<br><br>Incluidos todos los impuestos a que haya lugar.Para efectos de cada pago el interventor deberá adjuntar con los informes, la constancia del pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud y pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales, de la totalidad del personal asignado para la ejecución del contrato. |
| **VALOR A PAGAR** | VEINTICINCO MILLONES SETESIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($$25.717.427.00) M/CTE |


**SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO**


El día TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2024 se suscribió el contrato de obra entre el municipio de Simijaca y el contratista **M&T INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** NIT. 901.807.998-8 R/L: **FREDDY ZAMIR TELLEZ** C.C No. 1.053.343.468 DE CHIQUINQUIRA. Cumpliendo con todos los requisitos contractuales para el contrato N° **IPMC-043-2024**
Ahora bien, el proceso de ejecución no presento contratiempos en el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma dando cumplimiento parcial al objeto contractual, por lo anterior el supervisor del contrato recibe y aprueba los productos de la misma de acuerdo al informe presentado por el contratista de obra y registro fotográfico anexo en el presente informe.

**Ing. JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA**
Secretario de Planeación e Infraestructura
Simijaca – Cundinamarca




Escaneado con CamScanner

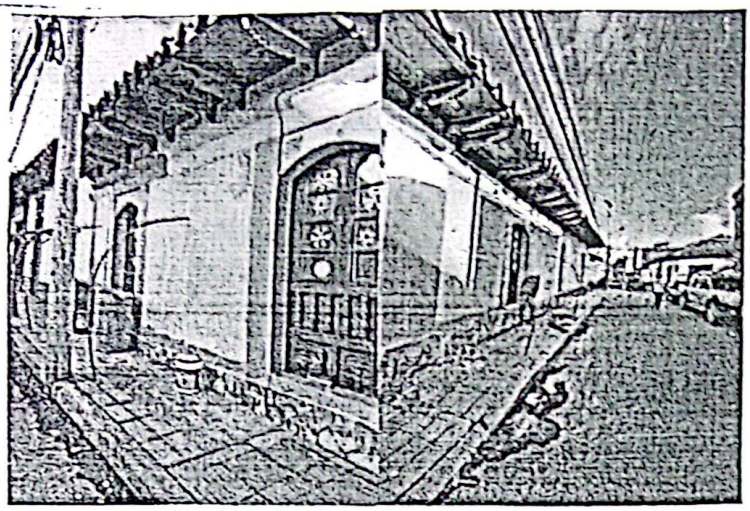

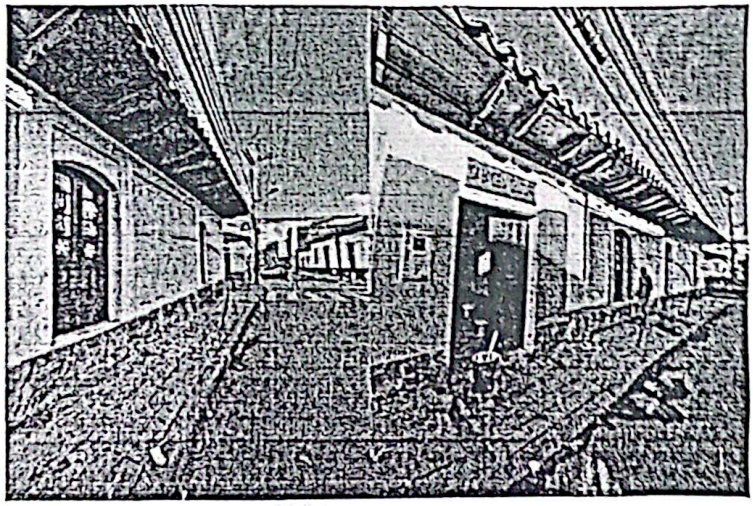



Escaneado con CamScanner

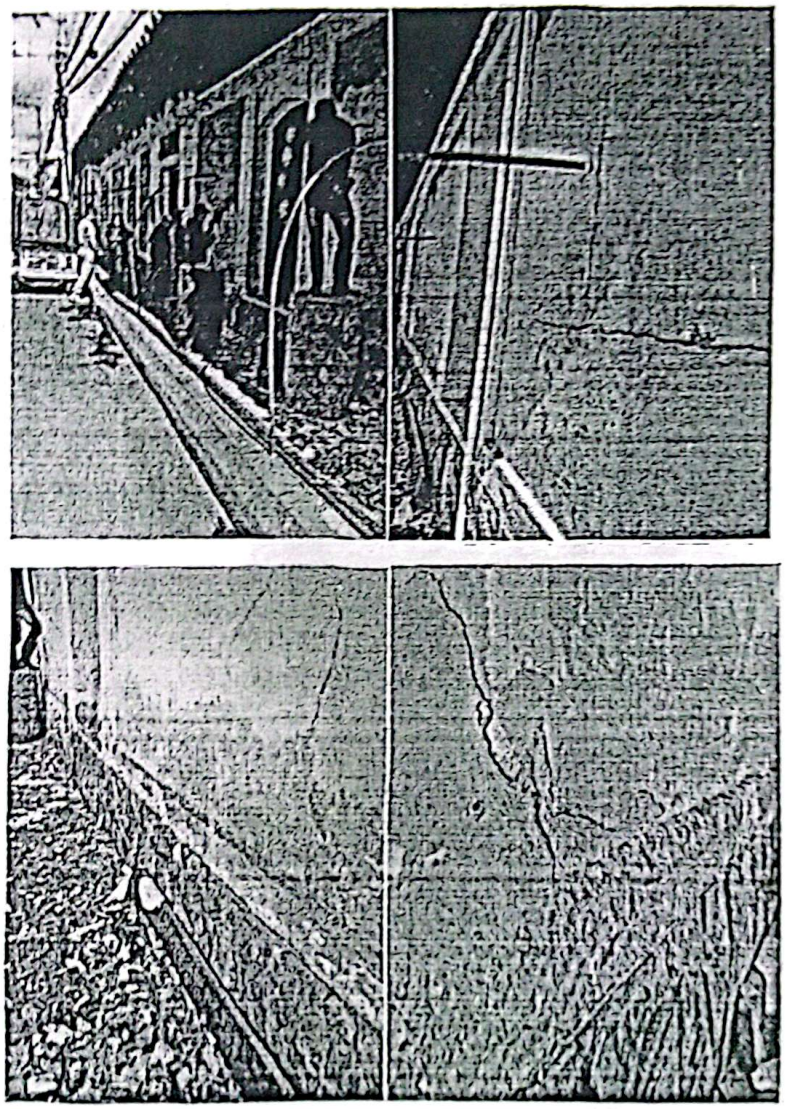



Escaneado con CamScanner
