	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 016 DE 2023 **Contratista:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Contrato de Interventoría No. 4763 de 2023 **Interventoría:** CONSORCIO SADINTECON

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

INFORME MENSUAL No. 10 **MES O PERIODO:** nov-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		11
2.1	Localización		11
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		13
2.4	Características técnicas del proyecto		17
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		22
3.1	Información general del contrato		22
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		23
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		25
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		26
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		29
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	75
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	88
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	91
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	93
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	95
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	98
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	126
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	176
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Plan de inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	179
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-2	181
	• Seguimiento Programa de Obra		184
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	191
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	193
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	195
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	211
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		53
5.1	Información general del contrato		53
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		54
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	234
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	236
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	238
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	240
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		244

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Monica Montenegro Q

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** 10

CONTRATO DE OBRA No.: 016 de 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y *2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 5/01/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/12/2024
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 23.137.768.645,10
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 4.895.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 28.032.768.645,10
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 11.568.884.300,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SANDINTECON **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	KM	10,26
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Alcantarillas	UND	24
	Boxculvert	UND	5
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	KM	2	8,5
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Alcantarillas	UND	0	24
	Boxculvert	UND	0	5
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS			
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			22.904.510.491,30
ADICIONAL EN VALOR No.1			4.895.000.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			233.258.153,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN No.1			28.032.768.645,10

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	1.303.460.195,50		1.303.460.195,50	19.390.302.120,00
AJUSTES	1.303.460.195,50			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				19.390.302.120,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	1.303.460.195,50		1.303.460.195,50	19.390.302.120,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 26.820.705.047,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 19.390.302.120,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 69,17%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 69
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **89**

REGISTRO FOTOGRÁFICO







TRAMO 1 ACTIVIDADES GENERALES CAÑO FLORES







TRAMO 2 ACTIVIDADES GENERALES PALMARITO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: JAVIER E. FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO No. 4763 DE 2023

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10

PERIODO

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CONSORCIO SADINTECON

MINISTERIO DE TRANSPORTE

IINSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 10

PERIODO

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Elaborado por:	Revisado por: JAVIER E. FUENTES CAPACHO.	Aprobado por: JAVIER E. FUENTES CAPACHO
ESNEIDER FUENTES ZÁRATE RUBEN A. BORRERO CAMPOS Cargos: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	FIRMA	FIRMA
Fecha: 30/11/2024	Fecha: 30/11/2024	Fecha: 30/11/2024

CONSORCIO SADINTECON

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 6

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 8

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8

2.2 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 10

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 14

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 19

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 19

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 20
3.2.1 TRAMO 1 – Caño Flores a Sitio nuevo, en el municipio de Fortul. 20
3.2.2 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso. 21
3.2.3 Vallas informativas. 22

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 22

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA 23

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 26

4.1 INFORME SEMANAL 26

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 32

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 32

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 32

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 32

4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO 32

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO 33

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 33

4.9 Otros Documento Seguimiento Mensual 33
4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 33

4.9.2 Seguimiento Programa de obra 33
4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones 33
4.9.4 Acta de comité de obra 49
4.9.5 Acta de reunión. 49

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 50

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 50

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. 51

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 53

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 53

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS. 53

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 54
5.6.1 CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura) 54
5.6.2 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. 54

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 55

6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 55

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 55

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 55

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 55

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 55

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO 55
6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo 55
6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado. 55
6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas a la inversion del Anticipo 55

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56

8 ANEXOS 58

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 58

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS 62

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES- SST 64

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE 69

8.5 FORMATOS 70

CONTENIDO DE TABLA

Tabla 1. Información del contrato de Obra 19
Tabla 2. Informes semanales en el mes de noviembre de 2024. 31
Tabla 3. Reuniones celebradas en el mes de noviembre de 2024. 49
Tabla 4. Reuniones celebradas en el mes de noviembre de 2024 49
Tabla 5. Información sobre el contrato de interventoría 50

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización especifica sector Vereda Palmarito (Fuente Google earth). 8
Imagen 2. Localización especifica sector Vereda Caño Flores. (Fuente Google earth). 9

1 INTRODUCCIÓN

El departamento de Arauca cuenta con 1. 730 km de red vial distribuida en 303 km de red primaria, 653 km de red secundaria y 775 km de red terciaria.

Por su parte, el municipio de Fortul en Arauca cuenta con una red vial terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal, esta red vial está conformada por 18 corredores viales que se distribuyen en los cinco distritos rurales que están conformados por 54 veredas y el distrito urbano está conformado por 14 barrios. En los distritos rurales, se localizan además seis centros poblados: Nuevo Caranal, Palmarito, El Mordisco, Puerto Nidia, Caño Flores y Sitio Nuevo.

La deficiencia vial, aunado a las extensiones geográficas que caracterizan al Departamento y a la debilidad de infraestructura productiva, ha puesto una limitante a la comercialización de la producción y a la integración tanto interna como hacia el exterior del territorio, es decir hacia otras regiones del país. A pesar de ello la producción de Arauca se direcciona hacia otras regiones como los Santanderes, Casanare, Bogotá y Venezuela de manera ilegal, principalmente; siendo de todos modos muy baja su participación en la producción total nacional que se moviliza hacia esos territorios. En el caso del comercio con Venezuela, el departamento no ha aprovechado y canalizado adecuadamente su condición de zona fronteriza, lo cual se constituye en un potencial a desarrollar, aunque hoy se encuentre restringida y las condiciones del país vecino no favorezcan el desarrollo, se debe propender por avanzar integraciones con otros países que permitan globalizar los mercados.

Las vías terciarias que comunica la zona rural Municipio de Fortul con el casco urbano y vías principales presentan un estado inadecuado, lo cual dificulta la accesibilidad y el desarrollo integral de esas veredas y de sus habitantes. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos. Se presentan también deterioro acelerado de los tratamientos efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. En cuanto al número de tiempos de viajes se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos y en cuantos al comercio se presenta disminución en la afecta de demanda de los productos de la región.

El Proyecto tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones técnicas de la vía que conduce a de la vereda Caño Flores - El milagro, San Francisco - Sitio Nuevo, y el tramo de vías que comunica las veredas Palmarito - La Paz Gaitán - Alto Jordán - El Paraíso para ofrecer la

interconexión de estas veredas con la zona urbana del Municipio de Fortul, garantizando mayor seguridad y comodidad a los habitantes para el traslado de sus productos agrícolas y pecuarios, disminuir el tiempo de movilización de los habitantes hacia el área urbana.

La selección del Contratista de obra se realizó a través del Proceso de Contratación No. LP-FRL-SPI- 009- 2023 del SECOP I y la selección de la interventoría se realizó a través del CMA-DEO-SVR-076-2023 y el número de ID del SECOP II es CO1.NTC.4900402.

El presente documento contiene **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10** correspondiente al Periodo del **01 al 30 de noviembre de 2024**, elaborado por CONSORCIO SADINTECON, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría de obras públicas del INVIAS, Versión 2022, actualización del 01 febrero de 2022 y una vez surtido el proceso de del contrato de interventoría No. 4763 de 2023, con fecha de inicio a partir del 14 de diciembre de 2023.

En este informe, se hace la descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría, se presentan los formatos de seguimiento y control, solicitados por el INVIAS y un registro fotográfico en el cual se evidencian las diferentes actividades desarrolladas durante este periodo.

El Supervisor del Contrato de Interventoría asignado es la ingeniera MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO, cuyo acto administrativo de designación es la resolución 4270 DE 27 NOVIEMBRE DEL 2023, la Gestora Técnica asignada es la ingeniera JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL:

El proyecto se localiza en el departamento de Arauca, concretamente en el municipio de Fortul, en la vía que hace parte del corredor que comunica las veredas Palmarito, Caranal, La Paz, Gaitán, Alto Jordán y Paraíso del Municipio de Fortul.



Imagen 1. Localización especifica sector Vereda Palmarito (Fuente Google earth).

LOTE 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA:

El proyecto se localiza en el departamento de Arauca, concretamente en el municipio de Fortul, en la vía que comunica las veredas de Caño Flores - Sitio Nuevo del Municipio de Fortul.

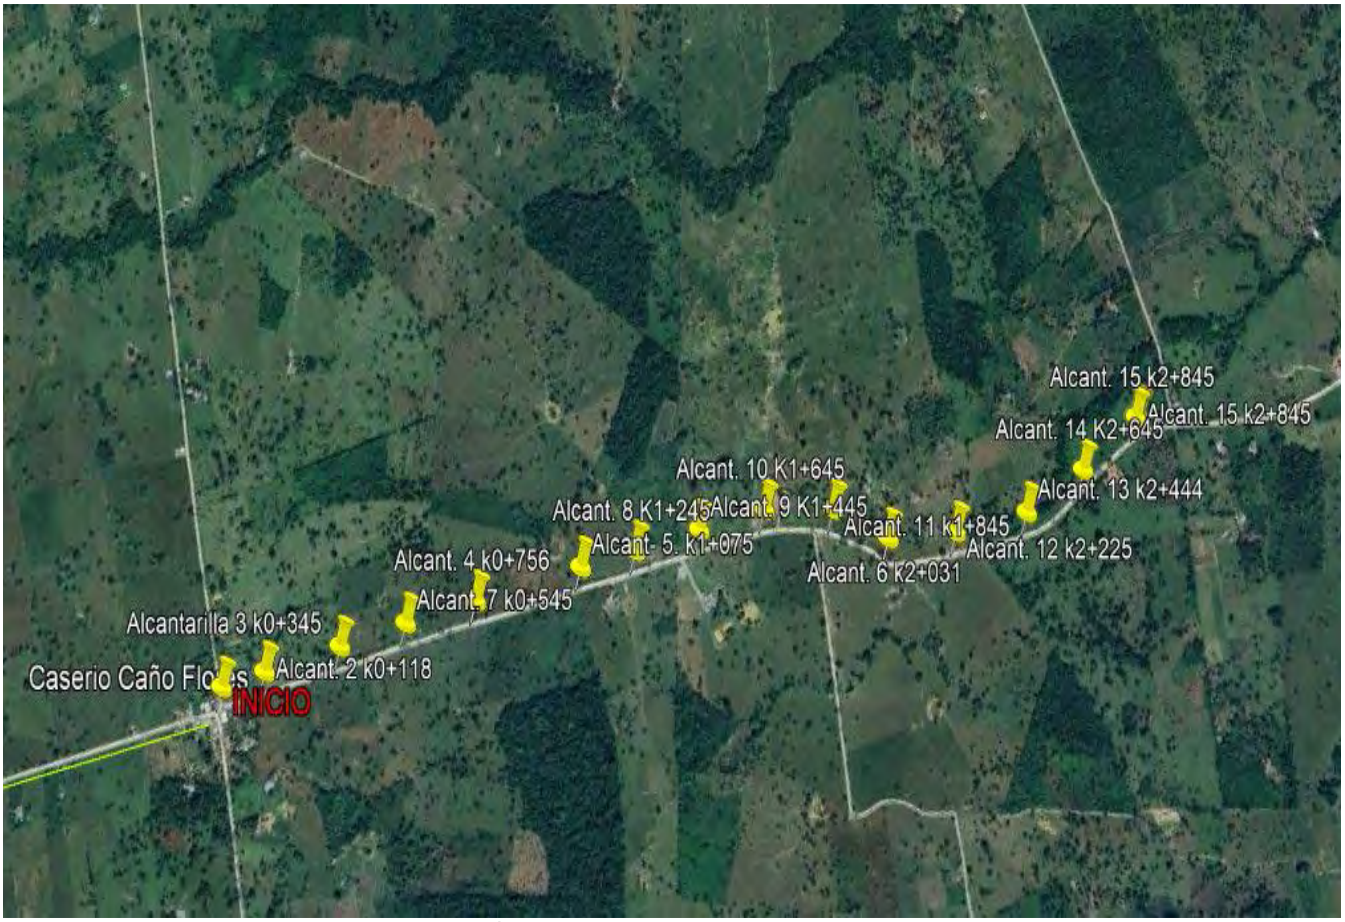


Imagen 2. Localización especifica sector Vereda Caño Flores. (Fuente Google earth).

2.2 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

A continuación, se hace una descripción de cada uno de los tramos a intervenir:

El departamento de Arauca cuenta con 1.730 km de red vial distribuida en 303 km de red primaria, 653 km de red secundaria y 775 km de red terciaria.

Por su parte, el municipio de Fortul en Arauca cuenta con una red vial terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal, esta red vial está conformada por 18 corredores viales que se distribuyen en los cinco distritos rurales que están conformados por 54 veredas y el distrito urbano está conformado por 14 barrios. En los distritos rurales, se localizan además seis centros poblados: Nuevo Caranal, Palmarito, El Mordisco, Puerto Nidia, Caño Flores y Sitio Nuevo.

Actualmente el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO presentan dificultades para la movilidad y comunicación en especial con el área urbana, debido al mal estado en el que se encuentra la superficie de rodadura, la falta de mantenimiento periódico o rutinario de las mismas por parte del Municipio. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos, aunado con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el aumento de los costos de operación y mantenimiento vial.

El aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros en la témpora de invierno afecta directamente a los pequeños productores quienes optan por perder sus cosechas debido a los altos costos de transporte para sacar la producción al casco urbano del Municipio.

A continuación, se presenta registro fotográfico donde se evidencia el avance del proyecto en el presente periodo, para cada tramo:

TRAMO 1. CAÑO FLORES:

K0+180	
	
ANTES	DESPUÉS
K0+720	
	
ANTES	DESPUÉS
K1+220	
	
ANTES	DESPUÉS

K3+630	
	
ANTES	DESPUÉS

TRAMO 2. PALMARITO:

K3+430	
	
ANTES	DESPUÉS
K3+6800	
	
ANTES	DESPUÉS

K4+005	
	
ANTES	DESPUÉS
K6+635	
	
ANTES	DESPUÉS
K6+0255	
	
ANTES	DESPUÉS

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Los tramos a intervenir pertenecen a un sector de carreteras terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal. Se divide en 2 tramos:


LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL:

La alternativa de solución plantea en el componente técnico la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,40 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, alternativa que se adapta a las condiciones geográficas y geométricas que presenta el tramo vial.

Geométricamente la vía presenta un perfil vial con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado según el diseño de la estructura del pavimento, se recomendó una unidad de diseño la cual presenta la siguiente estructura:

Unidad de diseño K0+00 al K7+400

- Ancho vía: 6.0 m
- Ancho bermas: 0.5 m
- Capa Asfáltica: 0.1O m
- Base granular: 0.15 m
- Subbase granular: 0.20 m

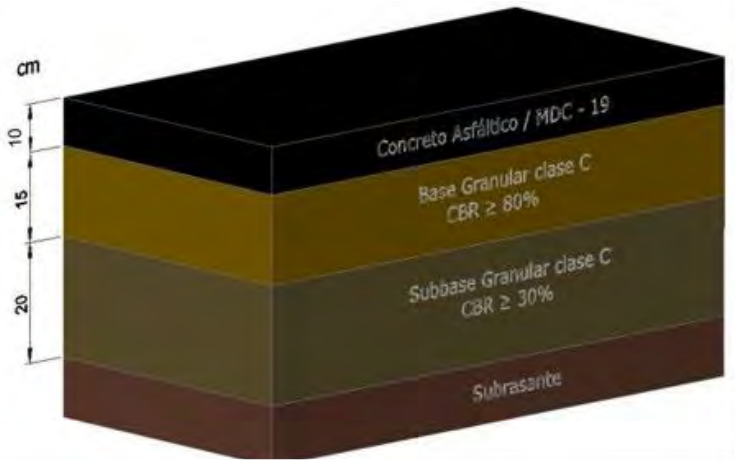

Según la modificación de obra No.3, las obras de drenaje transversal a construir en el tramo de Palmarito son:

OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+000
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 3 X1 m	K1+180
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+385
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+620
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+861
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+020
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+400
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K4+454
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+175
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+310
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K5+638
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K6+026
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K6+633

Estructuras Tipo Boxculvert y alcantarillas

El proyecto incluye la actualización a la caracterización del tramo total de la vía que comunica el caserío de Palmarito con intersección de la vía agua linda.

TRAMO A INTERVENIR	PUNTO	COORDENADA	LONGITUD KM
CASERIO PALMARITO-VEREDA EL PARAISO	INICIAL	6º44'48.01"N	7,40
		71º42'53.19"0	
	FINAL	6º47'12.83"N	
		71º401' 2.90"0	

Adicionalmente el proyecto contempla la ejecución de actividades complementarias indispensables para la correcta ejecución y operación del proyecto.

Las actividades principales se listan a continuación:

- Realizar obras de excavaciones.
- Implementar la estructura vial.
- Implementar las obras de drenaje.
- Implementar la señalización vertical y demarcación vial.
- Realizar actividades de caracterización vial implementar el PMT.
- Implementar el PAGA.
- Actividades medidas de compensación ambiental.

LOTE 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA:

Consiste en la construcción de pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías de una longitud de 2,86 km así:

La alternativa de solución plantea en el componente técnico la construcción de pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, alternativa que se adapta a las condiciones geográficas y geométricas que presenta el tramo vial.


A partir del análisis, se plantea una alternativa de estructura de pavimento utilizando la familia de estabilizantes T4 - Sales Inorgánicas, ya que el proceso de estabilización mediante la adición de este producto químico mejora de forma directa el desempeño mecánico - elástico del material, actuando como agente cementante, ligante y deflexivo en la matriz suelo - estabilizante.

El producto químico estabilizador de suelos ayuda a mejorar las propiedades mecánicas y cualitativas del suelo, mediante la interacción de las fuerzas de tensión superficial que conforman la macro estructura del suelo.

La metodología concluye que el espesor de suelo estabilizado aumenta la capacidad de soporte del suelo reemplazando posteriormente parte de la estructura de soporte del pavimento.

MODELO ESTRUCTURAL

Realizando los respectivos cálculos mediante el método AASHTO, se establece una estructura de pavimento que incluye una capa de mezcla densa en caliente (MDC-19) con un espesor de 7.5 centímetros, una capa estabilizada con sales inorgánicas con un espesor de 25 centímetros.

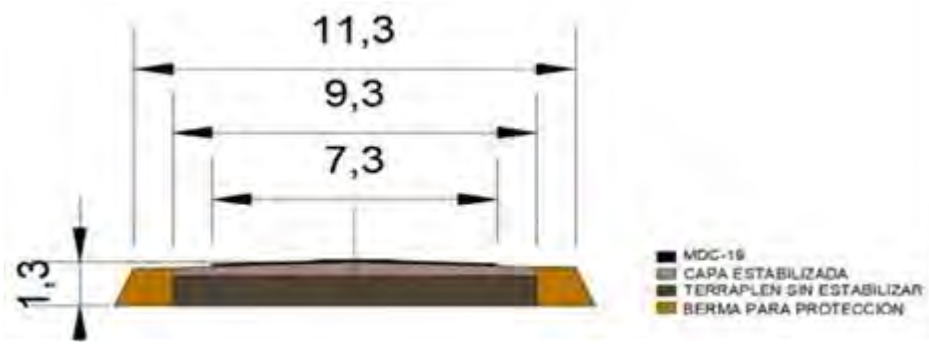


Modelo estructural - Sección transversal

Geométricamente la vía presenta un perfil vial con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado según el diseño de la estructura de pavimento, se recomendó una unidad de diseño la cual presenta la siguiente estructura:

Unidad de diseño K0+00 al K2+860

- Ancho vía 7.30 m
- Ancho bermas 1.00 m
- Bombeo: 2%
- Peralte máximo: 4%
- Sobreancho máximo: 1.00 m

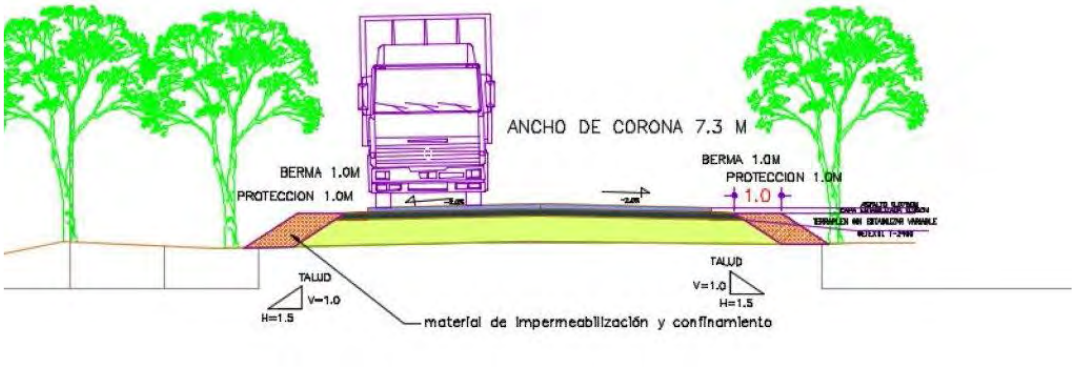

Sección transversal tipo en tan gente Unidad de diseño No. 02 estructura con Subrasante Estabilizada con Sales Inorgánicas

Con los ajustes realizados según acta de modificación No.3 y acta de adición No.1 del contrato de obra, se realizará la construcción de 19 estructuras de drenaje transversal en el tramo Caño Flores, los cuales son:

OBRAS DE DRENAJE SEGÚN MODIFICATORIO No.3		
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 1,5 X 1 m	k0+000
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 1 m	k0+137
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+435
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+545
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K0+757
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 1 m	k1+076
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+277
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+445
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+645
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K1+845
OBRA NUEVA	BOX CULVERT 2 X 2 m	k2+031
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+224
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+444
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+644
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K2+845

OBRAS DE DRENAJE SEGÚN ADICIONAL EN VALOR No.1		
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+045
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+245
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+455
OBRA NUEVA	ALCANTARILLA 36 "	K3+645

Estructuras Tipo Boxculvert y alcantarillas

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Aspectos generales del contrato de obra:

Tabla 1. Información del contrato de Obra

CONTRATISTA	
CONTRATO N°:	**016 DE 2023**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTE DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
N° PROCESO DE SELECCIÓN:	N°LP-FRL-SPI-009-2023 Aperturado mediante -resolución N°496 del 27 de 2023 del 29 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL • CONYCA SOLUCIONES SAS (78%) NIT 900.701.968-7 R.L LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ C.C 17.589.706 • CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%) NIT 834.000.202-7 R.L LEONEL ALBERTO ARIAS ROJAS C.C 79.447.547 • HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%) NIT 901.100579-1 R.L HORACIO DIAZ TORRES C.C 13.701.763 • VANUR SAS NIT 901335047-2 (10%) NIT 901.335.047-2 R.L HECTOR JULIAN RESTREPO MARÍN C.C 1.128.395.598
REP. LEGAL:	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ C.C 1.176.782.711
N° NIT:	901.758.303-9
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	$23.137.768.645,10 LOTE N°01: $12.024.004.631,44 LOTE N°02: $11.113.764.013,66
VALOR ADICIONAL	$4.895.000.000
CDP	N° 320 del 14 de agosto del 2023
RP	N° 600 del 29 de septiembre de 2023

ANTICIPO	$ 11.568.884.300 (50%)
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE MARZO DE 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PERIODO SUSPENSIÓN N°01	DESDE CINCO (05) DE ENERO DE 2024 HASTA EL CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024
PERIODO PRÓRROGA N°01 A SUSPENSIÓN N°01	DESDE EL CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL TRES (03) DE MARZO DE 2024
FECHA DE REINICIO N°01	CUATRO (04) DE MARZO DEL 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según REINICIO N°01)	DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2024
OTROSI MODIFICATORIO N° 001 (ADICION DE PLAZO)	CATORCE (14) DE MARZO DE 2024 SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según Adicional de Plazo)	CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024.
OTROSI MODIFICATORIO N° 002	VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2024 Modificación Clausula N°25 GARANTIAS
PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO)	Compañía Mundial de Seguros S.A. – NB–100285361 – NB-100069639 – Anexo 4
OTROSI MODIFICATORIO N° 003	OCHO (08) DE AGOSTO DE 2024 Modificación Mayores y menores cantidades, Items nuevos.
OTROSI MODIFICATORIO ADICION EN VALOR No.1	TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DE 2024 Legalización acta de adición en valor No.1.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades las cuales se dividen por tramos y áreas de Trabajo.

3.2.1 TRAMO 1 – Caño Flores a Sitio nuevo, en el municipio de Fortul.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Construcción de terraplén (arena limosa) La conformación del terraplén y la protección de los taludes se va conformando por capas, para este mes, se realizaron actividades en las siguientes abscisas: K3+590 a K3+790 capa posterior (Tramo según adicional en valor N°1).
- Se realizó chequeo de niveles topográficos de terraplén en las capas compactadas y al cereo después de instalar el geotextil durante las semanas del periodo del informe.
- Excavación mecánica en material común entre 0-2 en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarillas), sobre el carril izquierdo.

- Vaciado de concreto simple de 17 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarilla) sobre el carril izquierdo.
- Instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril izquierdo.
- Instalación de acero de refuerzo en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril izquierdo.
- Relleno y compactación de material seleccionado en las obras de drenaje transversal en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril izquierdo.
- Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares abscisas K0+180 - K0+820, carril derecho y del K0+180 - K0+535 carril izquierdo.
- Estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica abscisas K0+180 - K0+820, carril derecho y del K0+180 - K0+535 carril izquierdo.
- Se realizó ensayo de densidad de campo con el cono de arena.
- Se realizó la toma de muestras para el ensayo de compresión simple del concreto.

3.2.2 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Excavación mecánica en material común entre 0-2, vaciado de concreto simple de 17 Mpa, instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa, instalación de acero de refuerzo, relleno y compactación de material seleccionado para obras de drenaje transversal en la abscisa K6+633.
- Instalación de geotextil, Sub Base granular SBG-50, Base Granular Clase II, en los tramos correspondientes a obras de drenaje (K7+200-K7+400) (Sobre tramo correspondiente a obras de drenajes pendientes).
- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) desde el K3+950 hasta el K4+210 carril derecho y desde el K3+950 hasta el K4+280 carril izquierdo. Esta misma actividad desde el K7+400 hasta el K6+426 (Carril derecho) y K7+400 al K6+110 (Carril Izquierdo).

- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 desde el K3+950 hasta el K4+210 carril derecho y desde el K3+950 hasta el K4+280 carril izquierdo. Esta misma actividad desde el K7+400 hasta el K6+426 (Carril derecho) y K7+400 al K6+110 (Carril Izquierdo).
- Se realiza ensayo de densidad de campo con el cono de arena.

3.2.3 Vallas informativas.

Valla informativa instalada en la vía entre la vereda Palmarito y Caranal, en la finca la virgen, municipio de Fortul.



3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Para el presente informe correspondiente al mes de noviembre, no se presentaron por parte del Contratista de Obra ítems no previstos.

La interventoría, revisó y aprobó el análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, y posteriormente se presentaron a la alcaldía de Fortul, para realizar la legalización y tramites respectivo.

A continuación, se relacionan los ítems no previstos así y que fueron aprobados en el acta de modificación No. 3:

1.3 N	MOVIMIENTO RED ELECTRICA		
1.3.1 N	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT		
1.3.1.1 N	REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT	KM	0,33
	SUBTOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT		
1.3.2 N	APOYOS MT		
1.3.2.1 N	CONCRETO 3000 PSI (Incluye material, mano de obra y herramienta y equipos)	M3	1,80
1.3.2.2 N	POSTE EN CONCRETO 12 M X 2050 KG (Incluye suministro, transporte y proceso de hicada y aplomada)	UND	2
1.3.2.3 N	DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)	UND	2
	SUBTOTAL APOYOS MT		
1.3.3 N	VESTIDA/ARMADA POSTES MT		
1.3.3.1 N	ESTRUCTURAS 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.2 N	ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.3 N	ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	UND	1
1.3.3.4 N	ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1
1.3.3.5 N	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	UND	4
	SUBTOTAL VESTIDA/ARMADA POSTES		
1.3.4 N	TEMPLETES MT		
1.3.4.1 N	TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSIÓN (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	UND	4
	SUBTOTAL TEMPLETES MT		
1.3.5 N	VESTIDA/ARMADA POSTES MT		
1.3.5.1 N	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	UND	1
1.3.5.2 N	ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	UND	1

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

Para el presente informe, en términos generales esta Interventoría puede informar que, la ejecución de las actividades de obra se ha realizado normalmente sin inconvenientes, el contratista continúa realizando actividades de topografía, corte y figurado del acero, construcción

de terraplén (arena limosa), excavaciones mecánicas y manuales, instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, instalación de base granular clase B gradación fina, construcción de obras de drenaje (Alcantarillas y Box culvert), riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) y mezcla densa en caliente tipo MDC-19, estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica.

En el seguimiento administrativo del contrato de obra, se está revisando para aprobación el acta parcial de obra No.3, se está tramitando ante el INVIAS y la Alcaldía de Fortul la solicitud Prórroga de obra e Interventoría por diecisiete (17) días, que cubran la ejecución durante el mes de diciembre del presente año hasta el día 31. También se realizaron los comités de obra para seguimiento y avance de las obras y reuniones con la comunidad.

En cuanto al componente ambiental para este mes se reporta la siguiente información:
Se revisa de manera diaria el estado de las correcciones a los informes ambientales solicitadas desde la interventoría, estos informes a la fecha se encuentran sin las correcciones realizadas por lo cual continúan sin aprobación de la interventoría. Se recibe por parte del contratista el documento PAGA de obra actualizado, se aprueba y se radica ante el INVIAS Bogotá dirección de sostenibilidad. Se acompaña comité de obra, en este se manifiesta el estado de la obra en la parte documental dentro del componente.
Se escribe a el municipio de Fortul en relación el estado de los compromisos ambientales en cuanto a la entrega de la siguiente información por parte del contratista:
Entrega de documento PAGA: cumplido
Entrega de correcciones a informes mensuales desde marzo hasta septiembre: no cumplido.
Entrega de Plan de inversión Ambiental: no cumplido.
Se recibe por parte del contratista de manera extemporánea las correcciones de los informes desde el mes de marzo hasta el mes de agosto de 2024, la interventoría inicia con el proceso de revisión, después de revisado son aprobados por parte de la Interventoría. La Interventoría está a la espera de que se concluya por parte del contratista y el municipio el estado de plan de inversión ambiental. Se está a la espera por parte de la interventoría de que se concerté la reunión solicitada por la comunidad relacionada con el inicio de las compensaciones ambientales del proyecto. Se radica informe trimestral Ambiental 1 ante el INVIAS. Para este periodo se registra visita de la autoridad ambiental CORPORINOQUIA.

.

Desde el componente social, se realizó seguimiento a los compromisos generados en reunión con la veeduría del sector de Caño Flores. Reunión entrega de la programación de las actividades mensuales de noviembre y se realizaron los ajustes a los formatos de las actas de vecindad diligenciadas.

Se realizó capacitación al personal de obra sobre las habilidades comunicativas y diálogo. Por otro lado, se envió la ecard para convocatoria a la reunión con la veeduría de los dos sectores (Palmarito y Caño Flores), la cual se realizó la última semana del mes de noviembre. El día miércoles 20 de noviembre se realizó jornada de sensibilización para la prevención de todo tipo de violencia basada en género en el Colegio de Palmarito con los estudiantes. Se realizó la entrega del informe mensual por parte del Contratista y de la Interventoría.

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, se presenta el avance ejecutado acumulado del proyecto a la fecha del presente informe, por actividades y por capítulos:

28 DE NOVIEMBE DE 2024										
No.	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	ACUMULADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
EXCAVACIONES								CANT EJECUTADAS ACUM	VR TOTAL	% FISICO ACUM
1	1.1	X	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO)	M3	4976,39	$ 20.756,00	$ 103.289.950,84	4920,47	$ 102.129.275,32	98,88%
SUBTOTAL EXCAVACIONES							**$ 103.289.950,84**		**$ 102.129.275,32**	**98,88%**
ESTRUCTURA DE VIA										
2	2.1	X	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	51800	$ 12.133,00	$ 628.489.400,00	51800,00	$ 28.489.400,00	100,00%
3	2.2	X	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3	5776,08	$ 144.582,00	$ 835.117.198,56	5776,08	$ 835.117.198,56	100,00%
4	2.3	X	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	M3	11262,68	$ 182.611,00	$ 2.056.689.257,48	11262,68	$2.056.689.257,48	100,00%
5	2.4	X	BASE GRANULAR CLASE B GRADACION FINA	M3	8053,86	$ 222.012,00	$ 1.788.053.566,32	7913,86	$.756.971.886,32	98,26%
6	2.5	X	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	M2	51800	$ 5.034,00	$ 260.761.200,00	37522,50	$ 188.888.265,00	72,44%
7	2.6	X	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	4516,87	$ 1.481.973,00	$ 6.693.879.384,51	3243,10	$ 4.806.186.636,30	71,80%
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE VIA							**$ 12.262.990.006,87**		**$ 10.272.342.643,66**	**83,77%**
OBRAS DE DRENAJE										
8	3.1	X	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	M3	13,16	$ 828.183,00	$ 10.898.888,28	12,15	$ 10.062.423,45	92,33%
9	3.2	X	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	134,97	$ 1.200.425,00	$ 162.021.362,25	125,28	$ 150.389.244,00	92,82%
10	3.3	X	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	M3	25,85	$ 1.665.009,00	$ 43.040.482,65	25,85	$ 43.040.482,65	100,00%
11	3.4	X	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	14387,14	$ 8.309,00	$ 119.542.746,26	13554,57	$ 112.624.922,13	94,21%

28 DE NOVIEMBE DE 2024

No.	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	ACUMULADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
			EXCAVACIONES					CANT EJECUTADAS ACUM	VR TOTAL	% FISICO ACUM
12	3.5	X	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	M	117,00	$ 1.074.554,00	$ 125.722.818,00	110,5	$ 118.738.217,00	94,44%
13	3.6 N	X	DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	M3	51,11	$ 283.648,00	$ 14.497.249,28	51,11	$ 14.497.249,28	100,00%
SUB TOTAL OBRAS DE DRENAJE							**$ 475.723.546,72**	0	**$ 449.352.538,51**	**94,46%**
			SEÑALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION VIAL							
13	4.1	X	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	UND	35,00	$ 766.985,00	$ 26.844.475,00	25	$ 19.174.625,00	71,43%
14	4.2	X	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	22200	$ 3.164,00	$ 70.240.800,00	0	$ -	0,00%
SUB TOTAL SEÑALIZAION Y DEMARCACIÓN VIAL							**$ 97.085.275,00**			
SUB TOTAL							**$ 12.939.088.779,43**		**$ 19.174.625,00**	**0,00%**
			ACTIVIDADES DE CARACTERIZACION VIAL							
15	1P	X	ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR	KM	7,40	$ 674.337,00	$ 4.990.093,80	0	$ -	0,00%
SUB TOTAL CARACTERIZACIÓN VIAL							**$ 4.990.093,80**			0,00%
			ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL							
16		X	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	UND	1,00	$126.680.567,38	$ 126.680.567,38	0	$ -	0,00%
SUB TOTAL MEIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL							**$ 126.680.567,38**			0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO PALMARITO							**$ 13.070.759.440,61**		**$ 10.842.999.082,49**	**82,96%**
1	LOTE 1. CAÑO FLORES - SITIO NUEVO									
1.1	VIA									
1.1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
1	1.1.2.1	X	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. (Incluye Transporte)	m3	1.119,61	$ 28.183,00	$ 31.553.968,63	885,13	$ 24.945.618,79	79,06%
2	1.1.2.2	X	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	m3	1.092,68	$ 187.612,00	$ 204.999.880,16	885,13	$ 166.061.009,56	81,01%

28 DE NOVIEMBE DE 2024

No.	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	ACUMULADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
	EXCAVACIONES							CANT EJECUTADAS ACUM	VR TOTAL	% FISICO ACUM
3	1.1.2.3	X	TERRAPLENES	m3	55.304,45	$ 124.804,00	$ 6.902.216.577,80	55109,66	$ 6.877.906.377,06	99,65%
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS							$ 7.138.770.426,59		$ 7.068.913.005,41	99,02%
1.1.3	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
4	1.1.3.1	X	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	37.941,80	$ 12.133,00	$ 460.347.859,40	4676,50	$ 56.739.974,50	12,33%
5	1.1.3.2	X	ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA	m3	9.322,16	$ 247.006,00	$ 2.302.629.452,96	1169,13	$ 288.782.124,78	12,54%
6	1.1.3.3	X	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	m2	37.476,80	$ 5.034,00	$ 188.658.211,20	0	$ -	0,00%
7	1.1.3.4	X	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	2.229,29	$ 1.501.457,00	$ 3.347.183.075,53	0	$ -	0,00%
SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO							$ 6.298.818.599,09		$ 345.522.099,28	5,49%
1.1.4	SEÑALIZACIÓN									
8	1.1.4.1	X	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	Und	32,00	$ 766.271,00	$ 24.520.672,00	0	$ -	0,00%
9	1.1.4.2	X	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	m	15.160,00	$ 3.163,00	$ 47.951.080,00	0	$ -	0,00%
10	1.1.4.3	X	TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	Und	1.264,00	$ 9.838,00	$ 12.435.232,00	0	$ -	0,00%
11	1.1.4.4	X	DEFENSA VEHICULAR METALICA EN ACERO GALVANIZADO	m	439,00	$ 321.963,00	$ 141.341.757,00	0	$ -	0,00%
12	1.1.4.5	X	CAPTAFAROS	Und	115,00	$ 14.658,00	$ 1.685.670,00	0	$ -	0,00%
13	1.1.4.6	X	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SIMPLE (50 m X 40 m)	Und	9,00	$ 684.263,00	$ 6.158.367,00	0	$ -	0,00%
SUBTOTAL SEÑALIZACION							$ 234.092.778,00		$ -	0,00%
SUBTOTAL VIA							$ 13.671.681.803,68		$ 7.414.435.104,69	54,23%
1.2	OBRAS DE DRENAJE									
1.2.1	PRELIMINARES									

28 DE NOVIEMBE DE 2024

No.	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	ACUMULADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
	EXCAVACIONES							CANT EJECUTADAS ACUM	VR TOTAL	% FISICO ACUM
14	1.1.2.1	X	DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	m3	55,38	$ 283.648,00	$ 15.708.426,24	55,38	$ 15.708.426,24	100,00%
SUBTOTAL PRELIMINARES							**$ 15.708.426,24**		**$ 15.708.426,24**	**100,00%**
1.2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
15	1.2.2.1	X	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M.	m3	550,80	$ 28.183,00	$ 15.523.196,40	550,80	$ 15.523.196,40	100,00%
16	1.2.2.2	X	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	m3	30,92	$ 40.245,00	$ 1.244.375,40	0	$ -	0,00%
17	1.2.2.3	X	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO	m3	375,88	$ 233.118,00	$ 87.624.393,84	375,88	$ 87.624.393,84	100,00%
SUBTOTAL EXCAVACION Y RELLENOS							**$ 104.391.965,64**		**$ 103.147.590,24**	**98,81%**
1.2.3	CONCRETOS									
15	1.2.3.1	X	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	m2	6,40	$ 852.720,00	$ 5.457.408,00	0	$ -	0,00%
16	1.2.3.2	X	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	358,80	$ 1.647.023,00	$ 590.951.852,40	358,8	$ 590.951.852,40	100,00%
17	1.2.3.3	X	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	180,00	$ 1.074.555,00	$ 193.419.900,00	180,00	$ 193.419.900,00	100,00%
	1.2.3. 4 N	X	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	m3	29,17	$ 852.720,00	$ 24.873.842,40	29,17	$ 24.877.253,28	100,01%
SUBTOTAL CONCRETOS							**$ 814.703.002,80**		**$ 809.249.005,6800**	**99,33%**
1.2.4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa									
18	1.2.4.1	X	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	Kg	21.238,80	$ 8.333,00	$ 176.982.920,40	21238,80	$ 176.982.920,40	100,00%
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO							**$ 176.982.920,40**		**$ 176.982.920,40**	**100,00%**
SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE							**$ 1.111.786.315,08**		**$ 1.105.087.942,56**	**99,40%**
	1.3 N		**MOVIMIENTO RED ELECTRICA**							

28 DE NOVIEMBE DE 2024

No.	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	ACUMULADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
			EXCAVACIONES					CANT EJECUTADAS ACUM	VR TOTAL	% FISICO ACUM
	1.3.1N		**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT**							
	1.3.1.1N		REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT	KM	0,33	$ 519.376,00	$ 171.394,08	0,33	**$ 171.394,08**	**100,00%**
			SUBTOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT				**$ 171.394,08**		**$ 171.394,08**	
	1.3.2N		**APOYOS MT**							
	1.3.2.1N		Concreto 3000 PSI (Incluye Material, Mano de Obra, y Herramienta y Equipos)	M3	1,80	$ 1.137.476,00	$ 2.047.456,80	1,80	**$ 2.047.456,80**	**100,00%**
	1.3.2.2N		POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada y aplomada)	Und	2,00	$ 4.592.568,00	$ 9.185.136,00	2,00	**$ 9.185.136,00**	**100,00%**
	1.3.2.3N		DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)	Und	2,00	$ 763.318,00	$ 1.526.636,00	2,00	**$ 1.526.636,00**	**100,00%**
			SUBTOTAL APOYOS MT				**$ 12.759.228,80**		**$ 12.759.228,80**	
	1.3.3N		**VESTIDA / ARMADA POSTES MT**							
	1.3.3.1N		ESTRUCTURA 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 710.849,00	$ 710.849,00	1	**$ 710.849,00**	**100,00%**
	1.3.3.2N		ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 1.160.615,00	$ 1.160.615,00	1	**$ 1.160.615,00**	**100,00%**
	1.3.3.3N		ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 3.072.512,00	$ 3.072.512,00	1	**$ 3.072.512,00**	**100,00%**
	1.3.3.4N		ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 5.638.150,00	$ 5.638.150,00	1	**$ 5.638.150,00**	**100,00%**
	1.3.3.5N		DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	Und	4,00	$ 230.362,00	$ 921.448,00	4	**$ 921.448,00**	**100,00%**
			SUBTOTAL VESTIDA / ARMADA POSTES MT				**$ 11.503.574,00**		**$ 11.503.574,00**	**100,00%**
	1.3.4N		**TEMPLETES MT**							
	1.3.4.1N		TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSIÓN (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	Und	4,00	$ 714.703,00	$ 2.858.812,00	4	**$ 2.858.812,00**	**100,00%**
			SUBTOTAL TEMPLETES MT		-		**$ 2.858.812,00**		**$ 2.858.812,00**	
	1.3.5N		**VESTIDA / ARMADA POSTES BT**							
	1.3.5.1N		DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	Und	1,00	$ 140.918,00	$ 140.918,00	1	**$ 140.918,00**	**100,00%**

28 DE NOVIEMBE DE 2024										
No.	ITEM DE PAGO		DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	ACUMULADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO							
EXCAVACIONES								CANT EJECUTADAS ACUM	VR TOTAL	% FISICO ACUM
	1.3.5.2N		ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	Und	1,00	$ 229.245,00	$ 229.245,00	1	**$ 229.245,00**	**100,00%**
			SUBTOTAL VESTIDA / ARMADA POSTES BT		-		**$ 370.163,00**		**$ 370.163,00**	
			SUBTOTAL MOVIMIENTO RED ELECTRICA				**$ 27.663.171,88**		**$ 27.663.171,88**	
SUBTOTAL OBRAS							**$ 14.811.131.290,64**		**$ 8.547.186.219,13**	**57,71%**
19	1P		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS				$ 148.313.198,55		$ -	0,00%
20	2P		ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM)				$ 2.555.738,41		$ -	0,00%
			VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 14.962.000.227,60**		**$ 8.547.186.219,13**	
VALOR TOTAL							**$ 28.032.759.668,21**		**$ 19.390.185.301,62**	**69,17%**
			SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				**$ 8.976,89**			
TOTAL							**$ 28.032.768.645,10**			

Anexo A. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Tabla 2. Informes semanales en el mes de noviembre de 2024.

N° SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO
Semanal No. 38 (1 al 7 de noviembre 2024)	61,0 %
Semanal No. 39 (8 al 14 de noviembre 2024)	61,0 %
Semanal No.40 (15 al 21 de noviembre 2024)	61,0%
Semanal No. 41 (22 al 28 de noviembre 2024)	64,0%

El seguimiento y control de la ejecución del proyecto, se realiza teniendo en cuenta el programa de inversión vigente presentando por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo B. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (maquinaria y equipo contrato de obra).

Se presentan 2 versiones de este formato los cuales se distribuyen así:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.
- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo C. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (personal contrato de obra).

4.4 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo el Contratista entregó a la Interventoría para revisión y aprobación el acta parcial No.3 por un valor de $2.625.106.733,8y está en espera de pago por parte de la Alcaldía Municipal el acta parcial de obra No.2 por un valor de $3.928.517.820,19.

Anexo D MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo E, formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

Debido a la distancia entre los frentes de trabajo, se presentan 2 versiones de este formato los cuales se distribuyen así:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.
- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo F Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO

Anexo G. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

Se Anexa Ultimas Pólizas Actualizadas entregadas por el Contratista.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Anexo H. Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

4.9 Otros Documento Seguimiento Mensual

4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

- Anexo I. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

- Anexo J. Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2

4.9.2 Seguimiento Programa de obra

- Anexo K.

4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones

- Anexo L. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1

- Anexo M. Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2.

El CONTRATO FIDUCIARIO creado para el buen manejo del anticipo entre el CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. menciona que, los rendimientos financieros del anticipo, será girados mensualmente a la entidad contratante, responsable del contrato de obra, para este proyecto, la alcaldía del municipio de Fortul

La Alcaldía del Municipio de Fortul presentó la información correspondiente a los giros realizados por concepto del buen manejo del anticipo. A continuación, se muestra la información presentada:

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

No. ORDEN DE PAGO 147

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Febrero 22 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$10,291,749.00	$0.00	$10,291,749.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$10,291,749.00
			TOTAL PAGADO	**$10,291,749.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

No. ORDEN DE PAGO 148

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Febrero 22 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$5,901,424.00	$0.00	$5,901,424.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$5,901,424.00
			TOTAL PAGADO	**$5,901,424.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2014824	22/02/2024

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 148/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$5,901,424.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$5,901,424.00
		SUMAS IGUALES -->	**$5,901,424.00**	**$5,901,424.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
264

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Marzo 14 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$5,542,286.00	$0.00	$5,542,286.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$5,542,286.00
			TOTAL PAGADO	**$5,542,286.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N° 2 - 2026424 **Fecha** 14/03/2024

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 264/24, DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$5,542,286.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$5,542,286.00
		SUMAS IGUALES -->	**$5,542,286.00**	**$5,542,286.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
265

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Marzo 14 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$99,592,859.10	$0.00	$99,592,859.10

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACION	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$99,592,859.10
			TOTAL PAGADO	**$99,592,859.10**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	493

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$341,880.00	$0.00	$341,880.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$341,880.00
			TOTAL PAGADO	**$341,880.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2049324	30/05/2024

Pagado A: **Forma de Pago:** **Documentos Relacionados:**

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 493/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$341,880.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$341,880.00
		SUMAS IGUALES -->	**$341,880.00**	**$341,880.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
494

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$117,684.00	$0.00	$117,684.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$117,684.00
			TOTAL PAGADO	**$117,684.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2049424	30/05/2024

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 494/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$117,684.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$117,684.00
		SUMAS IGUALES -->	**$117,684.00**	**$117,684.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	495

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$103,345,286.00	$0.00	$103,345,286.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$103,345,286.00
			TOTAL PAGADO	**$103,345,286.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2049524	30/05/2024

Pagado A: **Forma de Pago:** **Documentos Relacionados:**

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 495/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$103,345,286.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$103,345,286.00
		SUMAS IGUALES -->	**$103,345,286.00**	**$103,345,286.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

No. ORDEN DE PAGO
496

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Mayo 30 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$93,280,801.55	$0.00	$93,280,801.55

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$93,280,801.55
			TOTAL PAGADO	**$93,280,801.55**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2049624	30/05/2024

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 496/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$93,280,801.55	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$93,280,801.55
		SUMAS IGUALES -->	**$93,280,801.55**	**$93,280,801.55**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	810

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$184,150.00	$0.00	$184,150.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$184,150.00
			TOTAL PAGADO	**$184,150.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081024	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 810/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$184,150.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$184,150.00
		SUMAS IGUALES -->	**$184,150.00**	**$184,150.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	811

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$176,682.00	$0.00	$176,682.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	$0.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$176,682.00
			TOTAL PAGADO	$176,682.00

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081124	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:
Orden de Pago No. 811/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$176,682.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$176,682.00
		SUMAS IGUALES -->	$176,682.00	$176,682.00

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	812

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$183,470.00	$0.00	$183,470.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$183,470.00
			TOTAL PAGADO	**$183,470.00**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081224	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 812/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$183,470.00	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$183,470.00
		SUMAS IGUALES -->	**$183,470.00**	**$183,470.00**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	814

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$51,876,007.99	$0.00	$51,876,007.99

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$51,876,007.99
			TOTAL PAGADO	**$51,876,007.99**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081424	26/08/2024

Pagado A: 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 814/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$51,876,007.99	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$51,876,007.99
		SUMAS IGUALES -->	**$51,876,007.99**	**$51,876,007.99**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	816

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$56,889,776.32	$0.00	$56,889,776.32

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$56,889,776.32
			TOTAL PAGADO	**$56,889,776.32**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081624	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 816/24, DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$56,889,776.32	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$56,889,776.32
		SUMAS IGUALES -->	**$56,889,776.32**	**$56,889,776.32**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900517804-1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	817

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Agosto 26 de 2024

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
PAGO A TERCEROS	24072643	0

CONCEPTO DE PAGO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$36,202,558.18	$0.00	$36,202,558.18

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	Rp	Valor
-	-	(FF:)		RP:	$0.00
				TOTAL FINANCIACIÓN	**$0.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	TIPO PAGO	CÓDIGO CONTABLE	VALOR
BBVA	842-004210	TRANSFERENCIA	1110060227	$36,202,558.18
			TOTAL PAGADO	**$36,202,558.18**

ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 2081724	26/08/2024

Pagado A:
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Forma de Pago:

Documentos Relacionados:

Por Concepto De:

Orden de Pago No. 817/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24072643	CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210	$36,202,558.18	$0.00
2	1110060227	842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS	$0.00	$36,202,558.18
		SUMAS IGUALES -->	**$36,202,558.18**	**$36,202,558.18**

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA

Año	Mes	Dia	Comprobante	Concepto	Nit	Nombre Tercero	Inicial	Valor Debito	Valor Credito	Saldo
2024	2	22	2014724	Orden de Pago No. 147/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	10,291,749	11,744,043,367.10
2024	2	22	2014824	Orden de Pago No. 148/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	5,901,424	11,738,141,943.10
2024	3	14	2026424	Orden de Pago No. 264/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	5,542,286	11,841,469,855.10
2024	3	14	2026524	Orden de Pago No. 265/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	99,592,859.10	11,741,876,996
2024	5	30	2049324	Orden de Pago No. 493/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	341,880	16,730,335,481.55
2024	5	30	2049424	Orden de Pago No. 494/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	117,684	16,730,217,797.55
2024	5	30	2049524	Orden de Pago No. 495/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	103,345,286	16,626,872,511.55
2024	5	30	2049624	Orden de Pago No. 496/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	93,280,801.55	16,533,591,710
2024	8	26	2081024	Orden de Pago No. 810/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	184,150	16,710,047,757.55
2024	8	26	2081124	Orden de Pago No. 811/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	176,682	16,709,871,075.55
2024	8	26	2081224	Orden de Pago No. 812/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	183,470	16,709,687,605.55
2024	8	26	2081424	Orden de Pago No. 814/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	51,876,007.99	16,657,811,597.56

Acti
Ve a C

2024	8	26	2081624	Orden de Pago No. 816/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	56,889,776.32	16,600,921,821.24
2024	8	26	2081724	Orden de Pago No. 817/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA	900517804	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0	0	36,202,558.18	16,564,719,263.06

De acuerdo a la información mostrada anteriormente, se presenta el siguiente resumen:

FECHA	ORDEN DE PAGO	MES REPORTADO	VALOR GIRADO
22-feb-24	147	ene-24	$ 10.291.749,00
22-feb-24	148	ene-24	$ 5.901.424,00
14-mar-24	264	feb-24	$ 5.542.286,00
14-mar-24	265	feb-24	$ 99.592.859,10
30-may-24	493	mar-24	$ 341.880,00
30-may-24	494	abr-24	$ 117.684,00
30-may-24	495	abr-24	$ 103.345.286,00
30-may-24	496	abr-24	$ 93.280.801,55
26-ago-24	810	may-24	$ 184.150,00
26-ago-24	811	jun-24	$ 176.682,00
26-ago-24	812	jul-24	$ 183.470,00
26-ago-24	814	may-24	$ 51.876.007,99
26-ago-24	816	jun-24	$ 56.889.776,32
26-ago-24	817	jul-24	$ 36.202.558,18
		TOTAL	**$ 463.926.614,14**

Según la relación mostrada, es importante que el instituto nacional de vías INVIAS, se comunique con la alcaldía del municipio de Fortul, para despejar cualquier duda, con respecto a los giros realizados con el rendimiento financiero del anticipo del contrato de obra No.016 de 2023.

4.9.4 Acta de comité de obra

Anexo N. Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1

Tabla 3. Reuniones celebradas en el mes de noviembre de 2024.

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	**FECHA**	**TEMÁTICA GENERAL**
Comité de obra N°24	1/11/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°25	8/11/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°26	15/11/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.
Comité de obra N°27	21/11/2024	Realizar Seguimiento al avance del proyecto y debatir la posibilidad de un adicional de tiempo.
Comité de obra N°28	26/11/2024	Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.

4.9.5 Acta de reunión.

Anexo O. Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

Tabla 4. Reuniones celebradas en el mes de noviembre de 2024

ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS		
ACTIVIDAD	**FECHA**	**TEMÁTICA GENERAL**
Acta de reunión	27/11/2024	Realizar socialización del adicional del Contrato con la comunidad de Palmarito.
Acta de reunión	28/11/2024	Realizar socialización del adicional del Contrato con la comunidad de Caño Flores.

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 5. Información sobre el contrato de interventoría

CONTRATO N°:	**4763 DE 2023**
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL	CASANARE
VALOR INICIAL	$1.856.588.140
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
CONCURSO DE MÉRITOS	CMA-DEO-SVR-076-2023
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	4270 DE 27 NOVIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO SADINTECON NIT 901.742.046-0 SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1 GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUTH ELENA TABARES ZULETA
VALOR CONTRATO	$1.856.588.140
CDP	173523 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSIÓN N°01	DESDE 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE FEBRERO DE 2024
PRÓRROGA N°01 A SUSPENSIÓN N°01	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE REANUDACION	01 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE MARZO DE 2024
PRÓRROGA N°01	DESDE EL 4 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 (10 MESES)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

A partir de las actividades generales inherentes a las labores de la interventoría tenemos las siguientes:

- Efectuar revisión del proyecto, estudiar los documentos contractuales.
- Disponer la organización y los recursos necesarios para la interventoría.
- Supervisar materiales y fuente de materiales.
- Verificar el cumplimiento de especificaciones y planos a que haya lugar.
- Supervisar las obras.
- Controlar la calidad de la obra a través de los ensayos de laboratorio.
- Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
- Medir obra ejecutada.
- Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
- Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
- Controlar el cronograma o programa de trabajo.
- Controlar los aspectos ambientales.
- Verificar y colaborar con el contratista en el trámite de las licencias y permisos necesarios.
- Elaborar informe mensual ambiental (parte del informe mensual de interventoría).
- Controlar los aspectos de seguridad industrial y hacer seguimiento al cumplimiento.
- Realizar seguimiento y acompañamiento de reuniones con la comunidad e interacciones necesarias en el área social.
- Verificar que el personal esté afiliado al Sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones, y que se realicen los aportes parafiscales (caja de compensación, ICBF, SENA)
- Efectuar el control de registros y archivo de interventoría.
- Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada.
- Organizar y desarrollar reuniones y comités de obras.
- Llevar un registro fotográfico del proyecto.
- Estudiar sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra.
- Expedir constancia de cumplimientos de normas de calidad.
- Efectuar un seguimiento al cumplimiento del plan de calidad de la interventoría.
- Atender observaciones y lineamientos de la entidad contratante.
- Realizar la medición de los indicadores del proyecto.

- Revisar que los equipos estén calibrados y registrar o actualizar el listado de equipos.
- Informar permanentemente sobre el desarrollo del proyecto y sobre incumplimientos del contratista.
- Elaborar informe mensual de la interventoría.

A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico en campo, en los frentes de trabajo.

Tramo 1. Caño Flores a Sitio nuevo.

Se realizó el acompañamiento y supervisión en las siguientes actividades de los dos tramos.

- Construcción de terraplén (arena limosa) La conformación del terraplén y la protección de los taludes se va conformando por capas, para este mes, se realizaron actividades en las siguientes abscisas: K3+590 a K3+790 capa posterior (Tramo según adicional en valor N°1).

- Se realizó chequeo de niveles topográficos de terraplén en las capas compactadas y al cereo después de instalar el geotextil durante las semanas del periodo del informe.

- Excavación mecánica en material común entre 0-2 en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarillas), sobre el carril izquierdo.

- Vaciado de concreto simple de 17 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarilla) sobre el carril izquierdo.

- Instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa para obras de drenaje en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril izquierdo.

- Instalación de acero de refuerzo en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril izquierdo.

- Relleno y compactación de material seleccionado en las obras de drenaje transversal en las abscisas K3+045, K3+245, K3+645 (alcantarillas) sobre el carril izquierdo.

- Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares abscisas K0+180 - K0+820, carril derecho y del K0+180 - K0+535 carril izquierdo.

- Estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica abscisas K0+180 - K0+820, carril derecho y del K0+180 - K0+535 carril izquierdo.

- Se realizó ensayo de densidad de campo con el cono de arena.

Tramo 2: La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

- Excavación mecánica en material común entre 0-2, vaciado de concreto simple de 17 Mpa, instalación de formaleta y vaciado de concreto de 21 Mpa, instalación de acero de refuerzo, relleno y compactación de material seleccionado para obras de drenaje transversal en la abscisa K6+633.

- Instalación de geotextil, Sub Base granular SBG-50, Base Granular Clase II, en los tramos correspondientes a obras de drenaje (K7+200-K7+400) (Sobre tramo correspondiente a obras de drenajes pendientes).

- Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (anteriormente CRL-1) desde el K3+950 hasta el K4+210 carril derecho y desde el K3+950 hasta el K4+280 carril izquierdo. Esta misma actividad desde el K7+400 hasta el K6+426 (Carril derecho) y K7+400 al K6+110 (Carril Izquierdo).

- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 desde el K3+950 hasta el K4+210 carril derecho y desde el K3+950 hasta el K4+280 carril izquierdo. Esta misma actividad desde el K7+400 hasta el K6+426 (Carril derecho) y K7+400 al K6+110 (Carril Izquierdo).

- Se realiza ensayo de densidad de campo con el cono de arena.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Anexo P. Se adjunta el respectivo informe de los Especialistas y profesionales socio-ambientales.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Anexo Q. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

Anexo R.

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

5.6.1 CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura)

Anexo S. Se anexa reporte de información cargada en el Plataforma CIFRA (Control de los proyectos de Infraestructura) e informes.

5.6.2 Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

Anexo T.

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo U. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (equipo contrato de Interventoría).

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo V. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría).

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo W. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo X. MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Se anexan Pólizas.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo Y. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO

6.6.1 Seguimiento a la inversion del Anticipo

Anexo Z. Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 A La Interventoría no solicitó el desembolso del anticipo.

Anexo AA. Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

6.6.2 Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado.

Anexo AB. Formato MEPI-MN-IN-3-FR-2

6.6.3 Seguimiento al Plan de Cargas a la inversion del Anticipo

Anexo AC. Formato MEPI-MN-IN-9-FR-3

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Contratista de obra viene cumpliendo con las actividades programadas de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado por esta Interventoría, a la fecha de corte del 28 de noviembre de 2024, se evidencia un avance físico ejecutado del 64,0% y un avance físico programado del 94,0%, una inversión obra programada acumulada del 95,69% y una inversión obra ejecutada acumulada del 69,18%. Se presenta un atraso del 30% en el avance físico debido a que se han venido presentando retrasos en el suministro e instalación del pavimento asfaltico en el sector de Palmarito, además la dificultad que se viene presentando, por manifestaciones de la población de APIAY (departamento del META), lugar donde se encuentra ubicada la refinería, desde donde se carga el cemento asfaltico materia prima para la mezcla. Por otro lado, en el sector de Caño Flores se han presentado fuertes lluvias lo cual ha retrasado la estabilización Química de terraplén con sales Inorgánicas. El movimiento de la red eléctrica se realizó quedando lista esta actividad.

- De acuerdo al atraso presentado y que no se no se va a cumplir con el plazo contractual, se solicitó ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS y la Alcaldía Municipal de Fortul un adicional de plazo, por un periodo de diecisiete (17) días, que cubran la ejecución durante el mes de diciembre del presente año hasta el día 31, para los contratos de Obra e Interventoría.

- Durante el periodo del presente informe se realizaron cinco (05) comités de obra donde se realizó el seguimiento del avance de las actividades de obra, se aclararon las dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra.

- La Interventoría viene cumpliendo con sus funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar al Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y la Alcaldía de Fortul, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, financiero y ambiental de acuerdo con la naturaleza del contrato. Por otra parte, está

cumpliendo con la entrega de los informes semanales y mensuales donde se está evidenciando el control integral al avance y ejecución del contrato de obra, así como la realización de las actas de comité de seguimiento al Contrato de obra y las diferentes reuniones con la comunidad.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
COMUNICACIÓN	**FECHA**	**ASUNTO**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
CSVF-1120-2024	1-nov-24	Entrega de Información maquinaria y laboratorios de asfalto	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1121-2024	2-nov-24	Entrega de Información	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1122-2024	2-nov-24	Entrega de Información	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1125-2024	5-nov-24	Entrega de Plan de Adaptación de la Guía Ambiental	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1126-2024	5-nov-24	Informes mensuales ambientales	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1127-2024	6-nov-24	Entrega de Informe mensual SST - septiembre	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
2024S-VCAS-082987	7-nov-24	Observaciones acta de costos No.8 (sept 2024) y apremio radicación acta de costos No.9 (oct. 2024) CI 4763-2023	INVIAS	Dr. Henry Antonio Meléndez Ortiz
CSVF-1130-2024	8-nov-24	Entrega Documentación	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1131-2024	8-nov-24	Respuesta a Oficio de fecha 06 de noviembre de 2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1132-2024	8-nov-24	Remisión de plan de Contingencia	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1133-2024	8-nov-24	Respuesta a Oficio CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-105	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1134-2024	12-nov-24	Respuesta a Oficio CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-101	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1135-2024	12-nov-24	Entrega de A.I.U. Contrato No.016 DE 2023, con las observaciones emitidas por la secretaria de Planeación e Infraestructura mediante “Comunicación enviada 1854 de 2024”	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1136-2024	12-nov-24	Relación de imprevistos en el suministro e instalación de mezcla asfáltica	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
2024S-VBOG-077647	13-nov-24	Respuesta a su oficio CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-080	INVIAS	Dr. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
CSVF-1139-2024	13-nov-24	Información de ingreso – Cuadrilla Eléctrica	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1140-2024	13-nov-24	Póliza Extracontractual	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
2024S-VCAS-084841	13-nov-24	Solicitud presentación actas de costos / Fechas de Cierre Fiscal 2024, Contrato No. 4763-2023.	INVIAS	Dr. Henry Antonio Meléndez Ortiz
2024I-VBOG-074127	13-nov-24	Cierre Operaciones con Impacto Financiero Vigencia 2024	INVIAS	Dra. Margareth Sofia Silva Montaña
CSVF-1141-2024	14-nov-24	informe que contienen el diseño de la estructura de pavimento, tramo 1 caño flores.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1144-2024	18-nov-24	Solicitud de adicional de Plazo No. 02	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CSVF-1147-2024	18-nov-24	Entrega de Informe mensual SST - Agosto	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
2024S-VBOG-085750	18-nov-24	: En respuesta al radicado 2024E-	INVIAS	Dr. Jairo Fernando Arguello Urrego

		VUVRAZ-112875, Nª CI: 4763 DE 2023 Trimestral 1		
2024S-VBOG-086521	20-nov-24	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-109315	INVIAS	Dr. Oscar Rodolfo Acevedo Castro
2024S-VBOG-088908	26-nov-24	Respuesta oficio CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-106 con radicado INVIAS No. 2024E-VUVRAZ-112251 del 08/11/2024.	INVIAS	Dr. Jairo Fernando Arguello Urrego

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**ENTIDAD**	**DIRIGIDO A**
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-100	1-nov-24	JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PLAN DE CARGAS INTERVENTORÍA	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-101	1-nov-24	solicitud de documentos y presencia de profesional SST.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-102	2-nov-24	Entrega de Informe Semanal No 37 (25 a 31 Octubre de 2024)	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-103	8-nov-24	Radicación y entrega de Informe Trimestral Social No. 01	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-104	6-nov-24	Solicitud de documentos para el informe del mes de Octubre de 2024.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-105	7-nov-24	Aprobación de Documento PAGA	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-106	7-nov-24	Entrega de documento PAGA Versión 1 con sus anexos, formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 ACTA DE RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL DE PROYECTOS, MASPS-MN1-IN-3-FR-1 ACTA DE RADICACION Y ACTUALIZACION SOCIAL DE PROYECTOS, con sus respectivos anexos.	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-107	9-nov-24	Respuesta comunicación Enviada N°1995 de 2024 al contratista de obra.	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	Ing. Wilmer Riatiga Ocampo
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-108	11-nov-24	Desacato Atención Observaciones al AIU para Revisión y Aprobación de la desagregación del AIU del Contrato de Obra No 016-2023	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-109	9-nov-24	Aprobación Análisis de trabajo seguro.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-110	9-nov-24	Solicitud Señalización y Maletines trabajos Caño Flores	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-111	9-nov-24	Atención Observaciones Entrega Acta Parcial de Costos No 08	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-112	9-nov-24	Entrega de Informe Semanal No 38 (01 a 07 Noviembre de 2024)	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-113	9-nov-24	Informe de Atraso Actividades – No culminación Actividades Periodo Contractual	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-114	12-nov-24	ANUNCIO CAUSAL DE MULTA TERMINO CONTRACTUAL	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	Ing. Wilmer Riatiga Ocampo
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-115	12-nov-24	Entrega informe ambiental trimestral N°1 periodo marzo - mayo 2024.	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-116	12-nov-24	Entrega de Actas de Comité No 24 y No 25	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-117	12-nov-24	PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO 016 DE 2023	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-118	13-nov-24	Novedades de la seguridad social	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**ENTIDAD**	**DIRIGIDO A**
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-119	13-nov-24	Diseño Geométrico actualizado.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-120	13-nov-24	Solicitud Pronunciamiento AIU Contrato Obra 016 de 2023	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	Ing. Wilmer Riatiga Ocampo
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-121	14-nov-24	SOLICITUD CERRAMIENTO, PROTECCION, DEMARCACIÓN, SEÑALIZACIÓN ZONAS DE ACOPIO Y MANIPULACIÓN SALES INORGANICAS	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-122	13-nov-24	SOPORTE IMPREVISTOS ACORDE PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO 016 DE 2023	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-123	14-nov-24	Observaciones al proceso de estabilización-Solicitud retiro material tramo prueba Frente Caño Flores	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-124	14-nov-24	Reiteración Atención Observaciones al AIU para Revisión y Aprobación de la desagregación del AIU del Contrato de Obra No 016-2023 acorde a comunicado No 2046 de 2024 Alcaldía de Fortul	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-125	14-nov-24	Reiteración de señalización, CAÑO FLORES	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-126	14-nov-24	Entrega de documentos soporte y actas de costos No.9, Octubre de 2024.	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-127	14-nov-24	Entrega de Proyección actas de costos No.10 correspondiente a Noviembre de 2024. Atención a solicitud registrada INVIAS con radicado: 2024S-VCAS-084841	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-128	16-nov-24	Entrega de Informe Semanal No 39 (08 a 14 Noviembre de 2024)	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-129	18-nov-24	Entrega de Actas de Comité No 26	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-130	19-nov-24	Respuesta comunicado 2024S-VBOG-085750. Observaciones informe trimestral componente social no. 1	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-131	20-nov-24	Informe Trimestral Componente Social no. 2.	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-132	20-nov-24	Solicitud Entrega de Plan de Inversión Ambiental Nro 1.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-133	22-nov-24	AVAL PRORROGA REGISTRO CSVF-1144-2024 CONTRATO 016 DE 2023	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	Ing. Wilmer Riatiga Ocampo
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-134	22-nov-24	SOLICITUD PRORROGA	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-135	22-nov-24	Entrega de Acta de Comité No 27	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-136	22-nov-24	Entrega Informe Ambiental Trimestral N°2 periodo (junio - agosto 2024.)	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Argüello
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-137	25-nov-24	Entrega Informe Semanal No 40	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-138	26-nov-24	Solicitud Presentación Planillas Inicio a Hoy acorde AIU Contrato Obra 016 de 2023	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-139	25-nov-24	Trazabilidad Atrasos en Áreas del Proyecto	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	**FECHA**	**ASUNTO**	**ENTIDAD**	**DIRIGIDO A**
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-140	27-nov-24	Incumplimiento reiterado de las medidas de seguridad y salud en el trabajo - Contrato de Obra 016 de 2023	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-141	27-nov-24	AVAL PRORROGA REGISTRO CSVF-1144-2024 CONTRATO 016 DE 2023	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-142	27-nov-24	AVAL PRORROGA REGISTRO CSVF-1144-2024 CONTRATO 016 DE 2023	Municipio de Fortul, secretaria de Planeación municipal	Ing. Wilmer Riatiga Ocampo
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-143	28-nov-24	Respuesta comunicado CSVF-1150-2024 del 21 de noviembre de 2024.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-144	28-nov-24	Solicitud de Paz y Salvo por Todo Concepto.	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Ing. Javier Orlando Sanabria Jiménez
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-145	28-nov-24	Entrega Formatos INVIAS Solicitud Prórroga Interventoría	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-146	29-nov-24	Entrega Informe Semanal No 41	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero
CONECTARARAUCA-INVIAS-2024-147	29-nov-24	Entrega de Acta de Comité No 28	INVIAS	Ing. Mónica Lorena Montenegro Quintero

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS

TRAMO 1 CAÑO FLORES



Figura 1. 27/11/2024 Instalación de Geotextil (K0+780-K0+820) Carril derecho y (K0+180-K0+535) carril izquierdo.



Figura 2. 25/11/2024 Estabilización Química de terraplén con sales Inorgánicas (K0+780-K0+820) Carril derecho y (K0+180-K0+535) carril izquierdo.



Figura 3. 18/11/2024. Movimiento Red eléctrica.



Figura 4. 19/11/2024. Estabilización Química de terraplén con sales Inorgánicas (K0+430 - K0+780) carril derecho.



Figura 5. 2/11/2024. Conformación de terraplén de la abs K3+590 a la abs K3+790, capas posteriores.



Figura 6. 9/11/2024. Estabilización Química de terraplén con sales Inorgánicas (K0+180 - K0+430)

TRAMO 2 PALMARITO



Figura 1. 28/11/2024. Aplicación de MDC-19, K6+850 -K6+426 (Carril derecho) y K6+850 - K6+110 (carril izquierdo)



Figura 2. 20/11/2024. Imprimación para posterior aplicación de MDC-19, K7+400 hasta K6+850 (Carril derecho e izquierdo)



Figura 3. 26/11/2024. Cereo de base granular K6+850 - k6+025 para posterior imprimación.



Figura 4. 21/11/2024. Aplicación de MDC-19, K7+400 hasta K6+850 (Carril derecho).



Figura 5. 7/11/2024. Construcción obra de drenaje (alcantarilla en tubo de diámetro 36") en la abscisa K6+633.



Figura 6. 15/11/2024. Construcción obra de drenaje (alcantarilla en tubo de diámetro 36") en la abscisa K6+633.

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES- SST

✓ GESTIÓN AMBIENTAL

Registro fotográfico noviembre 2024	
CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL	
	
	
Jornadas de sensibilización ambiental	
MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
	





Materiales de contruccion en frentes de obra.

SEÑALIZACIÓN FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES









Señalización en obra

SUMINISTRO DE AGUA Y HUMECTACIÓN EN OBRA





Humectación en obra para mitigar material particulado.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CANTIDADES GENERADAS (ORDINARIOS, RECICLABLES, PELIGROSOS)









Recolección y separación de residuos sólidos.

VISITA DE AUTORIDAD AMBIENTAL A FRENTES DE OBRA.









Funcionarios CORPORINOQUIA.

✓ GESTIÓN SOCIAL

Contrato de obra No 016 de 2023	
Registro fotográfico Noviembre	
SOCIALIZACIONES CON LA COMUNIDAD	





Capacitación a personal operativo

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD









Oficina de Atención e instalación de cartelera informativa

CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA





Reunión Extraordinaria

INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DE TRANSVERSALIZACIÓN





Capacitación en Escuela de Palmarito

8.4 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Anexo AD. Se adjunta copia de la bitácora de los siguientes sectores, respetivamente:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.

- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

8.5 FORMATOS

ANEXOS		
A	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Informe Semanal
B	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
C	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
D	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra
E	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Estado General del Tiempo
F	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Resumen Ensayos de Laboratorio
G	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra
H	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
I	MEPI-MN-IN-2-FR-1	Plan de inversión de anticipo de obra
J	MEPI-MN-IN-2-FR-2	Seguimiento a la Inversión del Anticipo
k		Seguimiento programa de obra
L	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Programa de Inversión o reprogramación obra
M	MEPI-MN-IN-6-FR-2	Seguimiento Programa de Inversiones
N	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Actas de Comité de Obra
O	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Actas de Reunión
P		Informes especialistas y profesionales
Q		Informe del Programa Anual de Caja - PAC
R		Informe matriz de riesgos.
S		Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría
T		Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.
U	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría
V	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría
W	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría
X	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría
Y	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría
Z	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Plan de inversión del anticipo de interventoría
AA	MEPI-MN-IN-3-FR-2	Seguimiento al plan de inversión del anticipo
AB	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado
AC	MEPI-MN-IN-9-FR-3	Seguimiento al Plan de Cargas
AD		Copia bitácora

ANEXOS		
AE		Informe Administración Vial

ANEXO A

MEPI-MN1-IN-15-FR-3

Informes Semanales

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 38 del 1/11/2024 al 7/11/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.

Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
INTEGRANTES:	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)		
CONTRATO No.	016 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 28.032.768.645,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		
INTEGRANTES:	SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)		
CONTRATO No.	4763 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.137.768.645	$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.856.588.140			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 21.429.697.509	76,45%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.690.045.443	63,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.739.652.066)	-13,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 21.429.697.509	76,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 17.690.045.443	63,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.739.652.066)	-13,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.880.836.389	10,28%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 963.592.882	3,44%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: **El contratista entrego la nueva programación de obra ajustada al adicional en valor No.1 del contrato de obra 016 de 2023.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.424.823.465	77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.424.823.465	77%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 43.176.469	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	11.568.884.300
Amortizado $	3.225.990.286,73
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 77% Avance o Atraso Físico % 16%
Meta Física Ejecutada % 61%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carrotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carrotanque irrigador de asfalto	2	
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual		
Compactador de rodillo		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

PALMARITO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		95%			95,0%
		103600			Ejec		73%			73,0%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		86%			86,0%
		12703,7			Ejec		94%			94,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0,0%
		22200			Ejec		0%			0,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		37%			37,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		49%			49,0%
					Ejec		0%			0,0%

CAÑO FLORES

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	100%				100,0%
					Ejec	99%				99,0%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	62%				62,0%
		54626			Ejec	0%				0,0%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	100%				100,0%
		523,41			Ejec	99%				99,4%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog	100%				100,0%
		1,8			Ejec	0%				0,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	43%				43,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	20%				20,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permi sos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41-16-0860 del 18 de julio de 2016

ESTADO: Se entrega por parte del contratista el documento paga de obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la RESOLUCIÓN 700.3624-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024

Se está a la espera por parte del proyecto del permiso que autoriza realizar las obras en el tramo adicional en el sector caño flores.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	80	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	69	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 94

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

OBSERVACIONES: El contratista realizó entrega de informe mensual junto con los anexos, también realizó entrega de la programación de las actividades correspondientes al mes de noviembre. Se realizaron las observaciones dadas por la Interventoría en los formatos de las actas de vecindad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Terraplén en las siguientes abscisas K3+590 - K3+790 capa posterior ; se realizó chequeo de niveles topográficos de terraplén en las capas compactadas durante la semana. 1.2.2.1 Excavación mecánica en material común , 1.2.2.3 Relleno con material seleccionado, 1.2.3.4 N Concreto simple (17 Mpa), 1.2.3.2 Concreto reforzado resistencia 21mpa, 1.2.3.3 Tubería de concreto reforzado, clase II-900 mm en Alcantarillas (k3+045, K3+245, K3+645) Sobre el Carril izquierdo. Desde el componente social se realizó seguimiento a los compromisos generados en reunión con la veeduria de este sector y se realizó la entrega del informe mensual por parte del Contratista y de la Interventoría. **TRAMO 2 (Palmarito)**: ;se realizó: 2,1 Geotextil , 2,3 Sub Base granular SBG-50 - (Sobre tramo correspondiente a obras de drenajes pendientres) , 2,4 Base Granular Clase II (K7+200-K7+400) . 2,5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 desde k3+850 hasta k4+840 (Carril derecho) y K3+850 hasta k4+040 (Carril Izquierdo); 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 desde k3+850 hasta k4+840 (Carril derecho) y K3+850 hasta k4+040 (Carril Izquierdo); . Se ejecutaron actividades correspondientes a obras de drenaje (k6+633)
Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información:
Se revisa de manera diaria el estado de las correcciones a los informes ambientales solicitadas desde la interventoría, estos informes a la fecha se encuentran sin las correcciones realizadas por lo cual continúan sin aprobación de la interventoría.
Se recibe por parte del contratista el documento PAGA de obra actualizado, se aprueba y se radica ante el INVIAS Bogotá dirección de sostenibilidad.
Se acompaña comité de obra, en este se manifiesta el estado de la obra en la parte documental dentro del componente.
Se escribe a el municipio de Fortul en relación el estado de los compromisos ambientales en cuanto a la entrega de la siguiente información por parte del contratista:
Entrega de documento PAGA: cumplido
Entregade correcciones a informes mensuales desde marzo hasta septiembre: no cumplido.
Entrega de Plan de inversión Ambiental: no cumplido.
Desde el Componente Social se realizó reunión entrega de la programación de las actividades mensuales de noviembre y se realizaron los ajustes a los formatos de las actas de vecindad diligenciadas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de base granular clase B gradación fina para donde se requiera según cereo , corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. se inicierán actividades de estructura de pavimento en caño flores. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se continuará con el seguimiento a los compromisos generados con la comunidad de Caño Flores, se realizará actualización de cartelera informativa y se realizará capacitación al personal operativo en el sector de Palmarito.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Conformación de terraplén de la abs K3+590 a la abs K3+790, capas posteriores. (Tramo 1)



Conformación de terraplén de la abs K3+590 a la abs K3+790, capas posteriores. (Tramo 1)



Construcción de obras de drenaje (Tramo 1)



Punto de separación de residuos frente de obra.



Llegada de materiales frentes de obra



Construcción de obras drenaje (K6+633) - Palmarito



Imprimación, Aplicación de MDC-19 , K3+850 hasta k4+ 040 (Carril derecho e Izquierdo)



conformación de estrructura de la vía, con geotextil y materiales granulares (tramos obras de drenaje)



Movimiento de equipos y maquinaria en obra.



Señalización en frentes de trabajo.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
Medir obra ejecutada.
Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
Llevar un registro fotográfico del proyecto.
Supervisar materiales y fuente de materiales.
Elaborar informe semanal

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 39 del 8/11/2024 al 14/11/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
INTEGRANTES:	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)		
CONTRATO No.	016 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 28.032.768.645,10
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		
INTEGRANTES:	SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)		
CONTRATO No.	4763 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.137.768.645	$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.856.588.140			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.946.278.272	85,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.969.842.964	64,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.976.435.308)	-21,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 23.946.278.272	85,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 17.969.842.964	64,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.976.435.308)	-21,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.516.580.763	8,98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 279.797.521	1,00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: **El contratista entrego la nueva programación de obra ajustada al adicional en valor No.1 del contrato de obra 016 de 2023.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.467.999.934	79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.467.999.934	79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 43.176.469	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	11.568.884.300
Amortizado $	3.225.990.286,73
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 84% Avance o Atraso Físico % 23%
Meta Física Ejecutada % 61%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carrotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carrotanque irrigador de asfalto	2	
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual		
Compactador de rodillo		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

PALMARITO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		95%			95,0%
		103600			Ejec		73%			73,0%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		86%			86,0%
		12703,7			Ejec		94%			94,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0,0%
		22200			Ejec		0%			0,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		37%			37,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		49%			49,0%
					Ejec		0%			0,0%

CAÑO FLORES

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	100%				100,0%
					Ejec	99%				99,0%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	62%				62,0%
		54626			Ejec	1%				1,0%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	100%				100,0%
		523,41			Ejec	99%				99,4%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog	100%				100,0%
		1,8			Ejec	0%				0,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	43%				43,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	20%				20,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: .....
TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permisos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41-16-0860 del 18 de julio de 2016

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la RESOLUCIÓN 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024

Se está a la espera por parte del proyecto del permiso que autoriza realizar las obras en el tramo adicional en el sector caño flores.

ESTADO: Se entrega por parte del contratista el documento paga de obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	80	14
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	69	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 94

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

OBSERVACIONES: El contratista realizó entrega de informe mensual junto con los anexos, también realizó entrega de la programación de las actividades correspondientes al mes de noviembre. Se realizaron las observaciones dadas por la Interventoría en los formatos de las actas de vecindad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares abscisas K0+180 - K0+430; 1.1.2.3 Estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica bscisas K0+180 - K0+430. se realizó chequeo de niveles topográficos de cereo de terraplén para la posterior colocación de geotextil. Desde el componente social se realizó envío de la e card para convocatoria a la reunión con la veeduría del sector. **TRAMO 2 (Palmarito)**: ; 2,5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 K4+040 hasta k4+210 (Carril derecho) y K4+040 hasta k4+280 (Carril Izquierdo); 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 K4+040 hasta k4+210 (Carril derecho) y K4+040 hasta k4+280 (Carril Izquierdo). Se ejecutaron actividades correspondientes a obras de drenaje (K6+633).


Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información:
Se recibe por parte del contratista de manera extemporánea las correcciones de los informes desde el mes de marzo hasta el mes de agosto de 2024, la interventoría inicia con el proceso de revisión de estos.
La Interventoría está a la espera de que se concluya por parte del contratista y el municipio el estado de plan de inversión ambiental.
Se esta a la espera por parte de la interventoría de que se concerté la reunión solicitada por la comunidad relacionada con el inicio de las compensaciones ambientales del proyecto.
Se radica informe trimestral Ambiental 1.

Desde el Componente Social se realizó capacitación al personal de obra sobre las habilidades comunicativas y diálogo. Por otro lado, se envío la ecard para convocatoria a la reunión con la veeduría del sector,la cual está programada para la última semana del mes de noviembre.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de base granular clase B gradación fina para donde se requiera según cereo , corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. se inicierán actividades de estructura de pavimento en caño flores. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se continuará con el seguimiento a los compromisos generados con la comunidad de Caño Flores, se realizará actualización de cartelera informativa y se realizará capacitación al personal operativo en el sector de Palmarito.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cereo y nivelación k0+180 -k1+300 para posterior instalacion de geotextil (Tramo 1)



Instalación de Geotextil (k0+180- k0+430) (Tramo 1)



Estabilización Química de terraplén con sales Inorgánicas (k0+180 - k0+430)



Ingreso de materiales a obra



Señalización de frentes de obra activos



Construcción de obras drenaje (K6+633) - Palmarito



Imprimación para posterior aplicación de MDC-19 , K4+040 hasta k4+280 (Carril Izquierdo) , K4+040 hasta k4+210) (Carril derecho)



Aplicación de MDC-19 , K4+040 hasta k4+210 (Carril Izquierdo) , K4+040 hasta k4+280) (Carril derecho)



Manejo de sustancias químicas en obra.



Maquinaria y señalización en obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
Medir obra ejecutada.
Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
Llevar un registro fotográfico del proyecto.
Supervisar materiales y fuente de materiales.
Elaborar informe semanal

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 40 del 15/11/2024 al 21/11/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		
INTEGRANTES:	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)			INTEGRANTES:	SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)		
CONTRATO No.	016 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10	CONTRATO No.	4763 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 28.032.768.645,10	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.137.768.645	$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.856.588.140			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 25.829.588.017	92,15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.371.299.108	65,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.458.288.910)	-26,6%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.829.588.017	92,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.371.299.108	65,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7.458.288.910)	-26,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.883.309.745	6,72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 401.456.144	1,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: **El contratista entrego la nueva programación de obra ajustada al adicional en valor No.1 del contrato de obra 016 de 2023.**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.511.176.403	81%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.511.176.403	81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	11.568.884.300
Amortizado $	3.225.990.286,73
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88% Avance o Atraso Físico % 27%
Meta Física Ejecutada % 61%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carrotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carrotanque irrigador de asfalto	2	
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual		
Compactador de rodillo		
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

PALMARITO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		95%			95,0%
		103600			Ejec		73%			73,0%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		86%			86,0%
		12703,7			Ejec		94%			94,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		0%			0,0%
		22200			Ejec		0%			0,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		37%			37,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		49%			49,0%
					Ejec		0%			0,0%

CANO FLORES

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	100%				100,0%
					Ejec	99%				99,0%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	62%				62,0%
		54626			Ejec	0%				0,0%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	100%				100,0%
		523,41			Ejec	99%				99,4%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog	100%				100,0%
		1,8			Ejec	0%				0,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	43%				43,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	20%				20,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permisos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41-16-0860 del 18 de julio de 2016

ESTADO: Se entrega por parte del contratista el documento paga de obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	x
EMISIONES:	SI		NO	N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	x

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovech amiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la RESOLUCIÓN 700.36 .24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24. 0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024

Se está a la espera por parte del proyecto del permiso que autoriza realizar las obras en el tramo adicional en el sector cañ o flores.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	80	16
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	69	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 96

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

OBSERVACIONES: El lunes 18 se realizó capacitación al personal operativo del sector de Caño Flores sobre el tema de habilidades de comunicación y diálogo con la participación de 14 personas. El miércoles 20 de noviembre se realizó jornada de sensibilización para la prevención de todo tipo de violencia basada en género en el Colegio de Palmarito con los estudiantes. Se realizó comité de obra el día viernes 15 con la Alcaldía.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: **Este programa no aplica para este proyecto**

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares abscisas K0+430 - K0+780 Carril derecho ; 1.1.2.3 Estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica bscisas K0+430 - K0+780 carril derecho. se realizó chequeo de niveles topográficos de cereo de terraplén para la posterior colocación de geotextil. Desde el componente social El lunes 18 se realizó capacitación al personal operativo del sector de Caño Flores sobre el tema de habilidades de comunicación y diálogo con la participación de 14 personas. **TRAMO 2 (Palmarito)**: ; 2,5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 K7+400 hasta k6850 (Carril derecho e izquierdo) ; 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 K7+400 hasta k6+850 (Carril derecho) . Se ejecutaron actividades de cereo de base granular para posterioemnte realizar imprimación . Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información:
Por parte de la interventoría se culmina la revisión de la totalidad de los informes entregados por el contratista de manera extemporánea, se realizan las observaciones pertinentes a fin de que estas sean corregidas lo más pronto posible (inmediato) y lograr la aprobación de los documentos. La Interventoría está a la espera de que se concluya por parte del contratista y el municipio el estado de plan de inversión ambiental, a la fecha no se tiene información en relación al tema, desde el municipio se programó una reunión la cual luego fue cancelada y no se tiene información de para cuando quedo reprogramada, la interventoría ve con preocupación este tema ya que en repetidas ocasiones ha manifestado el incumplimiento a la entrega de esta información y el vencimiento de los plazos para inicio de las actividades de compensación.
Se está a la espera por parte de la interventoría de que se concerté la reunión solicitada por la comunidad relacionada con el inicio de las compensaciones ambientales del proyecto.
Se recopila información, se inicia construcción del informe mensual y el informe trimestral 3, se actualiza información de informe trimestral 2 con el envió de manera extemporánea de la información requerida al contratista. Se revisa y aprueba ingreso de maquinaria para las actividades de pavimento. Desde el Componente Social, el miércoles 20 de noviembre se realizó jornada de sensibilización para la prevención de todo tipo de violencia basada en género en el Colegio de Palmarito con los estudiantes..

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de base granular clase B gradación fina para donde se requiera según cereo , corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. se iniciarán actividades de estructura de pavimento en caño flores. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se realizará el día 27 de noviembre la reunión informativa en el sector de Palmarito y el jueves 28 de noviembre en el sector de Caño Flores.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de Geotextil (k0+180- k0+430) (Tramo 1)



Movimiento Red electrica (Tramo 1)



Estabilización Química de terraplén con sales Inorgánicas (k0+430 - k0+780) carril derecho.



Aprobación e ingreso de maquinaria en obra.



Señalización de frentes de obra activos



Cereo de base granular K7+400 al k6+850 para posterior imprimación.




Imprimación para posterior aplicación de MDC-19 , K7+400 hasta k6+850 (Carril derecho e izquuerdo)



Aplicación de MDC-19 , K7+400 hasta k6+850 (Carril derecho)



Humectación de vías



Movimiento de postes de energía en obra.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
Medir obra ejecutada.
Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
Llevar un registro fotográfico del proyecto.
Supervisar materiales y fuente de materiales.
Elaborar informe semanal

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 41 del 22/11/2024 al 28/11/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOANNA ALEXANDRA OCHICA PLAZAS.

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumenta el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contempla la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Sí Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL			INTERVENTOR:	CONSORCIO SADINTECON		
INTEGRANTES:	CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%)			INTEGRANTES:	SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%)		
CONTRATO No.	016 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 23.137.768.645,10	CONTRATO No.	4763 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 1.856.588.140,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 4.895.000.000,00	FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	21/3/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 28.032.768.645,10	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/12/2024	VALOR ANTICIPO:	
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.137.768.645	$ 4.895.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 23.137.768.645			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.856.588.140			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1.856.588.140			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 26.820.705.047	95,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 19.390.302.120	69,18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.430.402.927)	-26,5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.820.705.047	95,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.390.302.120	69,18%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7.430.402.927)	-26,51%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 991.117.030	3,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.019.003.012	3,64%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.554.352.872	84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.554.352.872	84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 43.176.469	2%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 43.176.469	2%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	11.568.884.300
Amortizado $	3.225.990.286,73
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 94% Avance o Atraso Físico % 30%
Meta Física Ejecutada % 64%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezcladora de concreto (1 bulto)	2	2
Camioneta	2	2
Carrotanque de agua (1000 gl)	2	1
Motoniveladora 215 HP o similar	2	1
Vibrocompactador 153 HP o similar	2	1
Carrotanque irrigador de asfalto	2	2
Retroexcavadora	2	2
Compactador manual	2	2
Compactador de rodillo	2	2
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

PALMARITO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog		100%			100,0%
					Ejec		100%			100,0%
Excavaciones	m3	6587,78			Prog		100%			100,0%
					Ejec		99%			99,0%
* Estructura de vía	m3 y m2	26902,1			Prog		95%			95,0%
		103600			Ejec		73%			73,0%
* Obras de drenaje	m3 y Kg	70,44			Prog		86%			86,0%
		12703,7			Ejec		94%			94,0%
Señalización vertical y demarcación vial	Km y Un	35			Prog		100%			100,0%
		22200			Ejec		71%			71,0%
Actividades de caracterización vial	Km	7,4			Prog		80%			80,0%
					Ejec		0%			0,0%
* Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog		90%			90,0%
					Ejec		0%			0,0%

CAÑO FLORES

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Fase de prealistamiento para ejecución de obra					Prog	100%				100,0%
					Ejec	100%				100,0%
Excavaciones y llenos	m3	40652,5			Prog	100%				100,0%
					Ejec	99%				99,0%
* Estructura de pavimento	m3 y m2	8644,61			Prog	100%				100,0%
		54626			Ejec	5%				5,5%
* Señalización	Un y m	1098			Prog	0%				0,0%
		11880			Ejec	0%				0,0%
Obras de drenaje	Kg y m3	13660,8			Prog	100%				100,0%
		523,41			Ejec	99%				99,4%
Movimiento Red eléctrica	Und y m3	18			Prog	100%				100,0%
		1,8			Ejec	0%				0,0%
Actividades medidas de compensación ambiental	Un	1			Prog	90%				90,0%
					Ejec	0%				0,0%
* Actividades de caracterización vial	Km	2,8			Prog	80%				80,0%
					Ejec	0%				0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permi sos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 2023.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41-16-0860 del 18 de julio de 2016

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	x	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	x	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	x	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x

OBSERVACIONES:

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovech amiento forestal y concesión de aguas, RESOLUCIÓN 700.36.24-0055 17 de JUNIO de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la RESOLUCIÓN 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24. 0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024

Se está a la espera por parte del proyecto del permiso que autoriza realizar las obras en el tramo adicional en el sector cañ o flores.

ESTADO: Se entrega por parte del contratista el documento paga de obra para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	80	16
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	69	13
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	11	3
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	32	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 96

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

OBSERVACIONES: El miércoles 27 de noviembre se realizó reunión informativa con la comunidad del sector de Palmarito, funcionarios de la Alcaldía Municipal, personal de Interventoría y Contratista para informar sobre la adición realizada al contrato, así como las actividades realizadas durante el mes de noviembre.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: **Este programa no aplica para este proyecto**

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

TRAMO 1 (Caño Flores): Actividades 1.1.2.3 Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares abscisas K0+780 - K0+820 Carril derecho y K0+180 - K0+535 Carril Izquierdo ; 1.1.2.3 Estabilización química de terraplén y/o subrasante con sal inorgánica bscisas K0+780 - K0+820 Carril derecho y K0+180 - K0+535 Carril Izquierdo. se realizó chequeo de niveles topográficos de cereo de terraplén para la posterior colocación de geotextil. Desde el componente social se realizó la presentación para la reunión informativa que se desarrollará el jueves 28 de noviembre. **TRAMO 2 (Palmarito)**: ; 2,5 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-5 k6+850 -k6+426 (Carril derecho) y k6+850 -k6+110 (Carril Izquierdo) ; 2.6 Mezcla Densa en Caliente MDC-19 k6+850 -k6+426 (Carril derecho) y k6+850 -k6+110 (Carril Izquierdo) . Se ejecutaron actividades de cereo de base granular para posterioemnte realizar imprimación . Desde el componente ambiental para esta semana se reporta la siguiente información: Por parte de la interventoría se aprueba los informes revisados, los cuales fueron entregados por el contratista de manera extemporánea, se realizan observaciones a los informes de los meses de septiembre y octubre las cuales son subsanadas por parte del contratista, se realiza acompañamiento a las actividades de obra, se registra visita de la autoridad ambiental CORPORINOQUIA.
La Interventoría continua a la espera de que se concluya por parte del contratista y el municipio el estado de plan de inversión ambiental, a la fecha no se tiene información con relación al tema, la interventoría ve con preocupación este tema ya que en repetidas ocasiones ha manifestado el incumplimiento a la entrega de esta información y el vencimiento de los plazos para inicio de las actividades de compensación.
Se recopila información, se inicia construcción del informe mensual y el informe trimestral 3.
Desde el Componente Social, se realizó reunión informativa con la comunidad acerca de la adición del contrato y las actividades realizadas en el mes de noviembre.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuará con las actividades de instalación de riego de imprimacion y mezcla densa en caliente MDC-19 , excavación mecánica en material común, construcción de terraplén (arena limosa), concreto simple resistencia 17 Mpa, concreto de 21 Mpa para obras de drenaje transversal, verificación de niveles por parte de la comisión topográfica, instalación de base granular clase B gradación fina para donde se requiera según cereo , corte, figurado y traslado de acero para amarrado en el punto de ubicación de las obras de drenaje transversal. se iniciarán actividades de estructura de pavimento en caño flores. Se realiza requerimientos al contratista en relación a las actividades dentro del componente ambiental que a la fecha no se han cumplido, seguimiento y verificación de los compromisos establecidos dentro del permiso único ambiental. Desde el componente social se realizará el día 28 de noviembre la reunión informativa del sector de Caño Flores y se elaborará el informe mensual para ser entregado el 30 de noviembre.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de Geotextil (k0+780-K0+820) Carril derecho y (k0+180-k0+535) carril izquierdo (Tramo 1)



Estabilización Química de terraplén con sales Inorgánicas (k0+780-K0+820) Carril derecho y (k0+180-k0+535) carril izquierdo (Tramo 1)



Estabilización Química de terraplén con sales Inorgánicas (k0+780-K0+820) Carril derecho y (k0+180-k0+535) carril izquierdo (Tramo 1)



Limpieza de servicios sanitarios portátiles..



Señalización de frentes de obra activos



Cereo de base granular k6+850 - k6+025 para posterior imprimación.



Aplicación de MDC-19 , k6+850 -k6+426 (Carril derecho) y k6+850 -k6+110 (carril izquierdo)



Aplicación de MDC-19 , k4+210 -k4+766 (Carril derecho) y k4+280 -k4+335 (carril izquierdo)



Cargue y movimiento de materiales en obra.



Ingreso de materiales

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
Medir obra ejecutada.
Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
Llevar un registro fotográfico del proyecto.
Supervisar materiales y fuente de materiales.
Elaborar informe semanal

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO

Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

ANEXO B

MEPI-MN1-IN-15-FR-4

Maquinaria y Equipo del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

MAQUINARIA Y EQUIPO				MAYO																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMIONETA	TOYOTA / 2013	1000-5	**PALMARITO**	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A
CARROTANQUE	CEHVROLET / 1994	12000	**PALMARITO**	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A
EXACAVADORA	CATTERPILLAR	416F2	**PALMARITO**	A	R	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	SEM / 2022	.....	**PALMARITO**	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	R	R	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	BOMAG / 2011	.....	**PALMARITO**	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA	M2G9H	2 bultos	**PALMARITO**	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A
ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	**PALMARITO**	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B4O4	**PALMARITO**	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A
COMPACTADOR DE NEUMÁTICO	HAMM / GRW-15	.....	**PALMARITO**	A	A	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A
PAVIMENTADORA-FINISHER	CATTERPILLAR / AP 1050B 1992	.....	**PALMARITO**	A	A	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND. / SD-70D PRO-PAC	.....	**PALMARITO**	A	A	I	A	I	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
			TOTAL ACTIVO	11	10	0	10	8	11	11	9	8	0	11	11	8	11	11	11	0	7	7	8	6	10	10	0	6	10	11	11	11	11	11
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
			TOTAL INACTIVO	0	0	11	0	3	0	0	2	3	11	0	0	3	0	0	0	11	4	4	3	5	1	1	11	4	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	330	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	249	75,5
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	4	1,2
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	77	23,3

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO : L

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: * LA MAQUINARIA Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN INACTIVOS LOS DÍAS DOMINGOS DEL MES. EXCEPTO EN 2 DOMINGOS QUE SE LABORÓ CON INSTALACIÓN DE ASFALTO MDC-19.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Edier Jafeth Mariotta Padilla
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-277388 NTS

Firma

Nombre: Esneider Fuentes Zárate
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-105731 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

MAQUINARIA Y EQUIPO				MAYO																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMIONETA	MAZDA / 2013	1000-5	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
CARROTANQUE	INTERNACIONAL/ 2005	12000	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A
EXCAVADORA	KOMATSU/	220-8	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR/	10.700 c	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
MOTONIVELADORA	LIUGONG/ 2011	.....	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR/ 2022	.....	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA	M2G9H	2 bultos	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A
NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B4O4	CAÑO FLORES	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	I	I	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
			TOTAL ACTIVO	9	9	0	9	9	9	8	8	8	0	9	9	9	9	9	9	0	8	8	8	7	8	8	0	8	7	8	8	8	8
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	9	0	0	0	1	1	1	9	0	0	0	0	0	0	9	1	1	1	2	1	1	9	1	2	1	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	270	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	217	80,4
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	53	19,6

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO : L

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: *. *

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
iende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en rep
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplim
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma

Nombre: Ruben Alonso Borrero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202096268 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO C

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MNT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023 — **CONTRATISTA:** VIAS FORTUL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30-nov-24 — **PROYECTO:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

NOMBRE ARL: POSITIVA SEGUROS — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ	1116782711	RESIDENTE DE OBRA	$ 2.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.700.000	$ 188.000	5	NUEVA EPS	80651973	$ 108.000	PORVENIR	80651973	$ 432.000	$ 108.000			
2	SANDRA JOHANNA AMAYA PULIDO	1102718125	PROFESIONAL HSEQ	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	80651973	$ 52.000	PORVENIR	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
3	OLGA PIERINA CISNEROS FLORES	1116787329	PROFESIONAL HSEQ	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	80651973	$ 52.000	PORVENIR	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
4	ALEJANDRO ROJAS GOMEZ	80233801	ESPECIALISTA EN VIAS	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	80651973	$ 52.000	COLPENSIONES	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
5	WILFREDO RAMIREZ RAMIREZ	1116787495	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	80651973	$ 52.000	PORVENIR	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
6	EDER JAFETH MARIOTTA PADILLA	1124383847	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.700.000	$ 188.000	5	SANITAS	80651973	$ 108.000	COLPENSIONES	80651973	$ 208.000	$ 52.000			
7	MARLA ALESSANDRA DAVILA RAMIREZ	1102718125	ESPECIALISTA HIDRAULICO	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.800.000	$ 125.300	5	NUEVA EPS	80651973	$ 72.000	PORVENIR	80651973	$ 288.000	$ 72.000			
8	ACEVEDO CAÑAS YERNEY	1007329544	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 78.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.600	PORVENIR	79905934	$ 208.100	$ 45.100	$ 22.600	$ 33.900	
9	ACEVEDO CAÑAS JESSICA PAOLA	1007397121	CONTROLADOR VIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
10	MARTINEZ NIETO LUZ ANDREA	1115723899	INSPECTOR HSEQ	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 162.500	COLPENSIONES	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
11	DURAN CALVO RODRIGO	1098752215	CONTROLADOR VIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
12	SUESCUN CAICEDO ENDERSON	1115722111	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 84.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 199.100	PORVENIR	79905934	$ 208.100	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	
13	ACEVEDO AGUILAR LAURA MAGDALENA	1116782616	AUXILIAR SISO	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.500.000	$ 104.400	5	NUEVA EPS	78254700	$ 187.500	PORVENIR	79905934	$ 240.000	$ 60.000	$ 30.000	$ 45.000	
14	SIERRA JIMENEZ IVAN DARIO	1116801241	ALMACENISTA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 84.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 159.100	PORVENIR	79905934	$ 208.100	$ 48.600	$ 24.300	$ 36.500	
15	HERRERA ALVAREZ CRISTIAN ALEXANDER	1116806695	AUX RESIDENTE DE OBRA	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.500.000	$ 174.000	5	SANITAS	78254700	$ 312.500	COLPENSIONES	79905934	$ 400.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	
16	ROJAS BENITEZ JUAN DAVID	1119180729	CADENERO+E42:E44	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
17	ORTEGA SUESCUN MARYURY DANIELA	1119181598	CONTROLADOR VIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
18	VILLARRAGA ARCHILA DUMAR	1119182031	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
19	CUBIDES RIOS FREDY EMEL	1119182525	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
20	GONZALEZ PEDRAZA WILMER ALEXANDER	1121842709	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
21	CORTES RIALPE SEGUNDO FLORENCIO	12906422	OFICIAL	$ 1.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.400.000	$ 97.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 175.000	PORVENIR	79905934	$ -	$ 56.000	$ 28.000	$ 42.000	
22	CUBIDES PEÑA DAGEY ARNOLDO	17570610	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	COLPENSIONES	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
23	PABON VILLAMIZAR ELICEO	17570742	CADENERO	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 162.500	COLPENSIONES	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
24	PAOLA CRISTINA OJEDA SANCHEZ	37329121	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.800.000	$ 194.900	5	NUEVA EPS	78254700	$ 350.000	COLPENSIONES	79905934	$ 448.000	$ 112.000	$ 56.000	$ 84.000	
25	RODRIGUEZ SIERRA LEIDY VANESSA	60264418	SECRETARIA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	FOSYGA	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
26	HERNANDEZ GIRALDO DUMAR JAVIER	74860225	MAESTRO DE OBRA	$ 1.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.400.000	$ 97.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 175.000	PORVENIR	79905934	$ 224.000	$ 56.000	$ 28.000	$ 42.000	
27	HERNANDEZ HENAO BERNARDO	7505900	MAESTRO DE OBRA	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.600.000	$ 111.400	5	NUEVA EPS	78254700	$ 200.000		79905934	$ -	$ 64.000	$ 32.000	$ 48.000	
28	MIRANDA RUIDIAZ TARCISIO	79775680	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
29	ALARCON OLAYA ADALBERTO	79844309	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 3.350.000	$ 233.200	5	NUEVA EPS	78254700	$ 418.800	COLPENSIONES	79905934	$ 536.000	$ 134.000	$ 67.000	$ 100.500	
30	RODRIGUEZ BAUTISTA HECTOR	88203373	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	SANITAS	78254700	$ 160.800	COLPENSIONES	79905934	$ 208.100	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	
31	HERRERA TUNJANO LUIS ALBERTO	91243330	ALMACENISTA	$ 1.625.362	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.625.362	$ 113.200	5	NUEVA EPS	78254700	$ 203.200	PORVENIR	79905934	$ 260.100	$ 65.100	$ 32.600	$ 48.800	
32	ROPERO GOMEZ ISAIAS	91536077	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
33	RODRIGUEZ SALSEDO WILSON	96192995	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 1.300.000	$ 90.500	5	NUEVA EPS	78254700	$ 162.500	PORVENIR	79905934	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
34	GOMEZ FERNANDEZ LUIS ALEXANDER	96193901	TOPOGRAFO	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	$ 2.500.000	$ 174.000	5	NUEVA EPS	78254700	$ 312.500	PORVENIR	79905934	$ 400.000	$ 100.000	$ 50.000	$ 75.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista a la fecha (06/11/2024) no ha entregado las planillas de seguridad social del mes de octubre.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma
Nombre: Jánier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO D

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

MES INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** VIAS FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	600 DE 2023	Transporte Infraestrutura red vial regional		080 - CONVENIOS	CONTRATO PRINCPICAL	$ 23.137.768.645	$ -
2024	596 de 2024	Transporte Infraestrutura red vial regional		080 - CONVENIOS	CONTRATO ADICIONAL No. 01	$ 4.895.000.000	
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 28.032.768.645,10**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	parcial	2024			$ 6.451.980.286,41	$ 3.225.990.143,21	$ 3.225.990.143,20	$ 8.342.894.156,80							PAGADA
2	parcial	2024			$ 3.928.517.820	$ 1.964.258.910,10	$ 1.964.258.910,09	$ 6.378.635.246,70	15/09/2024						PAGADA
3	parcial	2024			$ 5.031.893.468	$ 2.515.946.734,03	$ 2.515.946.734,02	$ 3.862.688.512,67	31/10/2024						EN REVISIÓN
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

OBSERVACIONES: Para el período del presente informe No se presentaron actas parciales por parte del contrato de obra

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

El acta parcial 2 se encuntra en proceso para pago con la unidad ejecutora. El acta parcial 3 se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma
Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional ! 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO E

MEPI-MN1-IN-15-FR-10

Estado general del tiempo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**		**Total**
Seco	24	24	23	21	22	24	24	24	21	22	24	24	22	22	24	22	24	24	24	23	20	21	22	24	24	23	24	23	24	24		691
Lluvias moderadas			1	1	2				2	1			2	1		2				1	2	1	1			1		1				19
Lluvias intensas									1	1				1							2	2	1									8
Total horas	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		**718**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

EN HORAS LABORALES SE HAN PRESENTADO ALGUNAS LLUVIAS INTENSAS DURANTE ESTE PERIODO, UNA VEZ FINALIZADA LA LLUVIA SE RETOMABAN TRABAJOS DE CAMPO.

Firma

Nombre: Edier Jafeth Mariotta Padilla
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-277388 NTS

Firma

Nombre: Esneider Fuentes Zárate
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-105731 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	21	22	24	24	24	18	18	24	24	19	17	24	18	24	24	24	20	17	21	22	24	24	23	22	22	23	23		661
Lluvias moderadas			1	1	2				2	1			1	1		2				1	2	1	1			1	2	1	1			21
Lluvias intensas									4	5			4	6		4				3	5	2	1					1		1		36
Total horas	24	24	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		718

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

EN HORAS LABORALES SE HAN PRESENTADO ALGUNAS LLUVIAS INTENSAS DURANTE ESTE PERIODO, ESTA SITUACIÓN EFECTA DIRECTAMENTE LA ACTIVIDAD DE ESTABILIACIÓN DE TERREPLEN CON SALES INORGÁNICAS.

Firma

Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma

Nombre: Ruben Alonso Borrero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202096268 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO F

MEPI-MN1-IN-15-FR-11

Resumen ensayos de laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAL RURAL FORTUL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo		Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA										
1	3/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+065 - K0+430 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	12977	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,11	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,4	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,19	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,7	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
2	3/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+065 - K0+430 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13210	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,15	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	5,7	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	20	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,2	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	70	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
3	4/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+040 - K0+420 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13828	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,15	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,5	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,41	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,77	SI	
4	5/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+320 - K0+725 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13089	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,14	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,1	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,18	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,78	SI	

5	5/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+420 - K0+725 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	12205	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	3,79	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,76	SI	
6	7/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+725 - k0+960 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	12205	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	3,79	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,69	Si/ No	Presentó un % Límite de la tolerancia
7	7/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+725 - k0+960 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13893	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,44	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,1	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,04	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,8	SI	
8	8/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+440 - k0+695 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	14018	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,22	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,35	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,73	SI	
9	8/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / K0+440 - k0+695 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13914	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,13	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,45	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,71	SI	

10	9/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k0+695 - k1+020 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13284	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,23	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,3	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,13	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,72	SI	
11	10/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+020 -k1+345 carril Derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	13094	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,03	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,33	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,9	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,77	SI	
12	11/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+050 -k1+350 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13713	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,04	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,51	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	68	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,74	SI	
13	12/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k1+350 - k1+620 carril Izquierdo	1	Estabilidad corregida N.	9000	13894	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,07	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	4,7	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	19	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,53	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	69	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,75	SI	

B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	3/10/2024	MDC-19 / ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE -MARSHALL	INVIAS E - 148 /14 - ARTICULO 450 TABLA 450-22	PALAMRITO / k0+100 carril derecho	1	Estabilidad corregida N.	9000	12540	SI	
						Flujo en mm.	2-3,5	3,1	SI	
						Vacios con aire %	4 a 6	5,2	SI	
						Vacios en los agreg. Minerales %	Min 15	18,44	SI	
						Relación estadilidad/flujo (Kn/mm)	3 a 5	4,53	SI	
						Relación llenante/ligante efectivo (peso)	0,80 - 1,20	0,8	SI	
						Vacios llenos de Asfalto (VFA)	65 -75	69	SI	
						% de asfalto (fórmula de trabajo)	5,8 (tolerancia 0,3)	5,74	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR3+660-DER	1	≥ 95%		92,60%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR4+060-DER	1	≥ 95%		95,80%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR4+480-IZQ	1	≥ 95%		99,00%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR4+880-EJE	1	≥ 95%		95,20%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR5+360-DER	1	≥ 95%		94,20%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR5+760-IZQ	1	≥ 95%		92,20%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR6+155-DER	1	≥ 95%		109,00%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR6+560-EJE	1	≥ 95%		102,00%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR6+960-IZQ	1	≥ 95%		95,60%	SI	
	5/11/2024	BG- 38 /Densidad Cono y arena	INVIAS E - 161 /13	Caño flores / PR7+360-DER	1	≥ 95%		93,10%	SI	

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma
Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO METODO CONO Y ARENA

G&SDC
GEOTECNIA & SUELOS DE COLOMBIA
Laboratorio de suelos concretos y asfaltos

PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SOLICITANTE	CONSORCIO SADINTECON NIT 901.742.046-0
LOCALIZACIÒN:	SECTOR 1 CAÑO FLORES MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MATERIAL:	MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 4" CANTERA ROSA BLANCA MUNICIPIO DE SARAVENA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NORMA INVIAS	E - 161,150 INVIAS 2013
FECHA DE TOMA	martes, 5 de noviembre de 2024

Ensayo	No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Abscisa		K3+660 EJE	K4+060 DER	K4+480 IZQ	K4+880 EJE	K5+360 DER	K5+760 IZQ	K6+155 DER	K6+560 EJE	K6+960 IZQ	K7+360 DER
Peso frasco+cono+arena inicial	grs	6524	6458	6402	6336	6296	6250	6220	6169	6115	6060
Peso frasco+cono+arena restante	grs	3244	2644	2984	3336	2770	2754	2951	2711	2680	2259
Constante del cono	grs	1606									
Peso unitario arena	grs/cc	1,410									
Volumen del hueco	cc	1187,23	1565,96	1285,11	988,65	1361,70	1340,43	1179,43	1313,48	1297,16	1556,74
Peso material extraído húmedo total	grs	2765	3717	3112	2337	3165	3070	3182	3343	3126	3636
Peso material extraído grueso	grs	2124	2645	2023	1692	2179	2225	2197	2468	2472	2791
Peso material extraído fino	grs	641	1072	1089	645	986	845	985	875	654	845
Humedad particulas finas	%	4,2%	3,2%	3,2%	3,0%	3,4%	3,0%	3,2%	3,0%	3,2%	3,4%
Humedad particulas gruesas	%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Porcentaje de partículas gruesas	%	76,8%	71,2%	65,0%	72,4%	68,8%	72,5%	69,0%	73,8%	79,1%	76,8%
Porcentaje de partículas finas	%	23,2%	28,8%	35,0%	27,6%	31,2%	27,5%	31,0%	26,2%	20,9%	23,2%
Peso unitario Húmedo del material total	%	2,329	2,374	2,422	2,364	2,324	2,290	2,698	2,545	2,410	2,336
Humedad corregida	%	2,5%	2,3%	2,4%	2,3%	2,4%	2,3%	2,4%	2,3%	2,3%	2,3%
Peso unitario Seco del material total	grs/cc	2,272	2,319	2,364	2,311	2,269	2,239	2,635	2,489	2,357	2,283
Peso unitario seco laboratorio material fino	grs/cc	2,115									
Peso unitario seco total corregido	grs/cc	2,453	2,421	2,387	2,428	2,408	2,428	2,409	2,436	2,466	2,453
Contenido de humedad óptima laboratorio	%										
Gravedad específica del material grueso	grs/cc	2,600									
Grado compactación individual	%	92,6%	95,8%	99,0%	95,2%	94,2%	92,2%	109,4%	102,2%	95,6%	93,1%

OBSERVACIONES:

LAS DENSIDADES TOMADA EN EL SITIO DE OBRA CUMPLEN

FORMULA DE TRABAJO	GC_I (90)	GCI (90) ≥ 95 %	96,9%

DM	97	K	0,437
S	0,534	N	10

ARNEIDO CAÑA CONTRERAS
LABORATORISTA

JOHANN. MOYANO.

ING. JOHANN WALDIR MOYANO SOLANO
M.P N° 54202127220 NTS

Suelos & Geotecnia
Ingeniería – Geotecnia – Laboratorios y Construcción

PROYECTO

AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

SOLICITANTE

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

MEZCLA ASFALTICA

MDC-19

TRAMO

PR0+000 AL PR1+620 M. IZQ

PR0+000 AL PR1+345 M. DER

OCTUBRE DE 2024

ARAUCA/ARAUCA

Carrera 11 Nº 11 – 59 Barrio Meridiano Setenta
Cel. 314 261 31 82 / 321 981 33 53
E-mail: laboratoriohcsuelos@gmail.com / hercadi570@gmail.com
Arauca – Arauca - Colombia

Suelos & Geotecnia
Ingeniería – Geotecnia – Laboratorios y Construcción

INFORME DE LABORATORIO
2024-10-01 AL 2024-10-12

Carrera 11 Nº 11 – 59 Barrio Meridiano Setenta
Cel. 314 261 31 82 / 321 981 33 53
E-mail: laboratoriohcsuelos@gmail.com / hercadi570@gmail.com
Arauca – Arauca - Colombia

MEZCLA ASFALTICA MDC-19

Material 1 (M1)	Triturado 3/4″ retiene No 4, Procedente de Cantera Alfonso Sarmiento.
Material 2 (M2)	Triturado 3/8″ retiene No 4, Procedente de Cantera Alfonso Sarmiento.
Material 3 (M3)	Arena pasa No 4, Procedente de Cantera Alfonso Sarmiento.
Cemento asfaltico	60/70 Normalizado

Carrera 11 Nº 11 – 59 Barrio Meridiano Setenta
Cel. 314 261 31 82 / 321 981 33 53
E-mail: laboratoriohcsuelos@gmail.com / hercadi570@gmail.com
Arauca – Arauca - Colombia


Suelos & Geotecnia
Ingeniería – Geotecnia – Laboratorios y Construcción

ENSAYOS DE LABORATORIO
PR0+000 AL PR1+620 M. IZQ
PR0+000 AL PR1+345 M. DER
EXTRACCION DE ASFALTO
GRANULOMETRIA
ESTABILIDAD Y FLUJO

Carrera 11 Nº 11 – 59 Barrio Meridiano Setenta
Cel. 314 261 31 82 / 321 981 33 53
E-mail: laboratoriohcsuelos@gmail.com / hercadi570@gmail.com
Arauca – Arauca - Colombia

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+065 AL Pr0+430 M. Derecha	VIAJE No	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-03
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

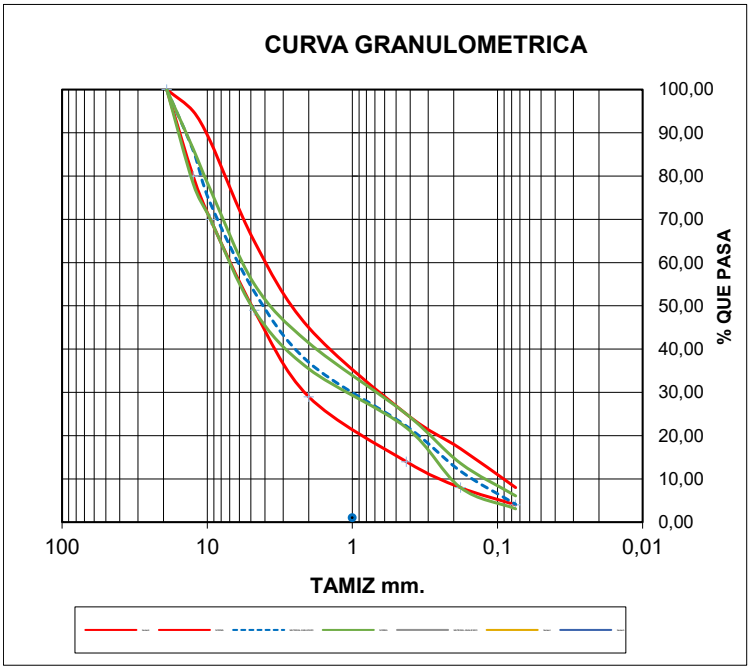

GRADACION No.1						
	Peso inicial muestra:			1439,0		
	Peso retenido tamiz No.200:			1379,3		
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	202,5	14,07	14,07	85,93	80,00	95,00
3/8"	176,3	12,25	26,32	73,68	70,00	88,00
No.4	292,6	20,33	46,66	53,34	49,00	65,00
No.10	235,5	16,37	63,02	36,98	29,00	45,00
No.40	212,2	14,75	77,77	22,23	14,00	25,00
No.80	150,0	10,42	88,19	11,81	8,00	17,00
No. 200	110,2	7,66	95,85	4,15	4,00	8,00
FONDO	59,7	4,15	100,00	0,00		
	1439,0	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1527,0	Peso Inicial gr	20,2	150
Peso final gr	1439,0	Peso final gr	20,4	
Diferencia gr	88,0	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	5,76			

BRIQUETA NUMERO	1	2	3	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	66,4	68,0	66,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1210,0	1196,0	1166,0			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1214,0	1202,0	1169,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	678,2	667,0	650,2	665,1		% asf. 5,76
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	535,8	535,0	518,8			Gmm 2,352
Peso especifico aparente	2,258	2,236	2,247	2,247		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,94	0,90	0,94			
Estabilidad medida N.	14490	13270	14220			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13621	11943	13367	12977	9000	SI
Flujo en mm.	3,20	3,24	2,88	3,11	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,0	4,9	4,4	4,4	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,3	3,7	4,6	4,19	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	67	69	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+065 AL Pr0+430 M. Derecha	VIAJE No	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-03
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

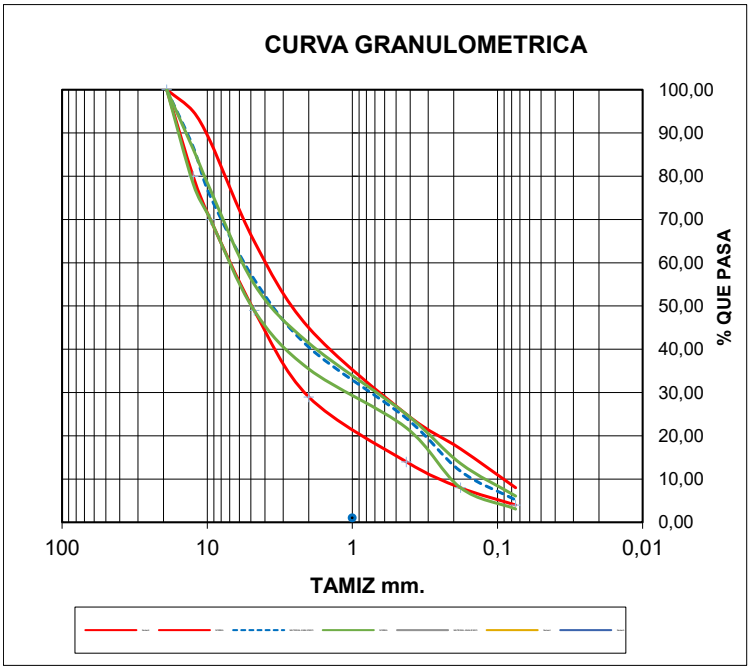

GRADACION No.1						
	Peso inicial muestra:			1533,3		
	Peso retenido tamiz No.200:			1454,0		
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	202,5	13,21	13,21	86,79	80,00	95,00
3/8"	176,2	11,49	24,70	75,30	70,00	88,00
No.4	293,1	19,12	43,81	56,19	49,00	65,00
No.10	240,2	15,67	59,48	40,52	29,00	45,00
No.40	252,3	16,45	75,93	24,07	14,00	25,00
No.80	187,4	12,22	88,16	11,84	8,00	17,00
No. 200	102,3	6,67	94,83	5,17	4,00	8,00
FONDO	79,3	5,17	100,00	0,00		
	1533,3	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1627,1	Peso Inicial gr	20,3	150
Peso final gr	1533,3	Peso final gr	20,5	
Diferencia gr	93,8	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	5,76			

BRIQUETA NUMERO	4	5	6	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	66,0	65,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1230,0	1215,0	1225,0			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1238,0	1225,0	1226,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	682,2	678,0	674,0	678,1		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	555,8	547,0	552,0			
Peso especifico aparente	2,213	2,221	2,219	2,218		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,94	0,96	0,96			
Estabilidad medida N.	13205	14250	14100			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	12413	13680	13536	13210	9000	SI
Flujo en mm.	3,12	3,08	3,25	3,15	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	5,9	5,5	5,6	5,7	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	20	20	20	20	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,0	4,4	4,2	4,19	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	70	70	70	70	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,76
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+040 AL Pr0+420 M. Izquierda	VIAJE No	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-04
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

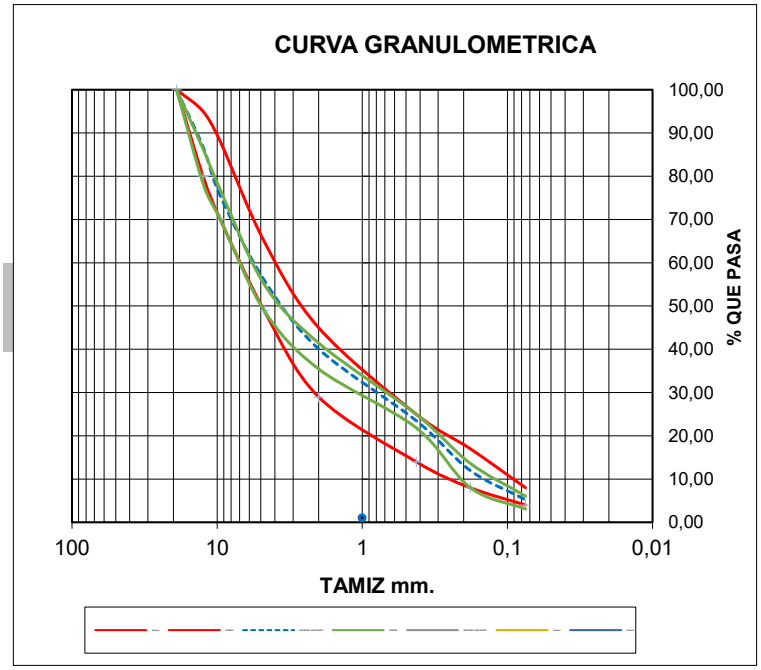

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1531,2	
Peso retenido tamiz No.200:					1451,2	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	202,3	13,21	13,21	86,79	80,00	95,00
3/8"	174,2	11,38	24,59	75,41	70,00	88,00
No.4	296,8	19,38	43,97	56,03	49,00	65,00
No.10	243,9	15,93	59,90	40,10	29,00	45,00
No.40	254,1	16,59	76,50	23,50	14,00	25,00
No.80	176,7	11,54	88,04	11,96	8,00	17,00
No. 200	103,2	6,74	94,78	5,22	4,00	8,00
FONDO	80,0	5,22	100,00	0,00		
	1531,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1623,4	Peso Inicial gr	20,4	150
Peso final gr	1531,2	Peso final gr	20,6	
Diferencia gr	92,2	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	5,68			

BRIQUETA NUMERO	7	8	9	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	63,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1214,3	1205,8	1215,3			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1215,7	1207,3	1217,3			
Peso de la briqueta en el agua grs.	678,0	673,3	678,9	676,7		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,7	534,0	538,4			
Peso especifico aparente	2,258	2,258	2,257	2,258		
Peso especifico max. Medido	2,354	2,354	2,354	2,354		
Factor de Correlación	0,96	1,01	0,96			
Estabilidad medida N.	13250	12041	13389			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	12720	12161	12853	12578	9000	SI
Flujo en mm.	3,14	3,30	3,28	3,24	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,1	4,1	4,1	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	18	18	18	18	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,1	3,7	3,9	3,88	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,68
Gmm	2,354


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+040 AL Pr0+420 M. Izquierda	VIAJE No	8
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-04
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

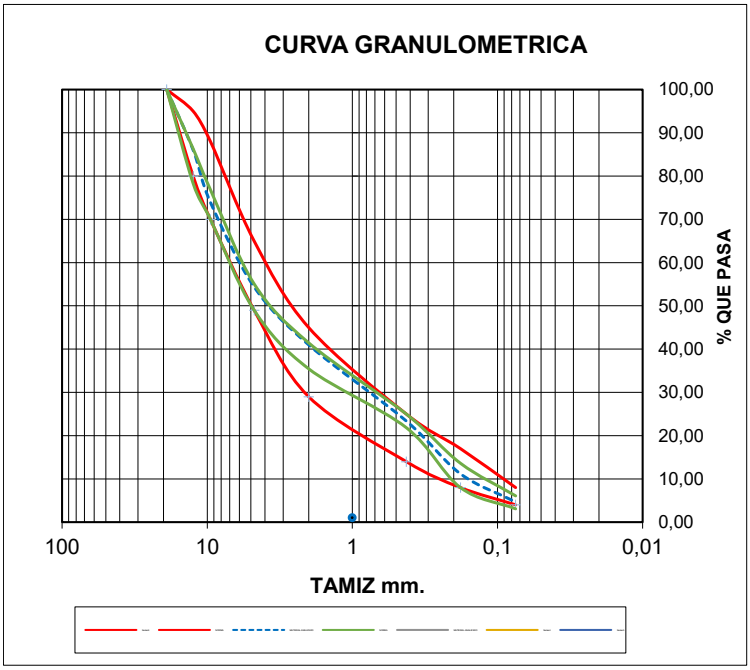

GRADACION No.1						
	Peso inicial muestra:			1427,3		
	Peso retenido tamiz No.200:			1360,5		
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	199,4	13,97	13,97	86,03	80,00	95,00
3/8"	172,6	12,09	26,06	73,94	70,00	88,00
No.4	279,1	19,55	45,62	54,38	49,00	65,00
No.10	191,1	13,39	59,01	40,99	29,00	45,00
No.40	251,3	17,61	76,61	23,39	14,00	25,00
No.80	174,2	12,20	88,82	11,18	8,00	17,00
No. 200	92,8	6,50	95,32	4,68	4,00	8,00
FONDO	66,8	4,68	100,00	0,00		
	1427,3	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1514,7	Peso Inicial gr	20,2	150
Peso final gr	1427,3	Peso final gr	20,4	
Diferencia gr	87,4	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	5,77			

BRIQUETA NUMERO	10	11	12	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	67,0	64,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1207,2	1212,7	1203,3			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1209,3	1215,4	1205,8			
Peso de la briqueta en el agua grs.	672,2	674,5	671,1	672,6		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,1	540,9	534,7			
Peso especifico aparente	2,248	2,242	2,250	2,247		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,96	0,92	0,99			
Estabilidad medida N.	13504	15594	14316			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	12964	14346	14173	13828	9000	SI
Flujo en mm.	3,29	3,14	3,01	3,15	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,4	4,7	4,3	4,5	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,9	4,6	4,7	4,41	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,77
Gmm	2,351


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+420 AL Pr0+725 M. Izquierda	VIAJE No	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-05
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

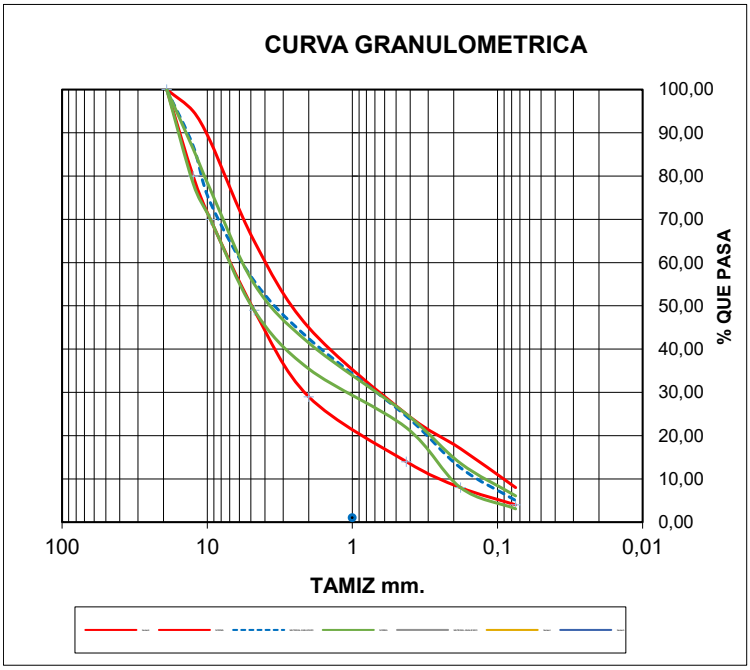

GRADACION No.1						
	Peso inicial muestra:			1531,2		
	Peso retenido tamiz No.200:			1454,4		
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	199,4	13,02	13,02	86,98	80,00	95,00
3/8"	201,5	13,16	26,18	73,82	70,00	88,00
No.4	276,2	18,04	44,22	55,78	49,00	65,00
No.10	203,9	13,32	57,54	42,46	29,00	45,00
No.40	274,9	17,95	75,49	24,51	14,00	25,00
No.80	182,6	11,93	87,42	12,58	8,00	17,00
No. 200	115,9	7,57	94,98	5,02	4,00	8,00
FONDO	76,8	5,02	100,00	0,00		
	1531,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1625,1	Peso Inicial gr	20,5	150
Peso final gr	1531,2	Peso final gr	20,7	
Diferencia gr	93,9	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	5,78			

BRIQUETA NUMERO	13	14	15	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	63,0	64,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1203,4	1197,4	1201,9			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1205,9	1201,8	1206,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	672,2	669,8	673,2	671,7		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	533,7	532,0	532,8			
Peso especifico aparente	2,255	2,251	2,256	2,254		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,96	1,01	0,99			
Estabilidad medida N.	12398	13578	13789			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	11902	13714	13651	13089	9000	SI
Flujo en mm.	3,30	3,08	3,05	3,14	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,3	4,1	4,1	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,6	4,5	4,5	4,18	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575

% asf.	5,78
Gmm	2,351


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+420 AL Pr0+725 M. Izquierda	VIAJE No	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-05
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

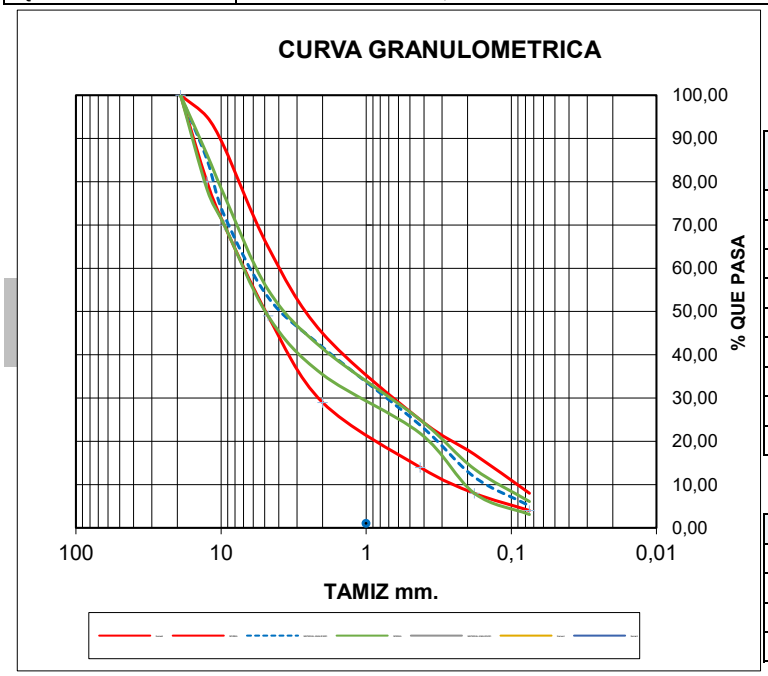

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1491,1	
Peso retenido tamiz No.200:					1415,1	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	221,7	14,87	14,87	85,13	80,00	95,00
3/8"	192,8	12,93	27,80	72,20	70,00	88,00
No.4	281,5	18,88	46,68	53,32	49,00	65,00
No.10	172,2	11,55	58,23	41,77	29,00	45,00
No.40	268,9	18,03	76,26	23,74	14,00	25,00
No.80	178,6	11,98	88,24	11,76	8,00	17,00
No. 200	99,4	6,67	94,90	5,10	4,00	8,00
FONDO	76,0	5,10	100,00	0,00		
	1491,1	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1582,2	Peso Inicial gr	20,3	150
Peso final gr	1491,1	Peso final gr	20,5	
Diferencia gr	91,1	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	5,76			

BRIQUETA NUMERO	16	17	18	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	68,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1209,1	1209,0	1206,1			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1211,5	1210,2	1207,6			
Peso de la briqueta en el agua grs.	675,5	672,2	672,2	673,3		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	536,0	538,0	535,4			
Peso especifico aparente	2,256	2,247	2,253	2,252		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,96	0,90	0,96			
Estabilidad medida N.	13130	12930	12890			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	12605	11637	12374	12205	9000	SI
Flujo en mm.	3,25	2,89	3,56	3,23	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,4	4,2	4,2	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,9	4,0	3,5	3,79	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,76
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+725 AL Pr0+960 M. Izquierda.	VIAJE No	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-07
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

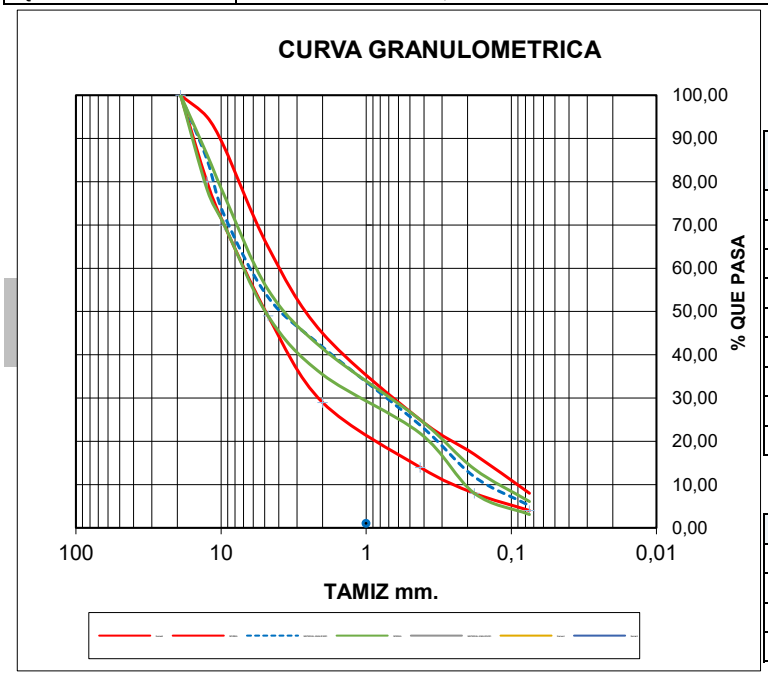

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1492,2	
Peso retenido tamiz No.200:					1415,6	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	221,7	14,86	14,86	85,14	80,00	95,00
3/8"	192,8	12,92	27,78	72,22	70,00	88,00
No.4	281,7	18,88	46,66	53,34	49,00	65,00
No.10	172,0	11,53	58,18	41,82	29,00	45,00
No.40	269,8	18,08	76,26	23,74	14,00	25,00
No.80	177,8	11,92	88,18	11,82	8,00	17,00
No. 200	99,8	6,69	94,87	5,13	4,00	8,00
FONDO	76,6	5,13	100,00	0,00		
	1492,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1582,3	Peso Inicial gr	20,3	150
Peso final gr	1492,2	Peso final gr	20,5	
Diferencia gr	90,1	Diferencia (gr)	0,2	
% Asfalto	5,69			

BRIQUETA NUMERO	16	17	18	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	68,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1209,1	1209,0	1206,1			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1211,5	1210,2	1207,6			
Peso de la briqueta en el agua grs.	674,2	672,2	673,8	673,4		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,3	538,0	533,8			
Peso especifico aparente	2,250	2,247	2,259	2,252		
Peso especifico max. Medido	2,354	2,354	2,354	2,354		
Factor de Correlación	0,96	0,90	0,96			
Estabilidad medida N.	13130	12930	12890			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	12605	11637	12374	12205	9000	SI
Flujo en mm.	3,25	2,89	3,56	3,23	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,4	4,5	4,0	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	18	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,9	4,0	3,5	3,79	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,69
Gmm	2,354


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+725 AL Pr0+960 M. Izquierda.	VIAJE No	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-07
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

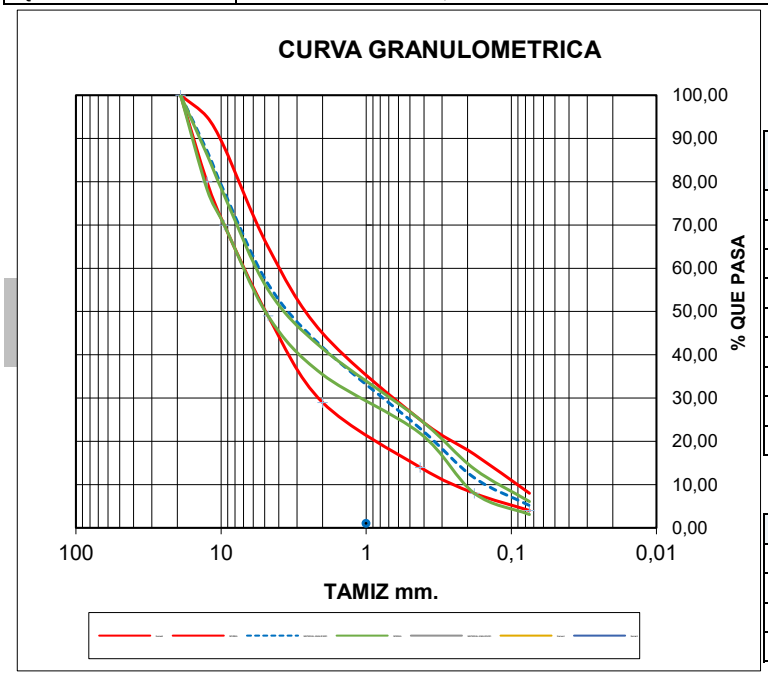

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					2079,1	
Peso retenido tamiz No.200:					1971,7	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	266,5	12,82	12,82	87,18	80,00	95,00
3/8"	197,8	9,51	22,33	77,67	70,00	88,00
No.4	442,3	21,27	43,61	56,39	49,00	65,00
No.10	304,3	14,64	58,24	41,76	29,00	45,00
No.40	390,5	18,78	77,02	22,98	14,00	25,00
No.80	237,1	11,40	88,43	11,57	8,00	17,00
No. 200	133,2	6,41	94,83	5,17	4,00	8,00
FONDO	107,4	5,17	100,00	0,00		
	2079,1	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	2207,0	Peso Inicial gr	20,5	150
Peso final gr	2079,1	Peso final gr	21,1	
Diferencia gr	127,9	Diferencia (gr)	0,6	
% Asfalto	5,80			

BRIQUETA NUMERO	19	20	21	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	64,2	63,8	64,2			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1210,4	1202,5	1204,7			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1211,8	1203,8	1206,1			
Peso de la briqueta en el agua grs.	675,5	670,2	671,8	672,5		% asf. 5,80
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	536,3	533,6	534,3			Gmm 2,351
Peso especifico aparente	2,257	2,254	2,255	2,255		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,98	0,99	0,98			
Estabilidad medida N.	14205	14177	14003			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13921	14035	13723	13893	9000	SI
Flujo en mm.	3,47	3,41	3,44	3,44	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,0	4,1	4,1	4,1	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,0	4,1	4,0	4,04	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	67	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+440 AL Pr0+695 M. Derecha.	VIAJE No	3
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-08
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

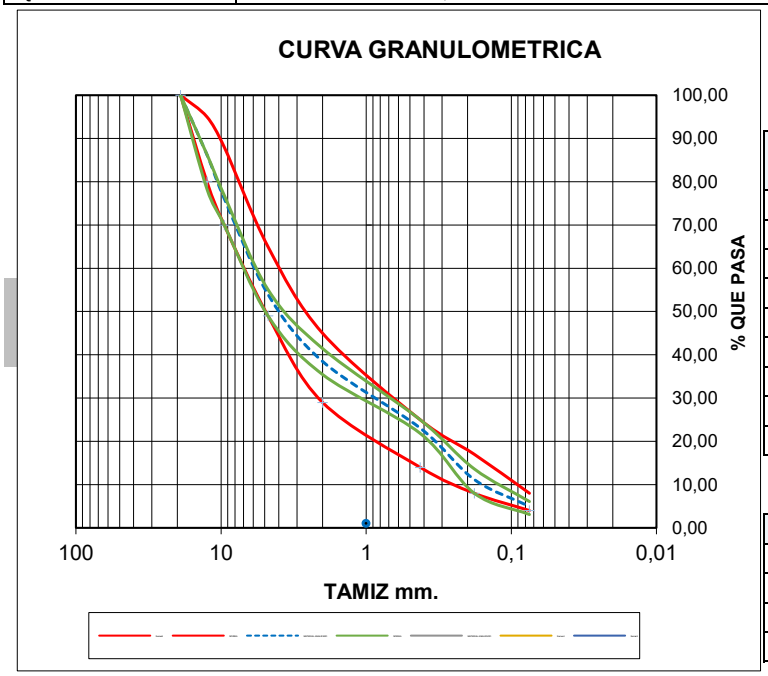

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					2020,7	
Peso retenido tamiz No.200:					1920,5	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	277,9	13,75	13,75	86,25	80,00	95,00
3/8"	205,1	10,15	23,90	76,10	70,00	88,00
No.4	447,0	22,12	46,02	53,98	49,00	65,00
No.10	313,2	15,50	61,52	38,48	29,00	45,00
No.40	311,4	15,41	76,93	23,07	14,00	25,00
No.80	240,4	11,90	88,83	11,17	8,00	17,00
No. 200	125,5	6,21	95,04	4,96	4,00	8,00
FONDO	100,2	4,96	100,00	0,00		
	2020,7	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	2143,6	Peso Inicial gr	20,4	150
Peso final gr	2020,7	Peso final gr	21,3	
Diferencia gr	122,9	Diferencia (gr)	0,9	
% Asfalto	5,73			

BRIQUETA NUMERO	22	23	24	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	63,7	62,4	63,1			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1214,5	1199,6	1211,6			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1215,7	1201,8	1212,8			
Peso de la briqueta en el agua grs.	677,4	670,2	672,2	673,3		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	538,3	531,6	540,6			
Peso especifico aparente	2,256	2,257	2,241	2,251		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	1,00	1,03	1,01			
Estabilidad medida N.	13987	14256	13250			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13987	14684	13383	14018	9000	SI
Flujo en mm.	3,24	3,18	3,25	3,22	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,1	4,7	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,3	4,6	4,1	4,35	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	69	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,73
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+440 AL Pr0+695 M. Derecha.	VIAJE No	3
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-08
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

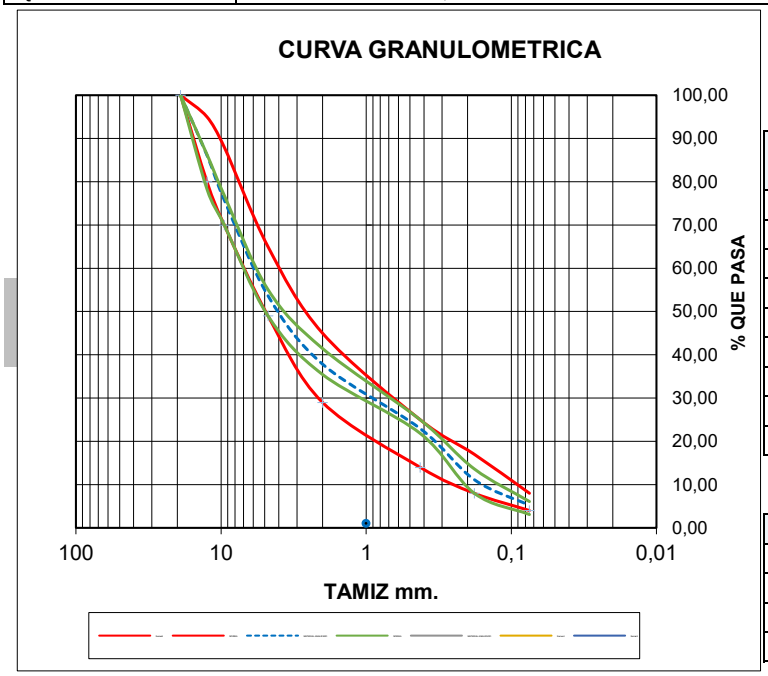

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					2049,2	
Peso retenido tamiz No.200:					1942,9	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	284,1	13,86	13,86	86,14	80,00	95,00
3/8"	212,3	10,36	24,22	75,78	70,00	88,00
No.4	453,3	22,12	46,34	53,66	49,00	65,00
No.10	324,0	15,81	62,16	37,84	29,00	45,00
No.40	305,0	14,88	77,04	22,96	14,00	25,00
No.80	242,2	11,82	88,86	11,14	8,00	17,00
No. 200	122,0	5,95	94,81	5,19	4,00	8,00
FONDO	106,3	5,19	100,00	0,00		
	2049,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	2173,3	Peso Inicial gr	20,3	150
Peso final gr	2049,2	Peso final gr	21,1	
Diferencia gr	124,1	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	5,71			

BRIQUETA NUMERO	25	26	27	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	64,0	63,9	62,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1218,7	1215,5	1199,3			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1219,6	1217,5	1221,1			
Peso de la briqueta en el agua grs.	678,4	674,4	692,2	681,7		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	541,2	543,1	528,9			
Peso especifico aparente	2,252	2,238	2,268	2,252		
Peso especifico max. Medido	2,353	2,353	2,353	2,353		
Factor de Correlación	0,99	0,99	1,04			
Estabilidad medida N.	13987	14256	13250			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13847	14113	13780	13914	9000	SI
Flujo en mm.	3,14	3,05	3,19	3,13	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,3	4,9	3,6	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	18	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,6	4,3	4,45	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	69	67	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,71
Gmm	2,353


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+690 AL Pr1+020 M. Derecha	VIAJE No	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-09
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

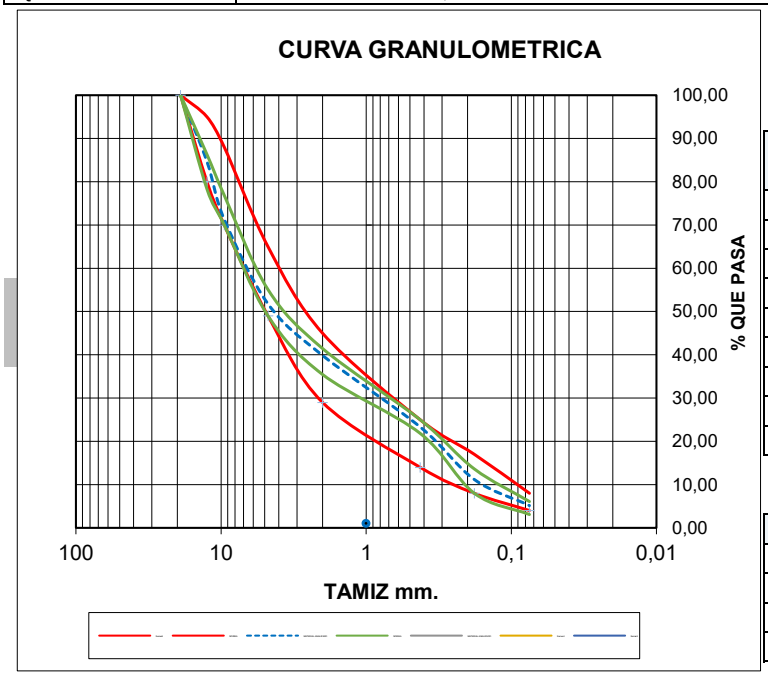

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1342,6	
Peso retenido tamiz No.200:					1273,5	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	206,0	15,34	15,34	84,66	80,00	95,00
3/8"	179,5	13,37	28,71	71,29	70,00	88,00
No.4	261,9	19,51	48,22	51,78	49,00	65,00
No.10	160,0	11,92	60,14	39,86	29,00	45,00
No.40	222,0	16,54	76,67	23,33	14,00	25,00
No.80	163,0	12,14	88,81	11,19	8,00	17,00
No. 200	81,1	6,04	94,85	5,15	4,00	8,00
FONDO	69,1	5,15	100,00	0,00		
	1342,6	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1424,1	Peso Inicial gr	20	150
Peso final gr	1342,6	Peso final gr	20,5	
Diferencia gr	81,5	Diferencia (gr)	0,5	
% Asfalto	5,72			

BRIQUETA NUMERO	19	20	21	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	67,0	64,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1205,1	1200,0	1210,1			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1208,3	1201,4	1211,8			
Peso de la briqueta en el agua grs.	674,2	668,9	672,2	671,8		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	534,1	532,5	539,6			
Peso especifico aparente	2,256	2,254	2,243	2,251		
Peso especifico max. Medido	2,353	2,353	2,353	2,353		
Factor de Correlación	0,92	0,99	0,96			
Estabilidad medida N.	14205	13259	14225			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13069	13126	13656	13284	9000	SI
Flujo en mm.	3,25	2,89	3,56	3,23	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,2	4,7	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,0	4,5	3,8	4,13	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	69	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,72
Gmm	2,353


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 0+690 AL Pr1+020 M. Derecha	VIAJE No	8
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-09
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

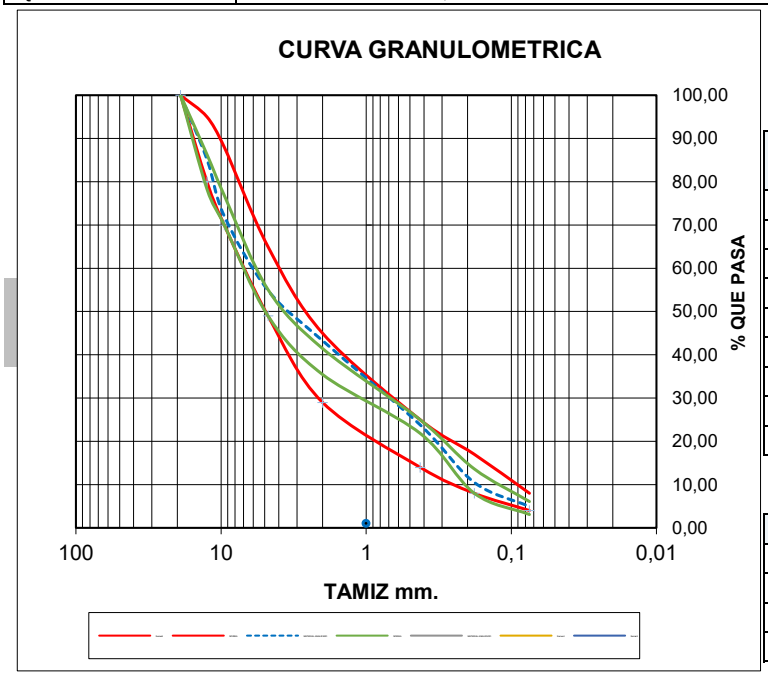

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1433,8	
Peso retenido tamiz No.200:					1363,3	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	212,7	14,83	14,83	85,17	80,00	95,00
3/8"	187,9	13,11	27,94	72,06	70,00	88,00
No.4	246,0	17,16	45,10	54,90	49,00	65,00
No.10	166,7	11,63	56,72	43,28	29,00	45,00
No.40	279,0	19,46	76,18	23,82	14,00	25,00
No.80	191,0	13,32	89,50	10,50	8,00	17,00
No. 200	80,0	5,58	95,08	4,92	4,00	8,00
FONDO	70,5	4,92	100,00	0,00		
	1433,8	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1521,1	Peso Inicial gr	20	150
Peso final gr	1433,8	Peso final gr	20,8	
Diferencia gr	87,3	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	5,74			

BRIQUETA NUMERO	22	23	24	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	64,0	62,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1212,4	1205,1	1204,7			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1219,1	1207,6	1206,2			
Peso de la briqueta en el agua grs.	681,9	673,0	671,1	675,3		% asf. 5,74
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,2	534,6	535,1			Gmm 2,352
Peso especifico aparente	2,257	2,254	2,251	2,254		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,96	0,99	1,04			
Estabilidad medida N.	14250	13987	12980			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13680	13847	13499	13675	9000	SI
Flujo en mm.	3,11	3,04	3,11	3,09	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,1	4,2	4,3	4,2	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,6	4,3	4,43	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+020 AL Pr1+345 M. Derecha	VIAJE No	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-10
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

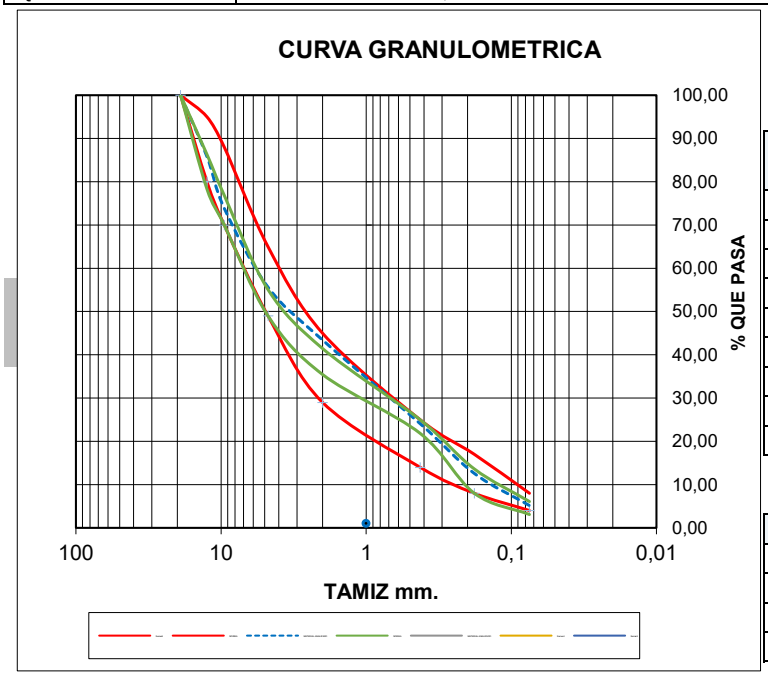

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1416,9	
Peso retenido tamiz No.200:					1343,9	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	201,2	14,20	14,20	85,80	80,00	95,00
3/8"	169,3	11,95	26,15	73,85	70,00	88,00
No.4	258,0	18,21	44,36	55,64	49,00	65,00
No.10	173,0	12,21	56,57	43,43	29,00	45,00
No.40	274,1	19,35	75,91	24,09	14,00	25,00
No.80	163,0	11,50	87,42	12,58	8,00	17,00
No. 200	105,3	7,43	94,85	5,15	4,00	8,00
FONDO	73,0	5,15	100,00	0,00		
	1416,9	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1503,7	Peso Inicial gr	20	150
Peso final gr	1416,9	Peso final gr	21,2	
Diferencia gr	86,8	Diferencia (gr)	1,2	
% Asfalto	5,77			

BRIQUETA NUMERO	25	26	27	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	66,0	65,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1209,4	1205,3	1208,4			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1211,3	1208,3	1210,9			
Peso de la briqueta en el agua grs.	674,2	673,2	674,2	673,9		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	537,1	535,1	536,7			
Peso especifico aparente	2,252	2,252	2,252	2,252		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,94	0,96	0,96			
Estabilidad medida N.	14250	13987	12980			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13395	13428	12461	13094	9000	SI
Flujo en mm.	3,04	3,08	2,96	3,03	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,2	4,2	4,2	4,2	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,4	4,2	4,33	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,77
Gmm	2,351


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+020 AL Pr1+345 M. Derecha	VIAJE No	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-10
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

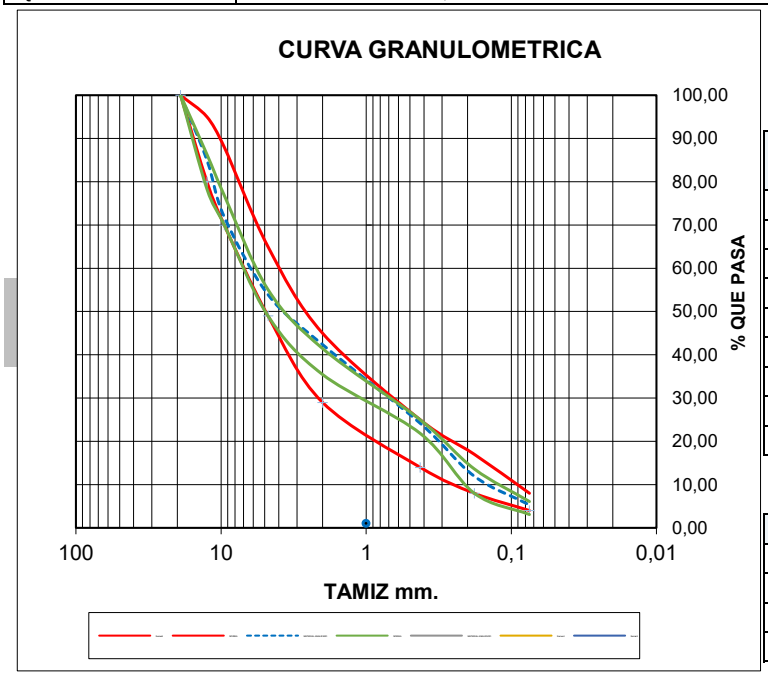

GRADACION No.2						
Peso inicial muestra:					1491,2	
Peso retenido tamiz No.200:					1412,1	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	224,0	15,02	15,02	84,98	80,00	95,00
3/8"	195,7	13,12	28,15	71,85	70,00	88,00
No.4	267,4	17,93	46,08	53,92	49,00	65,00
No.10	172,3	11,55	57,63	42,37	29,00	45,00
No.40	271,1	18,18	75,81	24,19	14,00	25,00
No.80	182,7	12,25	88,06	11,94	8,00	17,00
No. 200	98,9	6,63	94,70	5,30	4,00	8,00
FONDO	79,1	5,30	100,00	0,00		
	1491,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1582,2	Peso Inicial gr	20	150
Peso final gr	1491,2	Peso final gr	20,8	
Diferencia gr	91,0	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	5,75			

BRIQUETA NUMERO	28	29	30	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	64,0	63,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1202,1	1201,3	1197,1			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1203,8	1203,5	1200,2			
Peso de la briqueta en el agua grs.	670,0	669,2	668,9	669,4		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	533,8	534,3	531,3			
Peso especifico aparente	2,252	2,248	2,253	2,251		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,96	0,99	1,01			
Estabilidad medida N.	13025	14002	13689			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	12504	13862	13826	13397	9000	SI
Flujo en mm.	3,20	3,04	2,88	3,04	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,2	4,4	4,2	4,3	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	3,9	4,6	4,8	4,42	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,75
Gmm	2,352


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+050 AL Pr1+350 M. Izquierda	VIAJE No	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-11
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

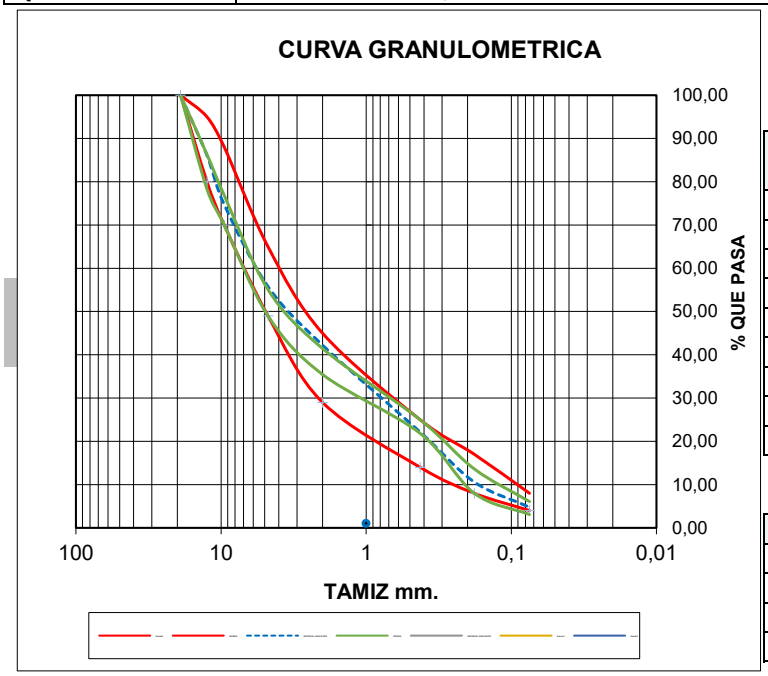

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1661,2	
Peso retenido tamiz No.200:					1581,8	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	231,0	13,91	13,91	86,09	80,00	95,00
3/8"	189,3	11,40	25,30	74,70	70,00	88,00
No.4	314,2	18,91	44,22	55,78	49,00	65,00
No.10	225,1	13,55	57,77	42,23	29,00	45,00
No.40	333,6	20,08	77,85	22,15	14,00	25,00
No.80	192,1	11,56	89,41	10,59	8,00	17,00
No. 200	96,5	5,81	95,22	4,78	4,00	8,00
FONDO	79,4	4,78	100,00	0,00		
	1661,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1762,3	Peso Inicial gr	20	150
Peso final gr	1661,2	Peso final gr	20,8	
Diferencia gr	101,1	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	5,74			

BRIQUETA NUMERO	31	32	33	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	64,0	63,0	65,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1204,7	1202,4	1206,7			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1206,1	1205,2	1208,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	670,0	672,2	673,3	671,8		% asf. 5,74
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	536,1	533,0	534,7			Gmm 2,352
Peso especifico aparente	2,247	2,256	2,257	2,253		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,99	1,01	0,96			
Estabilidad medida N.	14110	13890	13690			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13969	14029	13142	13713	9000	SI
Flujo en mm.	3,20	3,04	2,88	3,04	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,5	4,1	4,1	4,2	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,6	4,6	4,51	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+050 AL Pr1+350 M. Izquierda	VIAJE No	8
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-11
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

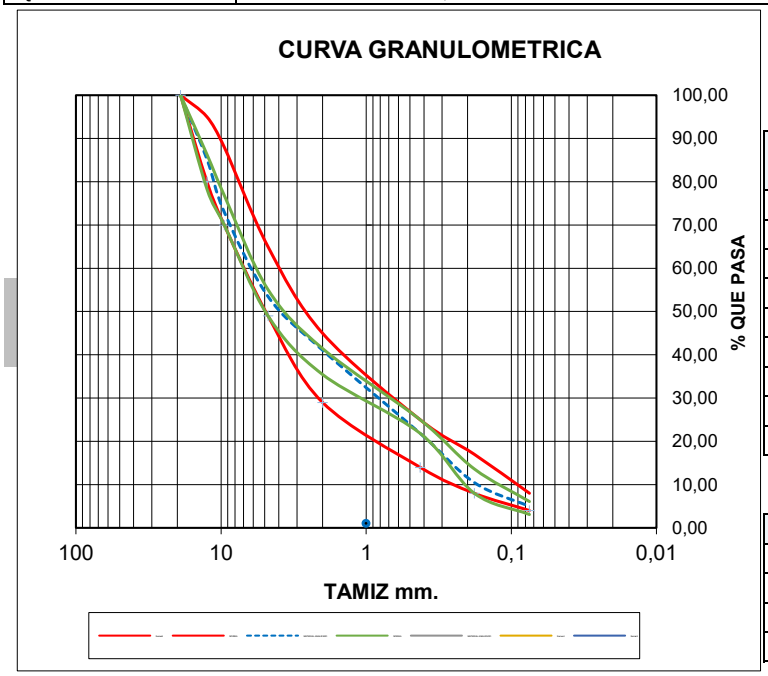

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1442,2	
Peso retenido tamiz No.200:					1370,8	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	213,5	14,80	14,80	85,20	80,00	95,00
3/8"	176,2	12,22	27,02	72,98	70,00	88,00
No.4	281,1	19,49	46,51	53,49	49,00	65,00
No.10	178,9	12,40	58,92	41,08	29,00	45,00
No.40	277,3	19,23	78,14	21,86	14,00	25,00
No.80	164,2	11,39	89,53	10,47	8,00	17,00
No. 200	79,6	5,52	95,05	4,95	4,00	8,00
FONDO	71,4	4,95	100,00	0,00		
	1442,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1529,9	Peso Inicial gr	20	150
Peso final gr	1442,2	Peso final gr	20,8	
Diferencia gr	87,7	Diferencia (gr)	0,8	
% Asfalto	5,73			

BRIQUETA NUMERO	24	25	26	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	65,0	65,0	64,0			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1206,1	1207,4	1203,4			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1208,4	1209,2	1205,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	672,5	672,2	670,2	671,6		% asf. 5,73
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	535,9	537,0	534,8			Gmm 2,352
Peso especifico aparente	2,251	2,248	2,250	2,250		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,96	0,96	0,99			
Estabilidad medida N.	14110	13890	13690			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13546	13334	13553	13478	9000	SI
Flujo en mm.	3,20	3,04	2,88	3,04	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,3	4,4	4,3	4,4	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,2	4,4	4,7	4,44	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	68	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+350 AL Pr1+620 M. Izquierda	VIAJE No	2
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-12
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

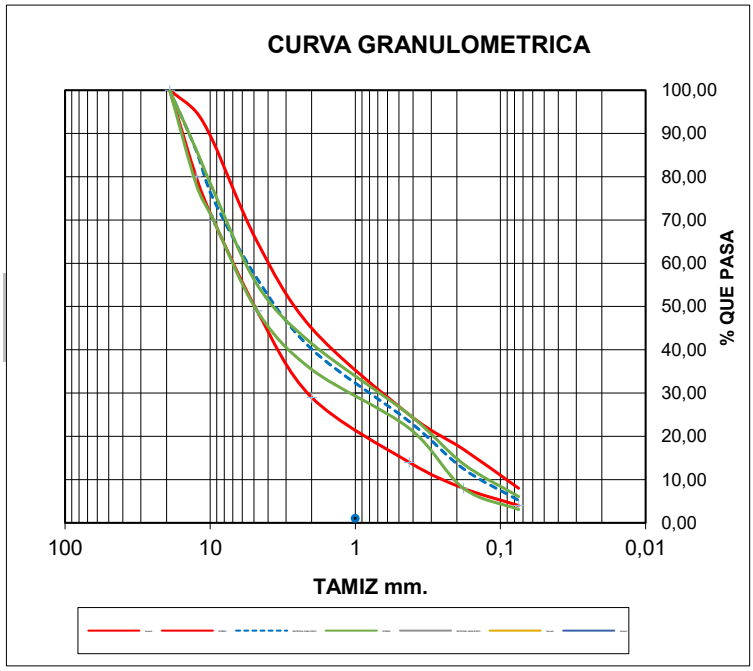

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1536,2	
Peso retenido tamiz No.200:					1456,4	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	214,0	13,93	13,93	86,07	80,00	95,00
3/8"	173,0	11,26	25,19	74,81	70,00	88,00
No.4	282,0	18,36	43,55	56,45	49,00	65,00
No.10	250,2	16,29	59,84	40,16	29,00	45,00
No.40	257,2	16,74	76,58	23,42	14,00	25,00
No.80	167,8	10,92	87,50	12,50	8,00	17,00
No. 200	112,2	7,30	94,81	5,19	4,00	8,00
FONDO	79,8	5,19	100,00	0,00		
	1536,2	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1630,2	Peso Inicial gr	20,4	150
Peso final gr	1536,2	Peso final gr	21,1	
Diferencia gr	94,0	Diferencia (gr)	0,7	
% Asfalto	5,77			

BRIQUETA NUMERO	27	28	29	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	64,0	63,2	63,7			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1241,1	1212,2	1207,7			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1243,5	1214,0	1209,0			
Peso de la briqueta en el agua grs.	689,0	674,2	672,2	678,5		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	554,5	539,8	536,8			
Peso especifico aparente	2,238	2,246	2,250	2,245		
Peso especifico max. Medido	2,351	2,351	2,351	2,351		
Factor de Correlación	0,99	1,01	1,00			
Estabilidad medida N.	14003	14158	14008			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13863	14300	14008	14057	9000	SI
Flujo en mm.	3,17	3,28	3,02	3,16	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,8	4,5	4,3	4,5	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,4	4,4	4,6	4,46	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	69	68	68	68	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,77
Gmm	2,351


OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

Código: ES-ES-FI-063	CONTROL DE CALIDAD PLANTAS DE ASFALTO MDC-19	Suelos & Geotecnia
Versión: 004		
2008/05/30		
Página 1 de 1		

PROYECTO:	AUNAR ESFUERZOS PARA. 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
LOCALIZACIÒN:	MUESTRA TOMADA EN VIA		
ABSCISA:	TRAMO Pr 1+350 AL Pr1+620 M. Izquierda	VIAJE No	7
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 748-14, ARTICULO 450-22	FECHA:	2024-10-12
EQUIPO UTILIZADO:	CENTRIFUGA ELECTRICA, PRENSA MARSHALL Y BALANZA DIGITAL		

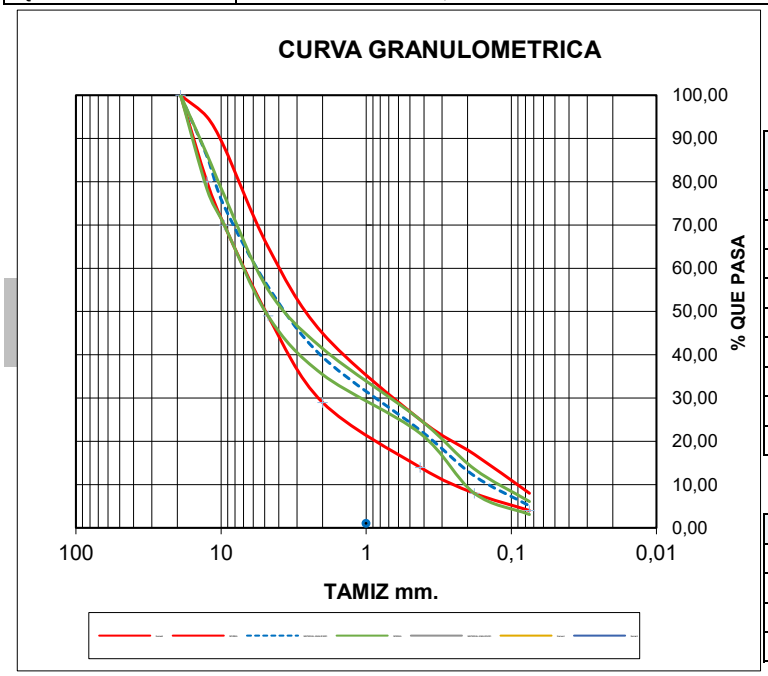

GRADACION No.1						
Peso inicial muestra:					1518,6	
Peso retenido tamiz No.200:					1441,4	
TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA	NORMA MDC-19	
					INF.	SUP.
3/4"	0,0	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1/2"	214,7	14,14	14,14	85,86	80,00	95,00
3/8"	175,5	11,56	25,69	74,31	70,00	88,00
No.4	281,0	18,50	44,20	55,80	49,00	65,00
No.10	247,3	16,28	60,48	39,52	29,00	45,00
No.40	257,4	16,95	77,43	22,57	14,00	25,00
No.80	160,3	10,56	87,99	12,01	8,00	17,00
No. 200	105,2	6,93	94,92	5,08	4,00	8,00
FONDO	77,2	5,08	100,00	0,00		
	1518,6	100,00				

EXTRACCION No 1		PESO FILTRO (g)		TEMP.
Peso Inicial gr	1611,2	Peso Inicial gr	20,4	150
Peso final gr	1518,6	Peso final gr	21,1	
Diferencia gr	92,6	Diferencia (gr)	0,7	
% Asfalto	5,75			

BRIQUETA NUMERO	30	31	32	PROM.	NORMA	
Espesor de la briqueta mm.	63,8	64,2	62,5			
Peso de la briqueta en el aire grs.	1215,4	1217,5	1205,6			
Peso de la briqueta s.s.s grs.	1217,0	1219,0	1206,3			
Peso de la briqueta en el agua grs.	674,5	674,9	670,0	673,1		
Volumen de la Briqueta Sola cm^3.	542,5	544,1	536,3			
Peso especifico aparente	2,240	2,238	2,248	2,242		
Peso especifico max. Medido	2,352	2,352	2,352	2,352		
Factor de Correlación	0,99	0,98	1,03			
Estabilidad medida N.	14110	13890	13690			CUMPLE
Estabilidad corregida N.	13969	13612	14101	13894	9000	SI
Flujo en mm.	3,11	3,02	3,08	3,07	2 - 3,5	SI
Vacios con aire %	4,7	4,9	4,4	4,7	4 - 6	SI
Vacios en los agreg. Minerales %	19	19	19	19	Mim. 15	SI
Relacion estadilidad/flujo (Kn/mm)	4,5	4,5	4,6	4,53	3 - 5	SI
Relacion llenante/ligante efectivo (peso)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80-1,20	SI
Vacios llenos de Asfalto (VFA)	69	69	68	69	65-75	SI

GS. Agre. grs/cm^3	2,575
% asf.	5,75
Gmm	2,352

OBSERVACIONES

LA MEZCLA INSTALADA CUMPLE CON EL CRITERIO DE ACEPTACION ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 450, TABLA 450-10, NORMA INVIAS.

Lab. HERNANDO CAMACHO DIAZ
MP. 54502004427 NTS

ANEXO G

MEPI-MN1-IN-15-FR-12

Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES
PLAZO MODIFICATORIO 001: 9 MESES Y 25 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **14/12/2024**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 23.137.768.645,10
VALOR ADICIONAL: $ 4.895.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 28.032.768.645,10
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: NO APLICA
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: NO APLICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	21	12	2023	21/07/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	21	12	2023	21/07/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	21	12	2023	21	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…….....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	21	3	2024	21	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 71833285 / **anexo 2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

POLIZA DE SEGURO RCE

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
RESPONSABILIDAD CIVIL ESCONTRACTUAL	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	21	3	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100285361 NB-100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 001

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	4	3	2023	20/09/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	21	12	2023	20/09/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	21	12	2023	20	5	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…….....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	21	3	2024	20	5	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/03/204

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 001

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	21	3	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 001 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	14	3	2024	16/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	14	3	2024	16/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	14	3	2024	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…….....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/04/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 001 **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	16	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 3/04/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 002 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	26	4	2024	16/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	26	4	2024	16/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	26	4	2024	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	.....	.....	....	....	.....	....	....	....
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 13/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 002 **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	16	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 13/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 003 **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.313.776.864,60	6	8	2024	16/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	6	8	2024	16/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.627.553.729,20	6	8	2024	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…….....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 6.941.330.593,80	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/09/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 003 **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.156.888.432,30	29	9	2023	16	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 3/09/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.803.276.864,51	9	9	2024	16/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	$ 11.568.884.323,00	9	9	2024	16/04/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 5.606.553.729,02	9	9	2024	16	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	….....	…….....	….	….	…..	….	….	….
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 8.409.830.593,53	16	12	2024	16	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100285361

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3/09/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5,0%	$ 1.401.638.432,26	29	9	2023	16	12	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN PRESENTADO ACTUALIZACIONES DE PÓLIZAS, DEBIDO A QUE NO SE HAN PRESENTADO ACTOS ADMINISTRATIVOS, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: x9X5ZwiFTRlxn17enEgKRQg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO (601)4801900 - 3351220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 80-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	22079844	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 29/09/2023	24:00 Horas Del 16/12/2029		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	901.758.383-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	TELÉFONO	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	800.136.869-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO	3227139196
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	800.136.869-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	TELÉFONO	3227139196

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESEDNTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTROSI 3 CON FECHA DE 08 DE AGOSTO DE 2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA A 23.137.768.645.10

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/08/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	2.313.776.864,51	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 06/08/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	11.568.884.322,55	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/08/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	4.627.553.729,02	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2024	24:00 Horas Del 16/12/2029	6.941.330.593,53	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 25.451.545.589,61

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/08/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A [illegible] CON EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO. PARA LA CONSULTA DE ESTA PÓLIZA EXPEDIDA CON EL RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta incluyendo responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

tu compañía siempre

N/T 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN CENTRAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851720 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSUS2R000000859-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	72079844	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	30/08/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HO INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.108.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.847-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860037013-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASARELAS APP

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, 6 cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL** , expedida por la Compañía en **30/08/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **30** dias del mes **AGOSTO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($23.137.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	PÓLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 6
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	30/08/2024		
OBSERVACIÓN:	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO 3 CON FECHA 08/08/2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA A $23.137.768.645,10		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 6)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	06/08/2024	16/04/2025	$ 2.313.776.864,51
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/08/2024	16/04/2025	$ 11.568.884.322,55
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	06/08/2024	16/12/2027	$ 4.627.553.729,02
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/12/2024	16/12/2029	$ 6.941.330.593,53

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	IpAheHV6bfLMi/pg6eYyOQ==		
Número de póliza	100059639	Número de anexo	6
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	11/06/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.156.868.432,30
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

Objeto de póliza: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide a los tres (03) días del mes de septiembre del 2024.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Juridico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Juridica	Firma

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.27 15:09:41 -05:00

Código de Seguridad: jvDEXeJ1n5ECjulWIIegow==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71833285	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	21/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	CALLE 06 N 28-52	**TELÉFONO**	3134007528
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	CALLE 06 N 28-52	**TELÉFONO**	3134007528

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023, EN LA CUAL SE ESTABLECE DAR INICIO AL OBJETO DEL CONTRATO EL DÍA 21/12/2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	2.313.776.864,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 21/07/2024	11.568.884.323,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 21/12/2023	24:00 Horas Del 21/03/2027	4.627.553.729,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 21/03/2024	24:00 Horas Del 21/03/2029	6.941.330.593,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.510,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935. O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	71833285	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	21/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
DO
A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA ABF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL** , expedida por la Compañía en **27/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **27** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

GILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

IADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.27 15:08:22 -05:00

Código de Seguridad: oAQBXa9qNEhYEkKDbI0bnw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	**No. ANEXO**	3	**No. CERTIFICADO**	71833284	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	27/12/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		**VIGENCIA HASTA**		**DÍAS**	**VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE**		**VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA**	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	21/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

**CON EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023, EN LA CUAL SE ESTABLECE DAR INICIO AL OBJETO DEL CONTRATO EL DÍA 21/12/2023

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	578.444.216,00	1.156.888.432,00	1.156.888.432,30	0,00
PATRONAL	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.156.888.432,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LIBROS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71833284	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	21/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZA

CONTRATO DE OBRA NO:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL"	
PLAZO:	TRES (03) MESES	
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($23.137.768.645,10).	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	
NIT:	901.758.303-9	
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ	
CC:	1.116.782.711 DE ARAUCA-ARAUCA	
PÓLIZA:	CUMPLIMIENTO	NB-100285361 ANEXO 2
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100069639 ANEXO 3
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
FECHA DE EXPEDICIÓN:	POLIZA NB-100285361	27 DE DICIEMBRE DE 2023
	POLIZA NB- 100069639	27 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS

PÓLIZAS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/12/2023	21/07/2024	$2.313.776.864,60
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	21/12/2023	21/07/2024	$11.568.884.323,00
PRESTACIONES SOCIALES	21/12/2023	21/03/2027	$4.627.553.729,20

CALIDAD DE LA OBRA	21/03/2024	21/03/2029	$6.941.330.593,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/09/2023	21/03/2024	$1.156.888.432,30

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual el municipio de Fortul aprueba las garantías, para efectos de acta de inicio del contrato (5folios).

La presente constancia se expide a los veintisiete (27) días del mes diciembre de 2023.

JAVIER ALONSO GABRERA HUERTAS
Alcalde Municipal

Dra. Judith Mora
Jefe Oficina Jurídica.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.03.13 09:35:29 -05:00

Código de Seguridad: aWHETyg1E2HdCEDgHRbHfg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2856600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71904819	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	20/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN LAS SIGUIENTES ACTAS:

-ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 05/01/2024
-ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 DEL 05/02/2024
-ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 04/03/2024

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (05/01/2024) HASTA (04/03/2024).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 20/05/2024

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 20/09/2024	2.313.776.864,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 20/09/2024	11.568.884.323,00	5.800.289,95
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 04/03/2024	24:00 Horas Del 20/05/2027	4.627.553.729,20	2.282.081,29
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 20/05/2024	24:00 Horas Del 20/05/2029	6.941.330.593,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.510,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	8.082.371,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	8.082.371,24
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.535.650,54
TOTAL A PAGAR	$	9.618.021,78

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	71904819	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	20/05/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL** , expedida por la Compañía en **13/03/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañia.

BOGOTA a los **13** días del mes **MARZO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.03.13 09:36:17 -05:00

Código de Seguridad: j5KGnUmt/epE68/bbMf6Vg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2854800 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71904820	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	20/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN LAS SIGUIENTES ACTAS:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DEL 05/01/2024
ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01 DEL 05/02/2024
ACTA DE REINICIO No. 01 DEL 04/03/2024

LAS CUALES ESTABLECEN SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESDE (05/01/2024) HASTA (04/03/2024).

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 20/05/2024

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	578.444.216,00	1.156.888.432,00	1.156.888.432,30	570.520,32
PATRONAL	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.156.888.432,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	570.520,32
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	570.520,32
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	108.398,86
TOTAL A PAGAR	$	678.919,18

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - API

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71904820	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/03/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	20/05/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($23.137.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	PÓLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 3
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/03/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN ACTA DE REINICIO DE FECHA 04/03/2024		
PÓLIZAS:	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	NB-100069639	ANEXO 4
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/03/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN ACTA DE REINICIO DE FECHA 04/03/2024		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 3)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	04/03/2024	20/09/2024	$ 2.313.776.864,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	04/03/2024	20/09/2024	$ 11.568.884.323,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	04/03/2024	20/05/2027	$ 4.627.553.729,20

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/05/2024	20/05/2029	$ 6.941.330.593,80

PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100069639 (ANEXO 4)			
AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/09/2023	25/05/2024	$ 1.156.888.432,30

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.



DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	aWHETyglE2HdCEDgHRbHfg==		
Número de póliza	100285361	Número de anexo	3
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	13/03/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	20/05/2029
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	25.451.545.510,60
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ANEXOS

Nombre del Anexo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/05/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 2.310.776.864,40	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 04/05/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 11.589.994.259,00	$ 5.600.230,95
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 04/05/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 4.637.515.746,20	$ 2.241.061,85
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 20/05/2024	24:00 Horas del 20/05/2029	$ 6.941.330.593,80	$ 0,00

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	JSKGnUmt/epE68/bbMf6Vg==		
Numero de poliza	100069639	Numero de anexo	4
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	13/03/2024
Inicio de Vigencia Global	29/09/2023	Fin de Vigencia Global	20/05/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.156.888.432,30
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 1.156.888.432,30	$ 870.330,32
PATRONAL	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 04/03/2024	24:00 Horas del 20/05/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide, a los quince (15) días del mes de marzo del 2024.

FREDY GARCIA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó y aprobó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Jurídica	Firma

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	NUEVE (09) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS		
VALOR:	VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 10/100 ($28.032.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 7
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/09/2024		
OBSERVACIÓN:	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL EN VALOR 001 DEL 09/09/2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA PÓLLIZA A $28.032.768.645.10		
PÓLIZAS:	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100069639	ANEXO 7
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/09/2024		
OBSERVACIÓN:	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL EN VALOR 001 DEL 09/09/2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA PÓLLIZA A $28.032.768.645.10		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 7)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	09/09/2024	16/04/2025	$ 2.803.276.864,51
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	09/09/2024	16/04/2025	$ 11.568.884.322,55
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	09/09/2024	16/12/2027	$ 5.606.553.729,02

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/12/2024	16/12/2029	$ 8.409.830.593,53

PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100069639 (ANEXO 7)			
AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/09/2023	16/12/2024	$ 1.401.638.432,26

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	hjSNM+pXx2iuZQ5vcjJdTQ==		
Número de póliza	100285361	Número de anexo	7
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	13/09/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2029
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	28.388.545.509,61
		Movimiento	MODIFICACION

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/04/2025	$ 2.303.276.564,51	$ 881.100,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/04/2025	$ 11.366.894.322,53	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2027	$ 5.396.553.719,02	$ 9.399.564,33
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 16/12/2024	24:00 Horas del 16/12/2029	$ 8.409.830.593,53	$ 12.039.569,66

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	Jxk3Wkay+UgKhvVADiz0yg==		
Número de póliza	100069639	Número de anexo	7
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	13/09/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.401.638.432,26
		Movimiento	MODIFICACION
Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y CAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 1.401.638.432,26	$ 197.141,10
PATRONAL	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 420.491.529,68	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 420.491.529,68	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 09/09/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 420.491.529,68	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del 2024.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Jurídica	Firma

CONSORCIO VIAL RURAL
FORTUL

Fortul, 16 de septiembre 2024

CSVF-1083-2024

Señores
OFICINA JURÍDICA
Municipio de Fortul

Ref. Contrato de obra No. 016-2023 con objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL"

Asunto: Aprobacion de Pólizas Según Adicional Valor No.1.

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir pólizas de cumplimiento NB-100285361 anexo No.7 y póliza de responsabilidad civil NB-100069639 anexo No.7 según adicional de valor No.1, para su revisión y aprobacion.

Anexo:

- Pólizas de cumplimiento
- Pólizas de responsabilidad civil

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
R/ CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
NIT 901.758.303-9

Elaborado por:
Adalberto Alarcon Olaya
Revisado por:
Ing Javier Orlando Sanabria J.

CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
Calle 19 No. 22 – 31, Arauca, Arauca
consorciovialfortul@gmail.com

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: hjSNM+pXx2iuZQ5vcjJdTQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	72095836	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3227139196
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-1
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3227139196

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESEDNTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL EN VALOR 001 CON FECHA DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA A 28.032.768.645.10

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/09/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	2.803.276.864,51	881.100,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 09/09/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	11.568.884.322,55	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/09/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	5.606.553.729,02	9.599.564,38
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2024	24:00 Horas Del 16/12/2029	8.409.830.593,53	22.039.569,86
		TOTAL ASEGURADO	$ 28.388.545.509,61	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	32.520.234,24
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	32.520.234,24
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.178.844,51
TOTAL A PAGAR	$	38.699.078,75

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 11/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA / PAGA APH

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	72095836	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

"Con la emisión de la poliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

LADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL ,** expedida por la Compañía en **13/09/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañia.

BOGOTA a los **13** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA-APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Jxk3Wkay+UgKhvVADiz0yg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX: 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	72095838	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	TELÉFONO	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	No. DOC. IDENTIDAD	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	TELÉFONO	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESEDNTE ANEXO Y EN VIRTUD DE ADICIONAL EN VALOR 001 CON FECHA DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE AJUSTA VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA A 28.032.768.645.10

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	700.819.216,00	1.401.638.432,00	1.401.638.432,26	197.141,10
PATRONAL	420.491.529,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	420.491.530,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	420.491.530,00	420.491.530,00	420.491.529,68	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.401.638.432,26	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	197.141,10
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	197.141,10
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	37.456,81
TOTAL A PAGAR	$	234.597,91

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	72095838	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023 HASTA 16/12/2024
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

VIGILADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Or9iPNGMi2vsu754A1JD9A==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71980991	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL DEL OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 02 DEL 26/04/2024

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 26/04/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	2.313.776.864,60	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 26/04/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	11.568.884.323,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 26/04/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	4.627.553.729,20	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2024	24:00 Horas Del 16/12/2029	6.941.330.593,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.510,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71980991	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: lpAhsHV6bfLMi/pg6eYyOQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71980995	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DEL CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA COMPAÑIA SEGUROS MUNDIAL DEL OTROSÍ MODIFICATORIO NO. 02 DEL 26/04/2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	578.444.216,00	1.156.888.432,00	1.156.888.432,30	0,00
PATRONAL	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.156.888.432,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/05/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ASIF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	71980995	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($23.137.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	PÓLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 5
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/06/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 002 DE FECHA 26/04/2024		
PÓLIZAS:	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	NB-100069639	ANEXO 6
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/06/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 002 DE FECHA 26/04/2024		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 5)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	26/04/2024	16/04/2025	$ 2.313.776.864,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	26/04/2024	16/04/2025	$ 11.568.884.323,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	16/12/2024	16/12/2029	$ 4.627.553.729,20

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/12/2024	16/12/2029	$ 6.941.330.593,80

PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100069639 (ANEXO 6)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/09/2023	16/12/2024	$ 1.156.888.432,30

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	Or9iPNGMi2vsu754A1JD9A==		
Número de póliza	100285361	Número de anexo	5
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	11/06/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2029
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	25.451.545.510,60
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/04/2025	$ 2.313.776.964,60	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/04/2025	$ 11.568.884.823,00	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2027	$ 4.627.553.729,20	$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 16/12/2024	24:00 Horas del 16/12/2029	$ 6.941.330.593,80	$ 0,00

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	lpAhsHV6bFLMi/pg6eYyOQ==		
Número de póliza	100069639	Número de anexo	6
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	11/06/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.156.888.432,30
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA
Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 1.156.888.432,30	$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 26/04/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide, a los trece (13) días del mes de junio del 2024.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Jurídica	Firma

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: X8HSIrYeN1CUfvCOSJurVw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUSZR000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71920454	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.136.069-4
DIRECCIÓN	KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL	**TELÉFONO**	3208504844

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUEDANDO COMO PLAZO TOTAL (9) MESES Y (25) DIAS, SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO N. 01 DEL 14/03/2024.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 16/12/2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/03/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	2.313.776.864,60	3.955.607,57
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 14/03/2024	24:00 Horas Del 16/04/2025	11.568.884.323,00	19.778.037,86
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/03/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	4.627.553.729,20	7.987.284,52
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2024	24:00 Horas Del 16/12/2029	6.941.330.593,80	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 25.451.545.510,60	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	31.720.929,95
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	31.720.929,95
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	6.026.976,69
TOTAL A PAGAR	$	37.747.906,64

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100285361	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	71920454	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	24:00 Horas Del	16/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ARF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100285361** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE FORTUL / MUNICIPIO DE FORTUL ,** expedida por la Compañía en **03/04/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **03** días del mes **ABRIL** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: XvqvvOywpbVRzI7aL57uUw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71920377	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
ASEGURADO	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.758.303-9
DIRECCIÓN	CL 19 22 31	**TELÉFONO**	3023224964
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUEDANDO COMO PLAZO TOTAL (9) MESES Y (25) DIAS, SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO N. 01 DEL 14/03/2024.

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 16/12/2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	578.444.216,00	1.156.888.432,00	1.156.888.432,30	1.996.821,13
PATRONAL	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	347.066.529,00	347.066.530,00	347.066.529,69	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.156.888.432,30	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
EXPE SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.996.821,13
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.996.821,13
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	379.396,01
TOTAL A PAGAR	$	2.376.217,14

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/03/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISO 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	NB-100069639	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	71920377	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/09/2023	23:59 Horas Del	16/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS

NOTA: LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

CONTRATO OBRA No:	016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		
PLAZO:	TRES (03) MESES		
VALOR:	VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($23.137.768.645,10)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
NIT:	901758303-9		
R/L	JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ		
C.C.:	1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA		
PÓLIZAS:	PÓLIZA CUMPLIMIENTO	NB-100285361	ANEXO 4
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	03/04/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 001 DEL 14/03/2024		
PÓLIZAS:	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRCTUAL	NB-100069639	ANEXO 5
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	03/04/2024		
OBSERVACIÓN:	SE ACTUALIZAN VIGENCIAS SEGÙN OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 001 DEL 14/03/2024		

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 4)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	14/03/2024	16/04/2025	$ 2.313.776.864,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/03/2024	16/04/2025	$ 11.568.884.323,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	14/03/2024	16/12/2027	$ 4.627.553.729,20

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16/12/2024	16/12/2029	$ 6.941.330.593,80

PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100069639 (ANEXO 5)			
AMPAROS	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29/09/2023	16/12/2024	$ 1.156.888.432,30

3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

DATOS DE LA PÓLIZA

Código de Seguridad	X8HSIrYeN1CUfvCOSJurVw==		
Número de póliza	100285361	Número de anexo	4
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	3/04/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2029
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	MUNICIPIO DE FORTUL	Valor asegurado	25.451.545.510,60
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/04/2029	$ 1.212.776.884,60	$ 3.855.607,57
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/04/2029	$ 11.369.694.324,00	$ 49.775.631,05
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2029	$ 4.657.359.758,50	$ 17.997.764,32
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 16/12/2024	24:00 Horas del 16/12/2029	$ 6.941.330.593,50	$ 0,00

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	XvqvvOywpbVRzI7aL57uUw==		
Número de póliza	100069639	Número de anexo	5
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	3/04/2024
Inicio de vigencia Global	29/09/2023	Fin de vigencia Global	16/12/2024
Tomador	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL		
Asegurado	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Valor asegurado	1.156.888.432,30
		Movimiento	PRORROGA
Objeto de póliza	SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 1.156.888.432,30	$ 69.821,13
PATRONAL	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 14/03/2024	24:00 Horas del 16/12/2024	$ 347.066.529,69	$ 0,00

4. APROBACIÓN

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de la póliza presentada dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley y por el municipio de Fortul, por lo que, se aprueban las garantías por parte del Municipio de Fortul.

La presente constancia se expide, a los ocho (08) días del mes de abril del 2024.

FREDY GARCÍA HERNÁNDEZ
Alcalde Municipal

Revisó y aprobó	Nombre: Yary Joel Llanes Ruiz Cargo: Asesor Jurídico	Firma
Proyectó	Nombre: Jefersson Mejía González Cargo: Apoyo Profesional Oficina Jurídica	Firma

ANEXO H

MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/11/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 026 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES **PLAZO ADICIONAL:** 6 MESES Y 25 DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4763 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: ____

OBSERVACIONES:

NO se presento plan de calidad, en el anexo técnico no se exige plan de calidad.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:

No se presentaron auditorias

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO X APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

No se presento un plan de inspección, medición y ensayos. Sin embargo para el período del presente informe se han realizado los ensayos de laboratorio pertinentes y se encuentran relacionados en formato 15-FR-11.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

para el el presente inform No se presentaron No conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

para el el presente inform No se presentaron quejas y reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

NO se presento plan de calidad, en el anexo técnico no se exige plan de calidad.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
2	ESTACION TOTAL	TOPKON	GTS-255	22/02/2024	11/07/2024	22/12/2024	**ok**
2	NIVEL AUTOMATICO	SOKKIA	B4O4	22/02/2024	11/07/2024	22/12/2024	**ok**

OBSERVACIONES:

DENTRO DEL CONTROL REALIZADO PARA LA CALIDAD DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS UTILIZADOS EN CAMPO.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO I

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

Plan de inversión del anticipo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1 1 de 1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 Y 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - CONTRATO PRINCIPAL

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES					$ 7.660.884.300,00	66,22%
2	TRANSPORTE					$ 2.489.000.000,00	21,51%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS					$ 1.419.000.000,00	12,27%
TOTAL						$ 11.568.884.300,00	100,00%

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - CONTRATO ADICIONAL

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES					$ 1.290.566.750,00	52,73%
2	TRANSPORTE					$ 856.625.000,00	35,00%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS					$ 300.308.250,00	12,27%
TOTAL						$ 2.447.500.000,00	100,00%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma:
Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO J

MEPI-MN1-IN-2-FR-2

Seguimiento a la inversión del anticipo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 11 **MES:** NOV **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | |

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. **DE** ENTIDAD FINANCIERA: ALIZANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 4000008399 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: ARAUCA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50% **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO CONTRATO PRINCIPAL : **$ 11.568.884.300,00** **(M/CTE)**

VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL: **$ 2.447.500.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	CCT No. 046	8-mar-24	COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS	$ 500.000.000,00	3	MAQUINARIA Y EQUIPOS
FACTURA	CT. No. 047	8-mar-24	CONSTRUIR Y TRANSPORTAR SAS	$ 1.000.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV 130	12-mar-24	ASOCIACION DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 98.200.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 01	20-mar-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	CT. No. 048	20-mar-24	CONSTRUIR Y TRANSPORTAR SAS	$ 580.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	CCT No. 050	11-abr-24	COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS	$ 919.000.000,00	3	MAQUINARIA Y EQUIPOS
FACTURA	ASOV135	25-abr-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 96.236.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 02	8-may-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	ASOV136	10-may-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 60.984.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV137	22-may-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 137.829.300,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 03	31-may-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	ASOV138	7-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 150.000.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV139	13-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 33.275.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	FV22	24-jun-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	$ 27.437.080,00	2	TRANSPORTE
_____	_____	24-jun-24	INVERSIONES Y SOLUCIONES ARDILA SAS ZOMAC	$ 11.241.789,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV140	28-jun-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 157.266.000,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 03	2-jul-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.000.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	FV25	18-jul-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	$ 29.465.892,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV141	11-jul-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 107.064.939,00	2	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 04	24-jul-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 500.000.000,00	1	MATERIALES
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 05	16-ago-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.530.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	FACTURA LP 38	16-ago-24	LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ	$ 1.530.000.000,00	1	MATERIALES
CUENTA DE COBRO	C.COBRO No. 06	19-sep-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 90.000.000,00	1	MATERIALES
FACTURA	ASOV148	15-oct-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 79.114.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	ASOV149	15-oct-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 120.886.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	**C.P No. 28**	17-oct-24	CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS	$ 1.180.868.576,25	1	MATERIALES
FACTURA	**FE24**	23-oct-24	MAKO INGIN S.A.S	$ 14.850.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	**FEAL327**	23-oct-24	ALFONSO SARMIENTO GONZALES	$ 6.534.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	**FV36**	23-oct-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	$ 6.657.960,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	**FV37**	23-oct-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	$ 23.469.800,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	**FV38**	7-nov-24	EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA	$ 12.991.860,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	**FE25**	7-nov-24	MAKO INGIN S.A.S	$ 35.046.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	**ASOV151**	18-nov-24	ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL	$ 160.215.000,00	2	TRANSPORTE
FACTURA	**FE26**	18-nov-24	MAKO INGIN S.A.S	$ 14.850.000,00	2	TRANSPORTE

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM **(CONTRATO PRINCIPAL)**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 7.660.884.300,00	$ 7.560.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 7.650.000.000,00	$ 10.884.300,00
2	TRANSPORTE	$ 2.489.000.000,00	$ 2.489.000.000,00	$ -	$ 2.489.000.000,00	$ -
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 1.419.000.000,00	$ 1.419.000.000,00	$ -	$ 1.419.000.000,00	$ -
	TOTALES	**$ 11.568.884.300,00**	**$ 11.468.000.000,00**	**$ 90.000.000,00**	**$ 11.558.000.000,00**	**$ 10.884.300,00**

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM **(CONTRATO ADICIONAL)**

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	MATERIALES	$ 1.290.566.750,00		$ 1.180.868.576,25	$ 1.180.868.576,25	$ 109.698.173,75
2	TRANSPORTE	$ 856.625.000,00	$ 200.000.000,00	$ 274.614.620,00	$ 474.614.620,00	$ 382.010.380,00
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 300.308.250,00		$ -	$ -	$ 300.308.250,00
	TOTALES	**$ 2.447.500.000,00**	**$ 200.000.000,00**	**$ 1.455.483.196,25**	**$ 1.655.483.196,25**	**$ 792.016.803,75**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) : $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma:
Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.


ANEXO K

MINFRA-MN-IN-2-FR-1

Programa de obra

PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1			**CONTRATO DE OBRA 016 DE 2023**	**$ 28.032.768.645,10**	**257 días?**	**jue 21/12/23**	**vie 13/12/24**
2			FASE DE PREALISTAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE	$ 0,00	24 días	jue 21/12/23	lun 18/03/24
3		II	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.	$ 13.070.759.440,61	191 días	mar 19/03/24	mar 10/12/24
4		1	EXCAVACIONES	$ 103.289.950,84	20 días	mar 19/03/24	lun 15/04/24
5		1.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE	$ 103.289.950,84	20 días	mar 19/03/24	lun 15/04/24
6		2	ESTRCTURA DE VIA	$ 12.262.990.006,87	175 días	mar 19/03/24	lun 18/11/24
7		2.1	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	$ 628.489.400,00	47 días	mar 16/04/24	mié 19/06/24
8		2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	$ 835.117.198,56	30 días	mar 19/03/24	lun 29/04/24
9		2.3	SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50	$ 2.056.689.257,48	55 días	mar 16/04/24	lun 28/10/24
10		2.4	BASE GRANULAR CLASE B GRADACION FINA	$ 1.788.053.566,32	50 días	mar 18/06/24	vie 1/11/24
11		2.5	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	$ 260.761.200,00	32 días	jue 3/10/24	vie 15/11/24
12		2.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC□19 - COMPRA DE MEZCLA	$ 6.693.879.384,51	32 días	vie 4/10/24	lun 18/11/24
13		3	OBRAS DE DRENAJE	$ 475.723.546,72	26 días	mié 9/10/24	mié 13/11/24
14		3.1	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	$ 10.898.888,28	20 días	mar 15/10/24	lun 11/11/24
15		3.2	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	$ 162.021.362,25	21 días	mié 16/10/24	mié 13/11/24
16		3.3	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU	$ 43.040.482,65	14 días	jue 24/10/24	mar 12/11/24
17		3.4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	$ 119.542.746,26	26 días	mié 9/10/24	mié 13/11/24
18		3.5	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	$ 125.722.818,00	21 días	mar 15/10/24	mar 12/11/24
19		3.6	DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	$ 14.497.249,28	20 días	lun 14/10/24	vie 8/11/24
20		4	SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACIÓN VIAL	$ 97.085.275,00	12 días	mar 19/11/24	mié 4/12/24
21		4. 1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	$ 26.844.475,00	4 días	mar 19/11/24	vie 22/11/24
22		4 .2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	$ 70.240.800,00	10 días	jue 21/11/24	mié 4/12/24
23			**ACTIVIDADES DE CARACTERIZACION VIAL**	**$ 4.990.093,80**	**30 días**	**jue 24/10/24**	**mié 4/12/24**
24		1P	ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR	$ 4.990.093,80	30 días	jue 24/10/24	mié 4/12/24
25			**ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL**	**$ 126.680.567,38**	**45 días**	**mié 9/10/24**	**mar 10/12/24**
26			OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 126.680.567,38	45 días	mié 9/10/24	mar 10/12/24
27		I	**EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**	**$ 14.962.009.204,49**	**154 días?**	**mar 14/05/24**	**vie 13/12/24**
28		1.1.2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ 7.138.770.426,59**	**124 días**	**mar 14/05/24**	**vie 1/11/24**
29		1.1.2.	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. (Incluye Transporte)	$ 31.553.968,63	10 días	mar 14/05/24	lun 27/05/24
30		1.1.2.	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES	$ 204.999.880,16	10 días	mar 14/05/24	lun 27/05/24

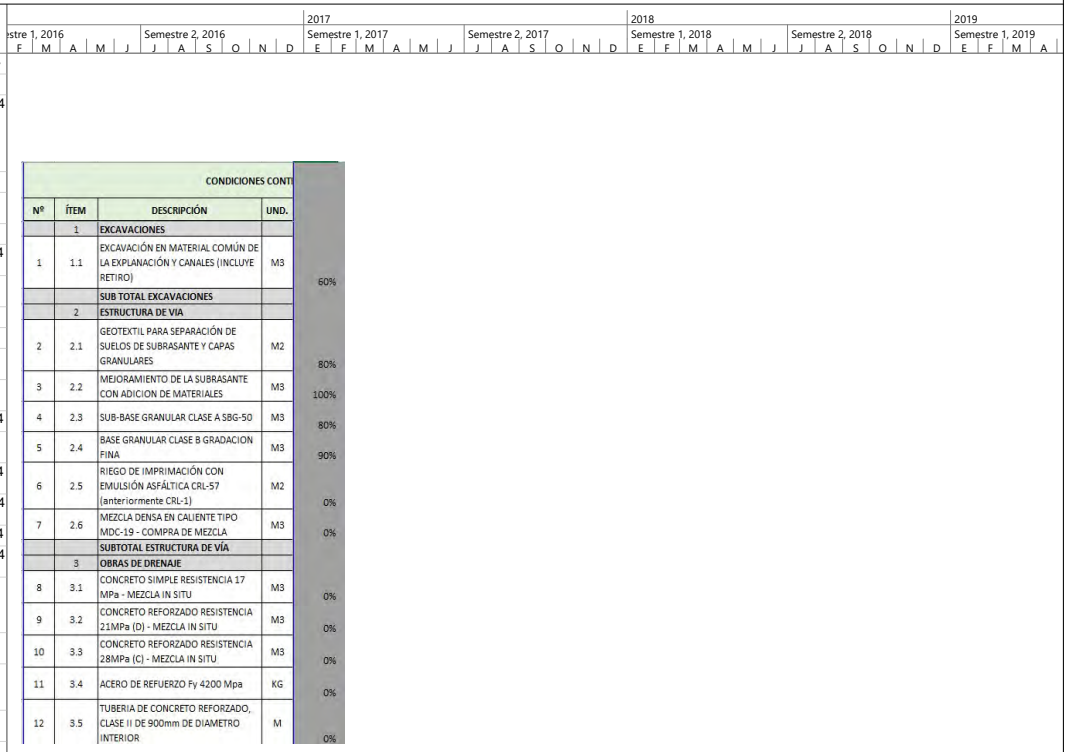


Proyecto: PROGRAMACION FO
Fecha: lun 21/10/24

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso

ING, JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
Representante Consorcio VIAL RURAL FORTUL

PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
31		1.1.2.	TERRAPLENES	$ 6.902.216.577,80	61 días	mar 14/05/24	vie 1/11/24
32		**1.1.3**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**$ 6.298.818.599,09**	**41 días**	**lun 7/10/24**	**lun 2/12/24**
33		1.1.3.	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	$ 460.347.859,40	20 días	lun 7/10/24	vie 1/11/24
34		1.1.3.	ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA	$ 2.302.629.452,96	20 días	lun 14/10/24	vie 8/11/24
35		1.1.3.	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1)	$ 188.658.211,20	25 días	lun 28/10/24	vie 29/11/24
36		1.1.3.	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC□19 - COMPRA DE MEZCLA	$ 3.347.183.075,53	25 días	mar 29/10/24	lun 2/12/24
37		**1.1.4**	**SEÑALIZACIÓN**	**$ 234.092.778,00**	**12 días**	**lun 25/11/24**	**mar 10/12/24**
38		1.1.4.	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm)	$ 24.520.672,00	5 días	mar 3/12/24	lun 9/12/24
39		1.1.4.	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES)	$ 47.951.080,00	6 días	mar 3/12/24	mar 10/12/24
40		1.1.4.	TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	$ 12.435.232,00	6 días	mar 3/12/24	mar 10/12/24
41		1.1.4.	DEFENSA VEHICULAR METALICA EN ACERO GALVANIZADO	$ 141.341.757,00	10 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24
42		1.1.4.	CAPTAFAROS	$ 1.685.670,00	4 días	lun 25/11/24	jue 28/11/24
43		1.1.4.	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SIMPLE (50 m X 40 m)	$ 6.158.367,00	2 días	vie 29/11/24	lun 2/12/24
44		**1.2**	**OBRAS DE DRENAJE**	**$ 1.111.786.315,08**	**89 días?**	**mar 28/05/24**	**vie 27/09/24**
45		**1.2.1**	**PRELIMINARES**	**$ 15.708.426,24**	**5 días**	**mar 28/05/24**	**lun 3/06/24**
46		1.2.1.	DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro)	$ 15.708.426,24	5 días	mar 28/05/24	lun 3/06/24
47		**1.2.2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**$ 104.391.965,64**	**85 días**	**mar 28/05/24**	**lun 23/09/24**
48		1.2.2.	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M.	$ 15.523.196,40	5 días	mar 4/06/24	lun 23/09/24
49		1.2.2.	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	$ 1.244.375,40	5 días	mar 28/05/24	lun 3/06/24
50		1.2.2.	RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO	$ 87.624.393,84	3 días	mar 30/07/24	jue 1/08/24
51		**1.2.3**	**CONCRETOS**	**$ 814.703.002,80**	**89 días?**	**mar 28/05/24**	**vie 27/09/24**
52		1.2.3.	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	$ 5.457.408,00	10 días	mar 28/05/24	lun 23/09/24
53		1.2.3.	CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	$ 590.951.852,40	16 días	mar 9/07/24	vie 27/09/24
54		1.2.3.	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO	$ 193.419.900,00	8 días	mar 11/06/24	mar 24/09/24
55		1.2.3.	CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU	$ 24.873.842,40	10 días?	mar 28/05/24	lun 23/09/24
56		**1.2.4**	**ACERDO DE REFUERZO**	**$ 176.982.920,40**	**71 días**	**vie 21/06/24**	**vie 27/09/24**
57		1.2.4.	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	$ 176.982.920,40	23 días	vie 21/06/24	vie 27/09/24
58			**MOVIMIENTO RED ELECTRICA**	**$ 27.663.171,88**	**4 días?**	**lun 14/10/24**	**jue 17/10/24**
59			**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT**	**$ 171.394,08**	**1 día**	**lun 14/10/24**	**lun 14/10/24**
60			REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT	$ 171.394,08	1 día	lun 14/10/24	lun 14/10/24
61			**APOYOS MT**	**$ 12.759.228,80**	**3 días?**	**mar 15/10/2**	**jue 17/10/24**
62			CONCRETO 3000 PSI (Incluye material, mano de obra y herramienta y equipos)	$ 2.047.456,80	3 días?	mar 15/10/24	jue 17/10/24
63			POSTE EN CONCRETO 12 M X 2050 KG (Incluye suministro, transporte y proceso de hicada y aplomada)	$ 9.185.136,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24




Proyecto: PROGRAMACION FO
Fecha: lun 21/10/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

ING, JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
Representante Consorcio VIAL RURAL FORTUL

PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
64			DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición)	$ 1.526.636,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24
65			**VESTIDA/ARMADA POSTES MT**	**$ 11.503.574,00**	**3 días**	**mar 15/10/2**	**jue 17/10/24**
66			ESTRUCTURAS 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	$ 710.849,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24
67			ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el suminstro, transporte y montaje de la estructura)	$ 1.160.615,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24
68			ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura)	$ 3.072.512,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24
69			ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	$ 5.638.150,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24
70			DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION	$ 921.448,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24
71			**TEMPLETES MT**	**$ 2.858.812,00**	**1 día**	**jue 17/10/24**	**jue 17/10/24**
72			TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSIÓN (Incluye Suministro, Transporte e Instalación)	$ 2.858.812,00	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24
73			**VESTIDA/ARMADA POSTES MT**	**$ 370.163,00**	**3 días**	**mar 15/10/2**	**jue 17/10/24**
74			DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION	$ 140.918,00	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24
75			ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura)	$ 229.245,00	2 días	mié 16/10/24	jue 17/10/24
76			**ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL**	**$ 148.313.198,55**	**40 días**	**mié 16/10/24**	**mar 10/12/24**
77			OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 148.313.198,55	40 días	mié 16/10/24	mar 10/12/24
78			**ACTIVIDADES DE CARACTERIZACION VIAL**	**$ 2.555.738,41**	**30 días**	**jue 31/10/24**	**mié 11/12/24**
79			ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2.86 KM + 0.93KM)	$ 2.555.738,41	30 días	jue 31/10/24	mié 11/12/24
80			**SALDO A FAVOR DEL MINUCIPIO**	**$ 8.976,89**	**1 día?**	**vie 13/12/24**	**vie 13/12/24**
81			Saldo favor del municipio	**$ 8.976,89**	1 día?	vie 13/12/24	vie 13/12/24



Proyecto: PROGRAMACION FO
Fecha: lun 21/10/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

ING, JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
Representante Consorcio VIAL RURAL FORTUL

PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL



Proyecto: PROGRAMACION FO
Fecha: lun 21/10/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			

ING, JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
Representante Consorcio VIAL RURAL FORTUL

PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL




Proyecto: PROGRAMACION FO
Fecha: lun 21/10/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			

ING, JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
Representante Consorcio VIAL RURAL FORTUL

PROGRAMACIÓN DE OBRA
CONTRATO 016 DE 2023
CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

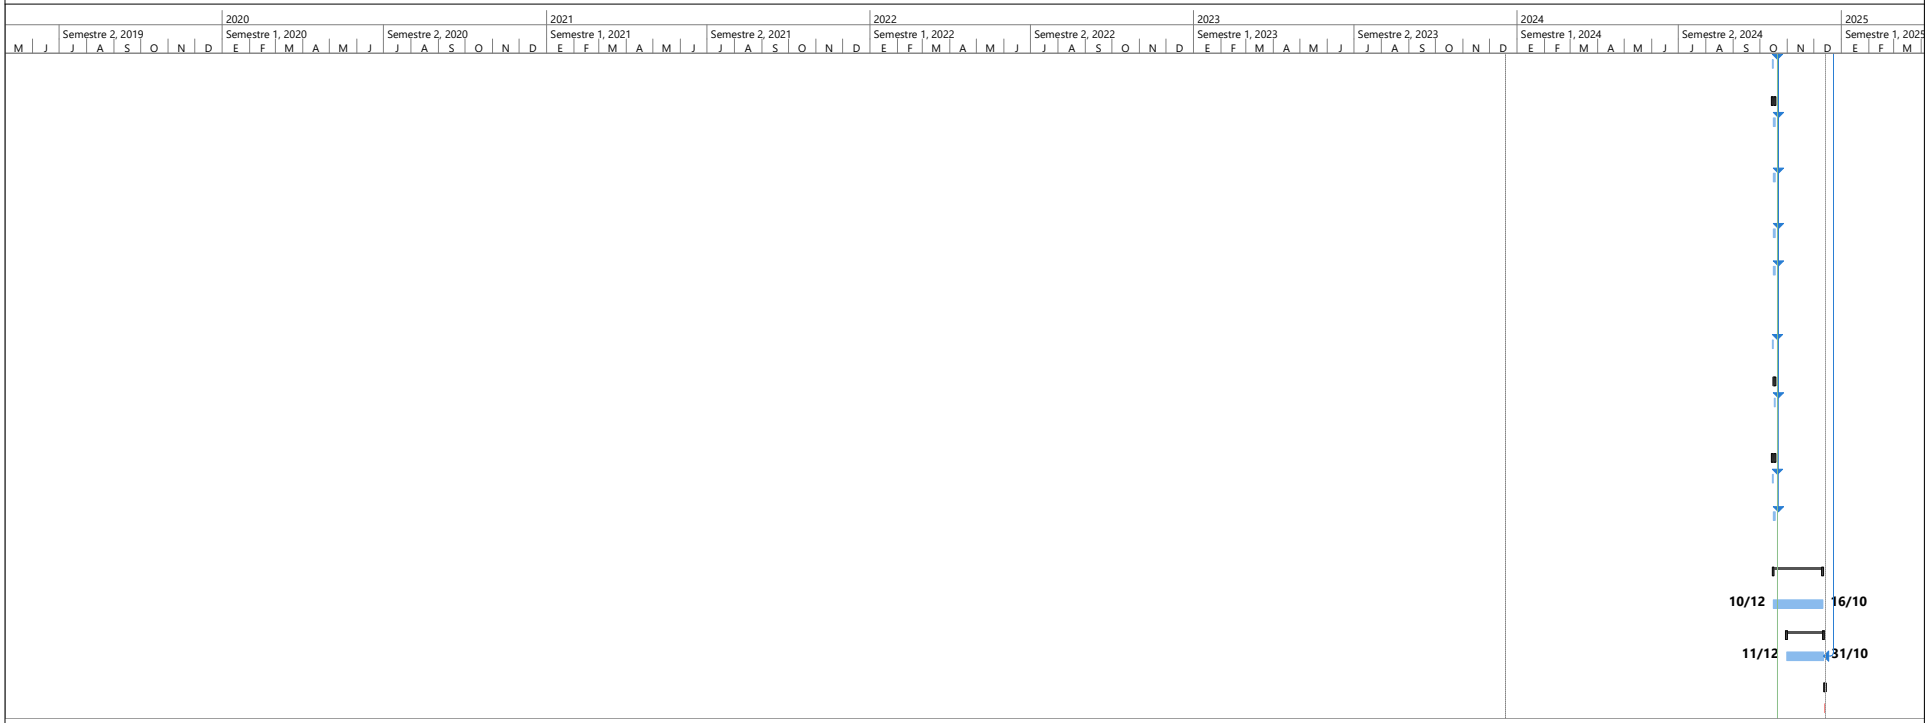

Proyecto: PROGRAMACION FO
Fecha: lun 21/10/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso	

ING, JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ
Representante Consorcio VIAL RURAL FORTUL

ANEXO L

MEPI-MN-IN-6-FR-1

Programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/11/2024 (Día/mes /año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. X **DE** X (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $
SEGUIMIENTO No. X
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra) (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 016 DE 2023
OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA NUEVA FORTUL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 DE 203 **INTERVENTOR:**

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión mas representativa con el recibido del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 23.137.768.645,10 (Rambo contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 28.032.768.645,10
PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 25 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 4.895.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	1 dic-23	2 ene-24	3 feb-24	4 mar-24	5 abr-24	6 may-24	7 jun-24	8 jul-24	9 ago-24	10 sep-24	11 oct-24	12 nov-24	13 dic-24	%
PALMARITO																	
EXCAVACIONES	$136.735.962	0,59%	0,59%	0,00%	SUSPENSION 01	PRORROGA SUSPENSION 01	0,27%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$136.735.962	0,59%	$136.147.944	$0			$61.531.183	$75.204.779	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$0			$0	$96.031.993	$4.644.363	$0	$0	$35.471.588	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,42%	0,02%	0,00%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURA DE VIA	$11.453.751.317	49,50%	23,57%	0,00%			0,67%	4,67%	5,53%	5,15%	2,96%	11,55%	2,37%	4,90%	0,00%	0,00%	
	$11.453.751.317	49,50%	$5.453.536.246	$0			$155.753.417	$1.079.553.988	$1.278.805.977	$1.190.821.089	$684.803.118	$2.672.116.525	$549.349.628	$1.133.810.586	$0	$0	
				$0			$0	$519.178.078	$680.798.781	$1.267.902.086	$1.189.818.036	$872.857.212	$97.982.054	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	2,24%	2,96%	5,48%	5,14%	3,77%	3,97%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE DRENAJE	$215.120.993	0,93%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,21%	0,22%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$215.120.993	0,93%	$215.120.993	$0			$0	$0	$49.009.113	$51.490.143	$114.621.737	$0	$110.988.050	$0	$0	$0	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACÓN VIAL	$97.085.275	0,42%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,23%	0,00%	
	$97.085.275	0,42%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.844.475	$52.680.600	$17.500.200	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN VIAL	$4.990.094	0,02%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	
	$4.990.094	0,02%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.079.206	$1.663.365	$415.841	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$116.320.991	0,50%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,10%	0,08%	0,10%	0,02%	0,02%	0,02%	
	$116.320.991	0,50%	$0	$0			$0	$0	$0	$4.846.708	$19.386.832	$24.233.540	$0	$24.233.540	$19.386.832	$4.846.708	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
CAÑO FLORES																	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$5.067.530.783	21,90%	0%	0,00%	SUSPENSION 01	PRORROGA SUSPENSION 01	0,00%	0,00%	7,00%	7,27%	7,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$5.067.530.783	21,90%	$5.289.812.436	$0			$0	$0	$1.820.337.887	$1.681.557.510	$1.681.557.510	$367.077.876	$0	$0	$0	$0	
				$0			$0	$0	$781.691.160	$1.167.866.924	$1.606.011.436	$1.833.533.036	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	3,38%	5,05%	6,50%	7,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$4.698.654.724	20,31%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	0,00%	1,98%	0,00%	0,00%	
	$4.698.654.724	20,31%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$784.289.067	$1.891.525.898	$0	$457.731.464	$0	$0	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$211.916.215	0,92%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,26%	0,02%	
	$211.916.215	0,92%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$147.477.223	$59.756.104	$4.682.888	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE DRENAJE	$1.023.715.223	4,42%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	1,16%	1,01%	2,26%	0,00%	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.023.715.223	4,42%	$1.023.715.223	$0			$0	$0	$267.320.945	$234.056.361	$521.797.916	$0	$35.670.800	$0	$0	$0	
				$0			$0	$0	$227.542.766	$199.172.338	$444.022.707	$88.820.264	$170.397.148	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,98%	1,33%	1,08%	0,30%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$110.018.464	0,48%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,08%	0,10%	0,00%	0,10%	0,08%	0,02%	
	$110.018.464	0,48%	$0	$0			$0	$0	$0	$4.584.103	$18.336.411	$22.920.513	$0	$22.920.513	$18.336.411	$4.584.103	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM)	$1.928.605	0,01%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.928.605	0,01%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$803.585	$642.868	$160.717	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL OTROS ITEMS																	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 23.137.768.645,10																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 23.137.768.645,10																

Reprogramación Reinicio No.1 Reprogramación Adicional de tiempo No.1

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje proorramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor c
4. El Proorama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provis
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se suedan agrup

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%			0,94%	4,99%	13,90%	13,69%	16,53%	20,29%	3,01%	25,11%	29,51%	4,31%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$217.284.600,29	$1.154.760.767,00	$3.215.473.921,70	$3.167.895.914,37	$3.824.792.591,82	$4.694.944.352,30	$696.008.477,87	$7.038.272.995	$8.271.843.927,34	$1.211.770.597,79	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%			0,94%	5,93%	19,83%	33,52%	50,05%	70,34%	41,87%	66,18%	95,69%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$ 217.284.600,29	$ 1.372.045.367,29	$ 4.587.519.288,99	$ 7.755.415.203,36	$ 11.580.207.795,18	$ 16.914.872.647,00	$ 11.510.881.124,87	$ 18.549.154.119,97	$ 26.820.998.047,31	$ 28.032.768.645,10	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%			0,00%	2,66%	7,35%	11,86%	12,72%	12,16%	5,63%	18,23%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$0	$615.210.071	$1.699.587.060	$2.743.740.648	$2.943.982.179	$2.812.482.690	$1.303.460.195,50	$5.109.913.511	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%			0,00%	2,66%	10,00%	21,86%	34,59%	46,74%	41,45%	59,68%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$0			$0	$615.210.071	$2.314.797.131	$5.058.537.778	$8.002.389.957	$10.315.952.595	$11.619.412.790,00	$16.726.452.561			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
-	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

OBSERVACIONES: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 SE LEGALIZO EL ACTA DE MODIFICACIÓN No.3, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE LEGALIZO EL ACTA DE ADICIÓN ENVALOR No.1, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL, NI CON LA PROGRAMACION REALIZADA EN EL MES ANTERIOR

Aprueba
Firma
Nombre: Taylor O. Sanabria Jiménez
Presidente la Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoria
Matricula profesional No. 68202112214 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO M

MEPI-MN-IN-6-FR-2

Seguimiento al programa de inversiones

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	(30 / 11 / 2024)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. X **DE** X (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $
SEGUIMIENTO No. 8
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 018 DE 2023
OBJETO:
ALINAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CASANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIA NUEVA FORTUL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4783 DE 203 **INTERVENTOR:**

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión mas reciente en el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 23.137.768.645,10 (Rango contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 28.032.768.645,10

PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 25 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 4.895.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	%
PALMARITO																	
EXCAVACIONES	$136.735.962	0,59%	0,59%	0,00%	SUSPENSION 01	PRORROGA SUSPENSION 01	0,27%	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$136.735.962	0,59%	$136.147.944	$0			$61.531.183	$75.204.779	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$0			$0	$96.031.993	$4.844.363	$0	$0	$35.471.588	$0	$0	$0	$0	
ESTRUCTURA DE VIA	$11.453.751.317	49,50%	19,60%	0,00%			0,67%	4,67%	5,53%	5,15%	2,96%	11,55%	2,37%	4,90%	0,00%	0,00%	
	$11.453.751.317	49,50%	$4.535.554.172	$0			$155.753.417	$1.079.555.988	$1.278.805.977	$1.190.821.089	$684.803.118	$2.672.116.525	$549.349.628	$1.133.810.586	$0	$0	
				$0			$0	$519.178.058	$885.798.781	$1.267.902.086	$1.189.818.036	$872.867.212	$317.952.654	$0	$0	$0	
OBRAS DE DRENAJE	$215.120.993	0,93%	0,93%	0,00%			0,00%	2,24%	2,96%	5,48%	5,14%	3,77%	3,97%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$215.120.993	0,93%	$215.120.993	$0			$0	$0	$49.009.113	$51.490.143	$114.621.737	$0	$110.988.050	$0	$0	$0	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$214.120.993	$0	$0	$0	
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACÓN VIAL	$97.085.275	0,42%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,93%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$97.085.275	0,42%	$0	$0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,23%	0,00%	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$26.844.475	$52.689.600	$17.560.200	
ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN VIAL	$4.990.094	0,02%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$4.990.094	0,02%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.079.206	$1.663.365	$415.841	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	$116.320.991	0,50%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$116.320.991	0,50%	$0	$0			$0	$0	$0	$4.846.708	$19.386.832	$24.233.540	$0	$24.233.549	$19.386.832	$4.846.708	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CAÑO FLORES																	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$5.067.530.783	21,90%	20,01%	0,00%			0,00%	0,00%	7,00%	7,27%	7,27%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$5.067.530.783	21,90%	$4.629.991.631	$0			$0	$0	$1.820.337.887	$1.881.557.510	$1.881.557.510	$84.077.876	$0	$0	$0	$0	
				$0			$0	$637.619.892	$781.601.150	$1.167.660.224	$1.505.011.438	$637.948.850	$0	$0	$0	$0	
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$4.698.654.724	20,31%	0%	0,00%			0,00%	2,76%	3,38%	5,05%	6,50%	2,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$4.698.654.724	20,31%	$0	$0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	8,18%	0,00%	1,98%	0,00%	0,00%	
				$0			$0	$0	$0	$0	$784.289.067	$1.897.590.888	$0	$457.731.464	$0	$0	
SEÑALIZACIÓN	$211.916.215	0,92%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$211.916.215	0,92%	$0	$0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,26%	0,02%	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$147.477.223	$59.796.104	$4.682.888	
OBRAS DE DRENAJE	$1.023.715.223	4,42%	5,11%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.023.715.223	4,42%	$1.182.520.692	$0			$0	$0	$267.320.945	$234.496.361	$521.797.916	$0	$35.670.800	$0	$0	$0	
				$0			$158.806.499	$227.542.768	$456.172.338	$289.022.707	$88.620.264	$170.367.148	$0	$0	$0	$0	
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$110.018.464	0,48%	0%	0,00%			0,00%	0,69%	0,98%	1,33%	1,08%	0,30%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$110.018.464	0,48%	$0	$0			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%	0,02%	
				$0			$0	$0	$0	$4.584.103	$18.336.411	$22.920.513	$18.336.411	$22.920.513	$18.336.411	$4.584.103	
ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM)	$1.928.605	0,01%	0%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$1.928.605	0,01%	$0	$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$321.434	$803.585	$642.868	$160.717	
				$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL OTROS ITEMS				0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 23.137.768.645,10																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 23.137.768.645,10																

Reprogramación Reinicio No.1 — Reprogramación Adicional de tiempo No.1

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje proramado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor
4. El Proarama de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provis
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se cuedan agrup

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

												Noviembre		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%		0,94%	4,99%	13,98%	13,69%	16,53%	20,29%	3,01%	25,11%	29,51%	4,31%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0		$217.284.600,29	$1.154.760.766,64	$3.215.473.921,70	$3.167.895.914,37	$3.824.792.991,82	$4.694.944.352,30	$696.008.477,87	$7.038.272.995	$8.271.843.927,34	$1.211.770.597,79	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%		0,94%	5,93%	19,83%	33,52%	50,05%	70,34%	41,07%	66,18%	95,69%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0		$ 217.284.600,29	$ 1.372.045.366,93	$ 4.587.519.288,63	$ 7.755.415.203,00	$ 11.580.207.794,82	$ 16.275.152.147,12	$ 11.510.881.124,87	$ 18.549.154.119,97	$ 26.820.998.047,31	$ 28.032.768.645,10	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%		0,00%	6,10%	7,35%	11,86%	12,72%	6,55%	5,63%	16,23%	9,50%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0		$0	$1.411.829.382	$1.699.987.060	$2.743.740.648	$2.943.882.179	$1.514.848.023	$1.303.460.196	$5.109.913.511	$2.663.849.559	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%		0,00%	6,10%	13,45%	25,31%	38,03%	13,89%	41,45%	59,68%	69,18%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0		$0	$1.411.829.382	$3.111.416.441	$5.855.157.089	$8.799.009.268	$10.313.857.291	$11.619.412.790	$16.726.452.561	$19.390.302.120		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
-	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
-	$ -		
	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

OBSERVACIONES: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 SE LEGALIZO EL ACTA DE MODIFICACIÓN No.3, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE LEGALIZO EL ACTA DE ADICIÓN ENVALOR No.1, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL NI CON LA PROGRAMACION REALIZADA EN MES ANTERIOR

Aprueba
Firma
Nombre: Zayler O. Sanabria Jiménez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334995

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoria
Matricula profesional No. 68202112214 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO N

MEPI-MN-IN-14-FR-1

Actas de comité de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 24
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de PAGA definitivo por parte de obra a la Interventoría.

Definir Compensación ambiental definitiva

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al avance del proyecto, desde los componentes técnico, ambiental, social y sst.

Revisar el cumplimeinto de los compromisos adquiridos

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra el director de la interventoría mencionando los compromisos que se han adquirido y que es necesario dar cumplimiento a cada uno de éstos, para que el proyecto avance de manera adecuada. Dicho esto se da la palabra al componente ambiental.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoría por medio de su Residente ambiental explica que a la fecha No se ha entregado en su totalidad todo lo correspondiente al PAGA, incumpliendo de esta manera compromisos anteriores, se menciona además que en oficio 099 se reitera los imcumplimientos ambientales al contrato de obra 016 de 2023. Por otra parte manifiesta que aún no se ha establecido o presentado la compensación ambiental definitiva para el proyecto, situación que es preocupante y que tiene a la expectativa a la comunidad.

El contratista de obra menciona que lo referente al PAGA quedará resuelto el día martes 5 de noviembre cuando se subsane la parte cartográfica que está pendiente. Po otra parte en lo referente a la compensación ambiental manifiesta que se han reunido con la administración municipal de fortul para realizar la gestión a este tema y se estableció que para la próxima semana CORPORINOQUIA realizará una reunión de manera virtual en la que serán partícipes adminstración municipal, contratista de obra e interventoría.

El director de interventoría solicita apoyo a la administración municipal para que realice la gestión urgente respecto a la definición de los temas del componente ambiental , advirtiendo que el proyecto se encuentra en la etapa de finalización del plazo contractual y que es necesario tener todos los componentes al día para darle cierre al proyecto y realizar la liquidaciones pertinenetes.

Desde la administración municipal de fortul se manifiesta la disponibilidad y atención para establecer soluciones al componente ambiental, se hace la solicitud al contratista de obra para que se ponga al día con todos los requerimientos que se le han realizado. Por otra parte se está a la expectativa de las conclusiones que se generen de la reunión con CORPORINOQUIA.

La interventoría para concluir menciona que es importante que una vez se defina la actividad que se va realizar como compensación ambiental se pueda realizar la socialización con la comunidad, debido a que ellos se encuentran a la expectativa de esta situación. Otra situación importante por definir es el Plan de inversión Ambiental, que debe ser aprobado por parte de la interventoría, de esta manera se solicita la entrega de éste documento a más tardar el día 5 de noviembre de 2024.

COMPONENTE SOCIAL:

Desde el componente social se menciona que el día sábado 26 de octubre se realizó una reunión con la comunidad y veeduría del sector palmarito, para dar a conocer el avance del proyecto y responder inquietudes de la comunidad. por otra parte se solicitó al contratista de obra que el informe mensual sea entregado con puntualidad debido a que estamos al margen del plazo contractual según un comunicado enviado por INVIAS.

COMPONENTE SST:

Desde el componente SST se Reitera que han existido recomendaciones por parte de la interventoría respecto a la relación de personal en campo, a la fecha No se realizó entrega de la relación de personal actualizada del mes de octubre. Adicionalmente se se reitera que es necesario preveer que se presentarán mas actividades simultáneamente, lo cual es importante aplicar el plan de señalización de manera efectiva. El contratista de obra menciona que la relación de personal actualizada será enviada en la mayor brevedad y en lo referente a la señalización y manejo de tránsito para las actividades de obra ya cuenta en campo con personal y logistica para cumplir con este manejo.

COMPONENTE TÉCNICO:

Desde el componente técnico, la interventoría manifiesta que el proyecto actualmente (31/10/2024) presenta un avance ejecutado acumulado financiero de 59,67% y que según el seguimiento a la programación contractual el proyecto presenta un atraso de 6,50 % en su ejecución. Por otra parte se menciona que aún no se iniciado ni entregado ningún avance en lo que tiene que ver con la actividad (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA), de esta manera se advierte que si esta actividad no se realiza según el cronograma establecido, continuará en aumento el atraso.

El contratista de obra manifiesta que ya en campo cuenta con la maquinaria para iniciar con esta actividad y que el día martes 5 de noviembre iniciará con la extracción del material para la aplicación de las sales inorgánicas.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
ENTREGA DE PAGA DEFINITIVO - TEMAS CARTOGRÁFICOS	5/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
ENTREGA DE PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	5/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
DEFINIR COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA	PRÓXIMA SEMANA	MUNICIPIO DE FORTUL - CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL- COPORINOQUIA
INICIO DE ACTIVIDAD - ESTABILIZACIÓN QUÍMICA DE TERRAPLÉN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA	PRÓXIMA SEMANA	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
PROXIMO COMITÉ	8/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 8/11/2024 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.


LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)


NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Narly Yardin Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Esteban Pico Méndez	Ingeniero Auxiliar interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Eliane Lopez Portilla	Profesional Social Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Gamal David Cuesta	Ingeniero Ambiental Interventoría	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Esneider D. Fuentes Zárate	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Harry Mena Mosquera	Especialista Ambiental	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Johana Quintero	Inspector sst - Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Andrés Felipe Gelves Ferrer	Ing apoyo ambiental - obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Wilfredo Ramirez Ramirez	Ingeniero Ambiental de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



ASISTENCIA VIRTUAL

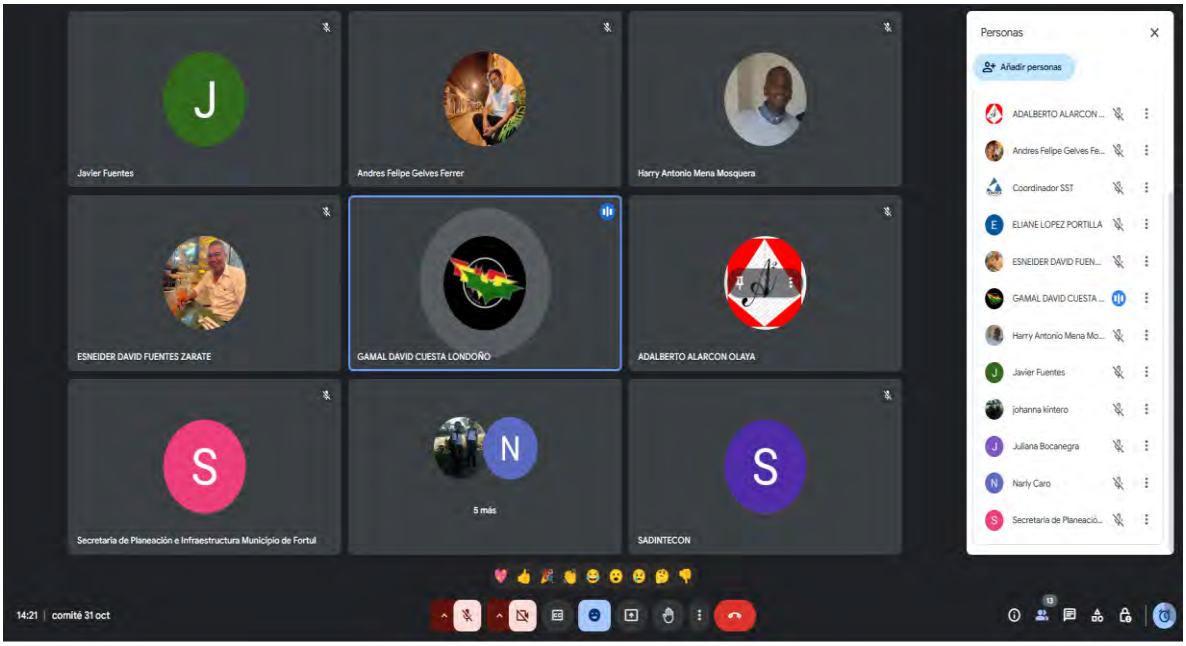



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 25
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Entrega de PAGA definitivo por parte de obra a la Interventoría.

Definir Compensación ambiental definitiva

Inicio de actividad -

Entrega Plan de inversión ambiental

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al avance del proyecto, desde los componentes técnico, ambiental, social y sst.

Revisar el cumplimeinto de los compromisos adquiridos

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra el director de la interventoría saludando a todos los presentes y expresando cada uno los compromisos que se han adquirido, recalcando la importancia del cumplimiento a cada uno de éstos, para que el proyecto avance de manera adecuada. Dicho esto se da la palabra el componente social.

COMPONENTE SOCIAL:

Desde el componente social la interventoría manifiesta que el contratista de obra ha realizado la entrega del informe conrrespondiente al mes de octubre en las fechas establecidas. por otra parte se recuerda el compromiso de establecer un canal de comunicación actualizado con la veeduría por ejemplo el grupo de whatsapp; el contratista expresa que ya se encuentra en el proceso de establecer ese canal de comunicación vía whatsapp. Otra parte importante que menciona la interventoría es sobre lo referente a la compensación ambiental, ya que la comunidad se encuentra inquieta y a la expectativa respecto a esta situación.

COMPONENTE SST:

Desde el componente SST se maniifesta que la relación de personal en campo, se debe actualizar semanalmente debido a que el contratista de obra ha ingresado personal entre semana y es necesario tener actualizado todos los soportes de afiliaciones ya personal del contratista o del personal de actividades subcontratadas. Igualmente se solicita que los vehiculos que vayan a ingresar a la obra de parte del contratista de obra , es necesario que envien la papeleria necesaria de éstos para llevar un control eficiente. Por otra parte se reitera que para el sector de caño flores hay que mejorar la señalización y logística para el inicio de la actividad de capa estabilizada con sales

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoría por medio de su Residente ambiental explica que a la fecha ya se entregó el Paga por parte del contratista de obra y fue radicado ante INVIAS. Respecto al plan de inversión se menciona que aún no se ha entregado. El contratista manifiesta que el plan de inversión está relacionado con lo que se defina con corporinoquia respecto a la compensación ambiental definitiva , debido a que aún no se ha realizado la reunión para establecer este tema.

Dicho esto la interventoría expresa que si bien se esta esperando definir la compensación ambiental definitiva con la corporación, es necesario y urgente avanzar con lo que tenemos contractualmente, de esta manera es importante se entregue el plan de inversión ambiental lo antes posible. Toma la palabra el especialista ambiental de la interventoría y manifiesta que el plan de inversión ambiental debe ser entregado en el formato Invias, y que si en algun momoento se realiza un cambio por resolcuion de la corporación respecto a la compensacion ambiental , pues se realizará una modificacion al plan de inversión ambiental.

COMPONENTE TÉCNICO:

Desde el componente técnico, la interventoría manifiesta que el proyecto actualmente (07/11/2024) presenta un atraso importante superando el 10% , situación que ya se venía advirtiendo desde comités técnicos anteriores. Por otra parte se reitera que a la fecha que aún no se iniciado ni entregado ningún avance en lo que tiene que ver con la actividad (ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGÁNICA), aclarando que hasta el día del presente comité se inició con tramo de prueba de esta actividad.

La administración municipal de fortul manifiesta su preocupación por el atraso que presenta el proyecto y solicita al contratista que establezca y entregue un plan de contingencia para mitigar esta situación (aclarando que ha enviado un oficio con esta solicitud el día 5 de noviembre).
El contratista de obra menciona que ya se encuentra realizando un tramo de prueba referente a la capa estabilizada en el sector caño flores y ya cuenta con los insumos para iniciar la estabilización. Por otra parte manifiesta que ha adelantado la gestión con otra planta de asfalto para mejorar los rendimientos e inicar posteriormente mdc-19 en el sector caño flores. Tambien menciona que le dia (08/11/2024) enviará el plna de contigencia a la administracion municipal e interventoría .

Toma la palabra (Mónica Lorena Montenegro) supervisora del contrato de interventoría del Invias, expresando que es necesario tomar acciones para cumplir con el proyecto en el tiempo establecido, recordando que No se puede extender el plazo contractual.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	PROXIMA SEMANA	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
REUNIÓN PARA DEFINIR COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA	PROXIMA SEMANA	MUNICIPIO DE FORTUL - CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL- COPORINOQUIA
ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA	8/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
PROXIMO COMITÉ	15/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 15/11/2024 (Día / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.


LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)


NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Narly Yardin Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Esteban Pico Méndez	Ingeniero Auxiliar interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Eliane Lopez Portilla	Profesional Social Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Gamal David Cuesta	Ingeniero Ambiental Interventoría	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Esneider D. Fuentes Zárate	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Harry Mena Mosquera	Especialista Ambiental	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Johana Quintero	Inspector sst - Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Monica L. Montenergo	Supervisor - Interventoría	Dirección territorial Casanare - Invías	Asistencia Virtual
Joanna A. Ochica	Gestor técnico del proyecto	Dirección territorial Casanare - Invías	Asistencia Virtual
Jhon Fredy Pachón	Apoyo supervisión - Invias	Dirección territorial Casanare - Invías	Asistencia Virtual
Andrés Felipe Gelves Ferrer	Ing apoyo ambiental - obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Wilfredo Ramirez Ramirez	Ingeniero Ambiental de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



ASISTENCIA VIRTUAL

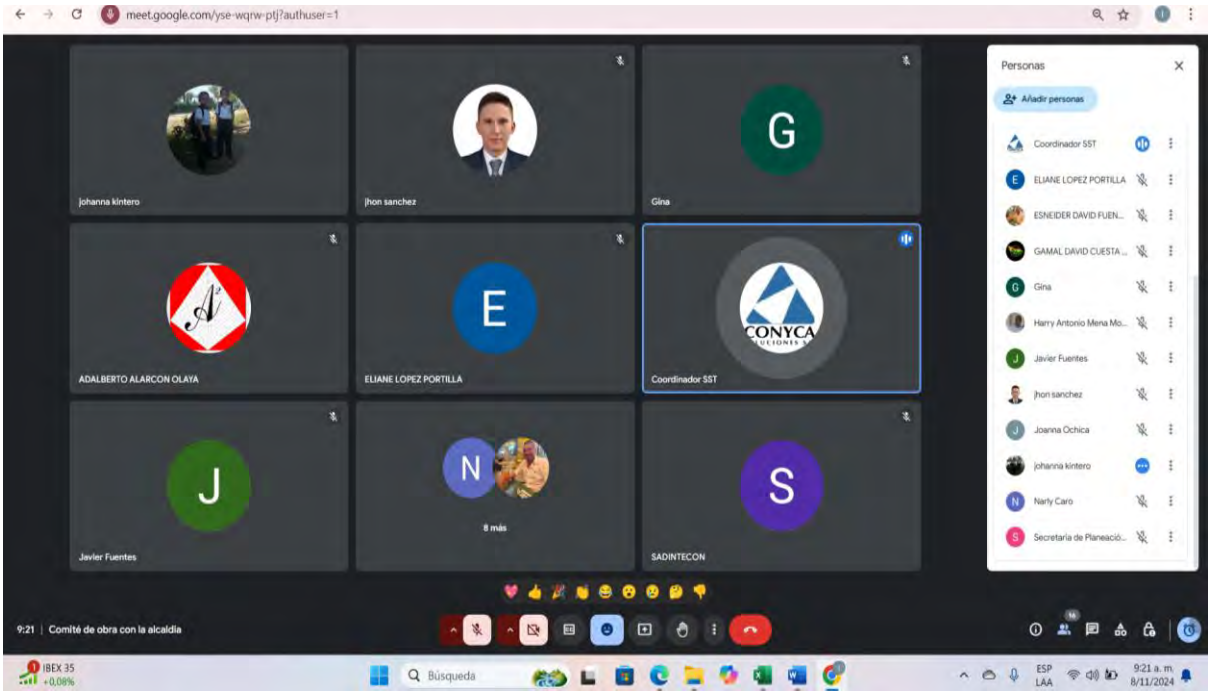

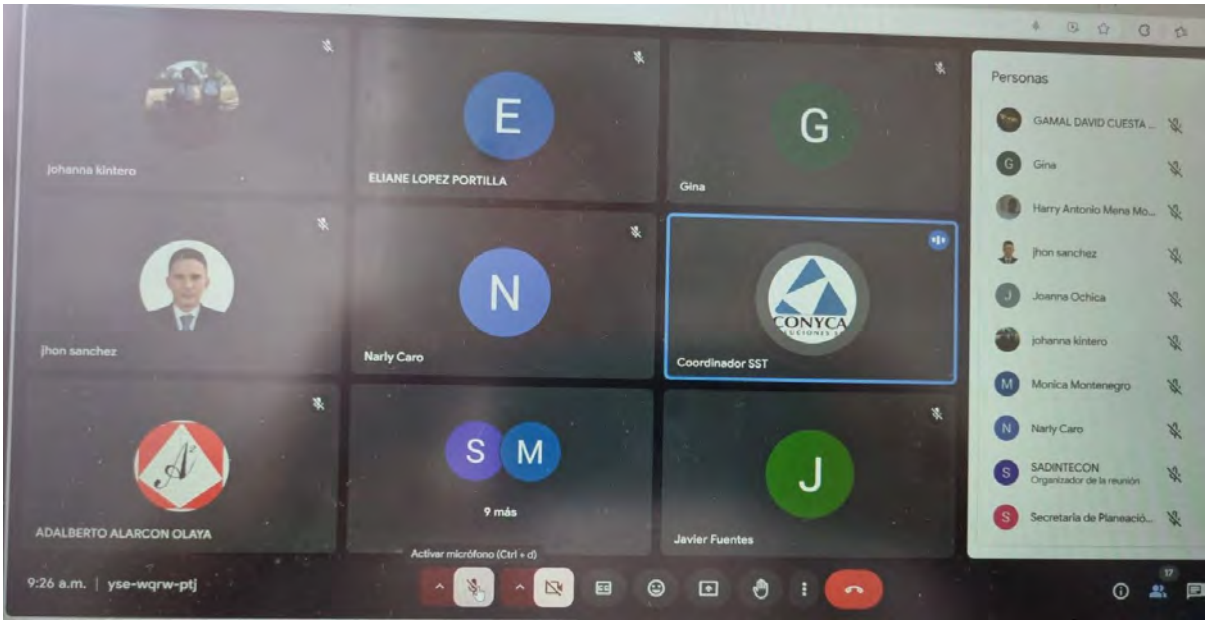

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/11/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 26
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Definir Compensación ambiental definitiva

Inicio de actividad -

Entrega Plan de inversión ambiental

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al avance del proyecto, desde los componentes técnico, ambiental, social y sst.

Revisar el cumplimeinto de los compromisos adquiridos

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra el director de la interventoría saludando a todos los presentes y expresando cada uno los compromisos que se han adquirido, recalcando la importancia del cumplimiento a cada uno de éstos, para que el proyecto avance de manera adecuada. Dicho esto se da la palabra el componente SST.

COMPONENTE SST:

Desde el componente SST se vuelve a mencionar que la relación de personal en campo, se debe actualizar semanalmente debido a que el contratista de obra manifiesta que tiene progrmadado ingresar otra cuadrilla de asfalto, por ende es importante tener actualizado todos los soportes de afiliaciones. Por otra parte la interventoría advierte que es necesario incluir más controladores viales en el sector de palmarito, se establezca un buen manejo y control del tránsito para evitar cualquier accidente. De igual manera se reitera que para el sector de caño flores hay que mejorar la señalización y logística debido a que ya se dió inicio a la actividad de capa estabilizada con sales inorgánicas.

COMPONENTE SOCIAL:

Desde el componente social la interventoría manifiesta que esta semana se ha realizado acompañamiento a una capacitación del personal operativo del proyecto. Por otra parte se realiza la pregunta a la administración municipal sobre la socializacion del adicional de valor del proyecto, ya que hatsa la fecha sólo se le ha socializado a la veeduría ciudadana y es necesario establecer una fecha para responder a la communidadn en general. Desde la administración municipal toma la palabra el secretario de planeación expresando que ha sido designado para realizar dicha labor y solicita que se establezca una fecha en la próxima semana para realizarla. La interventoría manifiesta que se iniciará el proceso de convocatoria e informará la fecha establecida para dar cumplimiento a este pendiente.

COMPONENTE AMBIENTAL:

La interventoría por medio de su Residente ambiental explica que a la fecha No se ha entregado el plan de inversión ambiental, por ende solicita al contratista que lo entregue en la mayor brevedad posible. El contratista manifiesta que el plan de inversión está relacionado con lo que se defina con corporinoquia respecto a la compensación ambiental definitiva , debido a que aún no se ha realizado la reunión para establecer este tema.

Dicho esto la interventoría reitera lo dicho en el comité 25, que es necesario y urgente avanzar con lo que tenemos contractualmente, es decir entregar un plan de inversion No. 01 y en la medida que se actualice según concertación con CORPORONOQUIA, se actuializará el plan de inversión ambiental. Po otra parte la interventoría solicita al contratista que los insumos e información para los informes mensuales sean enviadas a más tardar corte 25 de cada mes, debido a que los tiempos contractuales para los cortes de interventoría fueron notificados por parte del INVIAS.



COMPONENTE TÉCNICO:

Desde el componente técnico, la interventoría manifiesta que el proyecto actualmente (14/11/2024) presenta un atraso finaciero del 21% y Físico del 23%, situación que ya se venía advirtiendo desde comités técnicos anteriores; de igual manera se menciona que ya se ha entregado un plan de contingencia para mitigar esta situación , pero es necesario estar muy atentos y atacar la ruta crítica del proyecto de manera inmediata.

En el sector de caño flores se ha dado inicio a la actividad que incluye instalación de geotextil, extendido y compactado de capa establizada con sales inorgánicas. La interventoría expresa que sólo se ha realizado 250 metros lineales por el carril derecho, situación que es preocupante ya que se presentan rendimientos muy bajos.

El contratista de obra menciona que los rendimientos se están viendo afectados por la lluvía presentada durante la semana, de igual manera menciona que está en acción el plan de contigencia para atacar los dos sectores del proyecto de la mejor manera, incluyendo otra cuadrilla de asfalto en el sector palmarito e incrementando la logística para el sector de caño flores.

Toma la palabra el secretario de planeación del municipio de fortul para indicar que es necesario que se de el cumplimiento al plan de contingencia presentado por el contratista de obra, de lo contrario se generarían inconvenientes en el desarrollo del proyecto.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENTREGA DE SOPORTES DE AFILIACÓN DE PERSONAL DE CUADRILLA DE ASFALTO	PROXIMA SEMANA	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
ESTABLECER UNA FECHA PARA SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO ADICIONAL DE VALOR 001	PROXIMA SEMANA	MUNICIPIO DE FORTUL - CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL- COPORINOQUIA
ENTREGA DE PLAN DE INVERSION AMBIENTAL No. 01	22/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA	8/11/2024 - 14/12/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL
PROXIMO COMITÉ	22/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 22/11/2024 (Dia / Mes / Año)


NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.


LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)


NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Narly Yardin Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Rubén Alonso Borrero Campos	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Esteban Pico Méndez	Ingeniero Auxiliar interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Eliane Lopez Portilla	Profesional Social Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Gamal David Cuesta	Ingeniero Ambiental Interventoría	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Esneider D. Fuentes Zárate	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Harry Mena Mosquera	Especialista Ambiental	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Johana Quintero	Inspector sst - Interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	Asistencia Virtual
Andrés Felipe Gelves Ferrer	Ing apoyo ambiental - obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Wilfredo Ramirez Ramirez	Ingeniero Ambiental de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	Asistencia Virtual
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



ASISTENCIA VIRTUAL

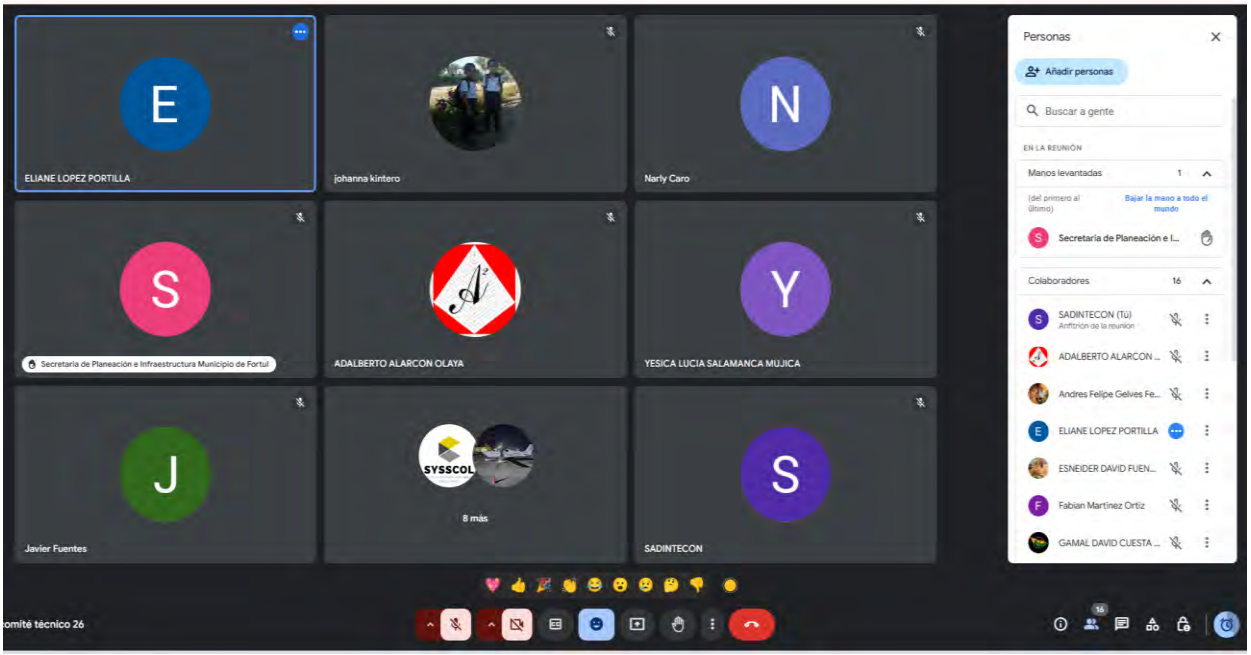

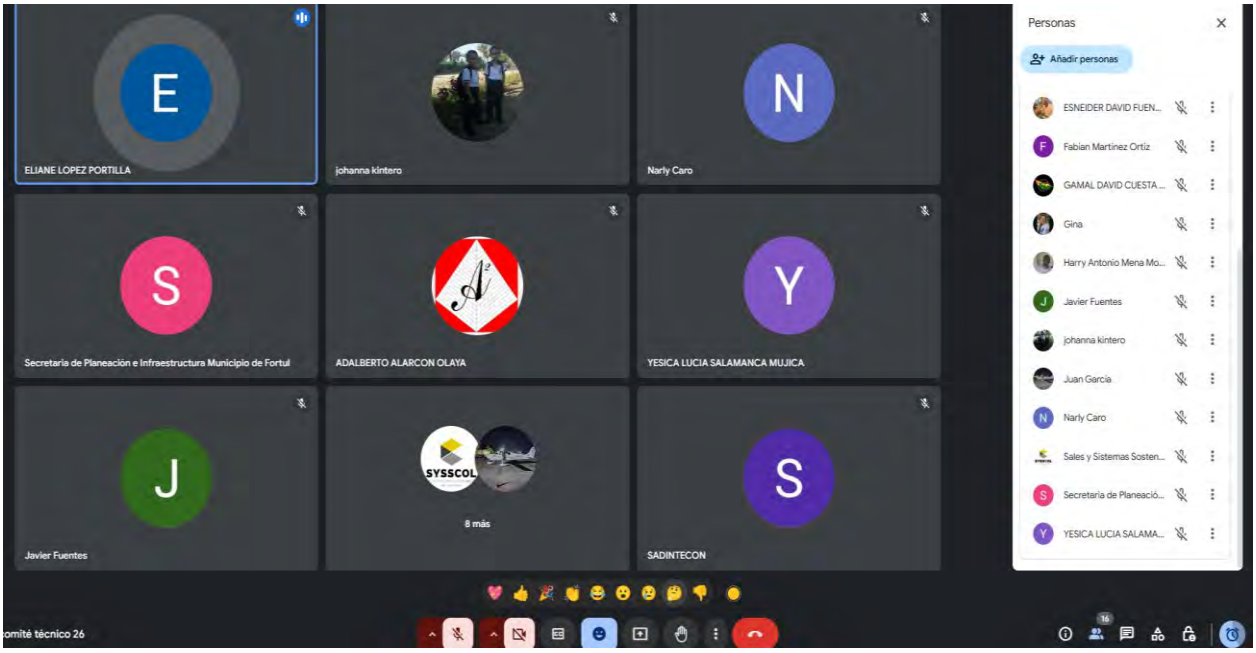

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 27
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

Seguimiento al avance del proyecto y debatir la posibilidad de un adicional de tiempo.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Inicialmente toma la palabra el ingenerio Jhon Fredy Pachón (apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No. 4763-2023) saludando a todos los presentes e indicando que el presente comité se realiza con el fin de evaluar el avance del proyecto y debatir las posibles alternativas que puedan existir poder garantizar la continuidad del proyecto, lo enterior teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales con las que se cuenta en el contrato de interventoría y además la limitación en tiempo con la que cuenta el proyecto, el cual al igual que la interventoría cuenta con fecha de terminación contractual del 14/12/2024.

Toma la palabra la ingeniera Monica Lorena Montenegro supervisora del contrato de interventoría, expresando lo que ya en reiteradas ocasiones se ha expresado por parte de INVIAS Territorial de Casanare, concerniente a que por temas de vigencia presupuestal de los recursos del contrato de interventoría 4763-2023, actualmente no es posible prorrogar el contrato a la vigencia 2025, ya que los mismos son vigencia 2023 lo que quiere decir que automaticamente fenecen una vez culminada la presente vigencia, es decir el 31/12/2024, lo que a su vez ocasiona que el contratato de interventoría no tenga recursos para la anualidad 2025.

Ante este panorama, la ingeniera Monica Montenegro, solicita a la interventoría y al contratista de obra, información sobre el porque del atraso en el contrato, el cual es aproximadamente del 20%, y adicionalmente, pregunta sobre el tiempo estimado que se prevé para terminar el 100% de las actividades de obra, conforme con el avance actual del contrato y los rendimientos actuales del contratista de obra.

El contratista de obra y la interventoría informan que a la fecha se han presentado atrasos en la ejecución del proyecto debido a situaciones específicas que han dificultado el cumplimiento del cronograma establecido. Entre estas, destacan las lluvias que han afectado significativamente las actividades en el sector de Caño Flores y, además, la limitada disponibilidad de asfalto (MDC-19) durante varios días de octubre y noviembre, lo que ha impactado el rendimiento en el sector de Palmarito. Como respuesta a estos inconvenientes, el contratista de obra ha radicado un plan de contingencia para mitigar los efectos de los atrasos, junto con una solicitud de prórroga de 15 días para culminar las actividades programadas dentro del presente año. Sin embargo, también se anticipa la posibilidad de requerir tiempo adicional más allá del 31 de diciembre, lo que llevaría la ejecución del contrato de obra a extenderse a la vigencia 2025.

La ingeniera Joanna Ochica, gestora del proyecto, manifestó que, debido a restricciones presupuestales, resulta muy complicado para el INVIAS aprobar una prórroga del contrato de interventoría que abarque la vigencia 2025. Por ello, propuso como posible solución que el municipio de Fortul asuma los costos asociados a la interventoría durante dicho periodo. En este contexto, planteó a los representantes de la Secretaría de Planeación la consulta sobre la viabilidad de que el municipio disponga de los recursos necesarios para cubrir estos gastos.

Adicionalmente, informó a la interventoría que, de acuerdo con el manual de Interventoría vigente, para el trámite del acta final de costos es necesario presentar el acta de recibo de la interventoría y el informe final de seguimiento del contrato de obra. Por esta razón, el pago correspondiente al acta del mes de diciembre no podría efectuarse en la presente vigencia. Asimismo, aclaró que, en caso de aprobarse una eventual prórroga del contrato de interventoría hasta el 31 de diciembre de 2024, este trámite no alcanzaría a realizarse en la actual anualidad, lo que implicaría que para el cobro de dicha acta se deban explorar otras instancias administrativas.

El secretario de Planeación del municipio de Fortul manifestó su disposición para gestionar la posibilidad de asumir los costos de la interventoría durante la vigencia 2025. No obstante, aclaró que, debido a las restricciones de los procesos presupuestales, esta opción es compleja y su viabilidad es limitada. Aun así, se comprometió a explorar la alternativa, aunque sin garantizar resultados concretos.

Dicho esto, las partes presentes en el comité acordaron que el contratista de obra y la interventoría elaborarán una proyección detallada del tiempo requerido para la finalización total del contrato de obra. Este análisis deberá plasmarse en un documento de solicitud dirigido al municipio, que incluya además una proyección del plan de cargas de la interventoría correspondiente al tiempo adicional solicitado. El propósito de este documento es permitir que el municipio de Fortul, Arauca, evalúe la viabilidad de asumir los costos relacionados con el seguimiento de la interventoría durante el tiempo que se extienda la ejecución del contrato de obra.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
AVAL DE PRÓRROGA A DIC. SOL CTA DE OBRA	22/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON.
PROYECCIÓN DE ADICIONAL DE PLAZO N.o 02	22/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON.
PROYECCIÓN DE PLAN DE CARGAS INTERVENTORÍA PARA EL ADICIONAL DE PLAZO No. 02 ACORDE A REPROGRAMACION CTA DE OBRA	25/11/2024	CONSORCIO SADINTECON.
PROXIMO COMITÉ	29/11/2024	CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, CONSORCIO SADINTECON , SECRETARIA DE PLANEACIÓN FORTUL

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES: (Anexo Lista Asistencia Física y Virtual)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Wilmer Riatiga Ocampo	Secretario de Planeación e Infraestructura	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Virtual
Narly Yardin Caro Sambrano	Apoyo supervisión cto de obra	Secretario de Planeación Municipio de Fortul	Asistencia Física-Virtual
Javier E. Fuentes capacho	Director de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Esneider D. Fuentes Zárate	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio SADINTECON	
Monica L. Montenergo	Supervisor - Interventoría	Dirección territorial Casanare - Invías	Asistencia Física-Virtual
Joanna A. Ochica	Gestor técnico del proyecto	Dirección territorial Casanare - Invías	Asistencia Virtual
Jhon Fredy Pachón	Apoyo supervisión - Invias	Dirección territorial Casanare - Invías	Asistencia Física-Virtual
Javier O. Sanabria Jimenez	Residente de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	
Adalberto Alarcón Olaya	Ingeniero Director de Obra	Contratista Consorcio vial rural Fortul	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



Asistencia Virtual - presencial



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 28
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Casanare

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

VERIFICACIÓN COMPROMISOS TÉCNICOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

EXPOSICIÓN INCONVENIENTES ARGUMENTOS DE ATRASO, EVALUACIÓN ATRASO, SOLICITUD REPROGRAMACIÓN, APROBACIÓN DE PRORROGA, Reiteración desgloce de AIU

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Dea acuerdo al avance registrado en el Informe Semanal No 40, la Interventoría manifiesta que es necesario dar una Prorroga en tiempo, durante los días complementarios del mes de Diciembre del año en curso, en **total 17 días** hasta el 31 de Diciembre-2024, ya q se reflejó un atraso financiero del 26% y físico 29%. El Contratista reitera lo registrado de manera oficial, de los inconvenientes de suministro de asfalto, además de la trazabilidad de los diferentes temas, a lo largo del desarrollo del proyecto. De esta forma es necesario presentar por escrito el aval a la solicitud de próorroga por parte del contratista de obra, que a su vez presentará la reprogramación con el aval de la Interventoría. Tambien será oficializado por el ente contratante Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de fortul,la solicitud de acompañamiento de las actividades en obra al INVIAS. Se reitera que el AIU oficiasl el es registrado de manera oficial CSVF-1135-2024, cuyo desglce se adjunta a este comite.

14- 21 de Noviembre de 2024

	OBRA	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 27.796.510.491	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 25.829.588.017	92,15%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.371.299.108	65,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.458.288.910)	-26,6%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 233.258.153,80	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.829.588.017	92,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.371.299.108	65,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (7.458.288.910)	-26,61%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 1.883.309.745	6,72%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 401.456.144	1,43%

Meta Física Programada %	88%	Avance o Atraso Físico %	26%
Meta Física Ejecutada %	62%		

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
ENVIO OFICIAL AVAL DE PRORROGA		INTERVENTORÍA
REPROGRAMACIÓN		CTA OBRA-INTERVENTORIA
SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO INTERVENTORIA		SECT. PLANEACIÓN E INFRAEST.
SOLICITUD PRORRO. INTERV.AL INVIAS		INTERVENTORÍA

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 3/12/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
	ASISTENCIA PRESENCIAL		

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT – 800136069-4

GESTION DE LA INFORMACION - ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONTROL DE ASISTENCIA

Código: F-GIN-AC-M01-01
Versión:01
Página 1-1
Fecha: 31/12/2018

FECHA: 26-11-2024 LUGAR: Sec. Planeación Infraest. Fortul PROGRAMA:
TEMA: ADICIONAL EN TIEMPO (PRORROGA) DEPENDENCIA: SEC. PLANEACION E INFRAEST.

ITEM	NOMBRE COMPLETO	TIPO DOC	DOCUMENTO IDENTIDAD	EDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL: GENERO M	GENERO F	Afro	Indigena	DISCAPACIDAD: SI, Y REGISTRADO	DISCAPACIDAD: SI, Y NO REGISTRADO	DISCAPACIDAD: NO	VICTIMA: DESPLAZAMIENTO FORZADO	VICTIMA: HOMICIDIO	VICTIMA: DESAPARICION FORZADA	VICTIMA: OTRO	INSTITUCION / ENTIDAD	CARGO	CORREO	DIRECCION	No. CELULAR	FIRMA
1	Javier E. Fuentes C.	CC	13.721.542	(45)	X						X					CONSORCIO SAGINTGCON	DIRECTOR INTERV	jfuentesingesp@gmail.com.	-	3184019410	
2	Nayly Yurdin Carol	CC	1094273710	30		X					X					Alcaldía Fortul	APOYO SEC. Planeac	Planeacion@fortul-arauca.gov.co	—	3223025855	Nayly Carol
3	ADALBERTO ARTUNDUAGA	CC	7186[illegible]	X												CONSORCIO VIAL RURAL	DIRECTOR	INGADARCHITECTURA@HOTMAIL.COM	—	3108[illegible]	
4	Gina Nieves T.	CC	1116716883			X					X					CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL	Profesional Social	ginanieves1026@gmail	—	3133[illegible]69	Gina Nieves
5	Willmer Rodrigo Ocampo	CC	1094[illegible]	31	X						X					Alcaldía	SEC. Planeación	Planeacion@fortul-arauca.gov.co	—	—	
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					

RESPONSABLE: _____

ANEXO O

MEPI-MN-IN-14-FR-2

Actas de reunión

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1.

FECHA: 18/NOV/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

Caño Flores

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Fortalecer las competencias de comunicación, escucha activo y resolución de conflictos, para fomentar relaciones laborales basadas en el entendimiento mutuo y la colaboración

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Habilidades de comunicación y diálogo.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

FECHA: 18-Nov-2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la actividad a las 6:40am.

Un integrante del grupo dirige una oración y seguido el grupo hace ejercicios de estiramiento muscular.

A traves de una actividad grupal se reflexiona sobre la importancia de comunicarnos de manera adecuada, así tambien sobre como nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en los demás.

Seguido se abre un espacio donde cada participante comparte una experiencia con la comunicación y el dialogo.

Por ultimo se concluye que la comunicación es una dinamica en la que los participantes tienen un papel crucial y que en ese intercambio constante de ideas y emociones donde se construye el entendimiento mutuo.

Scanned with CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIÓNES DEL COMPONENTE SOCIAL

CONSORCIO VIAL RURAL PORTUL

Sector: Caño Flores | **Fecha:** 18-NOV-2024

Tema: Habilidades de comunicación y diálogo

Objetivo: Fortalecer las competencias de comunicación, escucha activa y resolución de conflictos, para fomentar relaciones laborales basadas en el entendimiento mutuo y la colaboración.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTUD	DIRECCIÓN	GENERO					IDENTIFICACIÓN ETNICA					ENFOQUE DIFERENCIAL			
				F	M	NO- BINARIO	OTRO	Cual	AFRO	GITANO	RAIZAL	RROM-GITANO	PALENQUERO	LGBTIQ+	DISCAPACIDAD	VICTIMA CONFLICTO	MIGRANTE
1	Hayby daniela ortega cuesan	1119181598	caño flores	X													
2	Rodrigo duran .	1098752215	caño flores		X										X		
3	Jessica paola acevedo caños	1007397127	caño Flores	X													
4	Iuan Dario Sierra Jimenez.	1116-801-241.	Caño Florez.		X												
5	Fatder Bermejo Bermejo	7007767547	cano Flores		X												
6	Yeremy Ungo Mayorga.	1116872560.	Cuño Flores.		X												
7	Ramiro Villalba	3225735	caño florez		X												
8	Dadey Cubides	1757061	caño Flores		X												
9	Jesus caballero	96187716	caño Flore		X												
10	LAURA ACEVEDO A	1116782644	CAÑO FLORES	X													
11	Luis carlos silva	1116802391	caño florez		X												
12	Dunar villarraga. A.	1119182031	caño Flores		X												
13	Yefferson Duque	1102972082	Caño Florez		X												
14	Jorge Miguel Angarita	88217888	CAÑO Flore7		X												
15	VILMO NUBIO G.	19147744	CAÑO FLORES		X												
16																	
17																	
18																	
19																	

Scanned with CamScanner

Evidencia fotográfica de capacitación al personal Caño Flores.









	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MM1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1.

FECHA: 12-NOV-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SABINTECON

OBJETIVOS DE LA REUNION

Fortalecer las competencias de comunicación, escucha activa y resolución de conflictos, para fomentar relaciones laborales basadas en el entendimiento mutuo y la colaboración.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

Habilidades de comunicación y diálogo.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

FECHA 12-NOV-2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la actividad a las 7:00 am

Un integrante lidera una oración.

El grupo hace ejercicios de estiramiento muscular.

A través de una actividad grupal se reflexiona sobre la importancia de comunicarnos de manera adecuada, así también sobre como nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en los demás

Seguido se abre un espacio donde cada participante comparte una experiencia con la comunicación y el diálogo.

Por último se concluye que la comunicación es una dinamica en la que los participantes tienen un papel crucial y que en ese intercambio constante de ideas y emociones donde se construye el entendimiento mutuo.

Scanned with CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIÓNES DEL COMPONENTE SOCIAL

Sector: Palmarito | **Fecha:** 12-Nov-2024

Tema: Habilidades de comunicación y diálogo

Objetivo: Fortalecer las competencias de comunicación, escucha activa y resolución de conflictos, para fomentar relaciones laborales basadas en el entendimiento mutuo y la colaboración

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTUD	DIRECCIÓN	GENERO					IDENTIFICACIÓN ETNICA					ENFOQUE DIFERENCIAL			
				F	M	NO-BINARIO	OTRO	Cual	AFRO	GITANO	RAIZAL	ROOM-GITANO	PALENQUERO	LGBTIQ+	DISCAPACIDAD	VICTIMA CONFLICTO	MIGRANTE
1	Carlos Andres Jaramillo	1116033303	Fortul		X												
2	Leydi Vanessa Rodriguez S	60264418	Fortul		X											X	
3	Fernando Torres	17591201	Fortul		X												
4	Jhon Jairo Brito Nieves	1006629382	Palmarito		X												
5	José Rafa Sanchez	92189043	Fortul		X												
6	[illegible]	17395677	[illegible]		X												
7	[illegible]	1116332560															
8	Maryuri Rozo	1115722689	Los jardines	X													
9	Yaribol Galvez	1175 7083	V Palmarito		X												
10	Jimmi Maris	1006455316	Fortul		X												
11	Ramiro Soto	1335 0702			X												
12	Jorge Helicarballo		Palmarito.		X												
13	Wilson Rodriguez	96192995	Palmarito		X												
14	Robinson Rodriguez	96194221	Palmarito		X												
15	Nicol Zuñiga	1007100760	Palmarito	X													
16	Elicer Pabon	17570702	Palmito		X												
17	Juan David Rojas	1119180 2024	Palmarito		X												
18	Fredy Caicedo	21157389632	Palmarito		X												
19	Jose Feliz Carrero	6061492.	Palmarito		X												
20	Luis Alejandro Gom	96195901	Palmarito		X												

Evidencia fotográfica de capacitación al personal Palmarito.









	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 27/NOV/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 20
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

Palmarito.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar socialización del adicional de valor.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Adicional de valor.

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	2

FECHA: 27 / NOV / 2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión a las 3:59pm en el salón comunal de la Vereda Palmarito.

Toma la palabra el ingeniero Wilmer Restigo, secretario de planeación e infraestructura quien expone que la administración municipal tiene como prioridad el trabajo comunitario y que a este proyecto se le ha hecho especial vigilancia.

Toma la palabra el ingeniero director de obra quien inicia la presentacion con información general del contrato de obra y del contrato de interventoría.

Indica que el alcance inicial en el tramo Palmarito, es la construcción de pavimento flexible iniciando en el K0+000 al K7+400, así mismo se incluyen 12 alcantarillas de 36" y un box coolvert, además se contempla la instalación de señalización vertical y horizontal.

En cuanto al adicional de valor en el sector de Palmarito se concreta continuar también con la estructura de diseño contemplado para el tramo inicial, dando un alcance de 7.400mt de vía.

El ingeniero indica que mediante la adición de valor las actividades a realizar son: Excavación y rellenos, pavimento, señalización, obras de drenaje, obras de compensación ambiental y/o complementarios.

Con esto se da por finalizada la reunión.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3
		FECHA	27/NOV/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Esteban Pico Mendez	Ing. d. Interventoría	Consorcio Sadintrav	
Willmer Rioja Campo	sec planeación	Alcaldía/Fortul	
Narly Caro Sambrano	Apoyo Sec. Planeación	Alcaldía Fortul	Narly Caro S.
Jersa Martinez O	Apoyo Planeac.	Alcaldía Fortul	
Omaira Vega A	Vereda	J.A.C	Omaira V
Abdal Cabrices	coasiliador	JAC	
LUZDARY Verdad	asociado	JAC	luzdary
JHon Dimerson	Vereda	JAC	JHon Escobar
HECTOR MEJIA	AFILIADO	JAC	HECTOR MEJIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

FECHA 27/NOV/2024 (Día / Mes / Año)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Eunice Castañeda	Afiliada	JAC	Eunice C.
Henry Herrera	Vc. Presidente Ral	JAC	Henry Herrera
Gloria Rosalba C.E.	Presidenta	J.A.C.	Gloria Rosalba C.E.
Luis A Carrillo	Afiliado	JAC	Luis A Carrillo
Ignacio Acarón	Director Obra	C. Vial Rural F.	
Leyla Vanessa Roldán	Secretaria	C. Vial Rural F	
Gina Nieves T	Profesional Social consorcio vial Rural Fase II	Consorcio vial R.F	Gina Nieves
Javier E. Fuentes C.	Director Interventoría	CON. SAOINTECON	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 28 / NOV / 2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 21
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 016 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4763 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

Caño Flores

OBJETIVOS DE LA REUNION

Realizar Socialización del adicional de valor.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Adicional de valor.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

FECHA: 28/Nov/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunion a las 9:33am en el salón comunal de la vereda Caño Flores.

Toma la palabra la ingeniero Nairly Caro, repiesentante de la administración municipal, quien menciona que la alcaldía municipal está vigilando constantemente este contrato y que hoy hacen presencia con la intención de exponer el adicional de valor.

Toma la palabra el ingeniero director de obra quien inicia la presentación con información general del contrato. de obra e interventoría.

El ingeniero menciona que el alcance inicial del proyecto en este sector es de una intervención en pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías en una longitud de 2.86Km, iniciando en el K0+000 al K2+860 utilizando la familia de estabilizantes T4 - Sales inorganicos. Además del mejoramiento de la via se contempla la construcción de 11 estructuras de drenaje; según modificatorio de cantidades en este Sector se incluyó el desplazamiento de la red eléctrica que hacía interferencia con los parámetros de diseño geométricos de la vía, así mismo la construcción de una placa en concreto reforzado para garantizar la protección de la tubería y evitar cambios en la geometría de la vía.

Segun adicional de valor en el Sector de caño Flores se contempla la adición de 930 mt y la construcción de 4 alcantarillas; a continuación describe las actividades a ejecutar mediante la adicion de valor: Excavación y rellenos, estructura de pavimento, señalización, obras de drenaje, obras de compensación ambiental y actualización a caracterización vial del corredor. Con esto se da por finalizado la reunión.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

FECHA: 28/NOV/2024 (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Esteban Pico Mendez	Ing. I. interventoría	CONSORCIO SADINTECON	
Javier E. Fuentes C.	Director Interevent.	Con. SADINTECON	
Narly Caro Sambrano	Apoyo Sec Planeación	Alcaldía Fortul	Narly Caro
Jesus Martinez	Apoyo Planeación	Alcaldía Fortul	
Leonor Caicedo M.	directivo	San. Francisco	Leonor Caicedo
Alfredo Torres	Veedor.	San Fransisco	
Diomedes Galindo	Directivo.	San Francisco	Diomedes.
José Abel Torres	Presidente trabajo	San Francisco	J.A.T.
Maria Luisa Rios	veedora	Cuño Flores	J A C

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

FECHA 28/NOV/2024 (Día / Mes / Año)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Javier Ortiz	Veedor	J.AC.	
Dumerlis pinto	Veedora		
Freddy Cubides	Comunidad	JAC	FREDDY
Yamer acevedo	comonidad	J.A.C	Yamer
Jein. Yohana Ortiz	Inspector SST. Interventoria	Consorcio Sadinteccon	
LAURA ACEVEDO	SST	Consorcio vial emg	LAURA ACEVEDO
Leydi Vizcaya Ruiz	Secretaria	Consorcio vial Cund	
Yeider Aguirre	Inspector de Interventoria	Consorcio Sandinteccon	
Fayder Toltan	Conductor	Acompañante	
Fernel Cruzado S	Operador	Acompañante	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MIN1-SI-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 20-NOV-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 018 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4769 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO SADINTECON

OBJETIVOS DE LA REUNION

Fortalecer las competencias de los participantes en la identificación prevención y atención de situaciones de violencia y acoso basados en el género.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

- Capacitación y sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencia y acoso basados en el género.

Scanned with CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

FECHA: 20 - NOV - 2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La actividad inicia a las 8:30 am

Se hace una breve introducción al tema a desarrollar y se presenta al grupo.

En mesa redonda se desarrolla un conversatorio sobre lo que es la violencia de genero y los diferentes tipos de violencia, así mismo como estas situaciones afectan directamente a los hijos.

Cada participante tiene un espacio para dar opiniones y compartir sus experiencias sobre el tema.

A traves de un violentometro el grupo identifico palabras aceptables, de alerta y violentas.

Se reflexiona alrededor de tema y se finaliza la actividad.

Scanned with CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIÓNES DEL COMPONENTE SOCIAL

Sector: Palmarito | **Fecha:** 20-Nov-2024

Tema: Capacitación y sensibilización para la prevención y atención a todo tipo de violencia basada en el género

Objetivo:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN	GENERO					IDENTIFICACIÓN ETNICA					ENFOQUE DIFERENCIAL			
				F	M	NO-BINARIO	OTRO	Cual	AFRO	GITANO	RAIZAL	ROOM-GITANO	PALENQUERO	LGBTIQ+	DISCAPACIDAD	VICTIMA CONFLICTO	MIGRANTE
1	Maritza Tavarona Vega	60265976	Palmarito	X													
2	Leidy Adriana Tegsa	1007488478	Palmarito														
3	GEIDY MORENO	1116801123	palmarito	X													
4	olga cristina marin	63377253	Palmarito	X													
5	Graciela Jimenez S.	30187138	palmarito														
6	Cecilia Reyes cubides	60447383	palmarito	X													
7	Elsol Jaime Valdiri	3+5436-	palmarito	X													
8	Jose Salazar Gomez	46185060	Pto madrid		X												
9	Jesús Tarazona	1049395088	Palmarito		X												
10	claudia Garcia.	1049393952	palmarito	X													
11	Luz Heneida Guerrero Tarazona.	1115728563	Palmarito	X													
12	Brenda Villamizar Z.	30187139	Palmarito	X													
13	Diana Carrero Rojas	1005326498	Palmarito	X													
14	Zaida Rubela Ayala Santander	1116872421	palmarito	X													
15	Dennys Nebith Espejo Marquez	5014005	palmarito														
16	MARIN ANDREA CUEVAS RIOS	1116872190	Palmarito	X													
17	Adalis Quintana Gutierrez	37686446	Palmarito	X													
18	Beatriz elena Santos Cruz	1006595169	Barrancabermeja														
19	Nailli Yaritza Bermudez M.	1119868878	Palmarito	X													
	Erika Nieves.	1007641742	Portul	X													

ASISTENCIA A CAPACITACIÓNES DEL COMPONENTE SOCIAL

Sector: Palmarito | **Fecha:** 20-NOV-2024

Tema: Capacitación y sensibilización para la prevención y atención a todo tipo de violencia

Objetivo:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTUD	DIRECCIÓN	GENERO					IDENTIFICACIÓN ETNICA					ENFOQUE DIFERENCIAL			
				F	M	ND- BINARIO	OTRO	Cual	AFRO	GITANO	RAIZAL	RROM-GITANO	PALENQUERO	LGBTIQ+	DISCAPACIDAD	VICTIMA CONFLICTO	MIGRANTE
1	Dina Luz Roa	33516398	Palmarito	X													
2	Lida Galtan Forero	46376273	Directora Fortul	X													
3	Angie Paola Rojas																
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	

Scanned with CamScanner

ANEXO R

Informe matriz de riesgos

MATRIZ DE RIESGOS

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿ A quién se le asigna?	miento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		Seguimineto
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Prolongación del tiempo planeado por la entidad para el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las Empresas de Servicios Públicos y Secretaria de planeación Municipal involucradas en el proyecto	♦ Retraso en la iniciación del contrato de obra ♦ Afectación al cronograma de ejecución del contrato	4	4	8	Extremo	Proponente o contratista	♦ Contratista: Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y Entidades. ♦ FDLUSA como apoyo, realizar una adecuada y oportuna gestión interinstitucional.	2	3	5	Si	Supervisor / Contratista e Interventor	Acta de inicio y Acta de terminación	♦ Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos.	Cuando se requiera el trámite.	No se ha materializado el riesgo
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Aumento de cantidades de obra o especificaciones técnicas del producto, de variaciones en el alcance de las intervenciones	♦ Disminución del alcance del contrato.	2	1	3	Bajo	Municipio de Fortul	♦ Modificar elcontrato en su valor y en los anexos técnicos. ♦ Control del presupuesto. ♦ Control delalcance del proyecto.	1	1	2	Si	Coordinador / Supervisor	Acta de inicio y Acta de terminación	♦ Control delpresupuesto ♦ Control decantidades de obra	Quincenal	No se ha materializado el riesgo
3	General	Externo	Ejecución	Climático	Condiciones climáticas o ambientales que se encuentren por fuera del registro esperado según el comportamiento histórico.	♦ Posibles retrasos en la ejecución, daños a Obras ya ejecutadas.	1	4	5	Medio	Proponente o contratista	♦ Análisis y planeación de clima y factores meteorológicos en comités de obra. ♦ Determinaciónde acciones de mitigación para trabajar en condiciones climatológicas adversas. ♦ Presentaciónde plan de contingencia por parte del contratista	1	1	2	Si	Entidad Estatal /Contratista	1. Etapa de formulación 2. Fecha actade inicio 1. Fecha de recibo final 2. Fecha de Liquidación	Seguimiento y visita de campo de las acciones de mitigación implementadas	Semanal	No se ha materializado el riesgo
4	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Contagio de un trabajador por COVID 19	♦ Demoras en el desarrollo de las actividades de obra.	4	4	8	Extremo	Proponente o contratista	♦ Control de los trabajadores con los protocolos establecidos	3	2	4	Alto	Contratista	Acta de inicio y Acta e terminación	Seguimiento diario y atendiendo todas las recomendaciones propias del covid 19 (PAPSO).	Semanal	No se ha materializado el riesgo
5	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Demora por parte del contratista en la radicación oportuna de las facturas a la entidad, (correctamente diligenciadas, firmadas, con informe mensual aprobado y soportes respectivos) y/o cuentas de los gastos reembolsables.	♦ Retrasos en los tiempos de pago debidos a subsanes para el trámite interno del pago de las cuentas de cobro.	4	2	6	Alto	Proponente o contratista	♦ Establecer fechas de corte de obra cada mes y presentación de factura máximo al día 10 de cada mes.	1	1	2	Bajo	Entidad Estatal / Contratista	1. Etapa de Diagnostico 2. Fecha actade inicio 1. Fecha de recibo final 2 .Fecha de Liquidación	1.- El 6 de cada mes verificar que la factura junto con el corte de obra esté radicado en la Alcaldía Local.	Mensual	Se materializó el riesgo, no se han radicado facturas a la fecha ante la Entidad

ANEXO U

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

Equipo y vehículos contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4763 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

CONTRATO DE OBRA No. 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CAMIONETA	Placa GEN540 Marca NISSAN Linea NP300 FRONTIER Modelo 2020	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
CAMIONETA	Placa FUP887 Marca RENAULT Linea DUSTER Modelo 2020	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta Pulsar 180CC WTE67D 2016	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	Motocicleta Benelli TRK 500cc UGB78F 2022	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	PULSAR NS200 PLACA WRF74F 2024	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
Motocicleta	PULSAR 180 PLACA WTN98C 2013	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
ESTACIÓN TOTAL	Marca GOWIN REFERENCIA TKS202" serie. 8A8171	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: Gustavo Adolfo Becerra Gil
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Firma Monica Montenegro Q.
Nombre: Mónica Lorena Montenegro Quintero
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-276583 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO V

MEPI-MN1-IN-15-FR-7

Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	Noviembre de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 476 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE OBRA No.: 016 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** CONFAMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO		Director de Interventoría	$ 7,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 7,400,000	$ 515,100	V			$ 296,000		0	$ 1,184,000	$ 296,000			INGRESO
2	FUENTES ZARATE ESNEIDER DAVID	79,788,050	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 5,400,000	$ 375,900	V	EPS SANITAS	73168113	$ 216,000	COLFONDOS	73168113	$ 864,000	$ 216,000			
3	BORRERO CAMPOS RUBEN ALONSO	1370287?	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,400,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 5,400,000	$ 375,900	V	NUEVA EPS	73168113	$ 216,000	COLPENSIONES	73168113	$ 864,000	$ 216,000			
4	PICO MENDEZ ESTEBAN	1,095,820,682	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,150,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 3,150,000	$ 219,300	V	NUEVA EPS	73168113	$ 126,000	PORVENIR	73168113	$ 504,000	$ 126,000			
5	PALAU ISABEL CRISTINA		Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,150,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	GRUPO INTECON SAS	$ 3,150,000	$ 219,300	V			$ 126,000		0	$ 504,000	$ 126,000			INGRESO
6	LOPEZ PORTILLA ELIANE LIZETH	1,098,632,763	Profesional Social	$ 2,050,000				X	X	X	X	X						X	X	X	X	X						X	X	X	X	X			50	GRUPO INTECON SAS	$ 2,050,000	$ 142,700	V	SURA	73158561	$ 82,000	COLPENSIONES	73158561	$ 328,000	$ 82,000			
7	CUESTA LONDOÑO GAMAL DAVID	8,026,052	Profesional Ambiental	$ 4,100,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	GRUPO INTECON SAS	$ 4,100,000	$ 285,400	V	SURA	73158561	$ 164,000	COLFONDOS	73158561	$ 656,000	$ 164,000			
8	ORTIZ QUINTERO JEINI YOHANA	1,116,854,387	Inspector SST	$ 2,450,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 2,450,000	$ 170,600	V	NUEVA EPS	73168113	$ 98,000	PORVENIR	73168113	$ 392,000	$ 98,000			
9	GIRALDO SANDRA MILENA		Inspector SST	$ 2,450,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	GRUPO INTECON SAS	$ 2,450,000	$ 170,600	V			$ 98,000		0	$ 392,000	$ 98,000			
10	HERNANDEZ POSADA VALERIA	1,152,216,024	Técnico Administrativo	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIOSADINTECON	$ 1,300,000	$ 90,500	V	SURA	73168113	$ 52,000	PORVENIR	73168113	$ 208,000	$ 52,000			
13	ZAPATA GARCIA CARLOS ALBERTO*	3,482,037	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 3,250,000				X	X	X	X	X						X	X	X	X	X						X	X	X	X	X			50	CONSORCIOSADINTECON	$ 3,250,000	$ 226,200	V	EPS SANITAS	7941954787	$ 130,000	COLPENSIONES	7941954787	$ 520,000	$ 130,000			
14	MENA MOSQUERA HARRY ANTONIO*	12,023,693	Especialista Ambiental	$ 3,250,000				X	X	X	X	X						X	X	X	X	X						X	X	X	X	X			50	CONSORCIOSADINTECON	$ 3,250,000	$ 226,200	V	SURA	1067528019	$ 130,000	PORVENIR	1067528019	$ 520,000	$ 130,000			
15	RUIZ EDGAR		Inspector	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	CONSORCIOSADINTECON	$ 2,300,000	$ 160,100	V			$ 92,000		0	$ 368,000	$ 92,000			INGRESO
16	AGUIRRE YEIDER		Inspector	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	CONSORCIOSADINTECON	$ 2,300,000	$ 160,100	V			$ 92,000		0	$ 368,000	$ 92,000			INGRESO
17	MUÑOZ LARA EUDORE HERNANDO*		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 1,950,000			X	X				X	X				X				X			X			X					X	X		30	CONSORCIOSADINTECON	$ 1,950,000	$ 135,800	V			$ 78,000		0	$ -	$ 78,000			PENSIONADO
18	HINCAPIE AGUDELO GONZALO*		Especialista en Estructuras	$ 1,300,000		X					X					X					X				X									X	20	CONSORCIOSADINTECON	$ 1,300,000	$ 90,500	V			$ 52,000		0	$ -	$ 52,000			PENSIONADO
19	GERMAN MONSALVE SAENZ		Especialista en Hidráulica	$ 1,950,000			X	X				X	X				X				X			X			X					X	X		30															
																																					$ -														
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 53,150,000																																														

El Interventor adjunta la certificación de fecha ---------- a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matrícula profesional No. 6820211221 4 STD

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO W

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Informe financiero y presupuestal Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: Noviembre de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATO DE OBRA No: 016 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023-2024	1352623	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,670,929,326.00	$ 970,017,874
2023-2024	1352623	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 185,658,814.00	$ 107,779,764
				TOTAL		**$ 1,856,588,140.00**	**$ 1,077,797,638**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,856,588,140**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402041-02	Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402112-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
					$ -		**$ -**	**$ 1,670,929,326.00**	**$ 185,658,814.00**	**$ 1,856,588,140.00**		
								$ -	**$ -**	**$ -**		
1	**DICIEMBRE DE 2023 (DEL 14 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023)**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					
2	**MARZO DE 2024**	$ 50,621,700.00	$ 9,618,123.00	$ 60,239,823.00	$ -	$ 60,239,823.00	$ -	$ 1,616,713,485.30	$ 179,634,831.70	$ 1,796,348,317.00		
3	**ABRIL DE 2024**	$ 72,599,500.00	$ 13,793,905.00	$ 86,393,405.00	$ -	$ 86,393,405.00	$ -	$ 1,538,959,420.80	$ 170,995,491.20	$ 1,709,954,912.00		
4	**MAYO DE 2024**	$ 77,364,500.00	$ 14,699,255.00	$ 92,063,755.00	$ -	$ 92,063,755.00	$ -	$ 1,456,102,041.30	$ 161,789,115.70	$ 1,617,891,157.00		
5	**JUNIO DE 2024**	$ 71,570,700.00	$ 13,598,433.00	$ 85,169,133.00	$ -	$ 85,169,133.00		$ 1,379,449,821.60	$ 153,272,202.40	$ 1,532,722,024.00		
6	**JULIO DE 2024**	$ 110,511,600.00	$ 20,997,204.00	$ 131,508,804.00	$ -	$ 131,508,804.00	$ -	$ 1,261,091,898.00	$ 140,121,322.00	$ 1,401,213,220.00		
7	**AGOSTO DE 2024**	$ 121,891,900.00	$ 23,159,461.00	$ 145,051,361.00		$ 145,051,361.00	$ -	$ 1,130,545,673.10	$ 125,616,185.90	$ 1,256,161,859.00		
8	**SEPTIEMBRE DE 2024**	$ 126,479,300.00	$ 24,031,067.00	$ 150,510,367.00		$ 150,510,367.00	$ -	$ 995,086,342.80	$ 110,565,149.20	$ 1,105,651,492.00		
9	**OCTUBRE DE 2024**	$ 134,102,800.00	$ 25,479,532.00	$ 159,582,332.00		$ 159,582,332.00	$ -	$ 851,462,244.00	$ 94,606,916.00	$ 946,069,160.00		
10	**NOVIEMBRE DE 2024**	$ 156,371,300.00	$ 29,710,547.00	$ 186,081,847.00		$ 186,081,847.00		$ 683,988,581.70	$ 75,998,731.30	$ 759,987,313.00		
	TOTALES	**$ 921,513,300.00**	**$ 175,087,527.00**	**$ 1,096,600,827.00**	**$ -**	**$ 1,096,600,827.00**	**$ -**	**$ 683,988,581.70**	**$ 75,998,731.30**	**$ 759,987,313.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 724,354,800.00	$ 137,627,412.00	$ 861,982,212.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 197,158,500.00	$ 37,460,115.00	$ 234,618,615.00
SUBTOTAL COSTOS	$ 921,513,300.00	$ 175,087,527.00	$ 1,096,600,827.00
VALOR TOTAL	**$ 921,513,300.00**	**$ 175,087,527.00**	**$ 1,096,600,827.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matricula profesional No. 68202112214 STD

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO X

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Seguimiento garantías Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: Noviembre de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4763-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

FECHA DE INICIO: 14/12/2032

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/12/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.856.588.140,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.856.588.140,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	30/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 14/12/2023

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	2	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	2	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	2	3	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	Noviembre 2024 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	2	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	2	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	2	3	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	14	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	14	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	14	12	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 185.658.814,00	1	12	2023	14	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16,81%	$ 312.031.621,00	1	12	2023	14	6	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 371.317.628,00	1	12	2023	14	12	2027
Calidad del servicio	30,00%	$ 556.976.442,00	31	12	2023	2	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101226521

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 29/04/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES:

Se presenta las polizas aprobadas en secop 2 con corte a octubre de 2024

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202112214 STD

Firma Monica Montenegro Q.

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276583 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO AD

Copia bitácoras del mes correspondiente

TRAMO CAÑO FLORES

29 oct Martes 2024 Se realiza extendido y compactado de material para terraplén (K3+628 - K3+790) en capa posterior.
Se realiza Fundida de Solera y dentellón (K3+045, K3+245, K3+455) costado izquierdo. Se realizan chequeos topográficos.
PERSONAL: Ing Residente, HSQE, Topógrafo, Maestro, Oficiales Ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro-compactador, carrotanque, excavadora. clima: soleado

30 oct Miercoles 2024 Se realiza extendido y compactado de material para terraplén (K3+199 - K3+300) capa posterior.
Se realiza actividades de acero para Muros y aletas en alcantarillas (K3+045, K3+245, K3+455) costado izquierdo
PERSONAL: Ing residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficiales, ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, excavadora. clima: soleado

31 oct Jueves 2024 Se realiza extendido y compactado de material para terraplén (K3+498 - K3+539) capa posterior.
Se realiza Fundida de muros y aletas para alcantarillas (K3+045, K3+245, K3+455) costado izquierdo.
PERSONAL: Ing Residente, HSQE, topógrafo, Maestro, oficiales ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, carrotanque, excavadora, clima: soleado.

1 NOV Viernes 2024 Se realiza extendido y compactado de material para terraplen (K0+085 - K0+420) (K3+315 - K3+338) capa posterior. Se realiza sundida de sdera y dentellon del lado izquierdo de la alcantarilla K3+645. Se realizo Sundida de la placa superior del carril derecho de la alcantarilla K3+645. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, maestro, cadeneros, maestro, ayudante, oficial, controladores vales. MAQUINARIA: carrotanque, vibrocompactador, excavadora, motoniveladora. CLIMA: soleado.

	Se extendio y compactó material de terraplen en la capa posterior K3+652 - K3+790. Se arregla parte del talud en el tramo K3+350 - K3+400.
2 Noviembre Sabado 2024.	PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, maestro, Ayudante oficial, cadeneros, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora vibrocompactador, excavadora, carrotanque: CLIMA: Soleado.
3 Noviembre Domingo 2024	Sin Novedades para este dia (Domingo no se laboró)
4 Noviembre Lunes 2024	Sin Novedades para este dia (Lunes festivo - No se laboró)
05- Noviembre. Martes-2024	Se extendio y compacto Material de terraplen en la capa superior (K 3+455 - 3+645) - (3+645 - 3+790) PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, Cadeneros, Maestro, oficiales, Ayudantes, controladores viales, MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro Compactador, excavadora, Carrotanque, Clima. Soleado
06- Noviembre Miercoles-2024	Se extendio y compacto Material de terraplen en la capa superior (K 3+455 - 3+790), se realiza Chequeo de niveles de material extendido y compactado durante la Jornada, PERSONAL: Ing residente, HSQE, Topografo, Cadenero, Maestro, oficiales, Ayudantes, Controladores Viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro compactador, excavadora, Carrotanque, Clima, Soleado,
07- Noviembre Jueves - 2024.	Se extendio y compacto material de terraplen en la capa superior (K 3+455 - 3+790), instalacion de mallas sobre los costados derechos y conformacion de talud lateral, PERSONAL: Ing residente, controladores viales, HSQE, Topografo, cadenero, Maestro, oficiales, Ayudante, MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro compactador.

excavadora, carro tanque, clima soleado.

08-NOV Viernes 2024 inicio de instalacion geomembrana, extendido de material (K 0+180 - 0+260) en capa posterior, la interventoria verifica la calidad de los materiales para terraplen, PERSONAL ing Residente, HSQE, Topografo, cadenero, Maestro, oficiales, ayudantes, controladores viales, MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, mini cargadora, carrotanque, clima soleado.

09-NOV Sabado 2024 se realiza estabilizacion del material para terraplen con sales organicas K 0+180 - 0+360 sobre el costado derecho la interventoria realiza verificacion de la señalizacion y calidad de material de descarga, PERSONAL: ing residente, HSQE, Topografo, cadeneros, Maestro, oficiales, ayudantes, controladores viales, MAQUINARIA: motoniveladora, vibrocompactador, clima nublado.

10-NOV Domingo 2024 (sin novedad para este día) (Domingo)

11-NOV Lunes 2024 Sin novedades para este dia (Lunes festivo no se laboro)

12-NOV Martes 2024 Se realizo la actividad de revolver el material del terraplen del tramo K0+180 - K0+425. Se descarga material para la conformacion del terraplen y se mezcla el material. Se realizo el cereo del tramo, K0+425 - K0+615. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque. CLIMA: Soleado.

13-NOV Miercoles 2024 Se realizo cerco del tramo K0+615 - K0+751. Se realizo la actividad de revolver material de crudo y arcilla para terraplen. Se presentaron fuertes lluvias en horas de

	la mañana (4 horas de lluvias). PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, controlador vial, cadeneros, MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, vibrocompactador, carrotanque. CLIMA: lluvias dispersas (mañana y tarde (4 horas)).
14-Noviembre Jueves 2024.	Se realizo la actividad de cercar el material del tramo K1+020 - K1+240. Se acopio material del tramo K1+320 - K1+960. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadeneros, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque. CLIMA: lluvias dispersas en la mañana (7:00AM a 12:00 PM).
	Se realizo la instalacion de los nuevos postes para la parte electrica en la ubicacion K1+305
15-Noviembre viernes 2024	y K1+200. Se realizo cercado del tramo K1+240-K1+325. No se realizo actividades correspondientes a las sales organicas por motivos de lluvias del dia anterior. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, vibrocompactador, carrotanque. CLIMA: Soleado.
	NO se pudieron realizar actividades por motivos
16-Noviembre Sabado 2024.	de fuertes lluvias. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, controladores viales, MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, vibrocompactador, carrotanque CLIMA: lluvias fuertes (mañana 8:00 AM - 12:00 PM) y (tarde 4:00 PM - 5:00 PM).
17-Noviembre Domingo 2024	Sin novedades para este dia. (Domingo no se laboró)

18-NOV Lunes 2024

Se realizó labores de adecuacion del cable electrico, en los postes que se reubicaron en la abicacion K1+200 y K1+305. Se realizo el retiro de los posts que se encontraban entre la via. Se realizo la actividad de mezclar el material para estabilizar con sales inorganicas. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, controlador vial, electricistas. MAQUINARIA: carrotanque, vibrocompactador, excavadora, Motoniveladora. CLIMA: Soleado.

19-NOV Martes 2024

Se realizó la instalacion del geotextil del tramo K0+425 - K0+590. Se extiende material para estabilizacion con sales inorganicas en el tramo K0+425 - K0+590. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, controlador vial, MAQUINARIA: excavadora, Motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, retroexcavadora. CLIMA: Soleado.

20-NOV Miercoles 2024

Se realizo instalacion del geotextil del tramo K0+590 - K0+700. carril derecho. Se extiende material para estabilizacion con sales inorganicas del tramo K0+590 - K0+700. carril derecho. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: carrotanque, vibrocompactador, Motoniveladora, excavadora, Retroexcavadora. CLIMA: Soleado.

21-NOV Jueves 2024

Se realizo la instalacion del geotextil del tramo K0+700 - K0+820. carril derecho. Se extiende material para estabilizacion con sales inorganicas del tramo K0+700 - K0+730. carril derecho. Se realiza el cerco del material estabilizado del tramo K0+780 - K0+425 carril derecho. Se realizo visita tecnica por parte de Invias de la territorial de casanare. PERSONAL: Ingresidente, topografo, cadenero, HSQE, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, excavadora, carrotanque, vibrocompactador, Retroexcavadora. CLIMA: Soleado.

22-Noviembre Viernes 2024	Se realizo la compactacion del material estabilizado con sales inorganicas del tramo K0+300 - K0+730. Se realza la actividad de mezclar material que se encontraba acopiado en el tramo K1+328 - K1+645. carril derecho. Se realizo la actividad de extender el material de estabilizacion con sales inorganicas en los tramos K0+730 - K0+780. carril derecho. Se realizo visita tecnica por parte de coorporinoquia. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, excavadora, rectroexcavadora. CLIMA: lluvias moderadas (11:00 AM - 1:00 PM).
23-Noviembre Sabado 2024	Se extiende material para la estabilizacion con sales inorganicas del tramo K0+780 - K0+820. carril derecho. Se acopia material de arcilla y arena para luego mezclarlo con sales inorganicas. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: vibrocompactador, carrotanque, Motoniveladora, excavadora, rectroexcavadora. CLIMA: lluvias moderados (10:30 AM - 12:00 PM).
24-Noviembre Domingo 2024	Sin novedades para este dia. (Domingo no se laboró).
25-Noviembre Lunes 2024.	Se realizo la actividad de revolver el material estabilizante para que pierda humedad en el tramo K1+328 - K1+645. Se escalifico y se compacto material estabilizante del tramo K0+420 - K0+820. Carril derecho. Se cereo y se compacto el tramo K0+840 - K0+920. en la parte superior del terraplen. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, Cadenero, Controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, Carrotanque, vibrocompactador, excavadora, rectroexcavadora. CLIMA: Soleado.

Se revolvio material estabilizante con sales inorganicas, que se encontraba acoplado en el tramo K1+725 -
6-NOV K2+031. Se extiende material estabilizante con sales
artes inorganicas en el tramo K0+300 - K0+650. carril derecho.
024 PERSONAL: Ing residente, HSQE, topograso, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: Rectro excavadora, motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, excavadora. CLIMA: Soleado.

Se realizo la instalacion del geotextil del tramo K0+180-K0+420.
27-Nov carril izquierdo. Se revolvio material estabilizante acoplado
Miercoles en el tramo K2+445 - K2+845. Se adiciona sales
2024 inorganicas al material estabilizante en el tramo K2+031-K2+120. Se escalisica material y se compacta esto en el tramo K0+625 - K0+820. carril derecho. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topograso, cadenero, controlador vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, Carrotanque, excavadora, Rectro excavadora, vibrocompactador, excavadora. CLIMA: Soleado.

Se realizo la instalacion del geotextil del tramo K0+420 - K0+590. carril izquierdo. Se extiende material estabilizante con
28-Nov sales inorganicas en el tramo K0+420 - K0+540. carril izquierdo.
Jueves Se realizo la socializacion del contrato adicional de valor
2024 No 1. con la comunidad en general de caño flores y se expuso el avance actual del proyecto. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topograso, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: excavadora, motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, rectro excavadora, minicargador (bobcat). CLIMA: Soleado.

Se realizo la instalación del geotextil del tramo K0+590 - K0+675. carril izquierdo. Se extiende material estabilizante con sales inorganicas en el tramo K0+540
29-NOV - K0+645. Carril izquierdo. Se realizo el cerco del material estabilizante con
Viernes sales inorganicos del tramo K0+590 - K0+700. carril derecho. Se añadio las
2024 sales inorganicas al material estabilizante que se encontraba en el tramo K2+650 - K2+800. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topograso, cadenero, controlador vial. MAQUINARIA: motoniveladora, carrotanque, vibrocompactador, excavadora, recto excavadora, minicargador. CLIMA: Soleado.

ANEXO AD

Copia bitácoras del mes correspondiente

TRAMO PALMARITO

MAQUINARIA: Motoniveladova, vibrocompactador, excavadova, carrotanque compactador de neumáticos, irrigador de asfalto, finisher. CLIMA: soleado

30 oct Miercoles 2024 se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente al K2+990 - K3+850 carril derecho. Se realizaron ensayos de control de calidad. Se realizó fundida (K4+385, K5+175, K5+310, K6+080) carril izquierdo. (PE muros y aletas). PERSONAL: Ing residente, HSQE Topógrafo, Maestro, oficiales, ayudantes, Maestro, oficiales, ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, irrigador de asfalto, compactador de neumático, finisher. Clima: Soleado

31 oct Jueves 2024. Se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente a K3+390 - K3+850 carril izquierdo, previamente imprimado. Se realizaron ensayos de control de calidad MDC-19. PERSONAL: Ing Residente, HSQE, Topógrafo, Maestro, oficiales ayudantes, controladores viales. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, irrigador de asfalto, compactador neumatico, finisher. Clima: Soleado

01-NOV Viernes 2024. Se instaló MDC-19 en el tramo correspondiente a. K 3+290 - K 3+540 Carril derecho, Previamente imprimado Se realizaron ensayos de control de calidad MDC-19 PERSONAL: ING Residente, HSQE, Topografo, Maestro, oficiales, ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibrocompactador, excavadora, Carrotanque, irrigador de asfalto, Compactador neumatico, Finisher, Clima soleado

02-NOV Sabado. No se realizan Actividades de correspondiente. a la aplicacion de imprimacion y MDC-19, ya que la Planta Proveedora. de asfalto tiene inconvenientes en los equipos de produccion, se realiza instalación de base granular K 5+120 - K 5+820, la interventoria realiza Verificación de que el Personal tenga y utilite de buena manera los EPP. PERSONAL: ING residente, HSQE, topografo, Cadeneros, Maestro, oficiales, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro Compactado, excavadora, Carrotanque, irrigador

	de asfalto, compactador neumatico, clima- soleado.
03- Noviembre Domingo 2024	(sin novedades Para este día) (Domingo)
04- Noviembre Lones- 2024	(sin novedades Para este día) (Lones festivo)
	NO se realizo actividades correspondientes a la imprimacion y de MDC-19. ya que la planta proveedora de asfalto tiene inconvenientes en los equipos de produccion. Se extiende y
5- Noviembre Martes 2024	Se compacta material de subbase en los tramos (K5+624 - K5+655, K6+00 - K6+082). Se realizo del carril izquierdo la demolicion de la alcantarilla K6+631 y se realizo desvio del cauce. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topograsa, maestro, oficial, agudantes, controlador vial, MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotangue, Sinisher, irrigador de asfalto, compactador de neumatico. CLIMA: soleado.
6- Noviembre 2024 Miercoles	Se realizo la instalacion de MDC-19 en el tramo K2+890 - K3+220 carril izquierdo. Se realizo imprimacion del tramo K2+890 - K3+570 carril izquierdo Se realizo muestras de MDC-19 para control de calidad Se realizo solado para la colocacion de tubos de concreto y se realizo parte del amarre de acero para el dentellon. Se extiende y se compacta material de base en el tramo K3+940 - K4+140. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topograsa, maestro, oficial, agudante, controlador vial. MAQUINARIA: excavadora, motoniveladora, vibrocompactador, carrotangue, sinisher, irrigador de asfalto, compactador de neumatico. CLIMA: soleado.
11	

Se realizo la instalacion de MDC-19 en el tramo K3+220 - K3+504. carril izquierdo.. Se realizo imprimacion
7 NOV del tramo K3+570 - K3+860. carril izquierdo. Se toman
Jueves muestras de MDC-19 para realizar control de calidad.
2024 Se fundio dentellon y solera de la alcantarilla K6+631 del carril izquierdo. Se trabajo parte del talud derecho del tramo K5+190 - K5+210. Se extiende y se compacta material de base en el tramo K4+100 - K4+380. PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, maestro, ayudante, oficial, controlador vial. MAQUINARIA: motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, finisher, irrigador de asfalto, compactador de neumatico. CLIMA: Soleado.

Se realizo instalacion de MDC-19 en el tramo K3+504 - K3+657 carril izquierdo. Se toman muestras de MDC-19 para realizar control de calidad. Se realizo amarre de acero para aletas y muro y seguidamente
8 NOV se encofro y se fundio en la alcantarilla K6+637 carril izquierdo. Se realizo encofrado y fundida de la
Lunes placa superior de la alcantarilla K0+00 carril derecho.
2024 PERSONAL: Ing residente, HSQE, topografo, cadenero, maestro, ayudante, oficial, controlador vial. MAQUINARIA: Motoniveladora, vibrocompactador, excavadora, carrotanque, finisher, irrigador de asfalto, compactador de neumatico. CLIMA: Soleado.

No se realiza actividades correspondientes a la aplicacion de imprimacion de asfalto y no se instalo MDC-19 por inconvenientes en la planta de asfalto.
9 NOV Se relleno y se compacto material de crudo al
Sabado rededor de los tubos de concreto en la alcantarilla
2024 K6+631. Se realizo la actividad de encofrar y fundir la placa superior de la alcantarilla K6+631 del carril izquierdo. Se extendio y se compacto material base para el tramo K4+440 - K4+560.

motoniveladora, excavadora, vibro compactador, finisher, Compactador neumatico, irrigador de asfalto. clima Soleado.

14-NOV Jueves 2024 se realiza instalacion de MDC-19 en el tramo (K 3+930 - 4+210) sobre el costado izquierdo, Descarga y extendido y compactado de material base granular para cero, en el tramo (K 4+710 - 4+930), se realiza instalacion de encotrado sobre aletas y guardallantas, se realiza el vaciado de concreto de aletas y guardallantas, la interventoria realiza observaciones acerca de buenos metodos constructivos y estetica final, observaciones acerca de la señalizacion PERSONAL: ing residente, Topografo, cadenero, Maestro, Oficiales, Ayudantes, HSQE, Controladores Viales, MAQUINARIA: motoniveladora, vibro compactador, carro-tanque, finisher, compactador neumatico, irrigador asfalto clima soleado

15-NOV Viernes 2024 se realiza instalacion de MDC-19 en el tramo (K 3+650 - 3+860) sobre el costado derecho, se realiza imprimacion de tramo (K 3+860 - 4+000) PERSONAL: ing residente, HSQE, Topografo, cadenero, Maestro, Oficiales, Ayudantes, controladores Viales MAQUINARIA: Motoniveladora, vibro compactador, Finisher, compactador neumatico, irrigador de asfalto, MAQUINARIA: clima soleado se realiza escarificacion sobre el tramo K 7+400 - 7+100

16-NOV Sabado 2024 se realizo instaladon de MDC-19 en el tramo (K 3+860 - 4+110) sobre el costado derecho, se realiza instalacion de base granular sobre el tramo (K 7+400 - 7+130) extendido y compactado, PERSONAL: ing residente, HSQE, Topografo, Cadenero, Maestro, Oficiales, Ayudantes, controladores Viales, MAQUINARIA: Motoniveladora, vibro compactador, compactador neumatico, irrigador de asfalto, clima nublado con lluvias.

motoniveladora, excavadora, vibio compactador, finisher, Compactador neumatico, irrigador de asfalto. clima Soleado.

14-NOV Jueves 2024 Se tealiza instalacion de MDC-19 en el tramo (K 3+930 - 4+210) sobre el costado izquierdo, Descarga y extendido y compactado de material base granular para cero, en el tramo (K 4+710 - 4+930), se tealiza instalacion de encotrado sobre aletas y guardallantas, se tealiza el vaciado de concreto de aletas y guardallantas, la interventoria tealiza observaciones acerca de buenos metodos constructivos y estetica final, observaciones acera de la señalizacion PERSONAL: ing tesidente, Topografo, cadenero, Maestro, Oficiales, Ayudantes, HSQE, controladores viales, MAQUINARIA: motoniveladora, vibio compactador, carro-tanque, finicher, compactador neumatico, irrigador asfalto clima soleado

15-NOV Viernes 2024 Se tealiza instalacion de MDC-19 en el tramo (K 3+650 - 3+860) sobre el costado derecho, se tealiza imprimacion de tramo (K 3+860 - 4+000) PERSONAL: ing tesidente, HSQE, Topografo, cadenero, Maestro, Oficiales, Ayudantes, controladores viales MAQUINARIA: Motoniveladora, vibio compactador, Finisher, compactador neumatico, irrigador de asfalto, MAQUINARIA: clima soleado Se tealiza escarificacion sobre el tramo K 7+400 - 7+100

16-NOV Sabado 2024 Se tealiza instalacion de MDC-19 en el tramo (K 3+860 - 4+110) sobre el costado derecho, se tealita instalacion de base granular sobre el tramo (K 7+400 - 7+130) extendido y Compactado, PERSONAL: ing tesidente, HSQE, Topografo, Cadenero, Maestro, Oficiales, Ayudantes, controladores viales, MAQUINARIA: Motoniveladora, vibio compactador, compactador neumatico, irrigador de asfalto, clima nublado con lluvias.

17-Noviembre ·Domingo 2024	(Sin novedades para este día) (Domingo)
18-Noviembre lunes-2024	Se realiza excavacion mecanica, retiro de tuberia que habia sido previamente instalada para desvio de aguas y una vez terminada la actividad se retira (a tuberia y Material sobrante y se reanuda el caudal sobre la nueva alcantarilla, instalacion y compactacion de rellenos) Por capas sobre la excavacion que se utilizo para el desvio de agua) temporal y reanudacion de la via, se realiza extension de material base Granular sobre el tramo K 7+130 - 6+680, NO se realizan actividades correspondientes a imprimacion y instalacion MDC-19 PERSONAL: Ing residente, HSQE, Topografo, Cadeneros, Maestro, oficiales, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA: Motoniveladora, Vibro compactador 2, Mini cargador retro #1, Carrotanque 1, 1 HAMM, 1 Finisher Turbo carroceria, Irrigador de asfalto, Clima Soleado.
19. Noviembre. Martes-2024	El dia de hoy NO hay actividades correspondientes a imprimacion e instalacion de MDC-19, se realiza extendido de material base granulas y compactacion segun verificacion de los niveles topograficos. Sobre el tramo (K 6+680 - 6+740.), Se realiza nivelacion de base granulas sobre la alcantarilla o tramo K 6+620 - 6+640 previamente instalada la geotextil, la interventoria hace observacion acerca de la disposicion final de los escombros sobrantes de demolicion de tuberia antigua 18" en concreto. PERSONAL. Ing residente HSQE, Maestro, oficial, Ayudantes, Topografo, cadeneros, Controladores Viales, MAQUINARIA, 1 Motoniveladora, 2 Vibro compactador, 1 mini cargador retro, 1 HAMM, 1 Finisher, Turbo de carroceria, Irrigador de asfalto, Clima Soleado.

0-NOV iercoles 2024	El dia de hoy NO se realizan actividades correspondientes a imprimacion y instalacion MDC-19, Se realiza extendido y compactacion de base granular sobre la via mediante la verificacion de topografia sobre el tramo K 6+740 - 6+690, se realiza la verificacion de la llegada de 2da Finisherd para instalare y dar inicio sobre el tramo 7+400, se realizo la verificacion del proyecto en general por parte de la interventoria se espera dar inicio con asfalto. PERSONAL: Ing Residente, HSEQUE, Topografo, cadeneros, Maestro, oficial, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 2 vibro compactador, 1 Mini cargador retro, 1 HAMM, 2 Finisherd, Turbo carroceria, Irrigador asfalto, Clima soleado.
24-NOV Jueves 2024	se hace la verificacion de la llegada del personal correspondiente al 2do equipo o Frente de trabajos sobre el tramo 7+400. hacia atras y la llegada de 1 vibro compactado, 1 sellador neumatico, carro tanque de imprimacion o irrigador de asfalto, se realiza imprimacion sobre el tramo 7+400 - 6+830, se realiza instalacion de señalizacion vertical sobre la via sobre un tramo 0+000 - 2+800, se realizo extendido y Compactacion de base granular sobre el tramo 6+690 - 6+560, se hace verificacion de las actividades realizadas y se Recomienda continuar con buenos metodos de instalacion MDC-19 PERSONAL: ING Residente, HSQE, Topografo, Cadeneros, Maestro, oficiales, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA, 1 Motoniveladora, 3 Vibro compactador, 1 Mini retro cargado, 1 carro tanque, 2 Hamm, 2 finisherd, Turbo carroceria, Clima soleado.
2-NOV ieines 2024	Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el tramo (K 7+400 - 6+853) costado derecho, Se realiza instalacion de base granolus extendido y Compactacion sobre el tramo K 6+560 - 6+440, PERSONAL Ing Residente, HSQE, Topografo, Cadenero, Maestro, oficial, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 3 Vibro Compactador, 1 mini cargador retro, 1 Carro tanque, 2 Hamm, 2 finisherd, 1 turbo carroceria, Clima Soleado, de mañana, Tarde nublada,

23-Noviembre. Sabado-2024	Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado izquierdo en el tramo K 7+400 - 7+003, PERSONAL, Ing residente, #SSE, Topografo, Cadeneros, Maestro, oficiales, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 1 Vibro compactador, 1 Mini cargador Retro, 1 Carro-tanque, 2 Hamm, 2 Finished, 1 Turbo carroceria, Se realizo extendido y compactacion de base granular sobre el tramo (K 6+440 - 6+430), Clima nublado con lluvias de 9:30 AM - 11 AM.
24-Noviembre Domingo-2024	(Sin novedad para este dia) (Domingo)
25-Noviembre Lunes-2024	Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado izquierdo en el tramo (K 7+003 - 6+565), se realiza imprimacion en el tramo (K 7+003 - 6+500), la motoniveladora presento falla mecanica no hay extension de material base granular, PERSONAL: Ing residente, HSEQ, Topografo, Cadeneros, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Controladores Viales MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 3 Vibro compactador, 1 Mini retro cargador, 1 carro tanque, 2 Hamm, 2 Finished, 1 Turbo Carroceria, Clima soleado.
26-Noviembre Martes-2024	Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado derecho Equipo #1. sobre el Tramo (K 4+140 - 4+297). Se realiza instalacion de imprimacion (K 4+297 - 4+500), Se realizo instalacion de MDC-19 sobre el costado derecho en el tramo K 6+853 - 6+625, se realizo extendido y compactacion de base granular en el tramo K 6+430 - 6+160 PERSONAL, Ing Residente, HSEQE, TOPOGRAFO, cadeneros, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA 1 Motoniveladora, ya se desocio, 3 Vibro compactador, 1 Mini Retro Cargador, 1 Carro tanque, 2 Hamm, 2 Finished, 1 Turbo Carroceria, Clima, Soleado. Nota el dia de hoy se inicio con 2 frentes de trabajo en instalacion MDC-19.

27-NOV Miercoles 2024

Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado derecho en el tramo K 4+297 - 4+585, Se aplica imprimacion sobre el tramo (K4+585 - 4+850), Se realiza instalacion de base granular y compactacion en el tramo (K 6+160 - 5+980) PERSONAL: Ing Residente, HSEQ, Topografo, Cadenero, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 3 Vibro Compactador, 1 Mini Retro cargado, 1 Carro tanque, 2 hamm, 2 Finisher, 1 Turbo carrocería, clima soleado.
se realizó socialización adicional de vala N.01.

28. NOV Jueves 2024

Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado derecho en el tramo K 4+585 - 4+766, costado izquierdo en el tramo K 4+210 - 4+333, Se realiza imprimacion en el tramo (K 4+210 - 4+520), Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado Izquierdo, en el tramo K 6+565 - 6+115, y se realiza imprimacion sobre el tramo K 6+565 - 6+100, se realizo extendido y compactacion de base granular sobre el tramo K 5+980 - 5+690 Cerco de aproximación. PERSONAL: Ing residente HSEQ, Topografo, Cadeneros, Maestro, oficiales, Ayudantes, Controladores Viales, MAQUINARIA: 1 Motoniveladora, 3 Vibro compactador, 1 mini retro, 1 Carro tanque, 2 Hamm, 2 finisher, 1 Turbo carrocería, Clima soleado.

29, NOV Viernes 2024

Se realiza instalacion de MDC-19 sobre el costado izquierdo en el tramo (K 4+333 - 4+650); equipo 2 se realiza, instalación de MDC-19 sobre el costado derecho en el tramo (K 6+425 - 6+106), Se realiza extendido y compactación de base granular sobre el tramo (K 5+980 - 5+590), la interventoria hace observaciones acerca de Buenas tecnicas y metodos de instalacion de MDC-19 PERSONAL: Ing residente, HSEQ, Maestro, oficiales, Ayudantes, Topografo, Cadenero. Controladores Viales, MAQUINARIA, 1 Motoniveladora, 3 Vibro compactador, 1 mini cargador retro, 1 carro tanque, 2 Hamm, 2 finisher, 1 Turbo carrocería, clima soleado
