Bitacora.

Contratista

Prena C y G Construcciones S.A.

Contrato N°0
2409191072

Objeto

Mantenimiento y Adecuacion de las canchas de futbol sinteticas del area urbana del Mpio. Manatales.

OCT- NOV 2024

OCTUBRE 21 DE 2024

Despues de realizar un inventario de las obras a Ejecutar se Coordina Con el Ing. Juan Jairo Zuluaga y el Ing. Juan Manuel Torres R. las obra a realizar en las Canchas Priorizadas.

1) CANCHA Luis Fernando Montoya Auxiliar.
2) CANCHA Home cuter - Bajos Suiza.
3) CANCHA ENEA.
4) CANCHA ARANJUEZ.
5) CANCHA Arrayanes.
6) Cancha. Bomberos del B. Campin.
7) CANCHA Liborio.
8) CANCHA SOLFERINO.

Se Evalua por Tener los Materiales TIPO FIFA Como es la Grama Sintetica y el Caucho.

Ing. Residente
Carlos Andres Lopez Osorio



OCTUBRE 26 DE 2024


El dia de hoy llegan Procedentes de Toreneros y FACATATIVA los Materiales para Trabajar en la Mejora de los puntos deñados de las Canchas, se Coordina Con la interventoria de la alcaldia de Manizales las obras previstas Iniciando x la Cancha Auxiliar.



Ing. Residente

octubre 28 de 2024

Ya Teniendo los Materiales para los Canchas Comenzó el Concreto. y la grama Sintética se procedió obras en la Cancha Auxiliar los Fernando Montoya donde se Evalúa El Canb. se Grama en unos puntos por determinado de la Existente y por eso se inicia con Cambio de estos puntos dañados.
Se hace Cruces de Sitio a intervenir

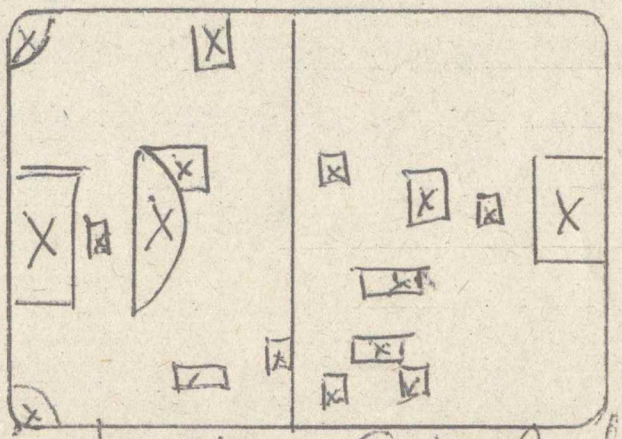


Sitio intervenido en Cancha Auxiliar



octubre 29 de 2024

Se instala Grama en Puntos Previo y se Cose y se pega con pegante.
Ass Especial para lona y Sintetico se Aplica Arena y Concreto dejando a los Especificados de los fabricantes

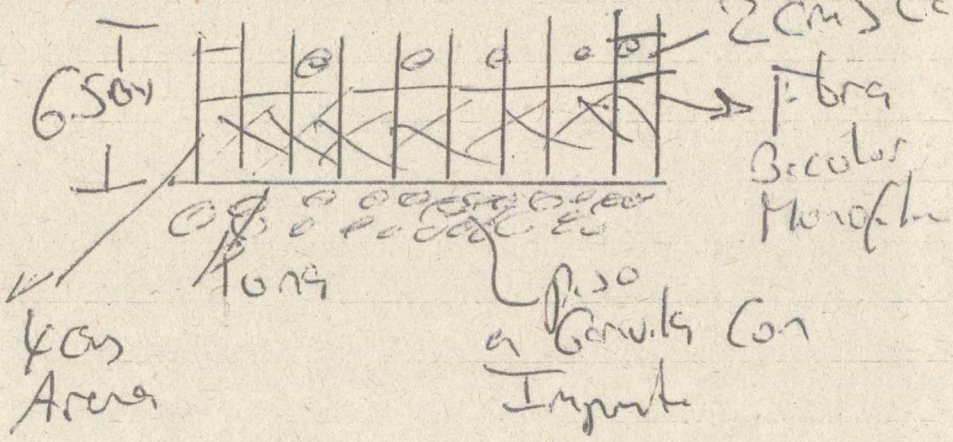



la Grama presupuestada para esta Cancha Auxiliar es de 7400 Mt²
y 4400 Kls de Concreto en Zona y de Juegos mas utilizados

Y Resto

Noviembre 01. de 2024

Se Trabaja en la Cancha Anexa los FDO Montaya, se instala Grama sintetica a Zona Norte y se Termina instalar Area y Caucho en estos Sitios.
Se inicia Trabajo en el lado Sur En la porteria y se pega Con Solución A-55

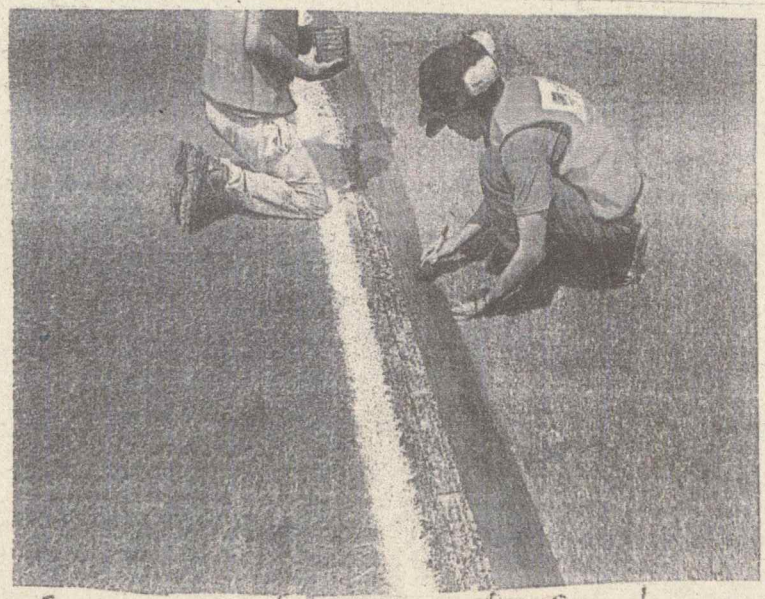

proceso de pegado de la Grama



Noviembre 2 de 2024


Se realiza Cambio de Cinta de demarcación Blanca y se Tiene S.t. de rayas Amarillas en esta Cancha los Curb son levantados para que se sequen y posteriormente ser pegados. se Sigue instalando Grama y Area en la Cancha y posteriormente se instala en Curb pegados por esta Cancha 4400


Noviembre 4 de 2024
despues de Trabajar instalando la Grama Sintetica, la Area se procede a instalar el Caucho en distinta Sem Foto de 110 Sacos de 40 Libs. distribuidos la Cancha y se Cepilla por que entorcen las fibras de la grama

Hoy Fin!

Noviembre 5 de 2024
Se realiza Trabajo de Charla de Seguridad en el Trabajo y SST
Se Trae un personal de

1 Ingeniero Residente
1 Maestro.
3 Ayudte hombre
2 Ayudte Mujer.

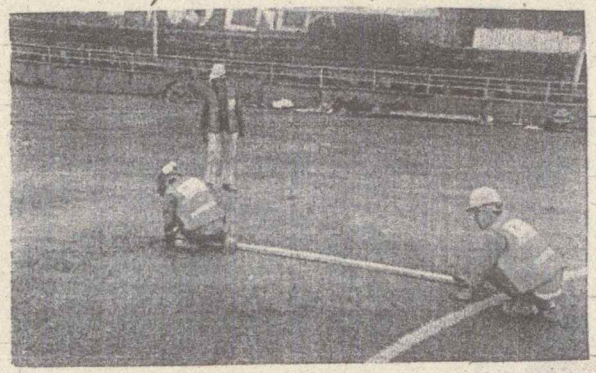

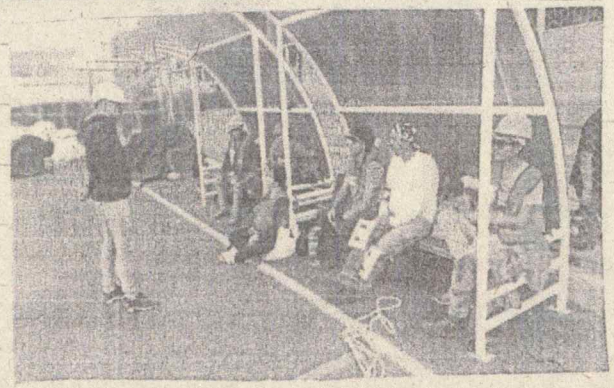


Trabajos y Charls.

Ingeniero



Noviembre 06 de 2024

Se inicia trabajo en la Cancha de Ensayo con Cabuya de grama y se cose con Nylon la Señal Blanca y la grama y se Aplica Arena en Sitio que presenta Vaya Caja de est

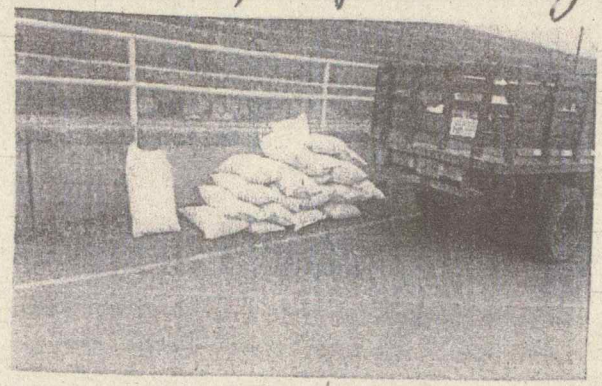

Suministro Arena y Ca


Se presentan lluvias fuertes los Cuales perjudican el proceso Continuo que se moja la Cancha Estadio y no pega x humedad x eso se Pega y Cose con Nylon.
Llueve a 12 M. a 4 pm

Ingeniero

(10)

Nov 7 de 2024

Se Coloca el Caucho en bultos de 40 kg Separados en la Cancha de la Auxiliar fueron 110 sacos. y se restriller en la Gran por expreso.

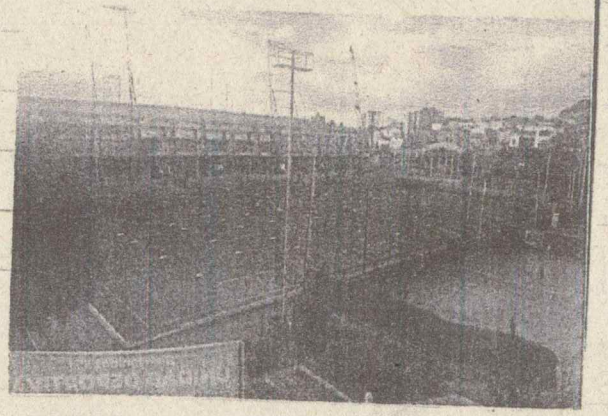


110 sacos




Cancha Auxiliar

(11)

Nov 8 de 2024
Procedimiento de instalación Grama con uso de lona y pegante A-55 para lograr adherencia de los rollos y se Cose luego con Nylon.

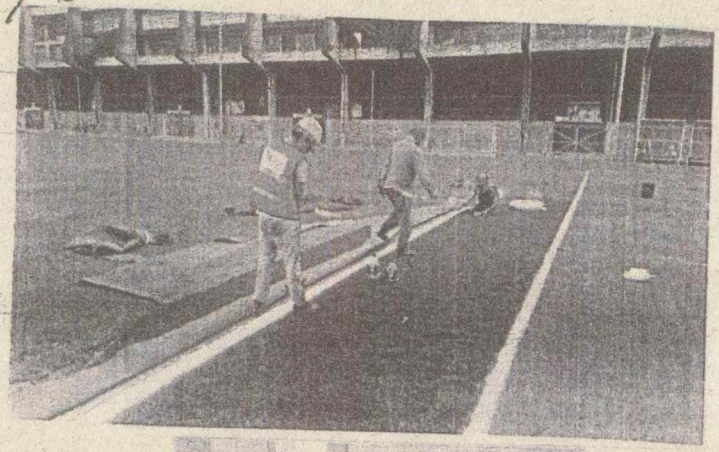


Uso pegante

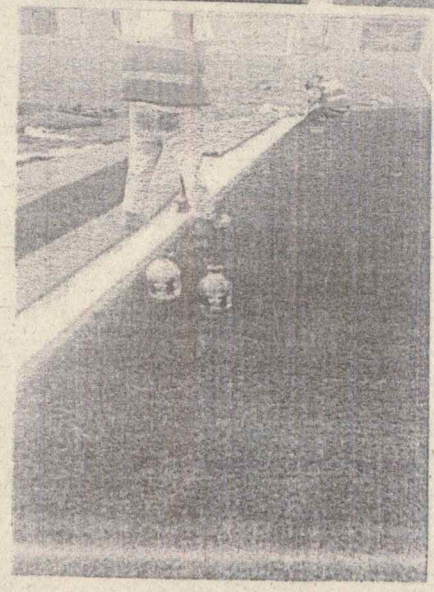

Cancha Auxiliar


Hoy sobre

Noviembre 10 de 2024 (12)

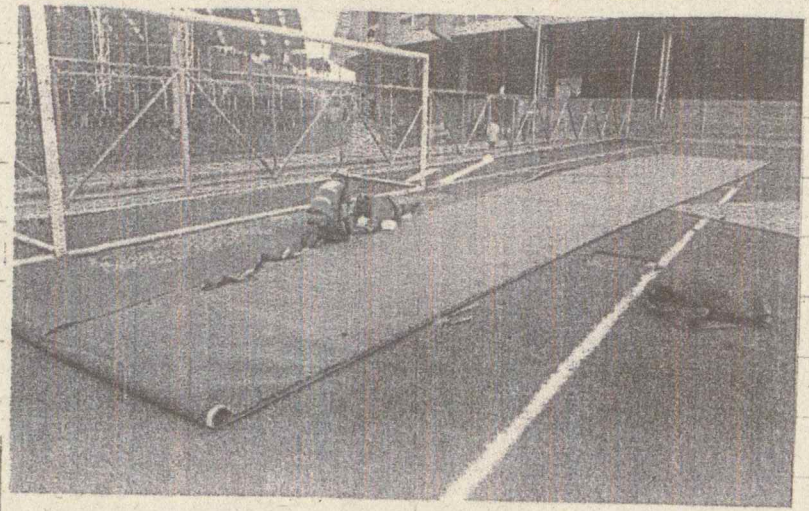

INSTALACION GRAMA SINTETICA

Trabajo en la Cancha Juvenil Luis Ramiro Mosquera

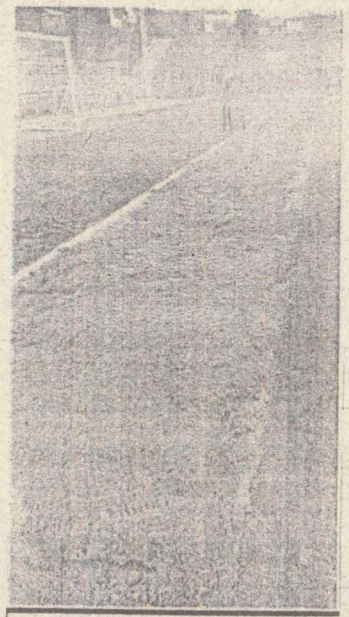

COLOCACION CAMA DE ARENA

Pegado

Arena sobre el Tapete grama S.Ht.

Noviembre 12 de 2024
Se Trabaja en Cancha Home C
o 3 de Sur con Franjas Bl
los Ends son Cocidos Con Nyl
Son 186 ML de Franja se
Coordina con los Entrenadores por
Trabajo en Turnos.
dos Hombres se Trabaja Sobre la
Mañana.

Ing Abc.

(13)

Noviembre 14 de 2024
Se Trabaja Tarde en la Cancha
de Arenque donde es necesario
el Cambio de aproximadamente 330
ML de Franjas, entre Blanco y
Amarillo, se Coordina por No Tener
Inconvenientes Con los Torneos y
Programas en la Cancha
Juvenil Fuera Todo el Tarde.

(14)

Noviembre 15. de 2024

Se Termino de trabajar en la Cancha de la Auxiliar y de Homenaje y se Arreglo en un 60% en Cancha de Arriba, y se pego y Corto la Cinta Blanca y se recogio la Arcilla Se instalo Cancha y Cancha de la Exa Con 2000 kilos en Zonas de mas Trabajo.
Dios Ilumosos.

Ing. Obr.
