ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO
CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	07 / Mar / 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		


LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
P.55	3.01	1.08	3.25	0.09	0.29
P.46'	7.04	5.13	36.12		
	2.18	1.66	3.62		
	1.91	3.68	7.03		
			46.76	0.08	3.74
R.V					
P56	15.41	3.19	49.16	0.04	1.97
TOTAL VOLUMEN COMPACTO					6.00
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)					1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)					N/A
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO					7.56

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

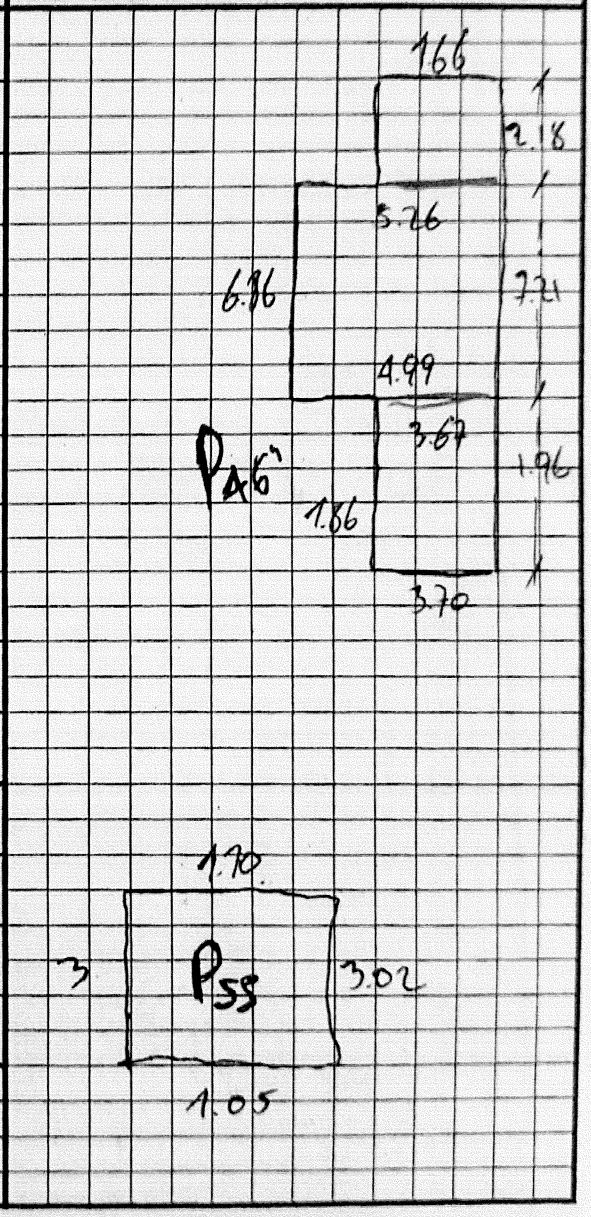

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre:

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO
CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA


CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA:	
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO			
BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
P60	2.22	1.99	4.42	0.10	0.44
P61	2.38	1.88	4.47	0.10	0.45
P62	3.75	6.41	24.04	0.16	3.85
P63	2.73	2.86	7.81	0.10	0.78
P64	2.53	2.79	7.06		
	3.16	3.36	10.62		
			17.68	0.10	1.77
P65	3.72	2.84	10.56	0.10	1.06
TOTAL VOLUMEN COMPACTO					8.40
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)					1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)					N/A
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO					10.58

OBSERVACIONES: 10/ Mar /2025
Ajustar P63 Son dos áreas

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

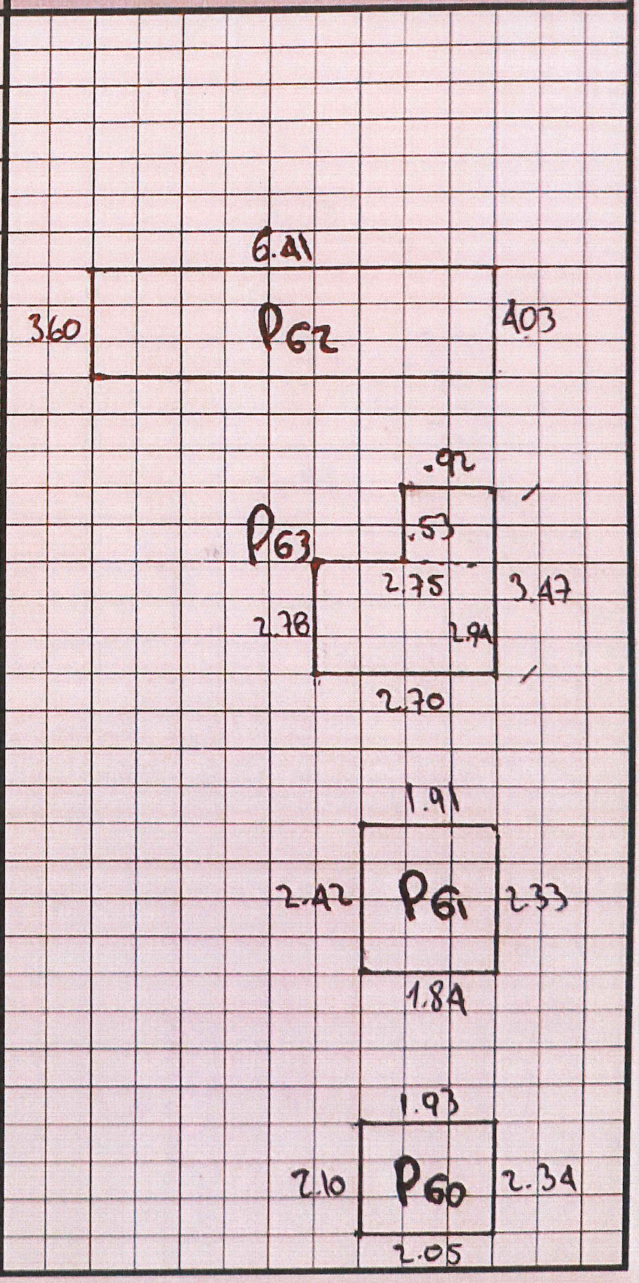

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre: David S	Nombre: Guillermo Lopez

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO
CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA:	
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		


LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO			
BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	

OBSERVACIONES: 10/ Mar/2025

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

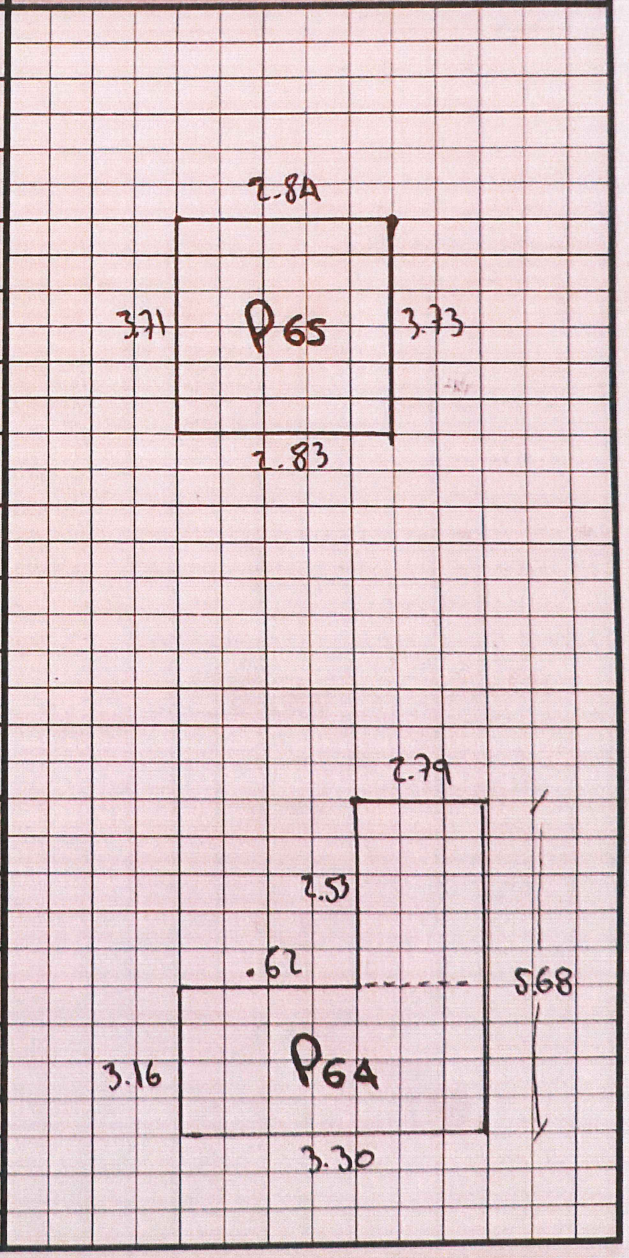

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre:

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA:	11 / Mar / 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		


LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO			
BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
P68	25.30	6.54	165.46	0.10	16.55

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	16.55
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	N/A
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	20.85

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

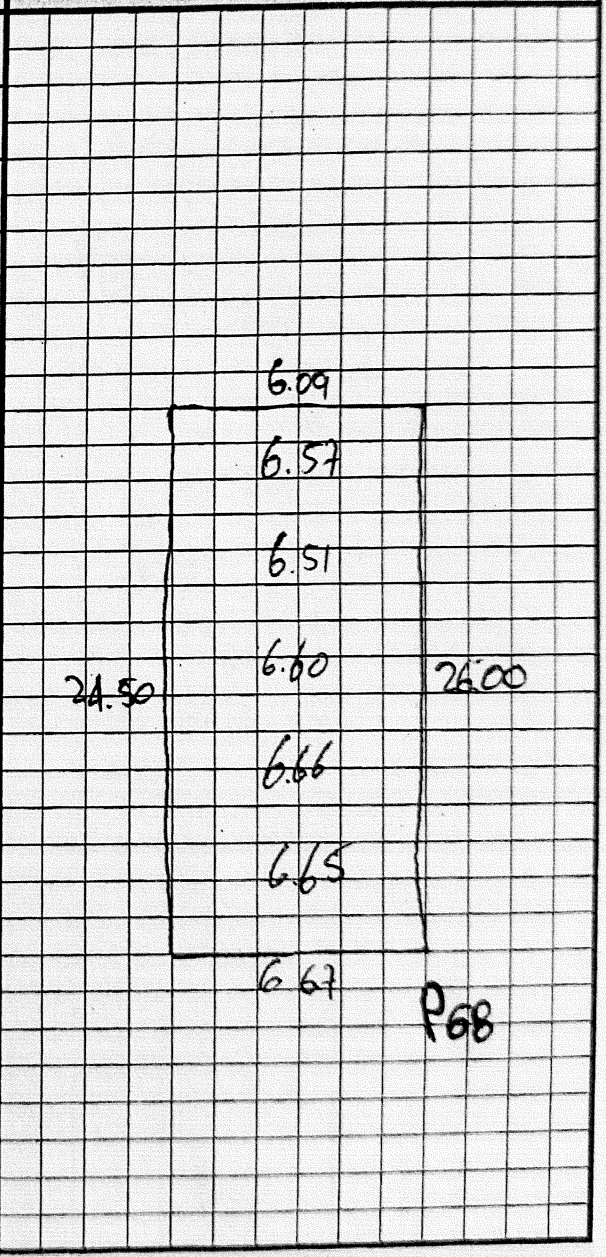

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre: Carl Hernando Vega

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA:	
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		


LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO			
BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
P66	10.53	3.16	33.27	0.10	3.33
P67	2.29	4.26	9.76		
	3.28	2.68	8.79		
	7.14	2.29	16.35		
			34.90	0.09	3.14
P68	18.97	6.16	116.86	0.10	11.69

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	18.16
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	N/A
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	22.88

OBSERVACIONES: 12/03/2025

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

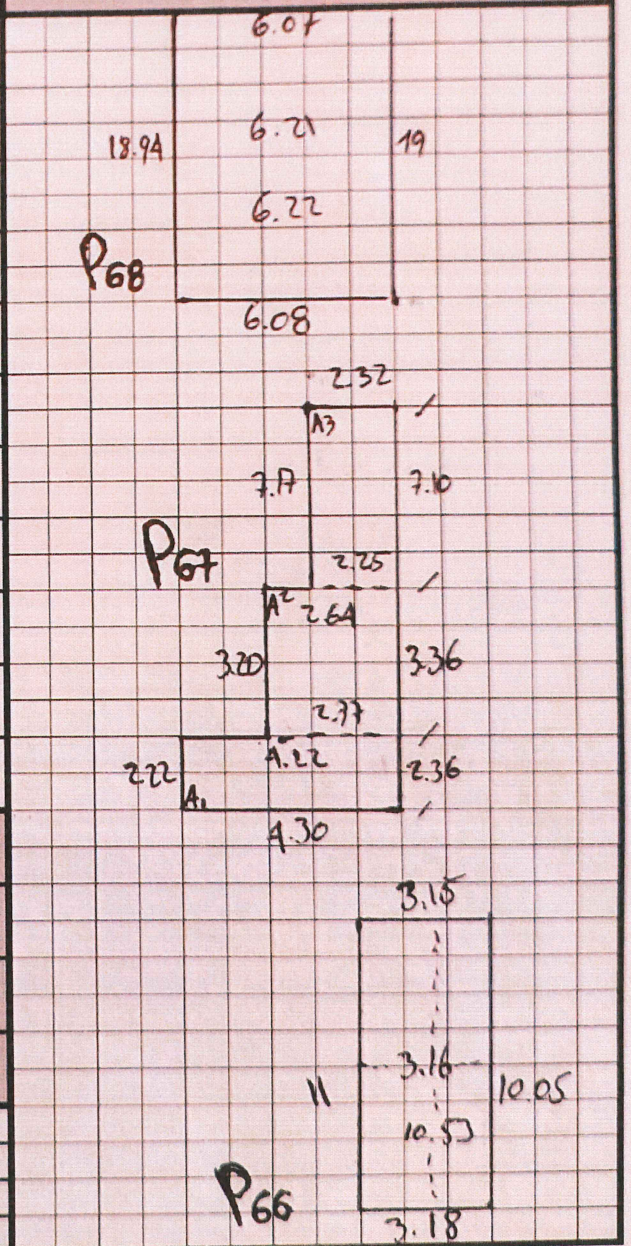

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre:

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO
CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	13/ 09/ 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		


LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
P69	2.19	1.81	3.96	0.10	0.40
P40	18.53	4.27	79.12		
	4.51	2.72	12.27		
			91.39	0.08	7.31
P71	4.14	1.27	5.26		
	1.55	1.78	2.76		
			8.02	0.10	0.80
P72	6.19	2.52	15.60	0.10	1.56

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	10.07
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	N/A
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	12.69

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

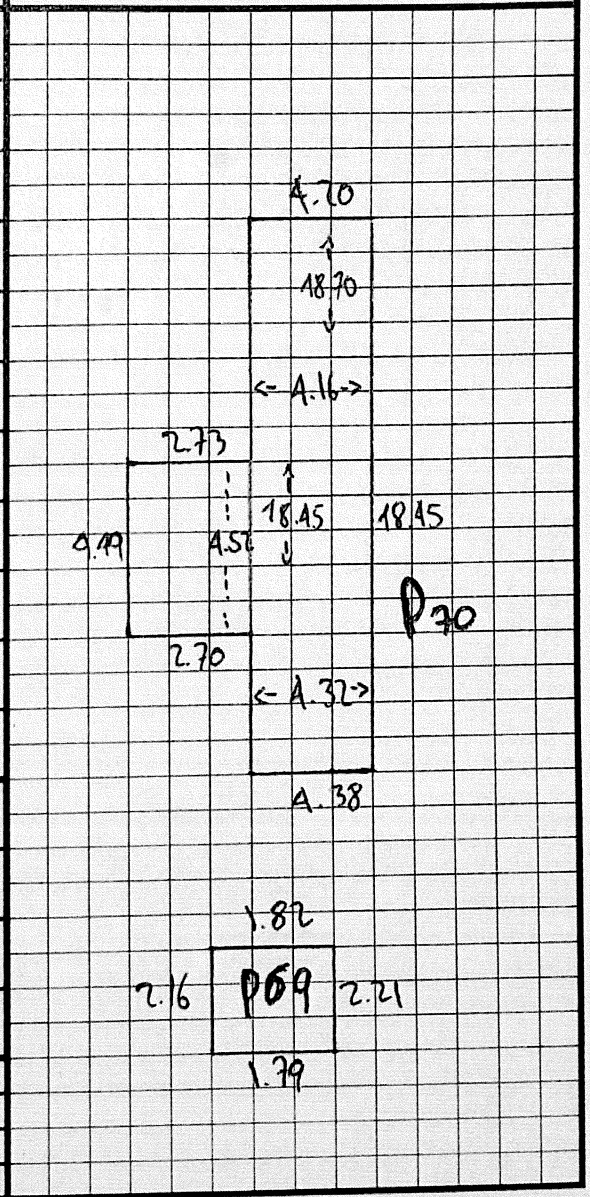

OBSERVACIONES: _____

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre: David S.	Nombre: Guillermo Leyva

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA:	13/ MARZO /2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		


LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO			
BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	

OBSERVACIONES: _____

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

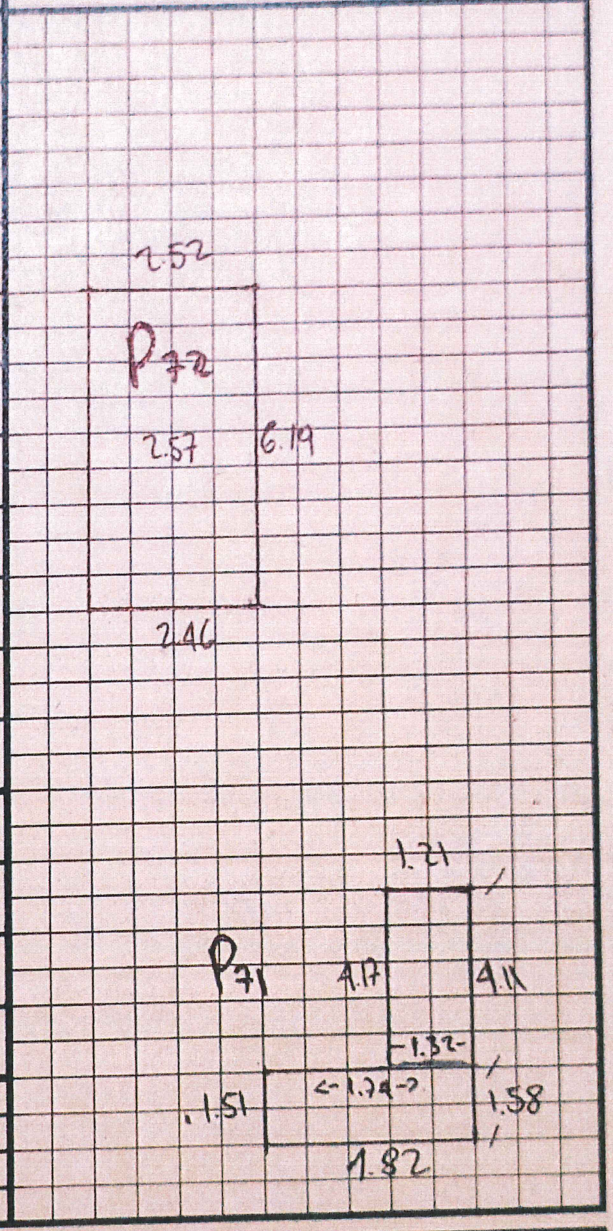

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre:

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO
CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA


CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	13-03-2024
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
Santa Ines	AV Universitaria	Calle 41	Calle 46

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
74	6,71	4,08	27,39	0,11	3,01
75	7,31	2,61	19,08	0,10	1,91
76	19,75	3,43	67,74	0,10	6,77

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

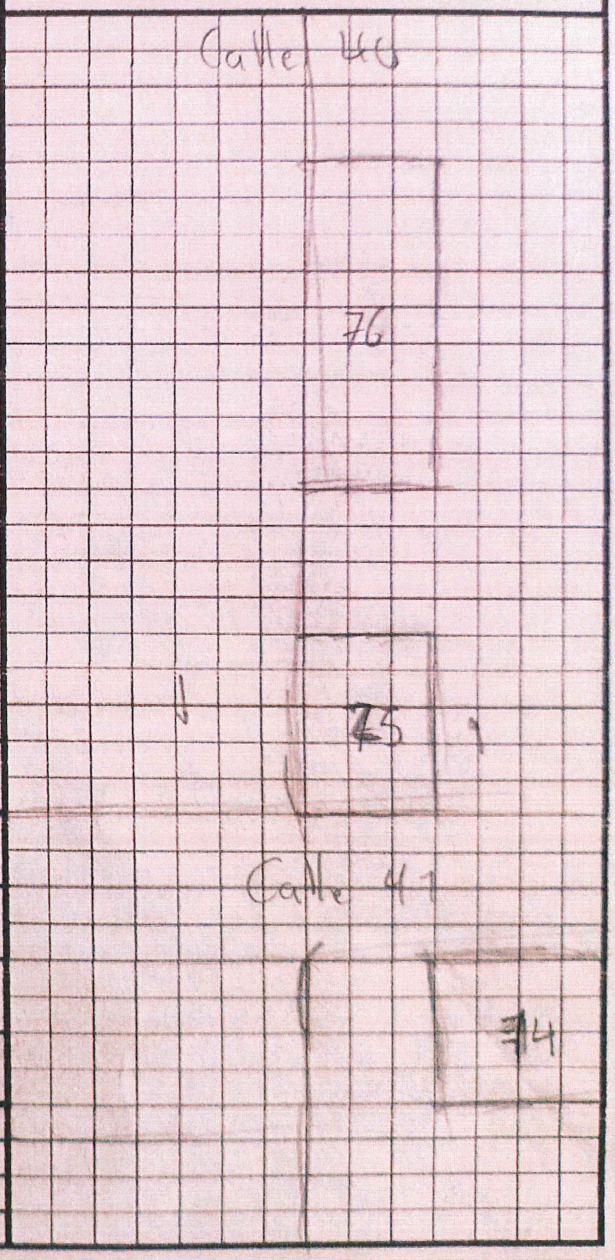

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	11,69
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	14,72
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	14,72

OBSERVACIONES: Falta nomenclatura Parche
3. solo se instalo 11 m3

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre:

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA


CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA:	14 / Marzo / 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
P73					
73-1	3.40	4.58	15.57		
73-2	3.43	3.92	13.45		
73-3	23.16	4.14	95.88		
73-4	6.30	2.39	15.06		
			139.96	0.08	11.20

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

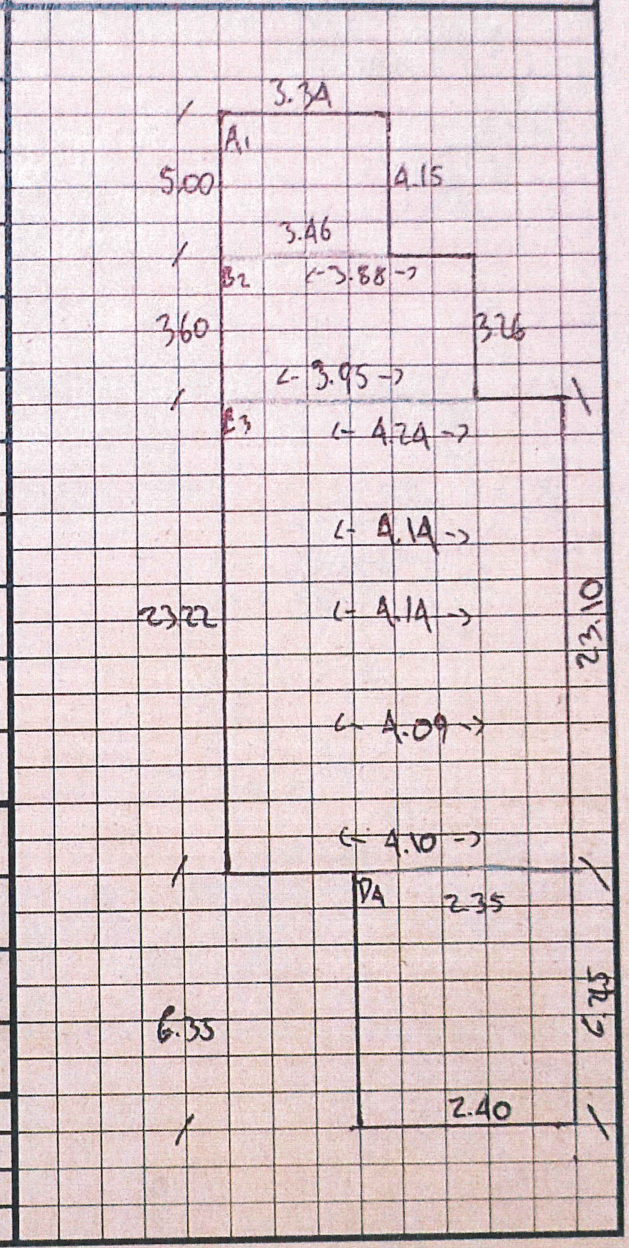

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	11.20
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	N/A
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	14.11

OBSERVACIONES: _____

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre: David	Nombre: Guillermo Ruiz

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
INFORME DIARIO DE CAMPO
CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA


CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	17-03-2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
Santa Ines	Av Universitaria	Calle 41	Calle 40

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
79	2,35	2,49	5,85	0,08	0,47
80	18,14	2,72	49,34	0,1	4,93

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

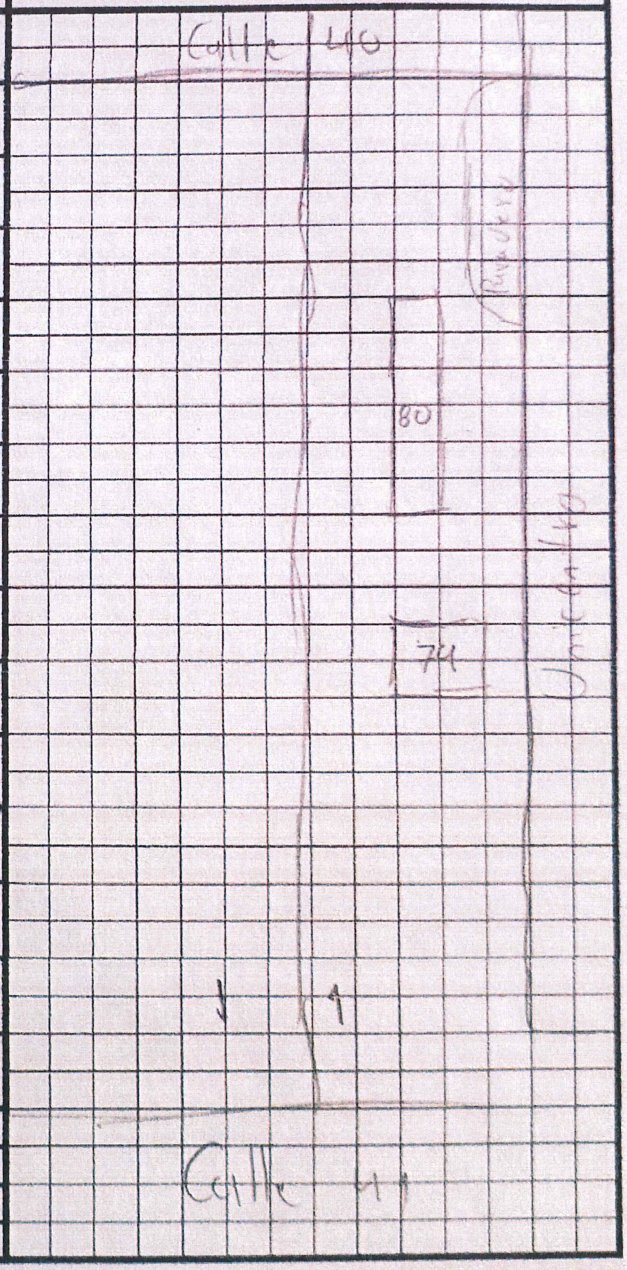

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	5,40
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	6,80

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre:

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA


CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA:	18/ Marzo / 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
P73					
P73-5	47.79	3.67	175.39	0.08	14.03

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

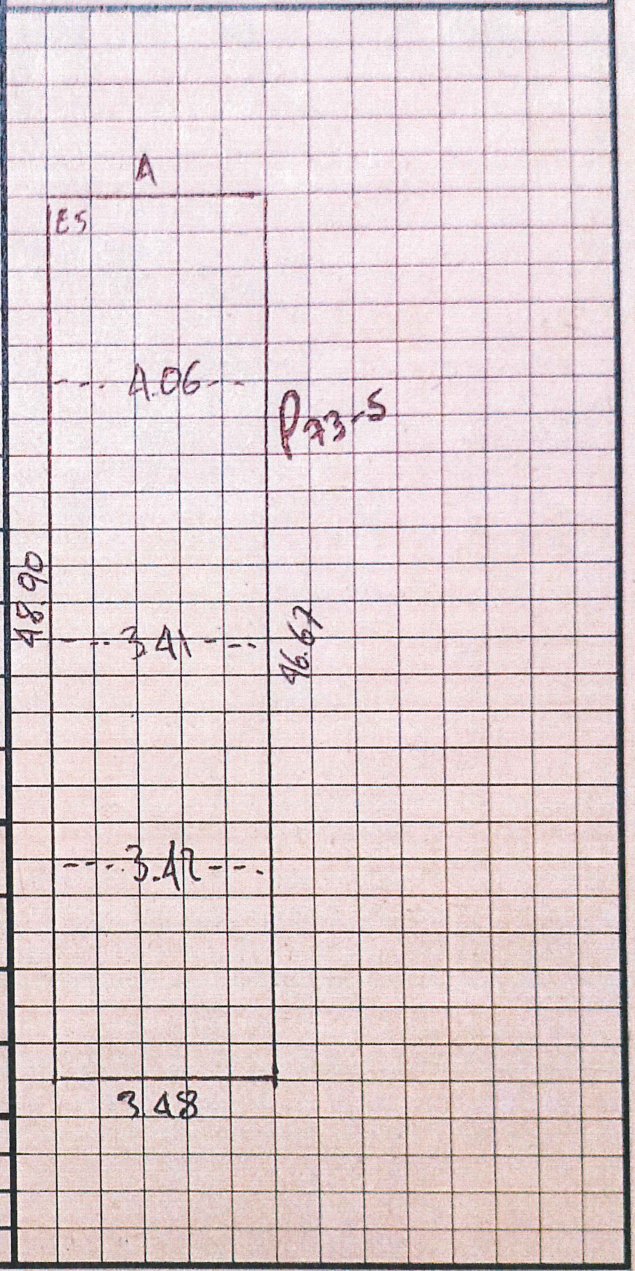

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	14.03
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	1/1
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	17.68

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre: Guillermo Suaza

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	18 - 03 - 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO


BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
Santa Ines	Av Universitaria	Calle 40	Av Olimpica

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
B1	4.26	4.09	17.42	0.10	1.74
B2a	2.76	3.34	9.22	0.10	0.92
B3a	2.77	1.44	3.99		
B3b	10.70	2.00	21.40		
			25.39	0.10	2.54

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	5.20
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	6.55

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

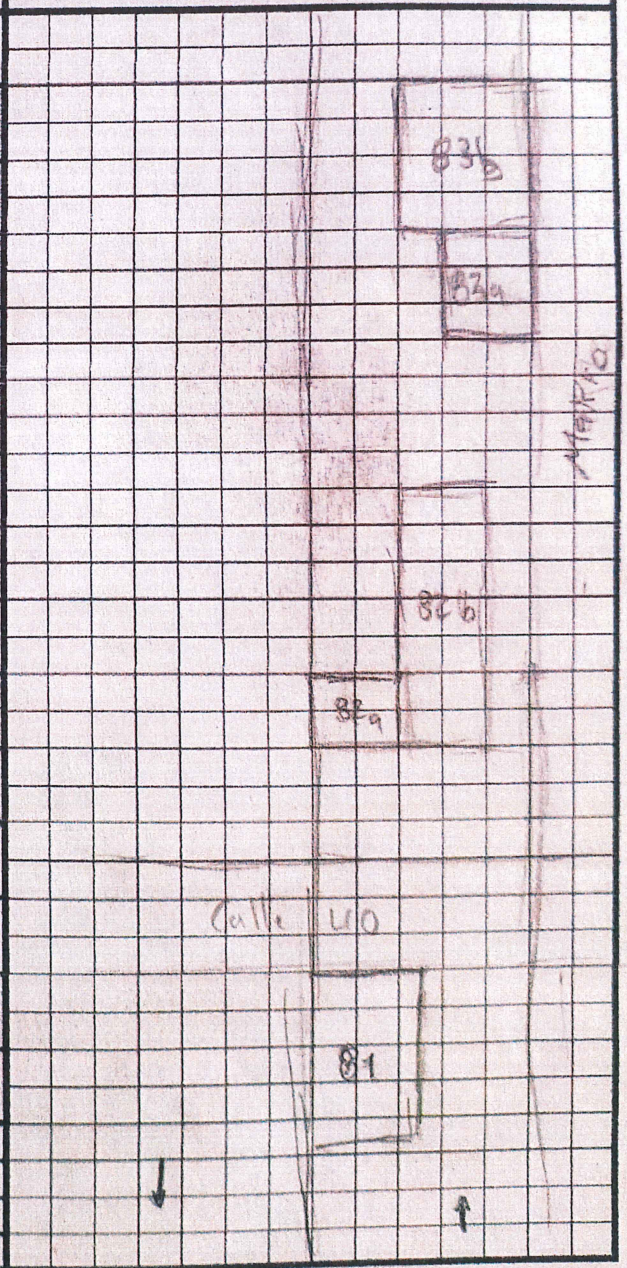

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre: Gustavo Jaya

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA


CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	19-03-2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
Santa Ines	Av Universitaria	Calle 40	Av Olimpica

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
826	26.62	3.80	101.16	0.10	10.12

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

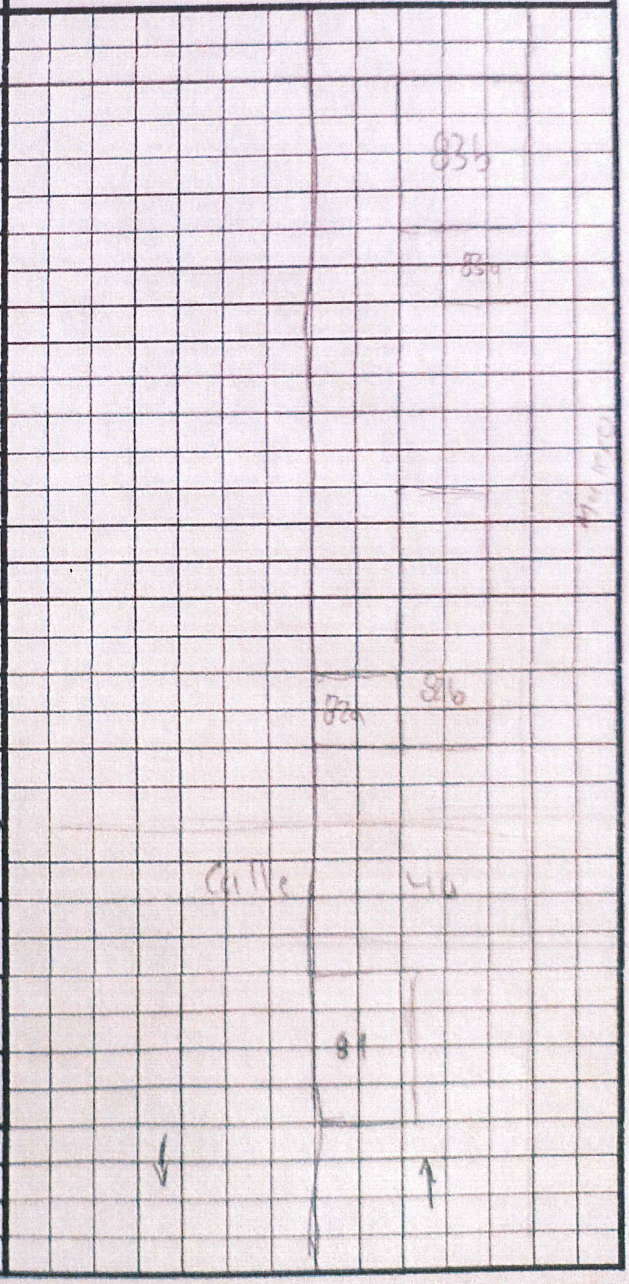

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	10.12
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	12.75

OBSERVACIONES: _____

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre:	Nombre: Guillermo de Jesus

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA:	20 / Marzo / 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO


BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
P73					
73-6	8.30	3.50	29.05	0.10	2.91
73-7	1.42	1.50	2.13	0.10	0.21
R.NV					
73-1	4.58	3.40	15.57		
73-2	3.43	3.92	13.45		
73-3	23.16	4.11	95.88		
73-4	6.30	2.39	15.06		
			139.96	0.01	1.40

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	4.52
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	1/1
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	5.70

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

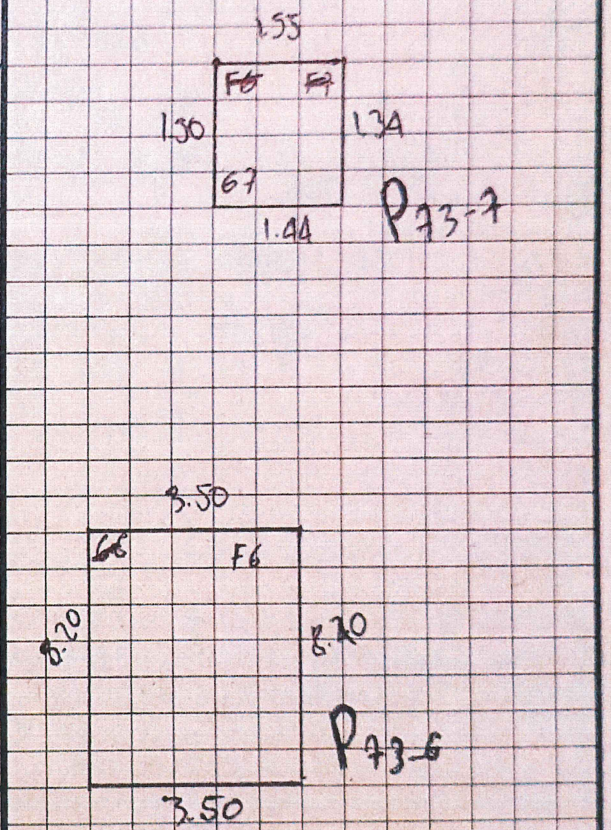

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre: David S	Nombre: Guillermo Sáez

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
INFORME DIARIO DE CAMPO
CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA


CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	20-03-2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
Santa Ines	Av Universitaria	Calle 40	Av Olimpica

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
84	3.05	2.87	8.75	0,14	1,23
85a	8.88	3.62	32.15	0,11	3.54
86a	4.39	3.42	15.01	0.10	1.50
87a	3.40	1.57	5.34	0,10	
87b	3.87	2.44	9.44	0,10	
87c	0,8	1,88	1.50	0,10	
			16.28	0.10	1.63

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

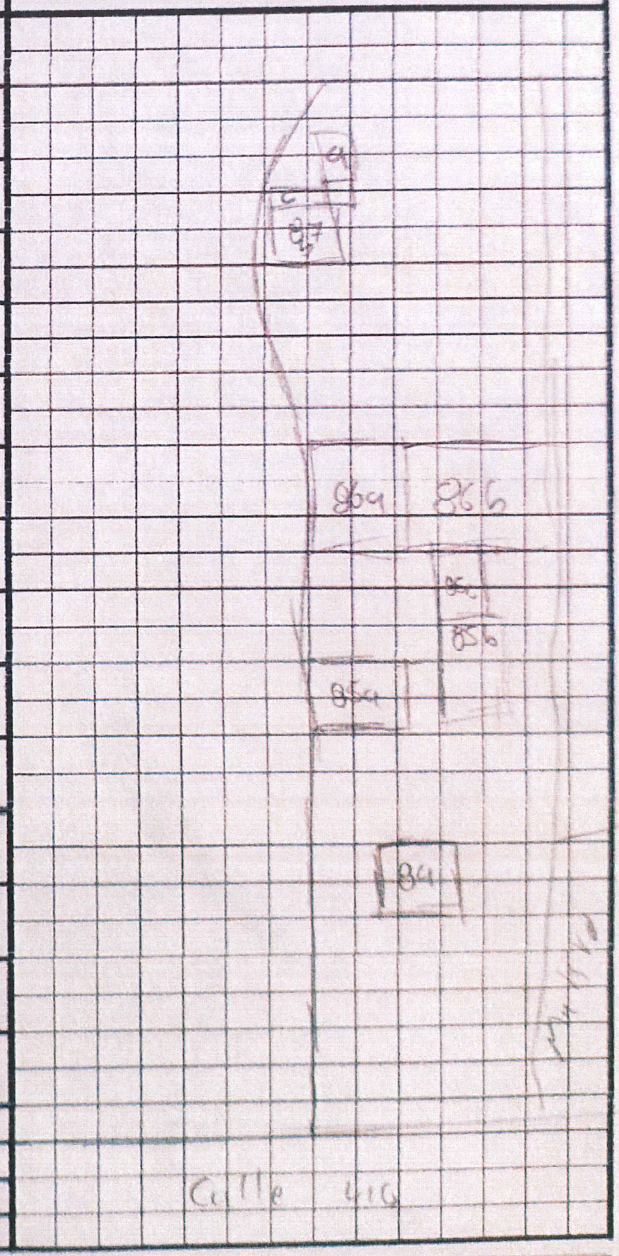

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	7.90
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	9.95

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre: David S.	Nombre: Guillermo Tafur

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA

CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	21 / marzo / 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO


BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m³)
P73					
73-8	5.27	3.82	20.13	0.10	2.01

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	2.01
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	N/A
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	253

OBSERVACIONES: _____

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

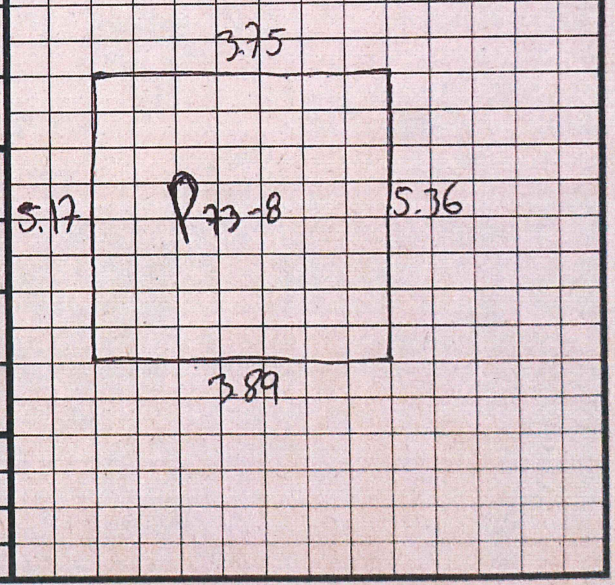

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre: David S.	Nombre: Cristian Camilo Suaza

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

INFORME DIARIO DE CAMPO

CONTROL MANTENIMIENTO VIAL CON MEZCLA ASFALTICA


CONTRATO No	1843 DE 2024	**FECHA:**	21-03-2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
Santa Lucas	Av Universitaria	Calle 40	Av Olaya

No Parche	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA (m2)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m)
85b	44,58	3.52	68,92	0,10	6,89
85c	10,50	3.21	33.71	0,10	3,37
86b	4,75	3,6	14,04	0,11	1,64

ESQUEMA DE AREAS INTERVENIDAS

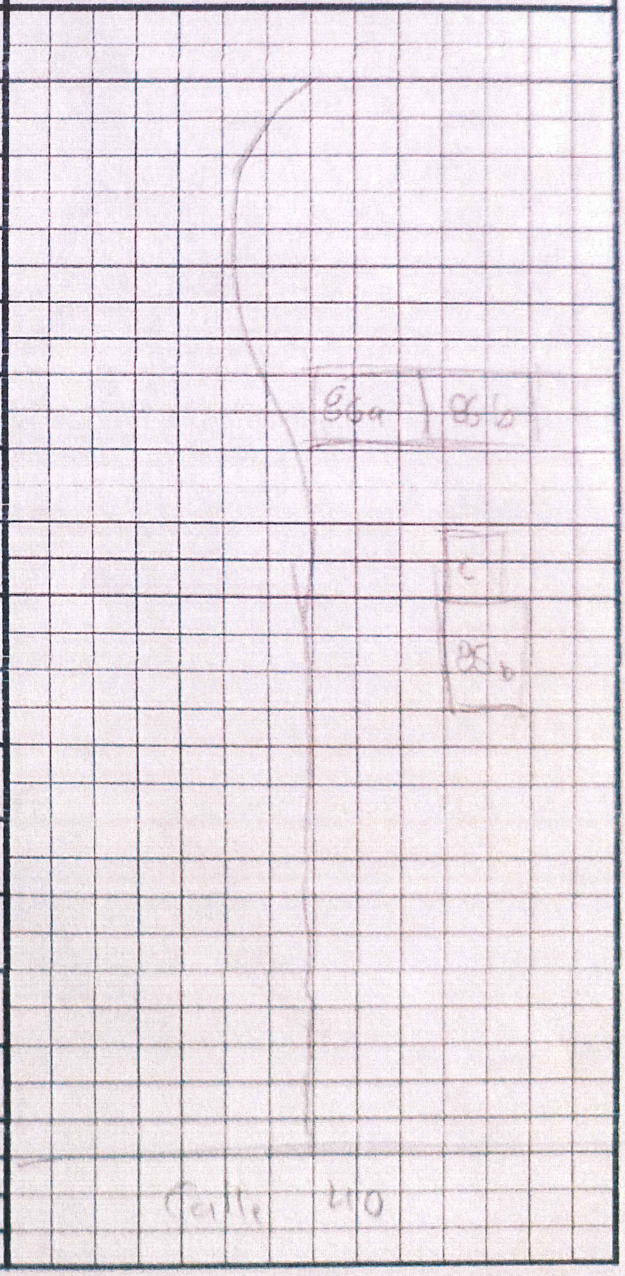

TOTAL VOLUMEN COMPACTO	11,90
FACTOR DE EXPANSIÓN (1,26)	1.26
PORCENTAJE DE DESPERDICIO (5,0 %)	
VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO	15

OBSERVACIONES: _____

Vo. Bo. Inspector de Obra	Vo. Bo. Coordinador
Nombre: David	Nombre: Guillermo Segura

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA	**ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA** **FRENTE DE PARCHEO GRUPO 3**

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA	**ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL** **CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL DE ASFALTO PARA EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**

RESUMEN DE CANTIDADES FRENTE PARCHEO

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
Mezcla Densa en Caliente MDC-19	m3	184.5
Emulsión Asfaltica (Caneca 55 galones)	und	4
Base Granular	m3	98

ING ROIMER ANDRÉS MOSQUERA WALDO
COORDINADOR DE PARCHEO

ING. LINA MARÍA BAUTISTA AVELLANEDA
VoBo SUPERVISOR

GRUPO 3.

SAN FRANCISCO

RELACIÓN DE ASFALTO DIARIA SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL DE ASFALTO PARA EL MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

VOLUMEN DE ASFALTO INSTALADO POR JORNADA

FECHA	REMISIÓN			VOLUMEN SUELTO INSTALADO (M3)	TIPO DE MANTENIMIENTO	FRENTE DE OBRA	SECTOR	LOCALIZACIÓN			TOTAL DE PARCHES EJECUTADOS
	No	VOLUMEN SUMINISTRADO (m3)	VOLQUETA					NOMENCLATURA	INICIO	FIN	
20 de Febrero de 2025	1485	7.5	OCM 235	15	PARCHEO CON MDC	GRUPO 3	SAN FRANCISCO	CALLE 6 SUR	CARRERA 11	CARRERA 9A	3
	1484	7.5	OCM 236								
21 de Febrero de 2025	1498	7	OCM 224	7	PARCHEO CON MDC	GRUPO 3	SAN FRANCISCO	CALLE 6 SUR	CARRERA 11	CARRERA 7	3
22 de Febrero de 2025	1504	6	OCM 235	12	PARCHEO CON MDC	GRUPO 3	SAN FRANCISCO	TRANSVERSAL 5 A	CARRERA 7	CARRERA 3A	3
	1505	6	OCM 224								
27 de Febrero de 2025	1567	7	OCM 227	56	PARCHEO CON MDC	GRUPO 3	SAN FRANCISCO	CALLE 1A SUR	CALLE 1A SUR	CALLE 1A SUR	1
	1560	7	OCM 224		PARCHEO CON MDC	GRUPO 4	SAN FRANCISCO				
	1559	7	OCM 227		PARCHEO CON MDC	GRUPO 5	SAN FRANCISCO				
	1552	7	OCM 229		PARCHEO CON MDC	GRUPO 6	SAN FRANCISCO				
	1564	7	OCM 236		PARCHEO CON MDC	GRUPO 7	SAN FRANCISCO				
	1550	7	OCM 236		PARCHEO CON MDC	GRUPO 8	SAN FRANCISCO				
	1563	7	OCM 235		PARCHEO CON MDC	GRUPO 9	SAN FRANCISCO				
	1565	7	OCM 229		PARCHEO CON MDC	GRUPO 10	SAN FRANCISCO				
28 de Febrero de 2025	1575	7	OCM 229	28	PARCHEO CON MDC	GRUPO 11	SAN FRANCISCO	CALLE 1A SUR	CALLE 1A SUR	CALLE 1A SUR	
	1574	7	OCM 236		PARCHEO CON MDC	GRUPO 12	SAN FRANCISCO				
	1573	7	OCM 235		PARCHEO CON MDC	GRUPO 13	SAN FRANCISCO				
	1576	7	OCM 227		PARCHEO CON MDC	GRUPO 14	SAN FRANCISCO				
03 de Marzo de 2025	1602	4.5	OCM 236	4.5	PARCHEO CON MDC	GRUPO 15	SAN FRANCISCO	CALLE 1A SUR	CALLE 1A SUR	4 SUR	1
SUBTOTAL				**122.5**							

Elaboró: **ING ROIMER ANDRÉS MOSQUERA WALDO**
COORDINADOR DE PARCHEO

BITÁCORAS DE REGISTRO DIARIO DE CANTIDADES SAN FRANCISCO

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL

CONTROL DE VOLUMEN DE MATERIAL DE ASFALTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL


CONTRATO No	1843 DE 2024	FECHA	jueves, 20 de febrero de 2025
OBJETO	SIT - 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TUNJA 2024, NIT. 901 895314-6		

LOCALIZACIÓN TRAMO EJECUTADO

FRENTE No	BARRIO	NOMENCLATURA	INICIO	FIN
1	SAN FRANCISCO	CALLE 6 SUR	CARRERA 11	CARRERA 9A

ÍTEM	1		UNIDAD	m3

CROQUIS Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

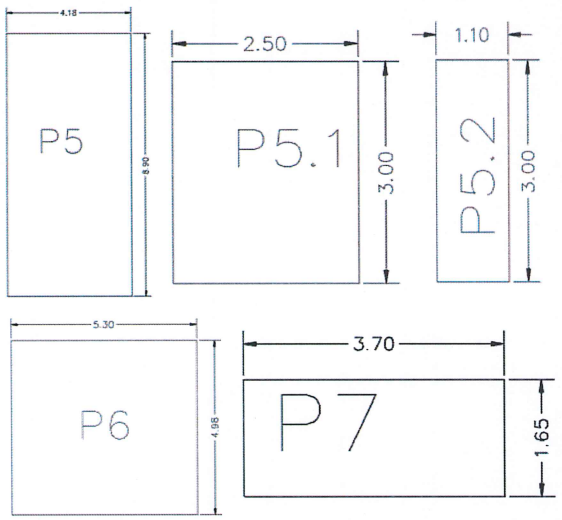

	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LONGITUD (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	ÁREA (M2)	ESPESOR PROMEDIO (M)	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD	TOTAL
P5	PARCHE No 5							
	A	8.90	4.18	37.20	0.16	5.95		
	NIV_1	3.00	2.50	7.50	0.07	0.53		
	NIV_2	3.00	1.10	3.30	0.07	0.23		
	SUBTOTAL			48.00		6.71	1.00	6.71
P6	PARCHE No 6							
	A	4.98	5.30	26.39				
	SUBTOTAL			26.39	0.160	4.22	1.00	4.22
P7	PARCHE No 7							
	A	1.65	3.70	6.11				
	SUBTOTAL			6.11	0.16	0.98	1.00	0.98
				80.50				
	TOTAL PARCHES						3.00	
	TOTAL VOLUMEN COMPACTO							11.91
	FACTOR DE EXPANSION							1.26
	VOLUMEN TOTAL DE ASFALTO INSTALADO							15.01

OBSERVACIONES:
Las dimensiones registradas corresponden a las tomadas en obra, los valores calculados finales fueron aproximados al entero más cer

Elaboró:

ING. ROIMER ANDRÉS MOSQUERA WALDO
COORDINADOR DE PARCHEO
