	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	UAC042

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA — CONTRATO No. PN.DIRAF.06-8-10176-19

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL

PERIODO A PAGAR: DE 20 DE ENERO A 13 DE FEBRERO DE 2020

En Bogota, a los trece (13) días del mes de Febrero del año 2020 se reunieron CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA Director de Obra del Contralista y los señores supervisores Subteniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA, Subcomisario RUTH BEATRIZ BEJARANO FONSECA y Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS de la Policía Nacional, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ITEMS QUE CONTEMPLAN AIU												
1	ADECUACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	GLB	1,00	517.315.868,28	517.315.868,28	-	0,35	0,35	-	181.060.553,90	181.060.554	0,65	336.255.314,38
2	ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES	UND	1,00	3.182.400,16	3.182.400,16	-	0,35	0,35	-	1.113.840,06	1.113.840	0,65	2.068.560,10
2,3	Baranda Metalica en Tubo Galvanizaco 2" Primer y SegUNdo Nivel				-								-
2,4	Baranda Metalica en Tubo Galvanizaco 2" tercer Nivel				-								-
3	MANTENIMIENTO CUBIERTA BODEGA	GLB	1,00	3.995.864,11	3.995.864,11		0,35	0,35		1.398.552,44	1.398.552	0,65	2.597.311,67
5	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A	UD	46,00	1.563.759,90	71.972.955,40	-	16,10	16,10	-	25.015.534,39	25.015.534	29,90	46.457.421,01
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 20TR	GLB	1,00	485.853.224,68	485.853.224,68	-	0,35	0,35	-	170.048.628,64	170.048.529	0,65	315.804.596,04
7	ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	UD	1,00	50.905.725,84	50.905.725,84	-	0,35	0,35	-	17.817.004,04	17.817.004	0,65	33.088.721,80
8	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV, CONTROL BIOMETRICAS, Y MULTIMEDIA	GLB	1,00	110.499.383,08	110.499.383,08	-	0,35	0,35	-	38.674.784,08	38.674.784	0,65	71.824.599,00
9	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS	UD	1,00	93.790.124,22	93.790.124,22	-	0,35	0,35	-	32.826.543,48	32.826.543	0,65	60.963.580,74
11	INSTALACIÓN CANALETA PERIMETRAL PLÁSTICA	M	80,00	149.701,54	11.976.123,20	-	28,00	28,00	-	4.191.643,12	4.191.643	52,00	7.784.480,08
12	INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA	M	140,00	162.240,10	22.713.614,00	-	49,00	49,00	-	7.949.764,90	7.949.765	91,00	14.763.849,10
13	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA	GLB	1,00	166.341.825,83	166.341.825,83	-	0,35	0,35	-	58.219.639,04	58.219.639	0,65	108.122.186,79
	SUBTOTAL				1.536.047.108,80						538.316.488,08	538.316.488,08	999.730.620,72
	ADMINISTRACIÓN	10,00%			153.804.710,88						53.831.649,00	53.831.649,00	99.973.062,00
	IMPREVISTOS	4%			61.521.884,35						21.532.660,00	21.532.660,00	39.989.224,35
	UTILIDAD	5%			76.902.355,44						26.915.824,00	26.915.824,00	49.986.531,00
	IVA	19%			14.611.447,53						5.114.007,00	5.114.007,00	9.497.440,53
					1.844.887.507,00						645.710.628,00	645.710.628,00	1.199.176.879,00
	ITEMS QUE CONTEMPLAN IVA												
4	ADQUISICIÓN RACK DE COMUNICACIONES 2,1 MTS	UD	1,00	1.925.763,87	1.925.763,87	-	0,00	0,00	-	-	-	1,00	1.925.763,87
10	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SWICH DE RED 48 PUERTOS	UD	1,00	3.388.244,53	3.388.244,53	-	0,00	0,00	-	-	-	1,00	3.388.244,53
	SUBTOTAL				5.314.008,00						-	-	5.314.008,00
	IVA	19%			1.009.662,00						-	-	1.009.662,00
					6.323.670,00						-	-	6.323.670,00
	TOTAL				1.851.211.177						645.710.628,00	645.710.628,00	1.205.500.549,00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	1.851.211.177	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:		% ANTICIPO :	0%
V/R ACTUAL CONTRATO:	1.851.211.177	% RETEGARANTIA :	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01		645.710.628	34,88%	-	-	-	645.710.628	1.205.500.549	34,88%
					-	-	-	-	-	
	TOTAL		645.710.628	34,88%	-	-		645.710.628		

OK

FECHA DE ELABORACIÓN: Bogotá Febrero 13 de 2020

Elaboró
CONTRATISTA:
Firma:
CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

Aprobó
Firma:
Subcomisario: RUTH BEATRIZ BEJARANO FONSECA
Supervisora Técnica Contrto PN DIRAF No. 06-8-10176-19

Firma:
Subteniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA
Supervisor Técnico Contrto PN DIRAF No. 06-8-10176-19


Firma:
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS
Supervisor Técnico Contrto PN DIRAF No. 06-8-10176-19

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE Nº	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO Nº: PN DIRAF 08-8-10178-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E1.SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAJE Y ELEMENTOS DERIVACION EN MEDIA TENSIÓN	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA, BODEGA 4B .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

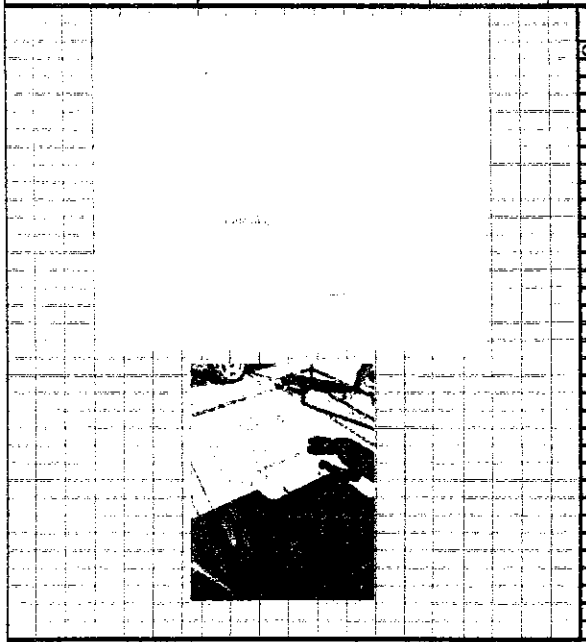

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
CAJA EXTERIOR DE BARRAJES CODENSA	1,00	1,00	1	1,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	1,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-6-10178-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E7.SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA DE PROTECCIÓN AISLADA EN SF6	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA, BODEGA 4B ,PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

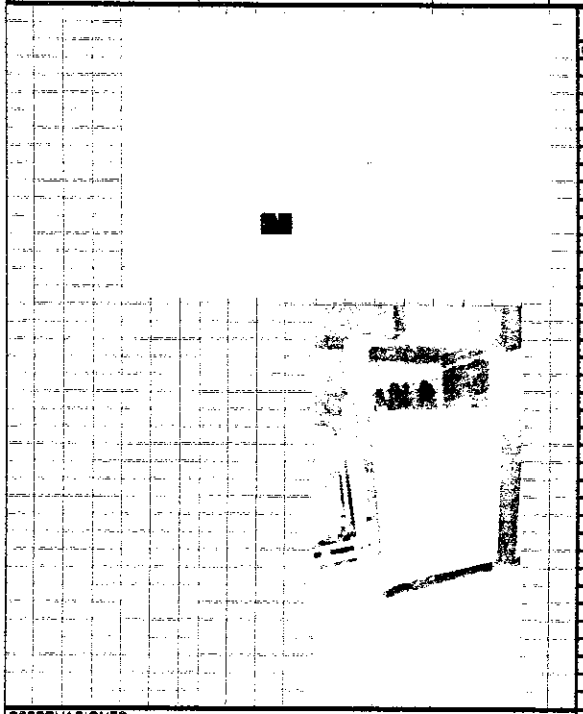

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
CASETA DEL TRANFORMADOR	1,00	1,00	1	1,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	1,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS


UAC SAS

MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	EB.SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDA TRANSFORMADOR	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 48 .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

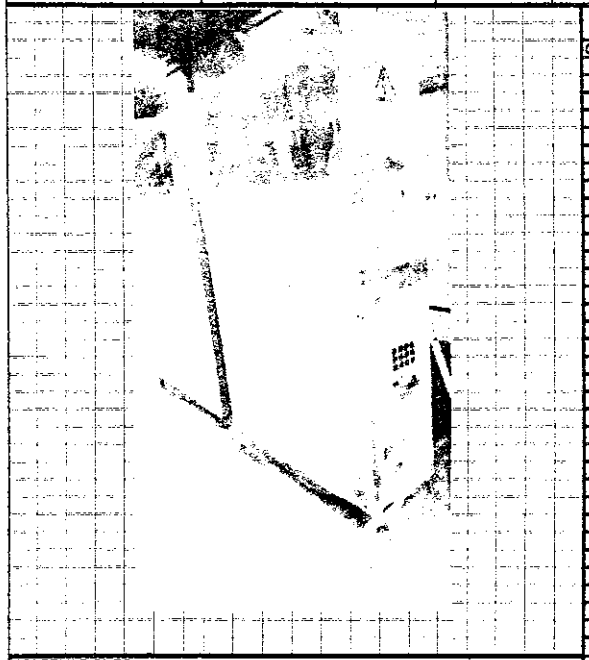

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
CASETA DEL TRANFORMADOR	1,00	1,00	1	1,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	1,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E11.CONSTRUCCIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA CS 280	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 4B .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

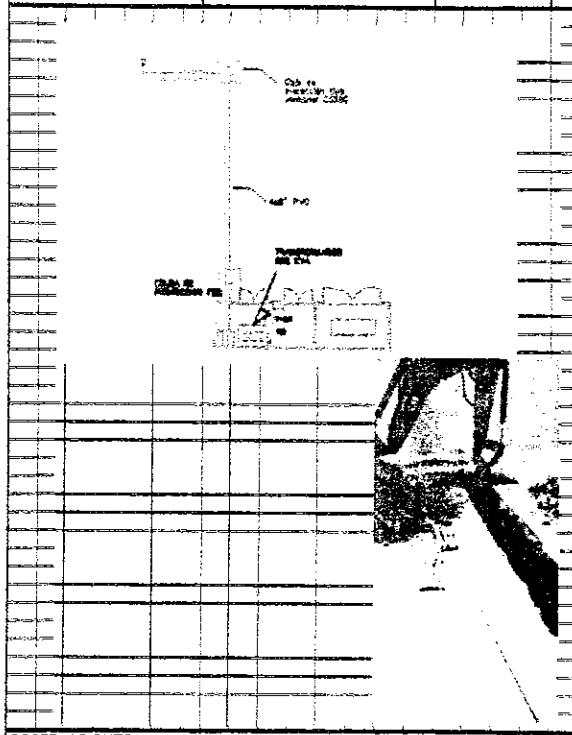

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
INTERIOR BODEGA	3,00	1,00	3	1,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	1,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E12.SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR TRIFASICO 225 kVA- 11400/208/120V	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA, BODEGA 4B ,PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

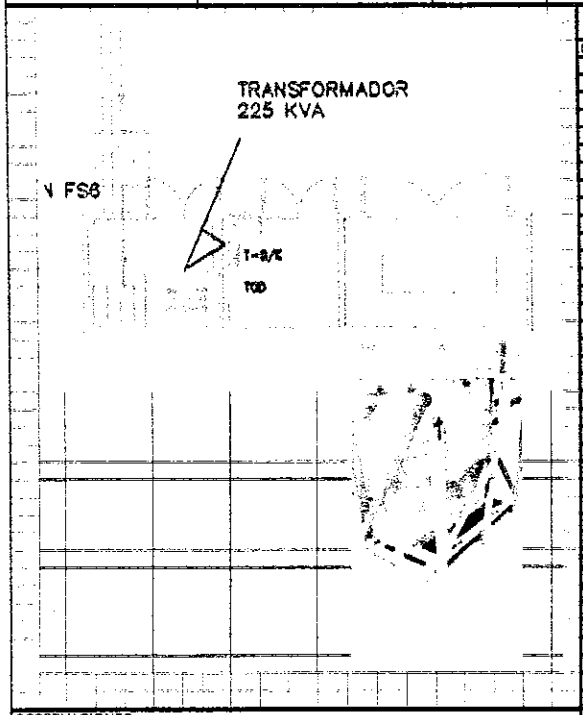

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
CASETA DEL TRANSFORMADOR	1,00	1,00	1	1,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	1,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORO	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE		
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	CONTRATO N°	PN DIRAF 08-6-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E29.SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TIPO CAMPANA LED 90W	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA, BODEGA 4B ,PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

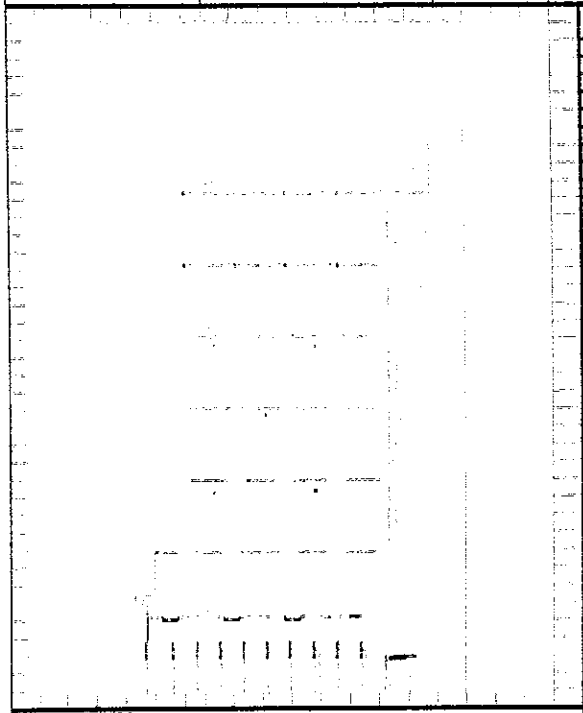

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
INTERIOR BODEGA	30,00	20,00	30	20,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	20,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	20,00


CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	
FECHA DD 13 MM 2 AA 20	CORTE N° 1 ELABORO	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-6-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E30.SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA HERMÉTICA LED 1X18W PC-UV	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 4B .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

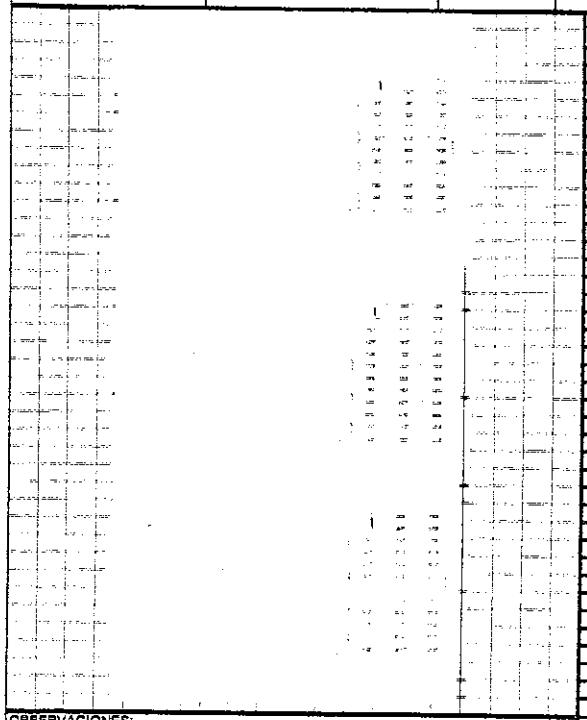

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
DENTRO DE ARCHIVO PISO 1 , PISO 2 Y PISO 3	316,00	216,00	316	216,00

Cantidad real ejecutada	216,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	216,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS


UAC SAS

MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORO	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CONTRATO N°	PN DIRAF 06-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E31.SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 2X1.6W	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 48 PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

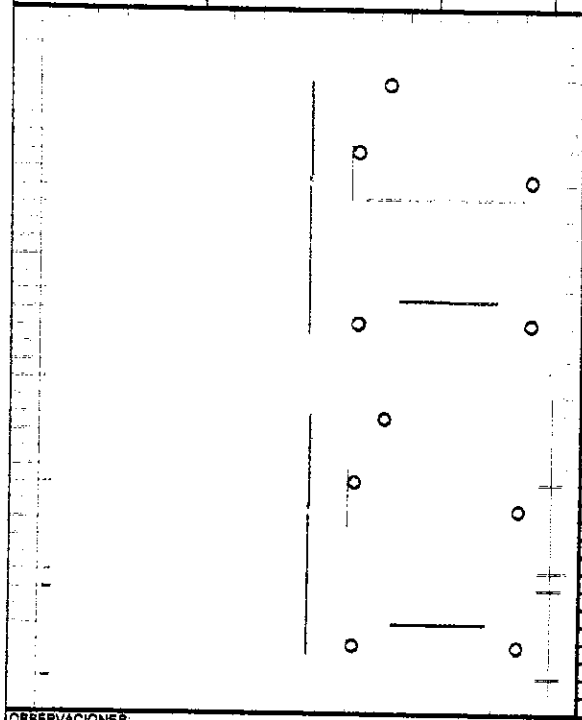

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
DENTRO DE ARCHIVO PIO 2 Y PISO 3	20,00	10,00	20	10,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	10,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	10,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORO	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E32.SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CON CABLE LIBRE DE HALOGENOS	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 48 .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

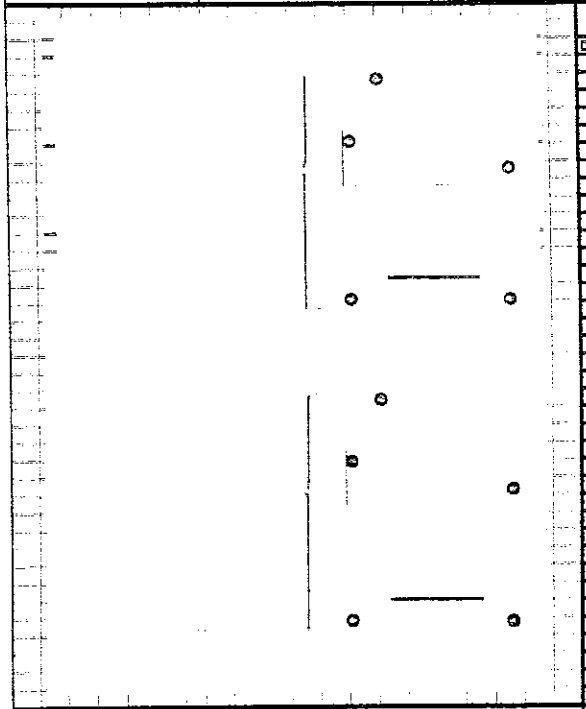

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
DENTRO DE ARCHIVO	20,00	10,00	20	10,00

Cantidad real ejecutada	10,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	10,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS


UAC SAS

MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORO	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CONTRATO N°	PN DIRAF 08-8-10178-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E37.SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1 1/4" CON ACCESORIOS	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA, BODEGA 48 ,PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

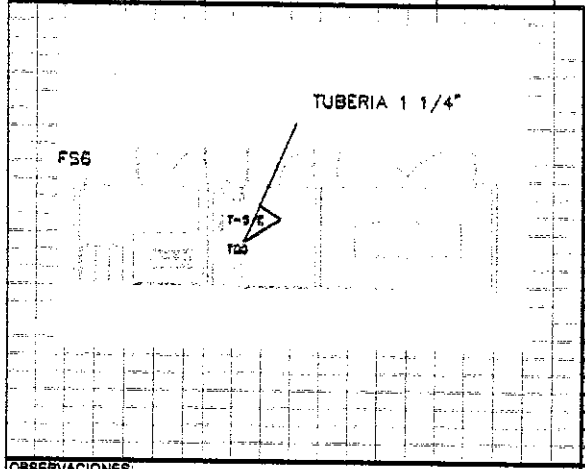

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
CUARTOS DE SUBESTACION	50,00	20,00	50	20,00
Cantidad real ejecutada				20,00
Descuento cantidad pagada acta No.				
TOTAL				20,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORO	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CONTRATO N°	PN DIRAF 08-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E38.SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EMT 1	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 48 .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
CUARTOS DE SUBESTACIÓN Y LÁMPARAS	140,00	40,00	140	40,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	40,00
Descuento cantidad pegada acta No.	
TOTAL	40,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS


UAC SAS

MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORO	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CONTRATO N°	PN DIRAF 06-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	E41.CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN BANCO DE DUCTOS 4Ø6"PVC ZONA DURA	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA, BODEGA 48 ,PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

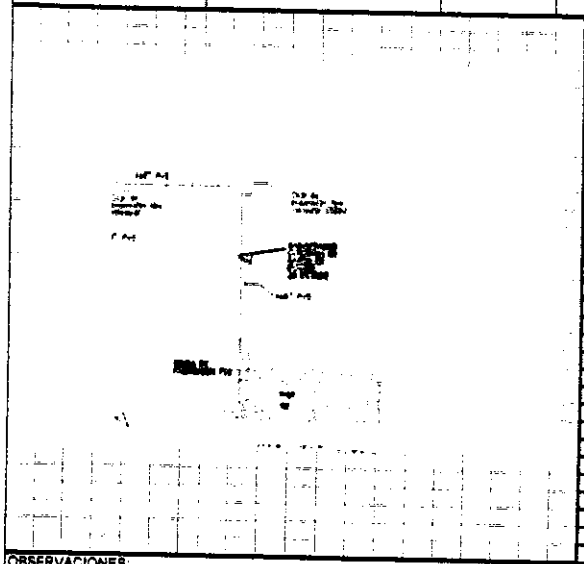

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
INTERIOR CORREDOR BODEGA	30,00	30,00	30	30,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	30,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	30,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS


UAC SAS

MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
CONTRATO N°	PN DIRAF 09-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	245.CONSTRUCCIÓN LOCAL SUBESTACIÓN	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 48 PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

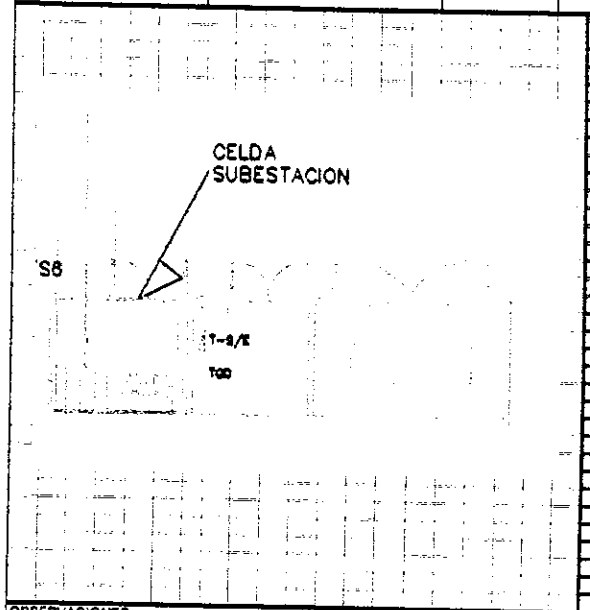

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
INTERIOR BODEGA	1,00	1,00	1	1,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	1,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE Nº	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO Nº: PN DIRAF 06-8-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ITEM	247.CONSTRUCCIÓN LOCAL TABLEROS BAJA TENSIÓN	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 4B .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

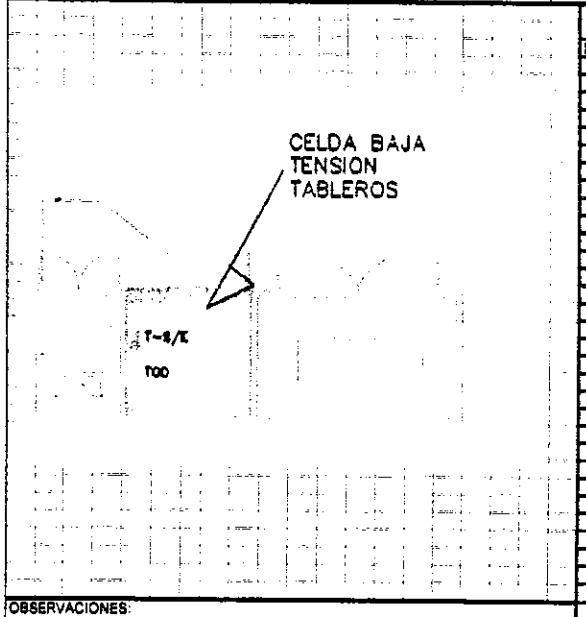

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
INTERIOR BODEGA	1,00	1,00	1	1,00

Cantidad real ejecutada	1,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	1,00


OBSERVACIONES:

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	
FECHA DD 13 MM 2 AA 20	CORTE N° 1 ELABORÓ	UAC SAS
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS	CONTRATO N° PN DIRAF 08-6-10176-19

CAPÍTULO	INSTALACIONES ELÈCTRICAS	ITEM	E48.CONSTRUCCIÓN LOCAL PLANTA ELÉCTRICA	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 4B PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

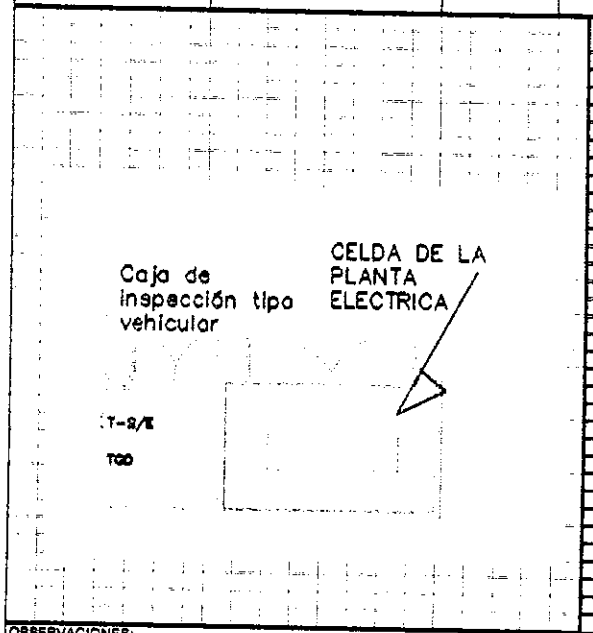

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
INTERIOR BODEGA	1,00	1,00	1	1,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	1,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	1,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS


MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS

CONTRATO N° PN DIRAF 06-6-10176-19

CAPÍTULO	ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES	ITEM	2. ADECUACIÓN SISTEMA PUESTA A TIERRA TELECOMUNICACIONES	UNID.	UN	UBICACIÓN	FUNZA BODEGA 4B PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

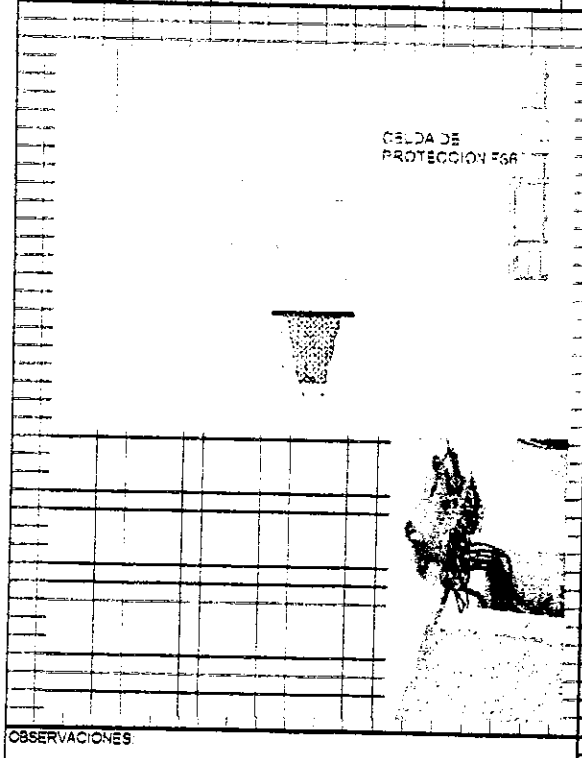

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
Cuarto de comunicaciones	1,00	0,35	1	0,35
Cantidad real ejecutada				0,35
Descuento cantidad pagada acta No.				
TOTAL				0,35

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-6-10178-19

CAPÍTULO	INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A	ITEM	5. INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6 A	UNID.	UND	UBICACIÓN	FUNZA, BODEGA 4B .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

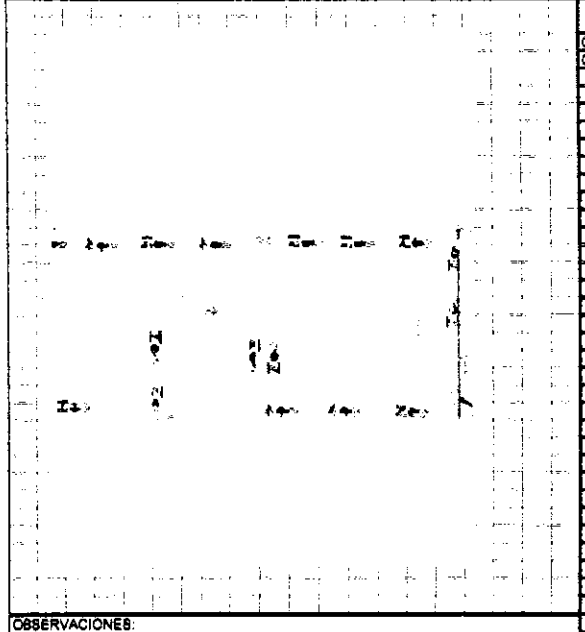

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
OFICINA 1 Y 2 DE PISO 1	46,00	16,10	46	16,10
OFICINA 1 Y 2 DE PISO 2				

OBSERVACIONES:		
	Cantidad real ejecutada	16,10
	Descuento cantidad pagada acta No.	
	TOTAL	16,10

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 08-6-10178-19

CAPÍTULO	ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	ITEM	7. ADQUISICIÓN SISTEMA DE UPS 20 KVA	UNID.	UND	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 4B PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

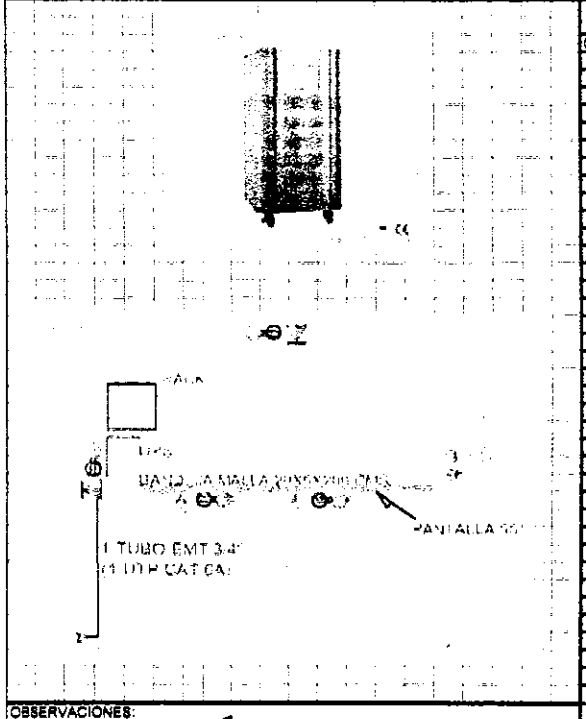

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
CUARTO DE MONITOREO	1,00	0,35	1	0,35

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	0,35
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	0,35

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORÓ	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-8-10178-19

CAPÍTULO	INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA	ITEM	11. INSTALACIÓN BANDEJA TIPO CANASTILLA	UNID.	MTR	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 4B .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA

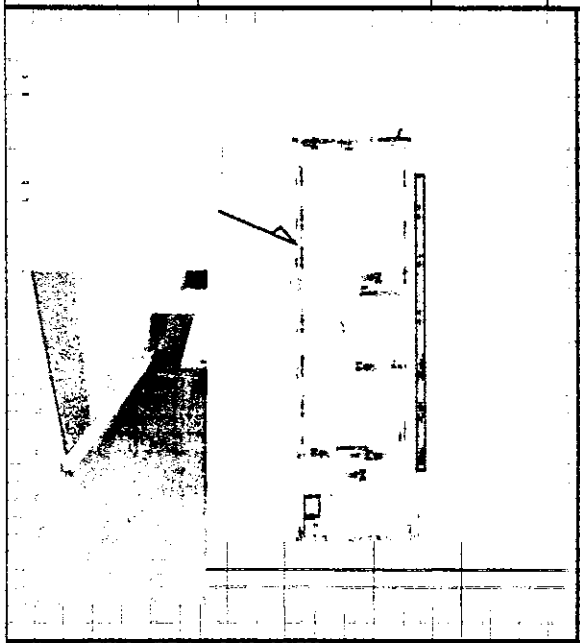

Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
INTERIOR BODEGA LATERALMENTE	80,00	28,00	80	28,00

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	28,00
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	28,00

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA


VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS

UAC SAS	MEMORIAS DE CALCULO INTERPOL	

FECHA	DD	13	MM	2	AA	20	CORTE N°	1	ELABORO	UAC SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE
CONTRATISTA	URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS — CONTRATO N° PN DIRAF 06-8-10178-19

CAPÍTULO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA	ITEM	13.ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PLANTA DE EMERGENCIA, CABINA INSONORA Y TRANSFERENCIA	UNID.	GBL	UBICACIÓN	FUNZA. BODEGA 4B .PARQUE INDUSTRIAL SANTA LUCIA



Localización	CONTRATADAS	EJECUTADAS	No Elem.	Medida Total
INTERIOR BODEGA CUARTO DE PLANTA DE EMEI	1,00	0,35	1	0,35

OBSERVACIONES:

Cantidad real ejecutada	0,35
Descuento cantidad pagada acta No.	
TOTAL	0,35

CONTRATISTA UAC SAS
CARLOS MIGUEL URIBE BAUSTISTA

VoBo Supervisor Técnico Contrato
Subintendente ADAN DAVID RUBIO HOYOS
