TEXVN-ARQ S.A.S ***NIT. 900634286-5***
DISEÑO Y CONSTRUCCION

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO - ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO – DEMOLICION - PREPARACION DEL TERRENO - INSTALACIONES ELECTRICAS - INSTALACIONES DE FONTANERIA,CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO - AMPLIACIONES Y REFORMA COMPLETAS DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL –TODAS LAS DEMAS INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

Bogotá 10 de enero de 2025

Señores
SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Sr. Jorge González Herrera
Supervisor del contrato
Subdirección de Empleo Y Formación
jgonzalez@desarrolloeconomico.gov.co
contactenos@desarrolloeconomico.gov.co
Carrera 10 No. 28 - 49 - Torre A. Bogotá, D.C
Teléfonos: 3693777 - 3693750 Fax: 2695402

Ref: **ID DEL CONTRATO EN SECOP:** ***CO1.SLCNTR.13598315***

CONTRATO: 1314-2024

OBJETO "REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO."

ASUNTO: ***OFC – SDDE – No 45-2024 – ENTREGA DE ACTA FINAL DE OBRA No. 2 Y SUS ANEXOS***

Estimado Ing. Jorge

Por medio del presente me permito remitir la información del acta de corte parcial de obra No. 2 correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2024 al 07 de enero de 2025, para su revisión y aprobación:

- Acta de recibo final de obra No. 2
- Memorias de calculo de cantidades corte No. 2

Cordialmente,

Arq. Gilvert Parra
ESP. GERENCIA DE OBRAS.
TEXVN-ARQ S.A.S
Representante Legal

TEXVN-ARQ S.A.S **NIT. 900634286-5**
DISEÑO Y CONSTRUCCION

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO - ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO – DEMOLICION - PREPARACION DEL TERRENO - INSTALACIONES ELECTRICAS - INSTALACIONES DE FONTANERIA,CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO - AMPLIACIONES Y REFORMA COMPLETAS DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL –TODAS LAS DEMAS INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

(anexo 1)
ACTA FINAL DE OBRA No. 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | BOGOTÁ

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 2

OBJETO: ADECUACIONES ADAPTACIONES Y TRASLADO DE KIOSKOS UBICADOS EN LA Calle 68 d bis a sur No. 49 f 70, Av. 1 de Mayo No. 01 40 sur, Calle 32 sur23- 62, Calle 165 7 -38 y Av Esmeralda 63 A 52

PERIODO: DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

VALOR PRESENTE ACTA : 36.046.680,00

CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA TOTALIDAD DE LOS KIOSKOS.						BALANCE PRESUPUESTAL				ACTAS PARCIALES DE OBRA									
						DIFERENCIAS MAYORES (+) Y MENORES (-) CANTIDADES DE OBRA		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1			ACTA PARCIAL No. 2			ACUMULADO		POR EJECUTAR	
CAP.	ITEMS	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	CANTIDAD KIOSKOS	VALOR PARCIAL DIRECTO	CANTIDAD TOTAL	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL DIRECTO	%	CANT	VALOR PARCIAL DIRECTO	%	CANTIDAD ACUM.	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
1.	ADECUACIONES					-	-	-	-									-	
1.2.1	Desmonte de piso en caucho	UND	5,00	55.000,00	275.000,00	-	-	5,00	275.000,00	5,00	275.000,00	100%				5,00	275.000,00	-	-
1.2.2	Suministro e instalacion piso caucho de color	M2	60,00	65.000,00	3.900.000,00	- 21,50	- 1.397.500,00	38,50	2.502.500,00	7,70	500.500,00	20%	30,80	2.002.000,00	80%	38,50	2.502.500,00	-	-
1.2.3	Pintura perimetral del pefil base en color negro esmalte mate	ML	75,00	9.600,00	720.000,00	73,88	709.248,00	148,88	1.429.248,00	67,25	645.600,00	45%	81,63	783.648,00	55%	148,88	1.429.248,00	-	-
1.2.4	Pintura de rampa acceso movilidad reducida en color negro esmalte mate	M2	3,50	14.000,00	49.000,00	- 0,09	- 1.260,00	3,41	47.740,00	3,41	47.740,00	100%				3,41	47.740,00	-	-
1.2.5	Desmonte y montaje techo en Upvc Kiosco	GL	1,00	150.000,00	150.000,00	-	-	1,00	150.000,00	1,00	150.000,00	100%				1,00	150.000,00	-	-
1.2.6	Desmonte y montaje de paneles laminas madera plastica Deck (Plaza Artesanos)	GL	1,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	1,00	1.050.000,00	1,00	1.050.000,00	100%				1,00	1.050.000,00	-	-
1.2.7	Desmonte de marcos y ventanas (Plaza de artesanos)	GL	1,00	180.000,00	180.000,00	-	-	1,00	180.000,00	1,00	180.000,00	100%				1,00	180.000,00	-	-
1.2.8	Desmonte de ventanas montantes (Plaza de artesanos)	UND	15,00	30.000,00	450.000,00	- 5,00	- 150.000,00	10,00	300.000,00	10,00	300.000,00	100%				10,00	300.000,00	-	-
1.2.9	Desmonte de luces y redes electricas (Plaza de artesanos)	GL	1,00	100.000,00	100.000,00	-	-	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	100%				1,00	100.000,00	-	-
1.2.10	Desmonte de estructura metalica de cubierta y base (Plaza de artesanos)	GL	1,00	229.000,00	229.000,00	-	-	1,00	229.000,00	1,00	229.000,00	100%				1,00	229.000,00	-	-
1.2.11	Desmonte de piso en lamina de madera Deck (Plaza de artesanos)	GL	1,00	120.000,00	120.000,00	-	-	1,00	120.000,00	1,00	120.000,00	100%				1,00	120.000,00	-	-
1.2.12	Desmonte de estructura metalica de kiosko (Plaza de artesanos)	GL	1,00	900.000,00	900.000,00	-	-	1,00	900.000,00	1,00	900.000,00	100%				1,00	900.000,00	-	-
1.2.13	Traslado del mobiliario a otro punto	GL	1,00	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00		-		1,00	500.000,00	100%	1,00	500.000,00	-	-
	Valor Capitulo				**8.623.000,00**	**-**	**- 839.512,00**	**-**	**7.783.488,00**		**4.497.840,00**			**3.285.648,00**		**-**	**7.783.488,00**	**-**	**-**
						-	-	-	-									-	-
2.						-													
2,1,1	Restauración muros panel Deck	M2	35,00	228.000,00	7.980.000,00	29,60	6.748.800,00	64,60	14.728.800,00	38,76	8.837.280,00	60%	25,84	5.891.520,00	40%	64,60	14.728.800,00	-	-
2,1,2	Lavado y restauracion de fachadas en Deck a dos caras	M2	95,00	16.000,00	1.520.000,00	- 47,50	- 760.000,00	47,50	760.000,00	23,75	380.000,00	50%	23,75	380.000,00	50%	47,50	760.000,00	-	-
2,1,3	Lavado y restauracion de pisos en Deck	M2	13,50	16.000,00	216.000,00	- 1,60	- 25.600,00	11,90	190.400,00	4,76	76.160,00	40%	7,14	114.240,00	60%	11,90	190.400,00	-	-
2,1,4	Lavado de vidrios a dos caras	M2	108,00	4.700,00	507.600,00	- 108,00	- 507.600,00	-	-		-					0,00	-	-	-
2,1,5	Lavado e instalación de cubierta en UPVC (Paza de Artesanos)	GL	1,00	500.000,00	500.000,00	-	-	1,00	500.000,00		-		1,00	500.000,00	100%	1,00	500.000,00	-	-
2,1,6	Lavado instalación y ajuste de cubierta teja upvc.	M2	69,00	13.500,00	931.500,00	- 2,20	- 29.700,00	66,80	901.800,00	50,10	676.350,00	75%	16,70	225.450,00	25%	66,80	901.800,00	-	-
2,1,7	Adecuacion perimentral de kiosko (matamaleza y gravilla)	M2	65,00	35.000,00	2.275.000,00	- 59,00	- 2.065.000,00	6,00	210.000,00		-		6,00	210.000,00	100%	6,00	210.000,00	-	-
	Valor Capitulo				**13.930.100,00**	**-**	**3.360.900,00**	**-**	**17.291.000,00**		**9.969.790,00**			**7.321.210,00**		**-**	**17.291.000,00**	**-**	**-**
						-	-	-	-		-					-	-	-	-
3	INSTALACIONES ELECTRICAS					-	-	-	-		-					-	-	-	-
3,1,1	Suministro e instalacion lamparas	UND	7,00	130.000,00	910.000,00	2,00	260.000,00	9,00	1.170.000,00	3,00	390.000,00	33%	6,00	780.000,00	67%	9,00	1.170.000,00	-	-
	Valor Capitulo				**910.000,00**	**-**	**260.000,00**	**-**	**1.170.000,00**		**390.000,00**			**780.000,00**		**-**	**1.170.000,00**	**-**	**-**
						-	-	-	-		-							-	-
4	CARPINTERIA EN ALUMINO					-	-	-	-		-							-	-
4,1,1	Limpieza y ajustes de puertas corredizas y ventanas	UND	10,00	90.000,00	900.000,00	- 10,00	- 900.000,00	-	-		-							-	-
4,1,2	Ajuste limpieza e instalación de ventanas y montantes	UND	15,00	90.000,00	1.350.000,00	17,00	1.530.000,00	32,00	2.880.000,00	32,00	2.880.000,00	100%				32,00	2.880.000,00	-	-
4,1,3	Ajustes limpieza e instalacion de puerta corrediza incluye cerradura tipo pico de loro	UND	5,00	160.000,00	800.000,00	-	-	5,00	800.000,00	2,00	320.000,00	40%	3,00	480.000,00	60%	5,00	800.000,00	-	-
	Valor Capitulo				**3.050.000,00**	**-**	**630.000,00**	**-**	**3.680.000,00**		**3.200.000,00**			**480.000,00**			**3.680.000,00**	**-**	**-**
						-	-	-	-		-							-	-
5	CARPINTERIA METALICA					-	-	-	-		-							-	-
5,1,1,	Suministro e instalacion de rampas en lamina alfajor incluye pintura	UND	3,00	560.000,00	1.680.000,00	1,00	560.000,00	4,00	2.240.000,00	2,00	1.120.000,00	50%	2,00	1.120.000,00	50%	4,00	2.240.000,00	-	-
5,1,2,	Instalación y armada de estructura para kiosko (Plaza de Artesanos)	GL	1,00	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	1,00	1.420.000,00		-		1,00	1.420.000,00	100,00%	1,00	1.420.000,00	-	-
	Valor Capitulo				**3.100.000,00**	**-**	**560.000,00**	**-**	**3.660.000,00**		**1.120.000,00**			**2.540.000,00**			**3.660.000,00**	**-**	**-**
						-	-	-	-		-							-	-
6	OTROS					-	-	-	-									-	-
6,1,2	Acometida final para Kiosco (trasalado Plaza de Artesanos)	GL	1,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	1,00	1.400.000,00		-		1,00	1.400.000,00	100,00%	1,00	1.400.000,00	-	-
	Valor Capitulo				**1.400.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.400.000,00**		**-**			**1.400.000,00**		**-**	**1.400.000,00**	**-**	**-**
7	OTRAS ACTIVIDADES					-	-	-	-									-	0
7,1	Suministro e instalación de salida de iluminación para posterior instalación de lamparas, incluye derivacion desde el punto actual mas cercano y canaleta tipo dexson plastica blanca.	UND		148.000,00		7,00	1.036.000,00	7,00	1.036.000,00				7,00	1.036.000,00	100%	7,00	1.036.000,00	-	-
7,2	Limpieza y brillado de estructura portante existente en acero inoxidable.	GL		586.300,00		5,00	2.931.500,00	5,00	2.931.500,00				5,00	2.931.500,00	100%	5,00	2.931.500,00	-	-
7,3	Nivelación de rampa de acceso al nivel de llegada en piso deck	UND		180.000,00		1,00	180.000,00	1,00	180.000,00				1,00	180.000,00	100%	1,00	180.000,00	-	-
7,4	Corte de raiz de arbol ubicado al costado sur del kiosko, Incluye Desmonte y reinstalación de adoquín de ser necesario.	GL		163.500,00		1,00	163.500,00	1,00	163.500,00				1,00	163.500,00	100%	1,00	163.500,00	-	-
7,5	Suministro e instalación de manijas para puerta ventana en aluminio.	UND		76.400,00		4,00	305.600,00	4,00	305.600,00				4,00	305.600,00	100%	4,00	305.600,00	-	-
7,6	Selección y corte de ser necesario en material deck existente para posterior reinstalacion en paneles interiores.	M2		60.625,00		37,00	2.243.125,00	37,00	2.243.125,00				37,00	2.243.125,00	100%	37,00	2.243.125,00	-	-
7,7	Suminstro e instalacion de vidrio tipo laminado 3 + 3 incoloro para fijos en kioskos, incluye desmonte del actual y cambio de empaques de ser necesarios.	M2		350.000,00		21,65	7.578.375,00	21,65	7.578.375,00				21,65	7.578.375,00	100%	21,65	7.578.375,00	-	-
7,8	Suministro e instalación de perfil para remate superior para la correcta instalación del wall panel en fachadas de kioskos de forma vertical con junta.	ML		45.796,00		31,50	1.442.574,00	31,50	1.442.574,00				31,50	1.442.574,00	100%	31,50	1.442.574,00	-	-
	Valor Capitulo					**-**	**15.880.674,00**	**-**	**15.880.674,00**					**15.880.674,00**			**15.880.674,00**	**-**	**-**
	COSTO DIRECTO				**$ 31.013.100,00**		**$ 19.852.062,00**		**50.865.162,00**		**19.177.630,00**			**31.687.532,00**			**50.865.162,00**		**-**
	ADMINISTRACION			0,05	$ 1.550.655,00		$ 992.603,10		$ 2.543.258,10		$ 958.881,50			$ 1.584.376,60			$ 2.543.258,10	$	-
	IMPREVISTOS			0,04	$ 1.116.471,60		$ 714.674,23		$ 1.831.145,83		$ 690.394,68			$ 1.140.751,15			$ 1.831.145,83	$	-
	UTILIDAD			0,04	$ 1.343.901,00		$ 860.256,02		$ 2.204.157,02		$ 831.030,63			$ 1.373.126,39			$ 2.204.157,02	$	-
	IVA SOBRE UTILIDAD			0,19	$ 255.341,19		$ 163.448,64		$ 418.789,83		$ 157.895,82			$ 260.894,01			$ 418.789,83	$	-
	COSTO TOTAL				**$ 35.279.468,79**		**$ 22.583.044,00**		**57.862.513,00**		**21.815.833,00**			**36.046.680,00**			**57.862.513,00**		**-**

Firma:
GILVERT ORLANDO PARRA VELANDIA
Representante Legal
TEXVN ARQ S.A.S
901.534.286-5

Firma:
JORGE GONZALEZ HERRERA
Supervisor del Contrato
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

TEXVN-ARQ S.A.S **NIT. 900634286-5**
DISEÑO Y CONSTRUCCION

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO - ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO – DEMOLICION - PREPARACION DEL TERRENO - INSTALACIONES ELECTRICAS - INSTALACIONES DE FONTANERIA,CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS - TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO - AMPLIACIONES Y REFORMA COMPLETAS DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL –TODAS LAS DEMAS INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

(anexo 2)
MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES CORTE No. 2

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	RAFAEL URIBE URIBE / SAN CRISTOBAL / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	1.2.2	Suministro e instalacion piso caucho de color	UNID.	M2	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL







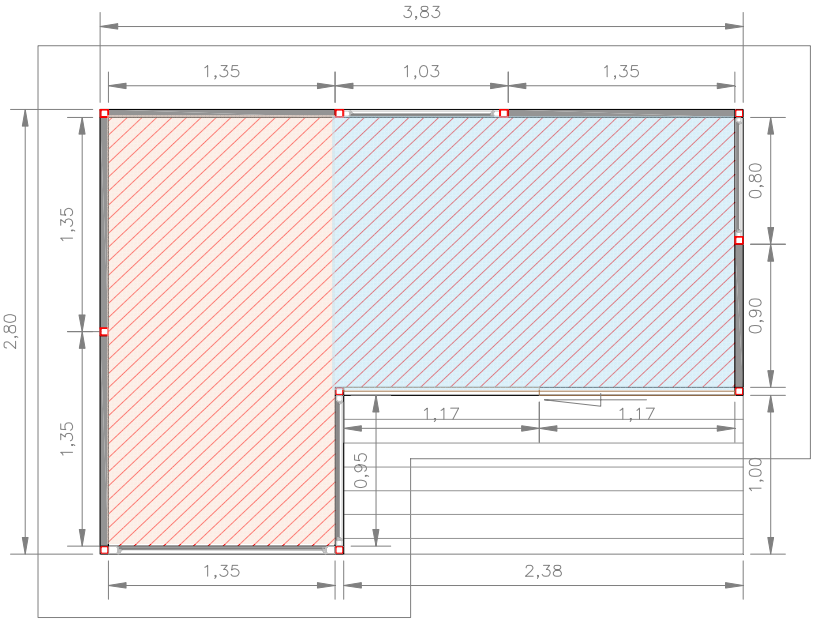

Localización	Dimensiones Alto	Ancho	Longitud	No Elem.	Medida Total
AREA INTERNA A R.U.U		1,35	2,70		3,65
AREA INTERNA B R.U.U		1,70	2,38		4,05
AREA INTERNA A R.U.U		1,35	2,70		3,65
AREA INTERNA B R.U.U		1,70	2,38		4,05
AREA INTERNA A R.U.U		1,35	2,70		3,65
AREA INTERNA B R.U.U		1,70	2,38		4,05
AREA INTERNA A R.U.U		1,35	2,70		3,65
AREA INTERNA B R.U.U		1,70	2,38		4,05
Subtotal					30,80
Vienen					0,00
TOTAL					30,80

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	1.2.3	Pintura perimetral del pefil base en color negro esmalte mate	UNID.	ML	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL







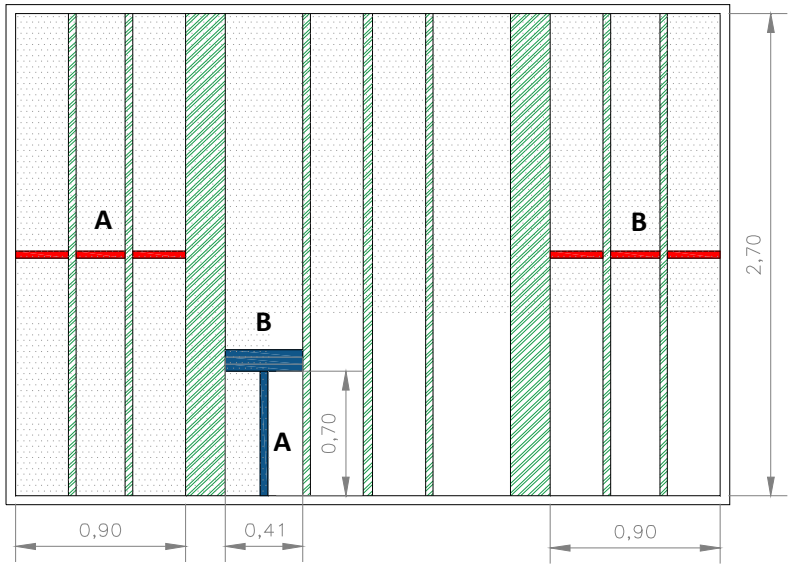

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
PERFIL INTERNO LONGITUDINAL C.1			2,70	9,00	24,30
PERFIL INTERNO LONGITUDINAL C.2			2,70	9,00	24,30
PERFIL INTERNO LONGITUDINAL C.3			2,70	9,00	24,30
PERFIL INTERNO TRANSVERSAL A			0,90	3,00	2,70
PERFIL INTERNO TRANSVERSAL B			0,90	3,00	2,70
PERFIL INTERNO LONGITUDINAL A			0,70	3,00	2,10
PERFIL INTERNO TRANSVERSAL B			0,41	3,00	1,23
Subtotal					81,63
Vienen					0,00
TOTAL					81,63

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	1.2.13	Traslado del mobiliario a otro punto	UNID.	GL	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL







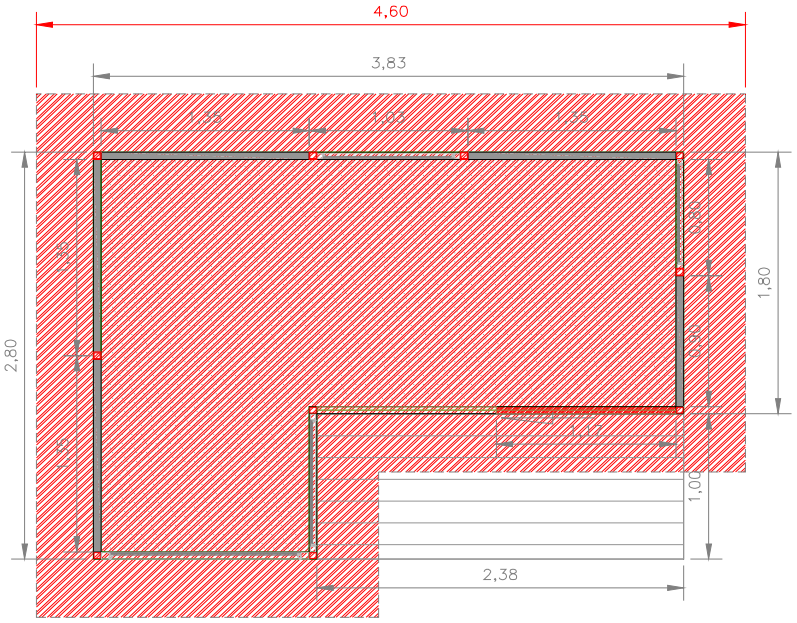

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
ARTESANOS				1,00	1,00
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	RAFAEL URIBE URIBE / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	2,1,1	Restauración muros panel Deck	UNID.	M2	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL












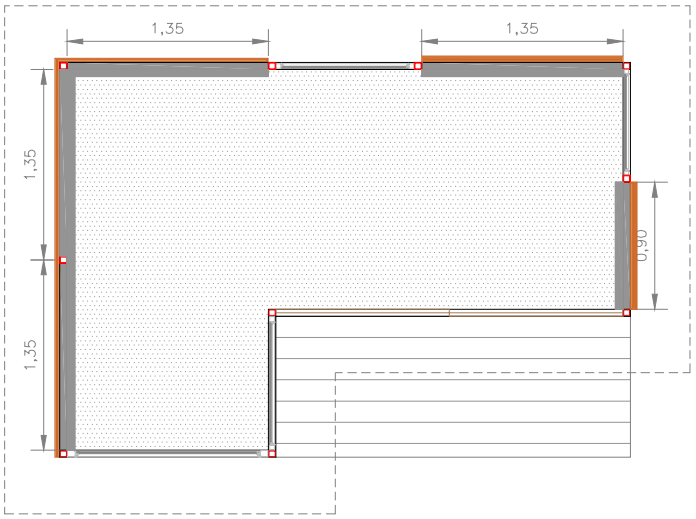

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
FACHADAS RAFAEL URIBE URIBE				12,92	12,92
					-
FACHADAS ARTESANOS				12,92	12,92
Subtotal					25,84
Vienen					0,00
TOTAL					25,84

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	USAQUÉN-SERVITA / RAFAEL URIBE URIBE / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	2,1,2	Lavado y restauracion de fachadas en Deck a dos caras	UNID.	M2	UBICACIÓN GENERAL: GENERAL







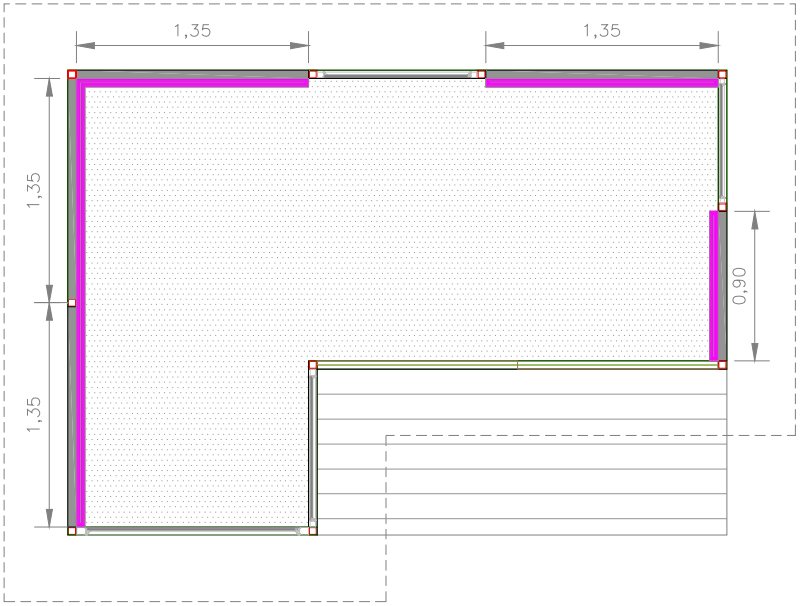

Localización	Dimensiones Alto	Ancho	Longitud	No Elem.	Medida Total
LAVADO AREA INTERNA USAQUEN	1,51		1,35	2,00	4,07
	1,51		0,90	0,50	0,68
LAVADO AREA INTERNA RAFAEL URIBE URIBE	1,51		1,35	2,00	4,07
	1,51		0,90	0,50	0,68
LAVADO AREA INTERNA CIUDAD BOLIVAR	1,51		1,35	2,00	4,07
	1,51		0,90	0,50	0,68
LAVADO AREA INTERNA ARTESANOS	1,51		1,35	4,00	8,14
	1,51		0,90	1,00	1,36
Subtotal					23,75
Vienen					0,00
TOTAL					23,75

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:


TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	RAFAEL URIBE URIBE / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	2,1,3	Lavado y restauracion de pisos en Deck	UNID.	M2	UBICACIÓN GENERAL: GENERAL



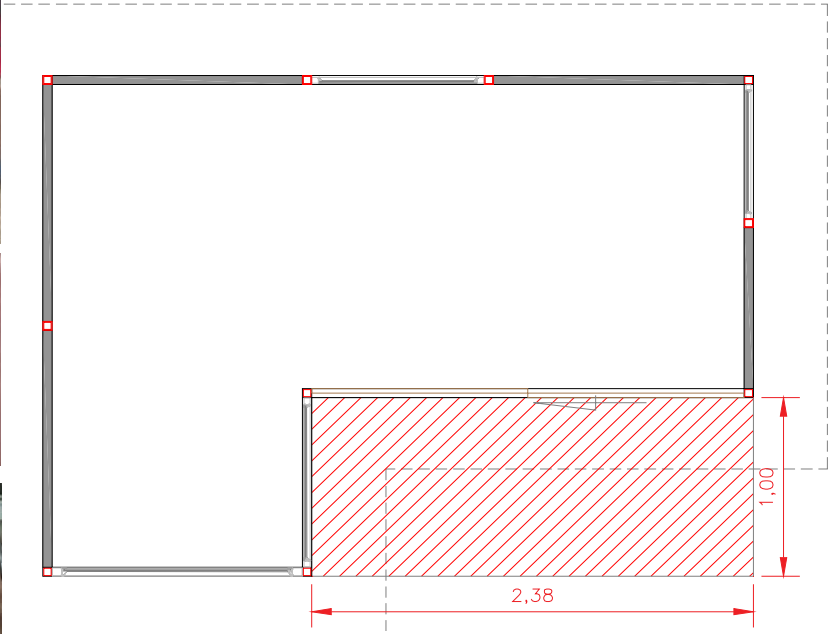

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
ACCESO RAFAEL URIBE URIBE		1,00	2,38		2,38
ACCESO CIUDAD BOLIVAR		1,00	2,38		2,38
ACCESO ARTESANOS		1,00	2,38		2,38
Subtotal					7,14
Vienen					0,00
TOTAL					7,14

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:


OBSERVACIONES:


TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	2.1.5	Lavado e instalación de cubierta en UPVC (Paza de Artesanos)	UNID.	GL	UBICACIÓN GENERAL: GENERAL

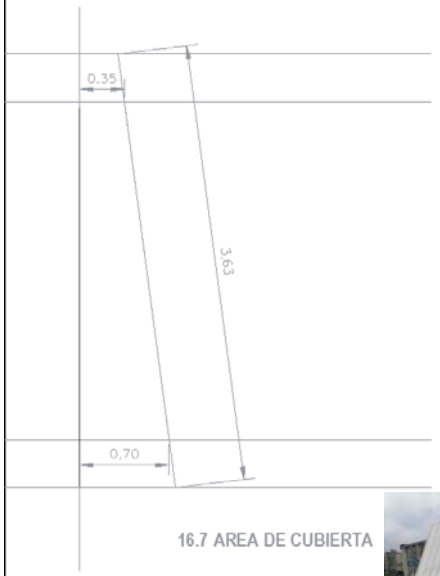

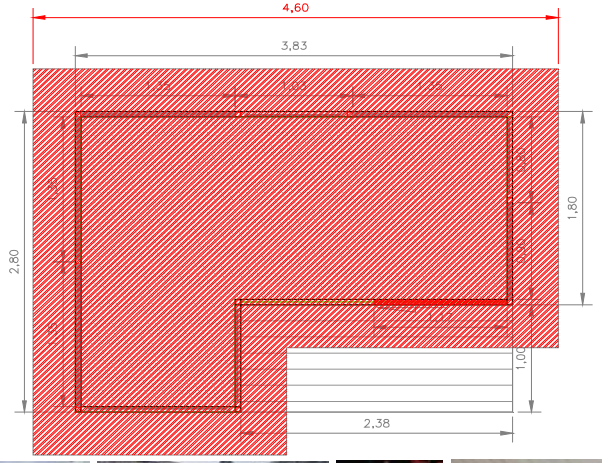

16.7 AREA DE CUBIERTA









Localización	Dimensiones Alto	Ancho	Longitud	No Elem.	Medida Total
CUBIERTA ARTESANOS				1,00	1,00
					-
					-
					-
					-
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:


OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	CIUDAD BOLIVAR	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	2.1.6	Lavado instalación y ajuste de cubierta teja upvc.	UNID.	M2	UBICACIÓN GENERAL: GENERAL

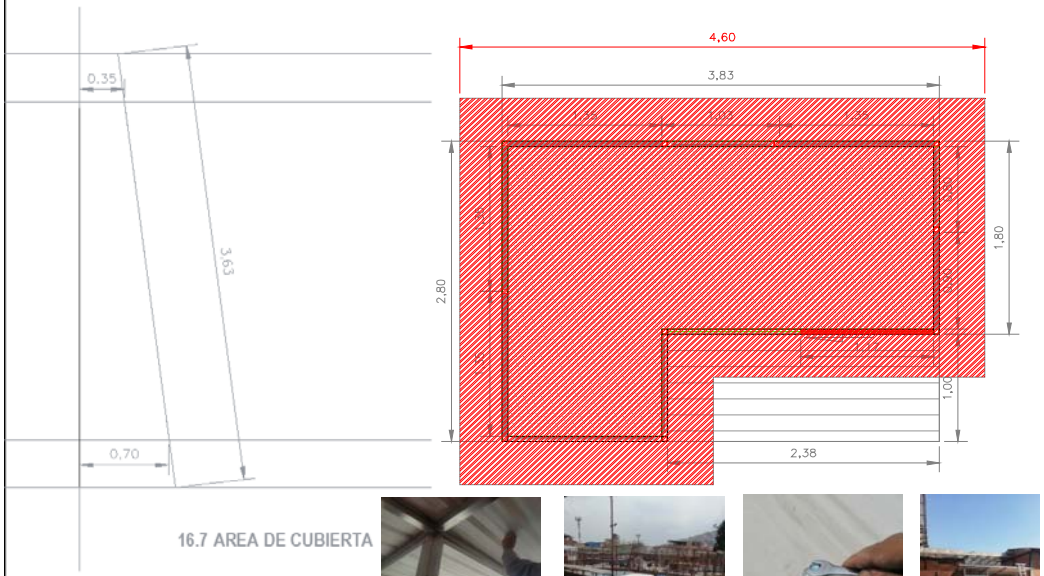






Localización	Dimensiones Alto	Ancho	Longitud	No Elem.	Medida Total
CUBIERTA CIUDAD BOLIVAR		3,63	4,60		16,70
					-
					-
					-
					-
Subtotal					16,70
Vienen					0,00
TOTAL					16,70

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	RAFAEL URIBE URIBE	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025


CAPÍTULO	2,1,7	Adecuacion perimentral de kiosko (matamaleza y gravilla)	UNID.	M2	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL









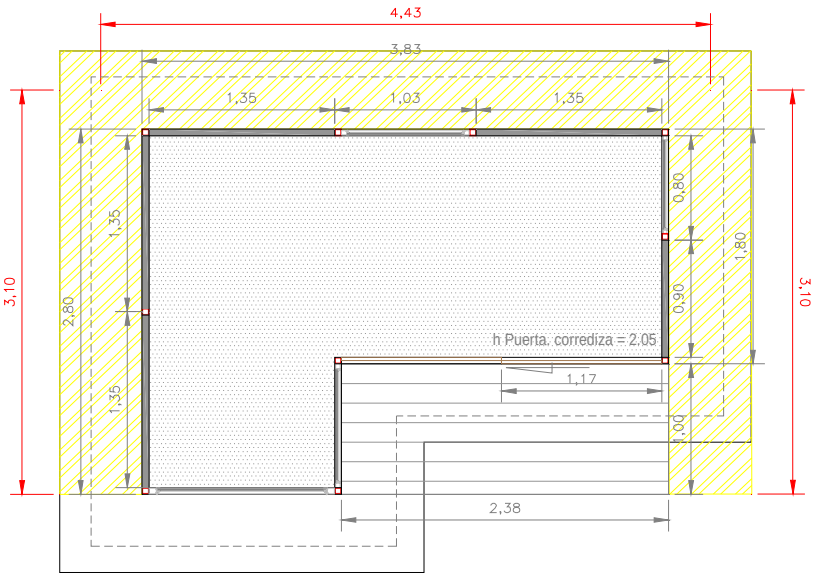

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
PERIMETRO RAFAEL URIBE URIBE		0,56	3,10		1,75
		0,56	4,43		2,50
		0,56	3,10		1,75
					-
					-
Subtotal					6,00
Vienen					0,00
TOTAL					6,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	RAFAEL URIBE URIBE / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	3,1,1	Suministro e instalacion lamparas	UNID.	UND	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL





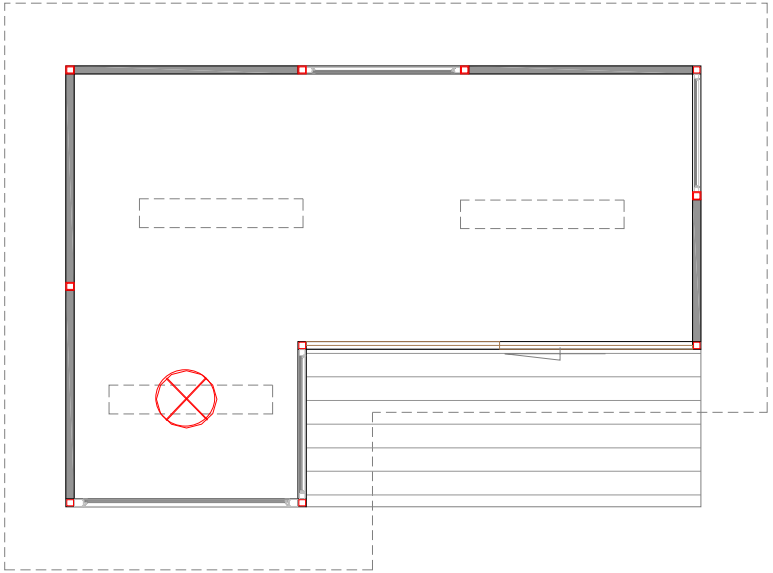

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
LAMPARAS RAFAEL URIBE URIBE				1,00	1,00
					-
LAMPARAS CIUDAD BOLIVAR				2,00	2,00
					-
LAMPARAS ARTESANOS				3,00	3,00
Subtotal					6,00
Vienen					0,00
TOTAL					6,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	SAN CRISTOBAL / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	4,1,3	Ajustes limpieza e instalacion de puerta corrediza incluye cerradura tipo pico de loro	UNID.	UND	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL





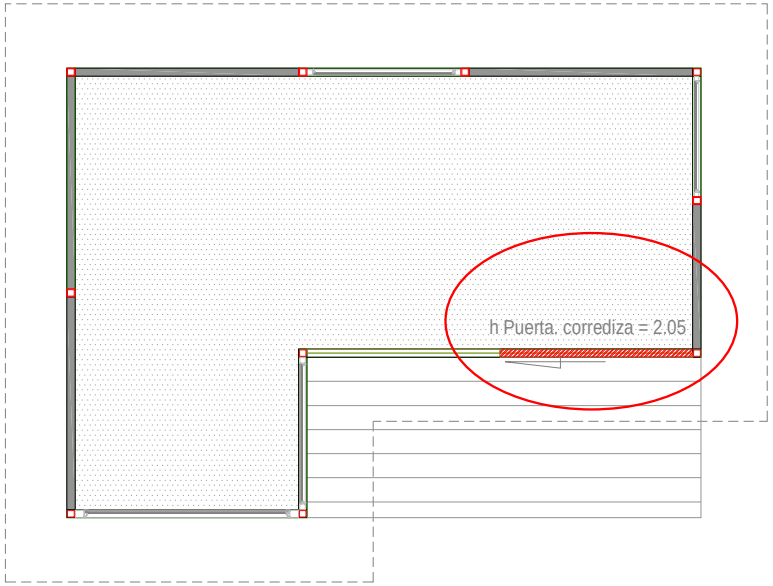

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
ACCESO SAN CRISTOBAL				1,00	1,00
ACCESO CIUDAD BOLIVAR				1,00	1,00
ACCESO ARTESANOS				1,00	1,00
Subtotal					3,00
Vienen					0,00
TOTAL					3,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:


OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	CIUDAD BOLIVAR	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	5,1,1,	Suministro e instalacion de rampas en lamina alfajor incluye pintura	UNID.	UND	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL

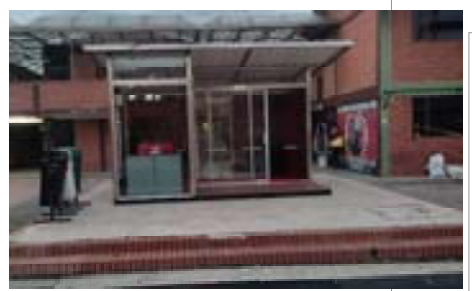



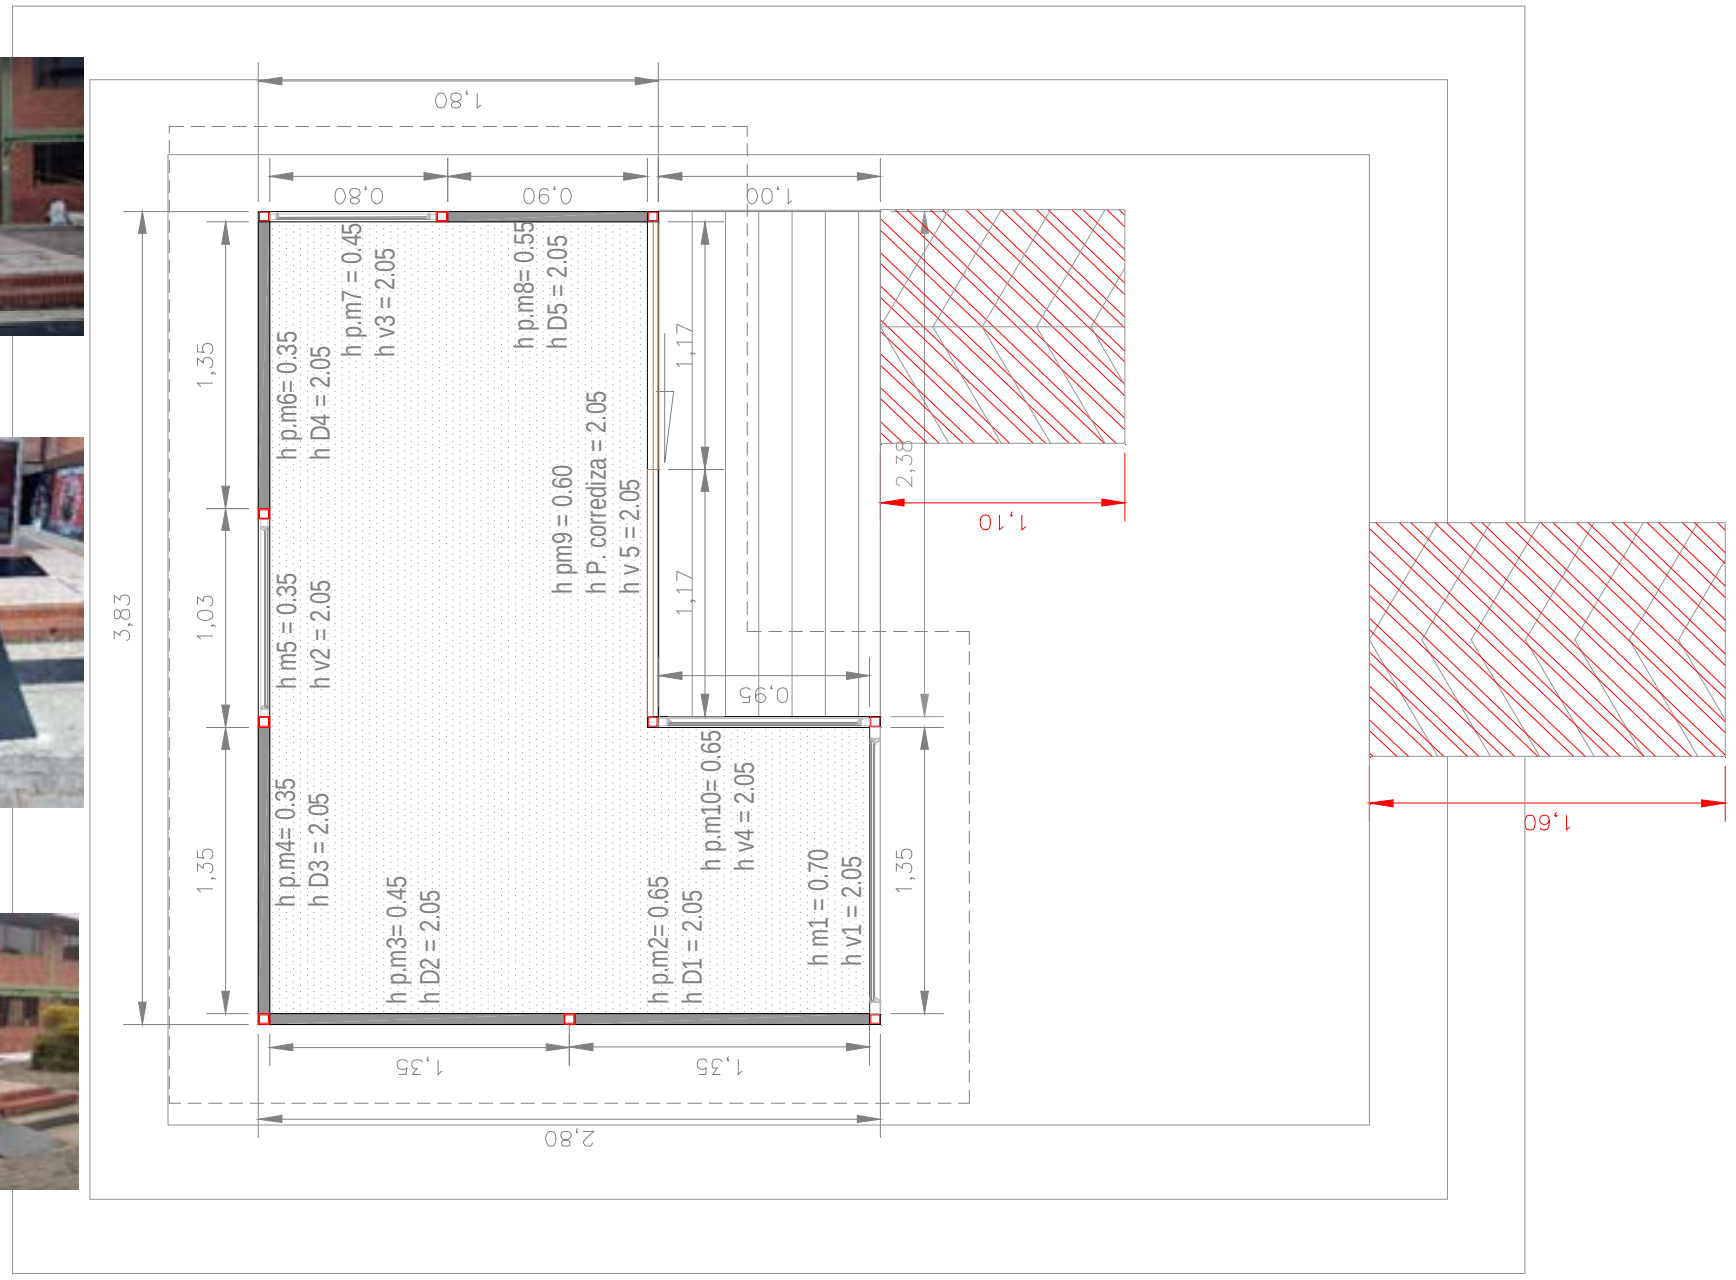

Localización	Dimensiones Alto	Ancho	Longitud	No Elem.	Medida Total
ACCESO CIUDAD BOLIVAR				2,00	2,00
Subtotal					2,00
Vienen					0,00
TOTAL					2,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	5,1,2,	Instalación y armada de estructura para kiosko (Plaza de Artesanos)	UNID.	GL	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL



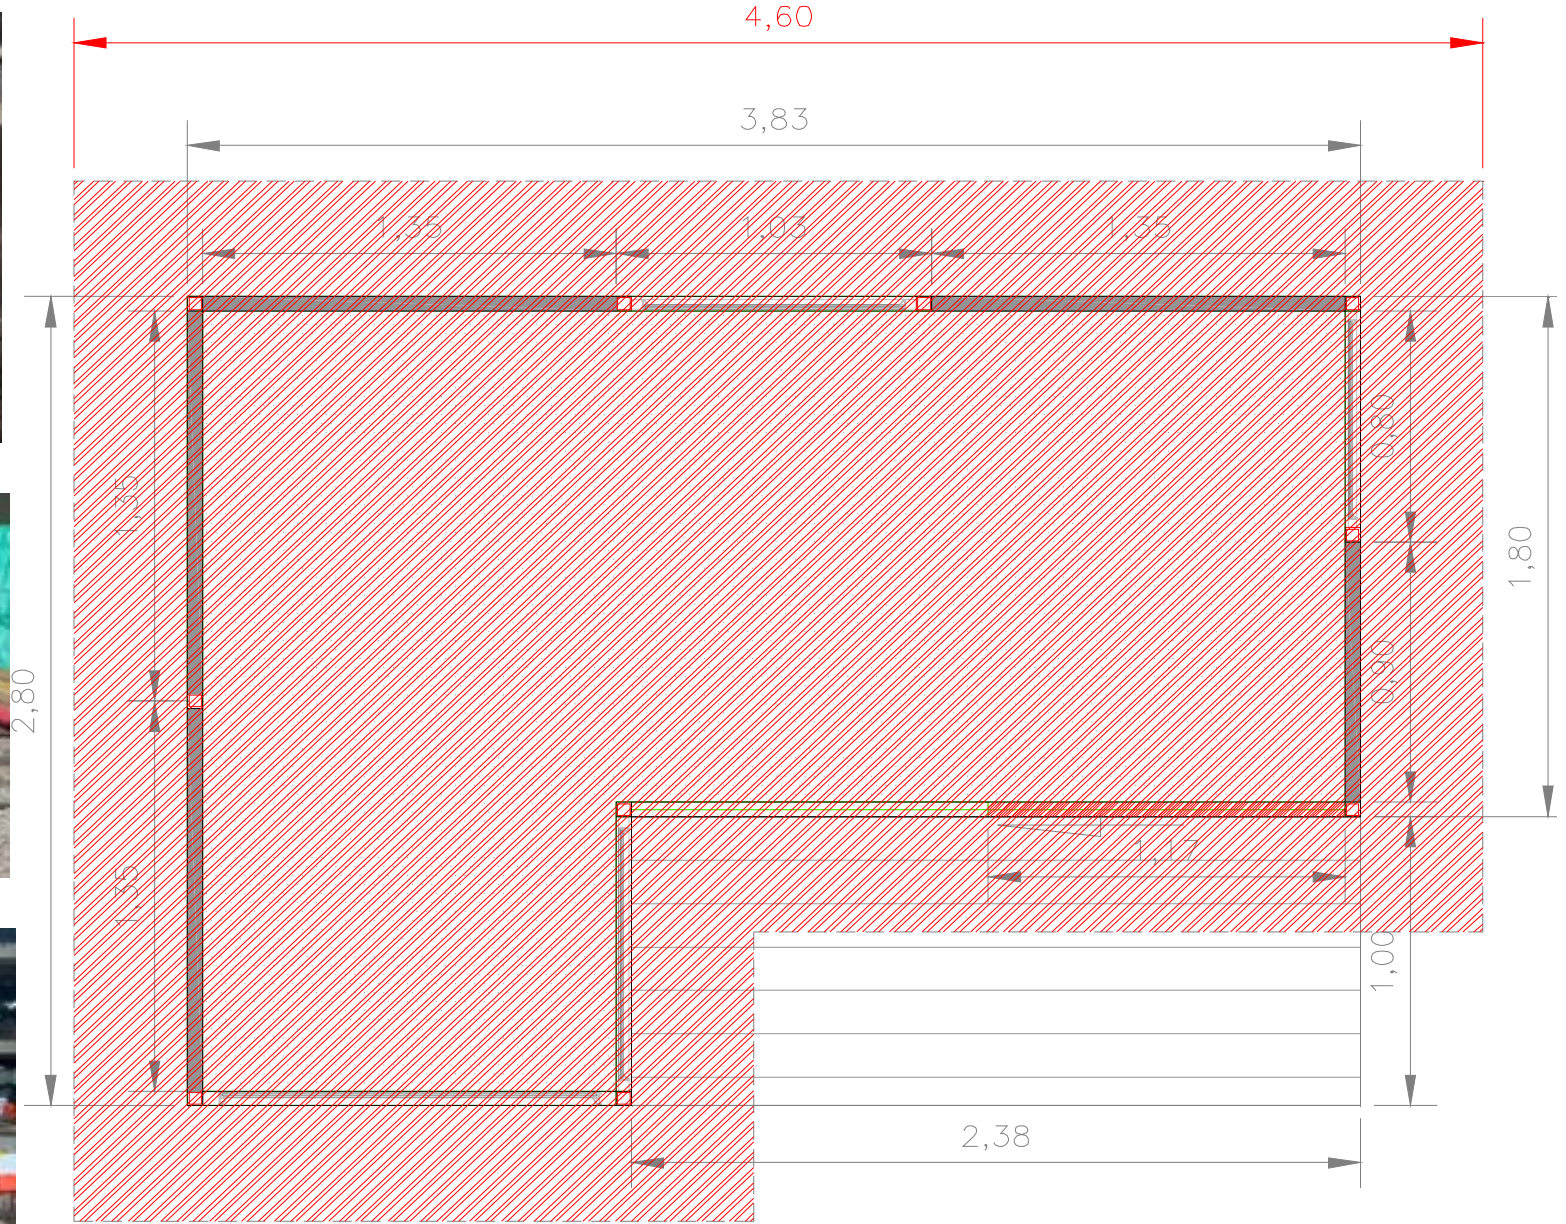

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
ARMADO KIOSCO ARTESANOS				1,00	1,00
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO — BOGOTÁ — ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	6,1,2	Acometida final para Kiosco (trasalado Plaza de Artesanos)	UNID.	GL	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL





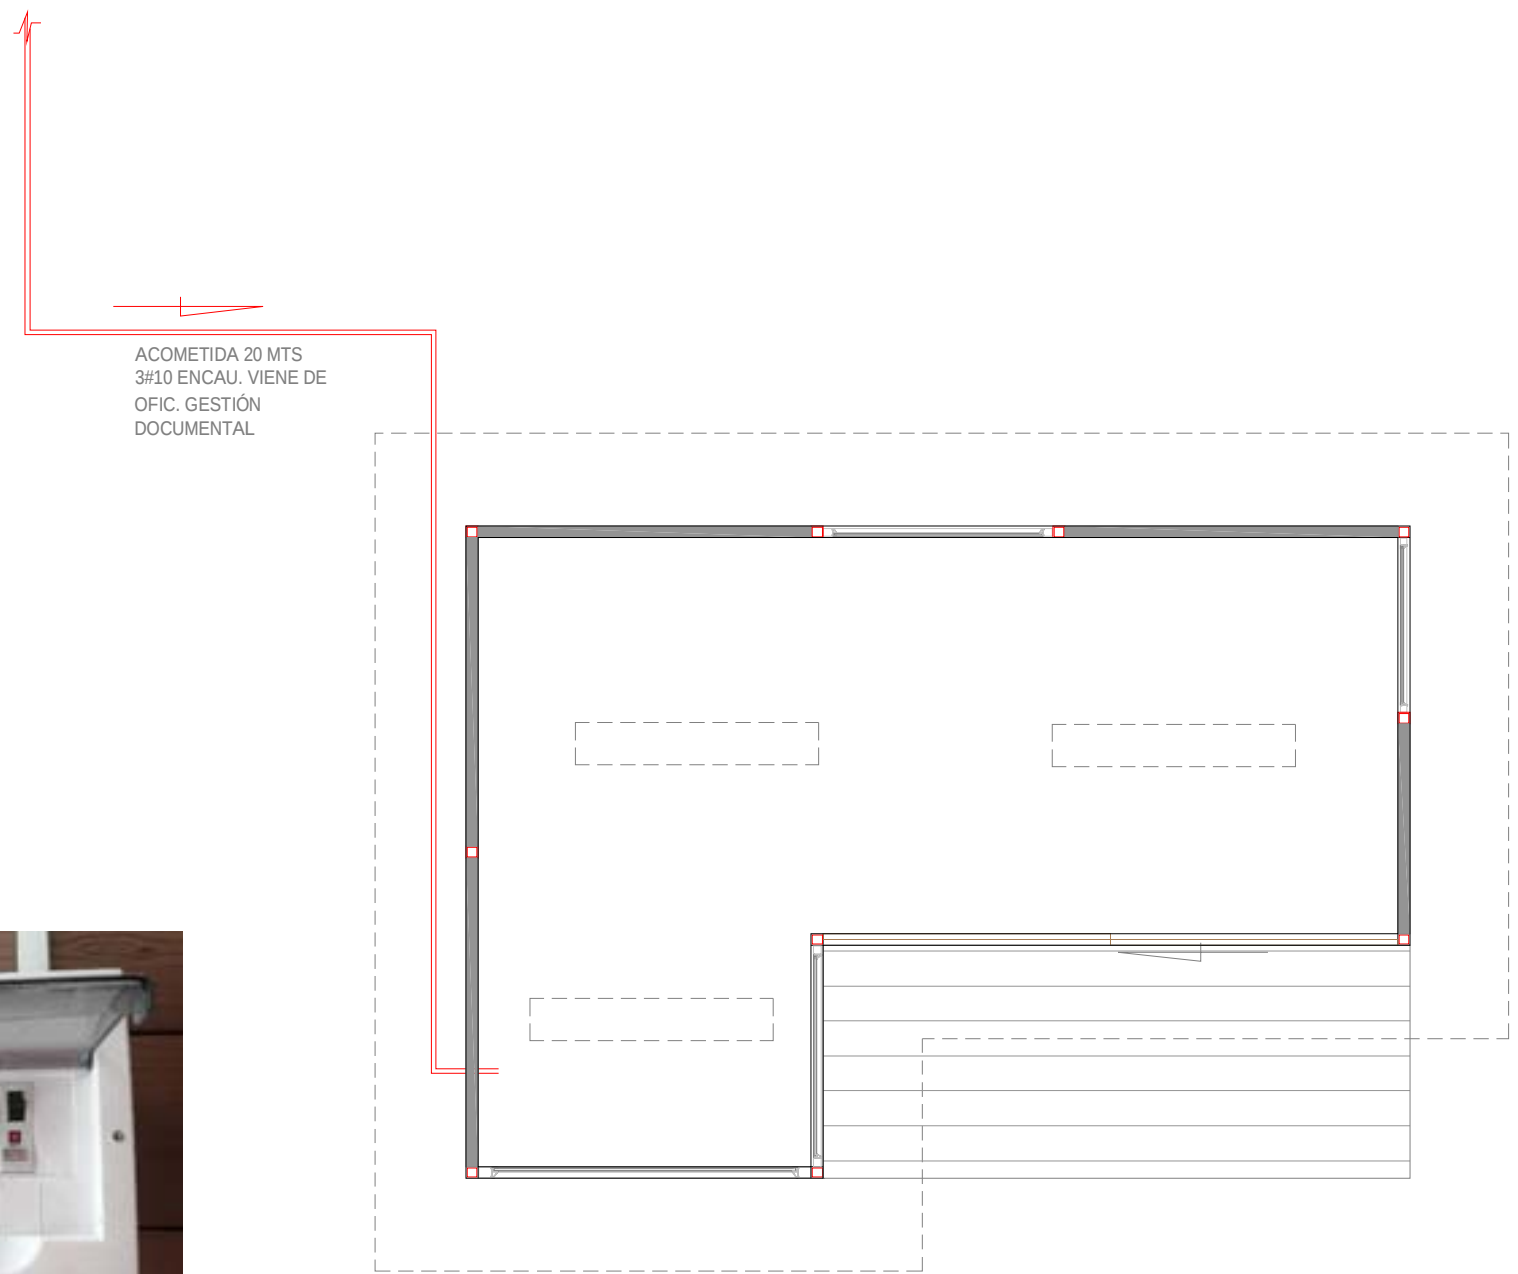

Localización	Dimensiones: Alto	Ancho	Longitud	No Elem.	Medida Total
KIOSCO ARTESANOS				1,00	1,00
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López Arquitecta A25992007-53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ

Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	USAQUEN / RAFAEL URIBE URIBE / SAN CRISTOBAL / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	7,1	Suministro e instalación de salida de iluminación para posterior instalación de lamparas, incluye derivacion desde el punto actual mas cercano y canaleta tipo dexson plastica blanca.	UNID.	UND	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL







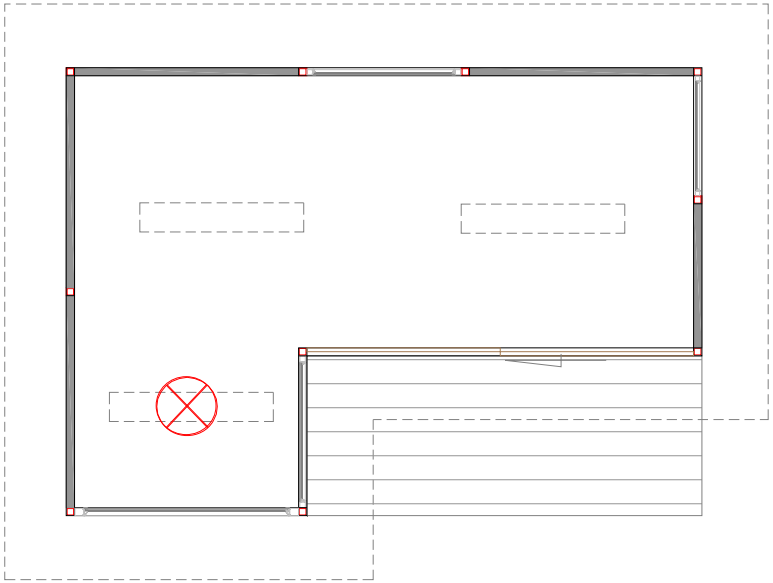

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
USAQUEN				1,00	1,00
RAFAEL URIBE URIBE				1,00	1,00
SAN CRISTOBAL				1,00	1,00
CIUDAD BOLIVAR				1,00	1,00
ARTESANOS				3,00	3,00
Subtotal					7,00
Vienen					0,00
TOTAL					7,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:


OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	USAQUEN / RAFAEL URIBE URIBE / SAN CRISTOBAL / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	7,2	Limpieza y brillado de estructura portante existente en acero inoxidable.	UNID.	GL	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL

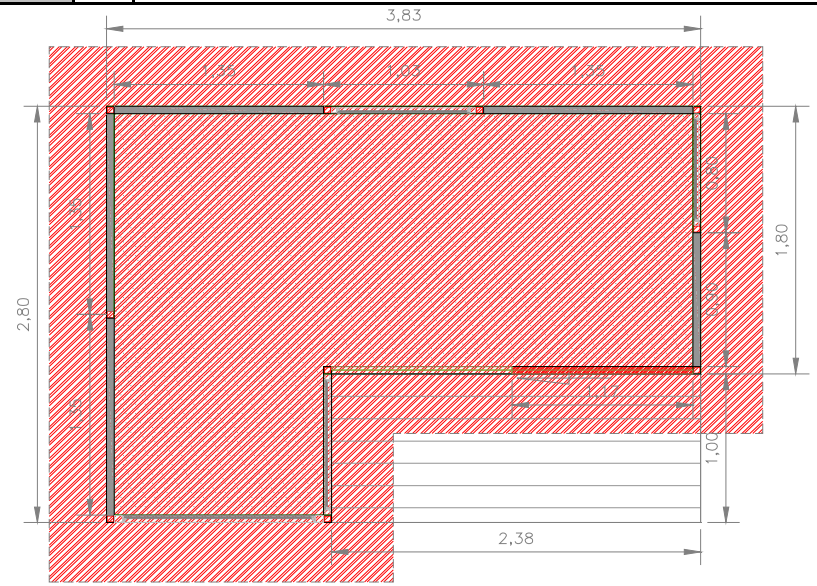







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
USAQUEN				1,00	1,00
RAFAEL URIBE URIBE				1,00	1,00
SAN CRISTOBAL				1,00	1,00
CIUDAD BOLIVAR				1,00	1,00
ARTESANOS				1,00	1,00
Subtotal					5,00
Vienen					0,00
TOTAL					5,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	RAFAEL URIBE URIBE	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	7,3	Nivelación de rampa de acceso al nivel de llegada en piso deck	UNID.	UND	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL





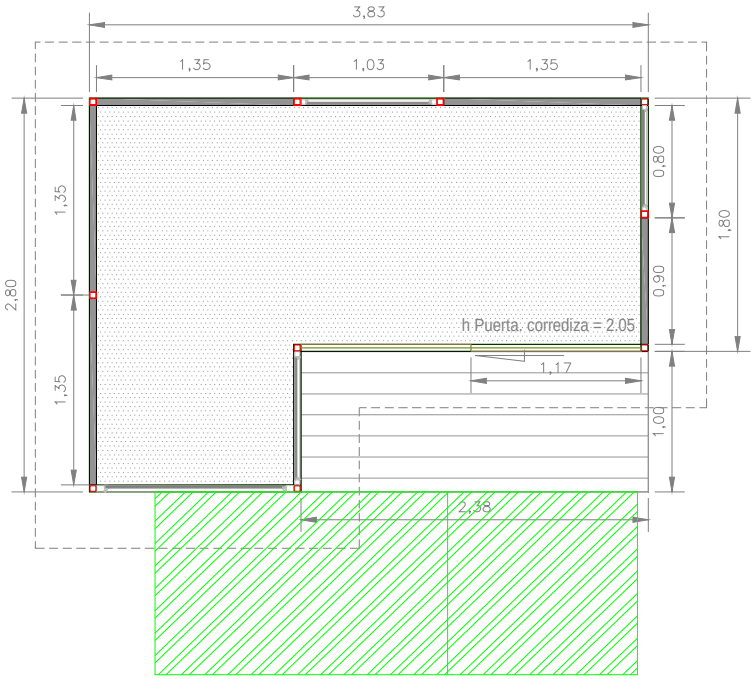

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
RAFAEL URIBE URIBE				1,00	1,00
					-
					-
					-
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007-53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:


OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	USAQUÉN-SERVITA	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	7,4	Corte de raiz de arbol ubicado al costado sur del kiosko, Incluye Desmonte y reinstalación de adoquín de ser necesario.	UNID.	GL	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL

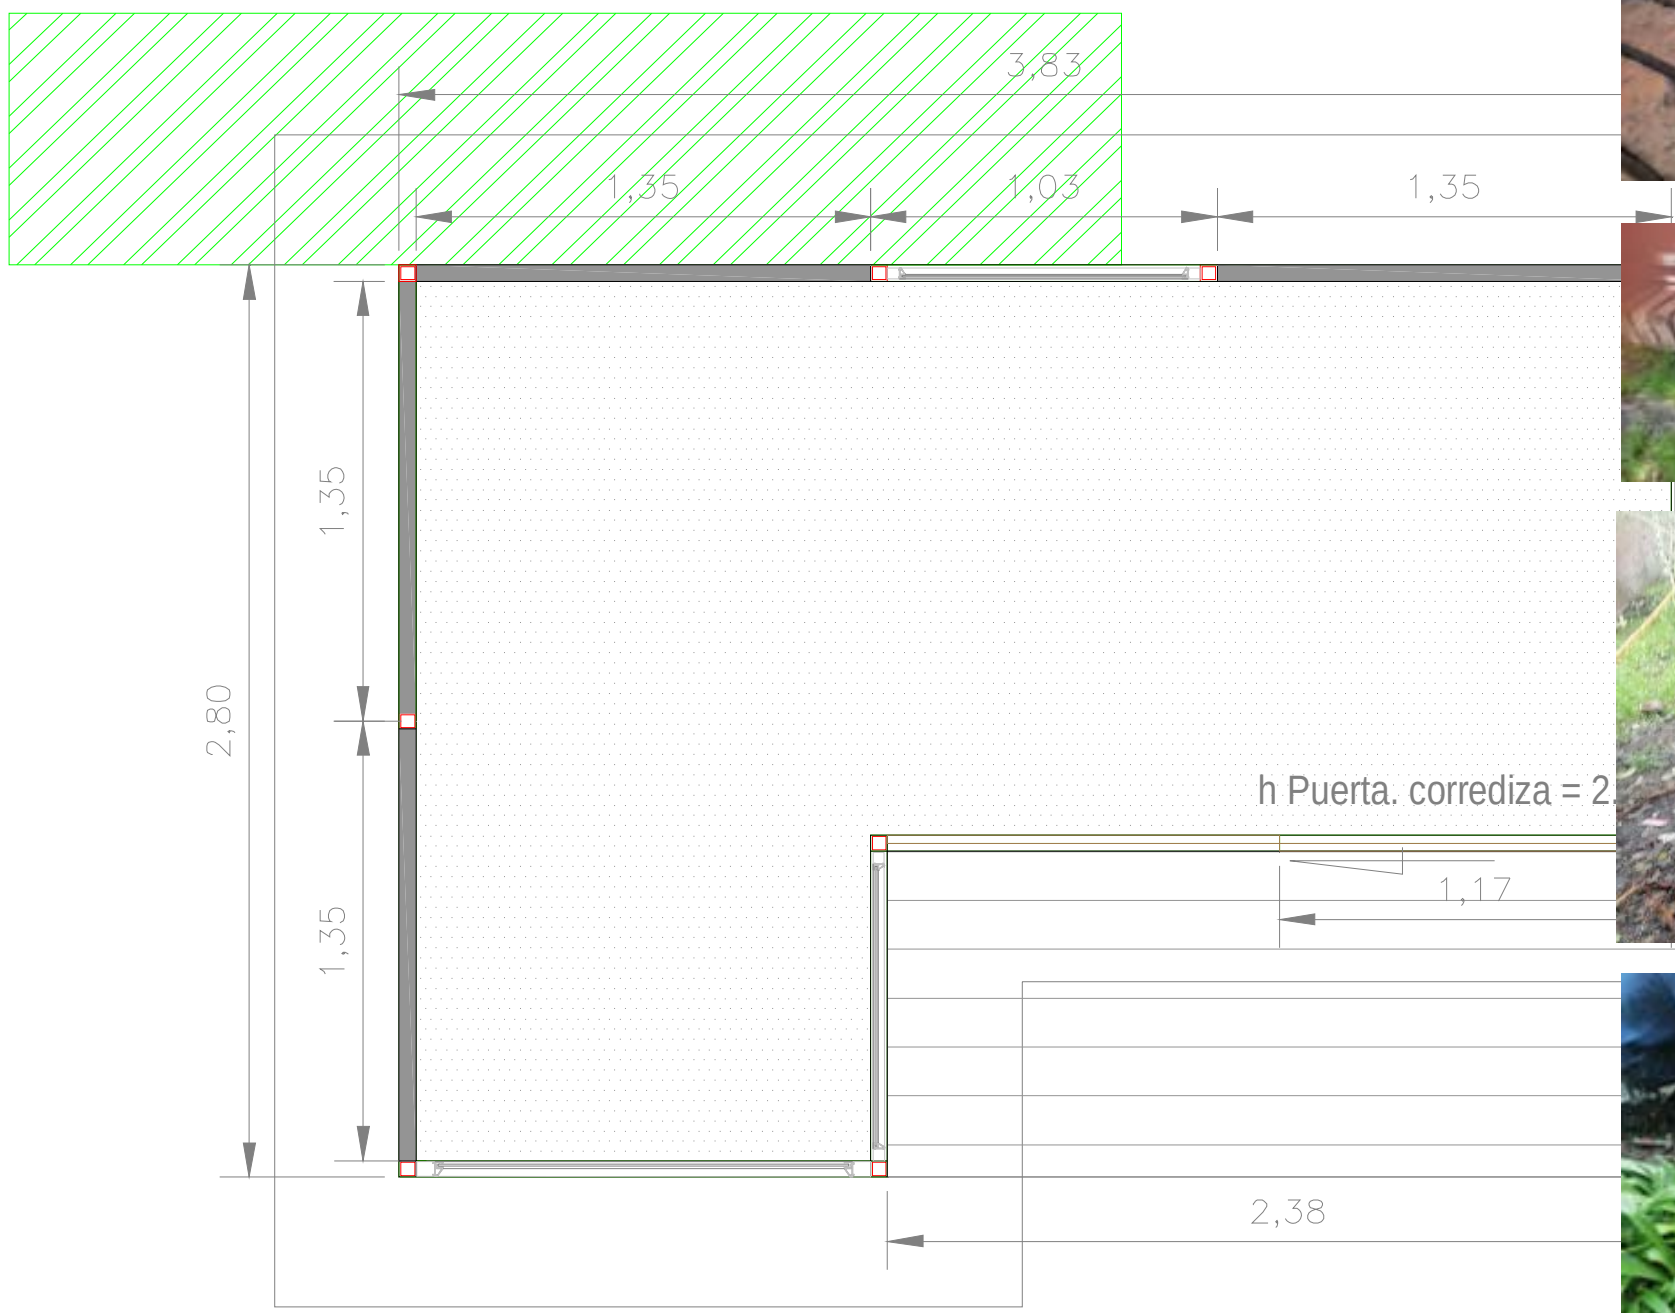











Localización	Dimensiones: Alto	Ancho	Longitud	No Elem.	Medida Total
COSTADO SUR				1,00	1,00
					-
					-
					-
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007-53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:


OBSERVACIONES:


TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	USAQUEN / SAN CRISTOBAL / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	7,5	Suministro e instalación de manijas para puerta ventana en aluminio.	UNID.	UND	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL

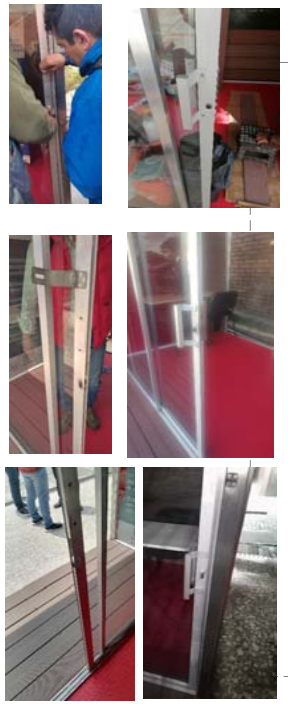

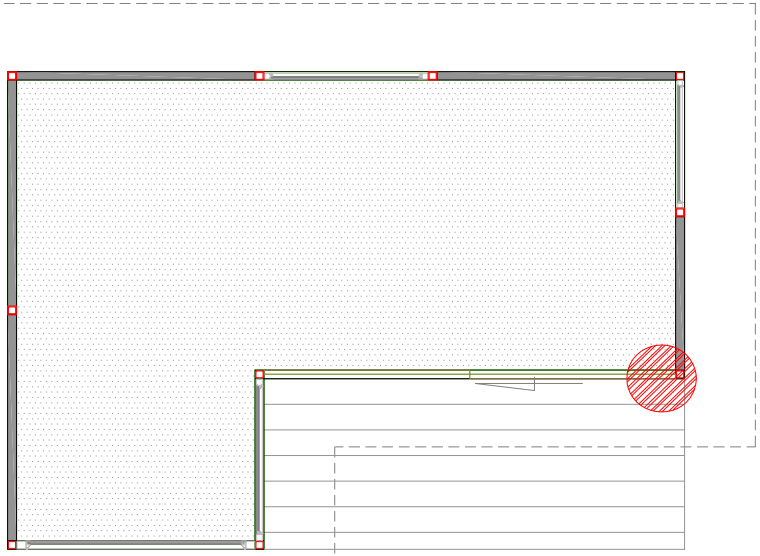

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
USAQUEN				1,00	1,00
SAN CRISTOBAL				1,00	1,00
CIUDAD BOLIVAR				1,00	1,00
ARTESANOS				1,00	1,00
Subtotal					4,00
Vienen					0,00
TOTAL					4,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	USAQUEN / RAFAEL URIBE URIBE / SAN CRISTOBAL / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	7,6	Selección y corte de ser necesario en material deck existente para posterior reinstalacion en paneles interiores.	UNID.	M2	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL







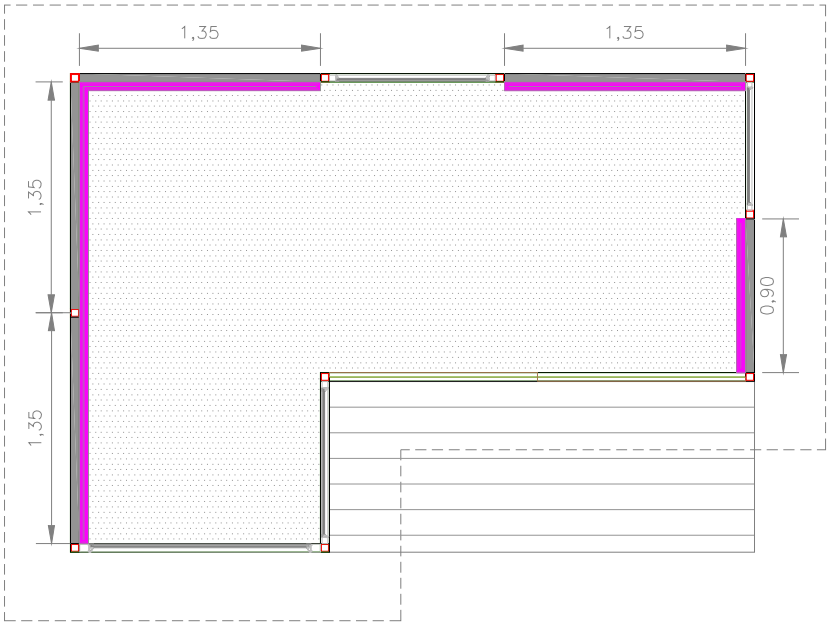

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
USAQUEN		0,16	1,31	30,00	6,29
		0,16	0,89	5,00	0,71
RAFAEL URIBE URIBE		0,16	1,31	34,00	7,13
		0,16	0,89	5,00	0,71
		0,12	1,31	1,00	0,16
SAN CRISTOBAL		0,16	1,31	31,00	6,50
		0,16	0,89	10,00	1,42
		0,09	0,89	1,00	0,08
CIUDAD BOLIVAR		0,16	1,31	30,00	6,29
		0,16	0,89	5,00	0,71
ARTESANOS		0,16	1,31	30,00	6,29
		0,16	0,89	5,00	0,71
Subtotal					37,00
Vienen					0,00
TOTAL					37,00

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S


MEMORIA DE CANTIDADES

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	USAQUEN / RAFAEL URIBE URIBE / SAN CRISTOBAL / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	7,70	Suminstro e instalacion de vidrio tipo laminado 3 + 3 incoloro para fijos en kioskos, incluye desmonte del actual y cambio de empaques de ser necesarios.	UNID.	M2	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL





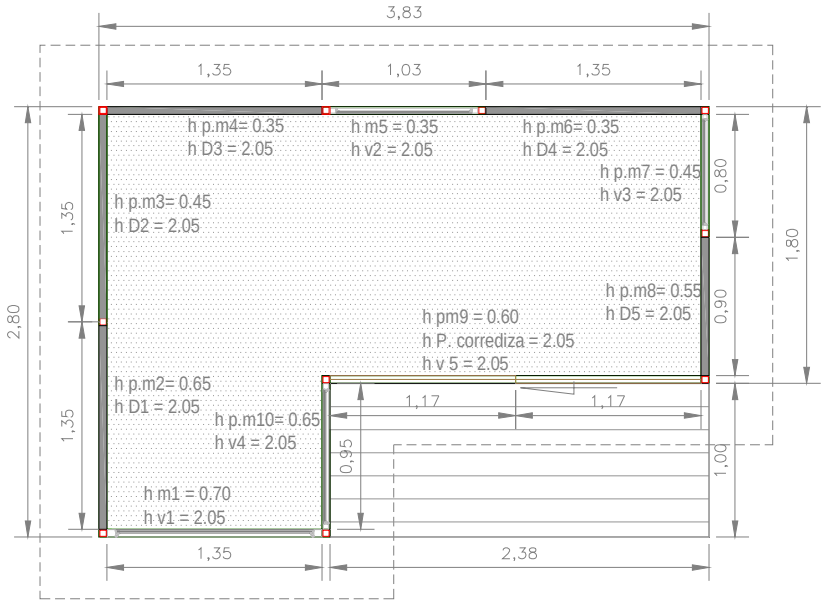

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
USAQUEN					
	2,05	1,30			2,67
	2,05	0,80			1,64
					-
RAFAEL URIBE URIBE					-
	2,05	0,90			1,85
					-
					-
SAN CRISTOBAL					-
	2,05	1,00			2,05
					-
					-
CIUDAD BOLIVAR					-
	2,05	1,30			2,67
					-
ARTESANOS					-
	2,05	0,80			1,64
	2,05	1,03			2,11
	2,05	0,95			1,95
	2,05	1,35			2,77
	0,59	2,34			1,38
	0,69	1,35			0,92
Subtotal					21,65
Vienen					0,00
TOTAL					21,65

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:

TEXVN-ARQ S.A.S

MEMORIA DE CANTIDADES


OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y TRANSPORTE DE KIOSCOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.				
CONTRATISTA	TEXVN-ARQ S.A.S	NIT O C.C.	900634286-5	CONTRATO N°	1314-2024
FRENTE DE TRABAJO	USAQUEN / RAFAEL URIBE URIBE / SAN CRISTOBAL / CIUDAD BOLIVAR / ARTESANOS	CORTE N°	2	PERIODO DE EVALUACION	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 07 DE ENERO DE 2025

CAPÍTULO	7,8	Suministro e instalación de perfil para remate superior para la correcta instalación del wall panel en fachadas de kioskos de forma vertical con junta.	UNID.	ML	UBICACIÓN GENERAL	GENERAL







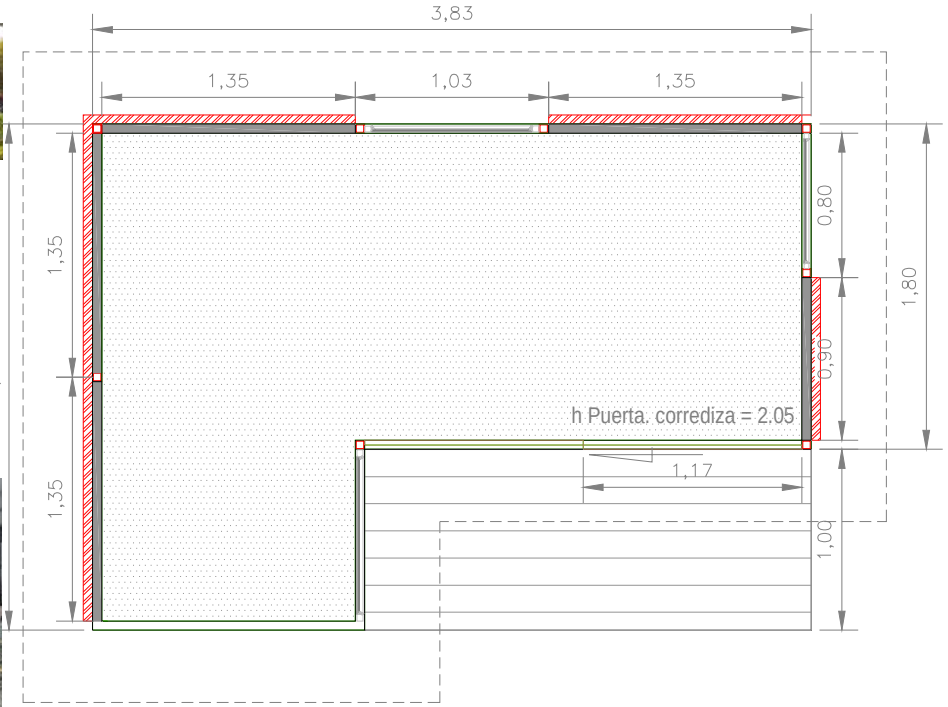

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Longitud		
USAQUEN			1,35	4,00	5,40
			0,90	1,00	0,90
RAFAEL URIBE URIBE			1,35	4,00	5,40
			0,90	1,00	0,90
SAN CRISTOBAL			1,35	4,00	5,40
			0,90	1,00	0,90
CIUDAD BOLIVAR			1,35	4,00	5,40
			0,90	1,00	0,90
ARTESANOS			1,35	4,00	5,40
			0,90	1,00	0,90
Subtotal					31,50
Vienen					0,00
TOTAL					31,50

Por el Contratista:

Jennifer Cárdenas López
Arquitecta
A25992007 - 53038475

Residente de obra: ARQ. JENNIFER CÁRDENAS LÓPEZ
Mat. Profesional A25992007-53038475

Por el contratante:

Supervisión:

OBSERVACIONES:
