Contrato No. 00005191 del 03 de diciembre de 2024	**Fecha:** 18 de abril de 2025
Periodo del reporte: 06 de diciembre de 2024 a 30 de diciembre de 2024	**Pago 01 de 01**
Nombre del contratista: VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ	**C.C:** 1090456492
Objeto del contrato: "2024O-100 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MOBILIARIO TECNOLOGICO Y CONEXIÓN PARA LOS CENTROS DE ATENCIÓN INMEDIATA "CAI" DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA"	

Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)**
1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES INTERNOS EN L. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN L (1 UND) EN RH DE 15 MM, SUPERFICIES EN MELAMINA DECORATIVA DE 15 MM, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO TIPO L ANALISTA: CON MEDIDAS DE 1.50MTS x 1.50MTS x 0.75MTS DE ALTO. (11 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ARMADO DE ESCRITORIO EN L (11 UND) CON MEDIDAS DE 1.5m x 1.5m x 0.75m, INCLUYE SUPERFICIE, ESTRUCUTRA, ARCHIVADOR, FALDON, TAPA PASACABLES. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO TIPO ANALISTAS LINEAL, CON MEDIDAS DE 1,10*0,60 M X 0,75M DE ALTO. (4 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ARMADO DE ESCRITORIO TIPO ANALISTA LINEAL (4 UND) CON MEDIDAS DE 1.1m x 0.6m x 0.75m, INCLUYE SUPERFICIE, ESTRUCUTRA, ARCHIVADOR, FALDON, TAPA PASACABLES. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCRITORIO TIPO ANALISTAS LINEAL 1,20 M X 0,60 MT X ALTURA 0,75 M. (29 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ARMADO DE ESCRITORIO TIPO ANALISTA LINEAL (29 UND) CON MEDIDAS DE 1.2m x 0.6m x 0.75m, INCLUYE SUPERFICIE, ESTRUCUTRA, ARCHIVADOR, FALDON, TAPA PASACABLES. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
5. SUMNISTRO DE ESCRITORIO TIPO ANALISTAS LINEAL, CON MEDIDAS DE 1,30*0,60 M X 0,75M DE ALTO. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ARMADO DE ESCRITORIO TIPO ANALISTA LIENAL (1 UND) CON MEDIDAS DE 1.2m x 0.6m x 0.75m, INCLUYE SUPERFICIE, ESTRUCUTRA, ARCHIVADOR, FALDON, TAPA PASACABLES. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN

	LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA IMPRESORA. ESCRITORIO PARA IMPRESORA (M1P). CON MEDIDAS DE 1,2*0,60 M X 0,75M DE ALTO. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA PARA IMPRESORA (1 UND) CON MEDIDAS DE 1.2m x 0.6m x 0.75m, INCLUYE SUPERFICIE, MUEBLE CON RESPECTIVAS GABETAS Y PUERTAS. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
7. MANTENIMIENTO MUEBLE DE ATENCION AL PÚBLICO. (1 und)	SE REALIZO LA RESTAURACION DE MUBELE DE ATENCIÓN AL PUBLICO (1 UND), CON MEDIDAS DE 0,7m x 2,85m x 1,0m, ATENDIENDO LA NECESIDAD DE REPARACION Y DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

	
8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES RECEPCION. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE MUEBLE DE RECEPCION (1 UND) CON MEDIDAS DE 2.4m x 1.1m, INCLUYE SUPERFICIE, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE PARA CAFETERIA. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE MUEBLE PARA CAFTERIA (1 UND) CON MEDIDAS DE 1.2m x 0,8m X 0,5m, INCLUYE MUEBLE INFERIOR Y MUEBLE SUPERIOR, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

	
10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE DIVISION MODULAR EN ESCRITORIO CENTRAL PARA RECEPCION Y ATENCIÓN AL PUBLICO. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE MUEBLE DE RECEPCION (1 UND) CON MEDIDAS DE 1.5m x 1.0m, EN LAMINA MDP RH DE 25MM DE ESPESOR RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON MELAMINA DECORATIVA, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO DE DIVISION MODULAR EN ESCRITORIO DE LADO IZQUIERDO PARA RECEPCION Y ATENCIÓN AL PUBLICO (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE MUEBLE DE RECEPCION (1 UND) CON MEDIDAS DE 1.32m x 1.0m, EN LAMINA MDP RH DE 25MM DE ESPESOR RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON MELAMINA DECORATIVA, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

	
12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA EJECUTIVA (45 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE SILLA EJECUTIVA (45 UND), ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA NYLON, SOPORTE LUMBAR, BRAZOS EN POLIPROPILENO, ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO CON ESPUMA, MECANISMO BASCULANTE DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

13. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEVERA MINIBAR CONGELADOR (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE NEVERA MINIBAR (1 UND), CAPACIDAD 90 LITROS - CONTROL DE TEMPERATURA SI – VOLTAJE - 115 V - NÚMERO DE PUERTAS 1 – ALTO 85.1 CM DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
14. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLAS BUTACO TIPO CAJERO (6 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE SILLA BUTACO TIPO CAJERO (6 UND), CON ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN TELA PRANA COLOR NEGRO Y ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, BASE EN POLIURETANO, DESLIZADORES, Y CON ARO EN ACERO. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
15. SUMINISTRO DE SILLA INTERLOCUTORA (43 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE SILLA INTERLOCUTORA (43 UND), CON ESPALDAR INYECTADO MICROPERFORADO, ASIENTO TAPIZADO

	EN TELA, 4 PATAS EN TUBO, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
16. SUMINISTRO DE SILLA PARA EXTERIOR (11 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE SILLA PARA EXTERIOR (11 UND), SILLA SIN BRAZOS PLEGABLE EN POLIETILENO, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

17. SUMINISTRO DE SILLAS. ESTRUCTURA EN TUBO METÁLICO (6 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE SILLA (6 UND), ESTRUCTURA EN TUBO METÁLICO CUBIERTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. SILLA FABRICADA POR ESTRUCION SOPLADO CON POLIETYETILENO DE ALTA DENSIDAD, SILLA RIJIDA ANTI VANDALICA CON PROTECCION UV, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
18. SUMINISTRO DE SILLA TAMDEN 4 PUESTOS TAPIZADO (15 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE SILLA TANDEM 4 PUESTOS (15 UND), EN LÁMINA PERFORADA CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS, SOPORTES PATA CON BRAZOS CROMADOS, INCLUYE NIVELADORES DE SUPERFICIE, TRAVESAÑO EN ACERO ACABADO PINTURA NEGRA, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

19. SUMINISTRO DE PUESTO DE TRABAJO PARA EXTERIOR TIPO MALETA (11 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE MESA PARA EXTERIOR TIPO MALETA (11 UND), MESA PLEGABLE MULTIUSOS TIPO MALETA CON MEDIDAS DE 1,80*74*75. TAPA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA / BASE EN ESTRUCTURA COLD ROLLED, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOKERS DE 12 PUESTOS. (11 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE LOCKER 12 PUESTOS (11 UND), CON MEDIDAS 1.2m*0.5m*2.4m ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CADA PUESTO O COMPARTIMIENTO ESTÁ PROVISTO DE: PORTA- CANDADO, VENTILACIÓN EN PUERTA Y MANIJAS EN POLIPROPILENO DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
21. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOCKER DE 9 PUESTOS. (18 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE LOCKER 9 PUESTOS (18 UND), CON MEDIDAS 1.2m*0.5m*2.4m ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED CON

	ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CADA PUESTO O COMPARTIMIENTO ESTÁ PROVISTO DE: PORTA- CANDADO, VENTILACIÓN EN PUERTA Y MANIJAS EN POLIPROPILENO DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
22. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTES METALICOS. (12 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE ESTANTE METALICO (12 UND), CON MEDIDAS DE 0,94 M DE ANCHO X 0,40 M DE FONDO X 2,0 DE ALTO COMPUESTO POR CUATRO PARALES EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16, PUNZONADA Y DOBLADA, 6 ENTREPAÑOS EN LAMINA COLD, TERMIUNADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
23. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO METALICO: ARMARIO METALICO. (15 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE ARMARIO METALICO (15 UND), CON MEDIDAS: FONDO 0.45 X ANCHO 1.10 X ALTO 1.9 LAMINA METÁLICA COLD ROLL C22, CON SEIS ENTREPAÑOS Y PUERTA CON

	CHAPA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EN ACLIRICO. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO EN ACRILICO (1 UND), EN LAMINA ALUMINIO COMPUESTO CALIBRE 3 MM, CON ESTRUCTURA METALICA EN TUBO DE 1X1 PULGADA, CON LEYENDAS EN ACRILICO BLANCO CAL 3 MM, CON CORTE LASER Y ESCUDO EN IMPRESIÓN FULL COLOR PLASTIFICADO BRILLANTE INCLUYE INSTALACION DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE. (13 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE COMPUTADOR DE MESA ALL ON ONE (13 UND), PANTALLA: LED IPS O WVA MÍNIMO 23”.8, MÁXIMO 27”, RESOLUCIÓN MÍNIMA DE LA PANTALLA: 1920*1080. COLOR: NEGRO O GRIS, NÚMERO DE CORES: MÍNIMA 14. NÚMERO DE SUBPROCESOS:

	MÍNIMO 20. VELOCIDAD BASE: 1.2 GHZ. MEMORIA CACHÉ: MÍNIMO 24 MB, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
28. SUMINISTRO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BÁSICA. (24 und)	 SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR BASICA (24 UND), MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, SCANNER). IMPRESIÓN: LÁSER O LED O INYECCIÓN DE TINTA. CONECTIVIDAD: USB, 2.0 O SUPERIOR, CAPACIDAD ENTRADA DE PAPEL: MINIMO 100 TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS: CARTA, A4, FOLIO. ETHERNET 10/100 BASE-TX, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: MÍNIMO 600 X 1200 DPI. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

29. SUMINISTRO DE TABLET CONTROL SISTEMA DE REPORTES DE SEGURIDAD. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE TABLET (1 UND), TABLET TAB A A8 SM-X200 10.5 64GB 4GB RAM - TAMAÑO DE LA PANTALLA: 10.5 ". SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 11. CON PROCESADOR OCTA-CORE DE 2GHZ. RESOLUCIÓN DE PANTALLA DE 1920PX X 1200PX. CON LECTOR MICRO-SD. CUENTA CON GPS. MEMORIA INTERNA EXPANDIBLE HASTA 1 TB CON FUENTE EXTERNA. - INCLUYE CABLE USB-C.- DISEÑADA PARA LLEVAR A TODAS PARTES. CON ENTRADA PARA AUDIFONOS. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
30. SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU. (21 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU (21 UND), DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
31. SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU. (12 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU (12 UND), DE

	ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
32. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE PARED. 4 VELOCIDADES. (20 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE VENTILADOR DE PARED (20 UND), DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
33. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED: LAMPARAS DE 60X60, PANEL LED 40W 6500K 110V. (34 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE LAMPARA LED (34 UND), LAMPARAS DE SOBREPONER CON MEDIDAS DE 60X60, PANEL LED 40W 6500K 110V. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

34. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 18W. (7 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE LAMPARA LED 18 W (7 UND), LAMPARA LED, TEMPERATURA DE CALOR 6500 FLUJ0 LUMINOSO DE 1500, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
35. SUMINISTRO DE BANDERA. (63 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE BANDERA (63 UND), BANDERAS CON MEDIDAS 1,50 M X 2 M DOBLE FAZ Y RIATA DE SEGURIDAD DE 5CM DE ANCHA CON LOS JALETES Y 8 METROS DE PIOLA TELA CAMPERO DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
36. SUMINISTRO DE PAPELERA METALICA. (25 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE PAPELERA METALICA (25 UND), SUMINISTRO DE PAPELERA METALICA EN MALLA CAL 20, CON CAPACIDAD DE 10 LTS, CON ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA

	COLOR A DEFINIR DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
37. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ACRILICOS DE PARED. (19 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE TABLERO ACRILICO (19 UND), TABLEROS ACRILICOS DE PARED. DIMENSIONES: DE 1,20M X 2,40 MARCO ALUMINIO CON CUADRICULA Y MARCO EN ALUMINIO DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
38. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO P. (6 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO (6 UND), E= 10MM, ACCESORIOS= MANIJA ROMA DOBLE, EN ACERO INOXIDABLE PARA VIDRIO TEMPLADO 60 CM DE LARGO EN TUBO DE 1 PULGADA Y ARANDELAS DE 1 PULGADA. CERRADURA CHAPA CUADRADA PARA VIDRIO TEMPLADO CON BLOQUEO POR AMBOS COSTADOS EN ACERO INOXIDABLE. PIVOTES DE 90° DE GIRO CHAPETA INFERIOR Y SUPERIOR, POSTE EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSION PISO TECHO Y

	FALLEBA PASADOR) ACABADO SEGÚN DISEÑOS. (VER PLANO ARQUITECTONICO) INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
39. SUMINISTRO DE PAPEL AHUMADO PARA VIDRIOS BLINDADO. (6.8 m2)	SE REALIZO SUMINISTRO DE PAPEL ESMERILADO PARA VIDRIOS BLINDADOS (6.82 m2) INCLUYE PAPEL AHUMADO.RETIRO DE PELICULA, LIMPIEZA DE PEGANTE E INSTALACION DE NUEVA PELICULA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
40. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARGADOR MANTENEDOR. (5 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR MANTENEDOR (5 UND) CARGADADOR MANTENEDOR DE 110 – 240 DISPOSITIVO INTELIGENTE DE CARGA DE BATERIA 3 ETAPAS, CAPACIDAD DE CARGA DE 12 V 12 A, 24 V 6 A, 600 AMPERIOS POR HORA EN CARRO 30 AMPERIOS POR HORA, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
41. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA RECARGABLE DE 200 AMPERIOS. (5 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA RECARGABLE DE 200 AMPERIOS (5 UND) VOLTAJE DE NOMINAL 12 V CAPACIDAD NOMINAL DE 55.0 AH RANGO SE OPERACION 40 AMPERIOS HORA /2.05 AMPERIOS 40.0 AH /2.0A (20 HR 180V CELDA 25ª C/ 77) MAXIMA CORRIENTE, DESCARGA DE 800 AMPERIOS 5 SEGUNDAS, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

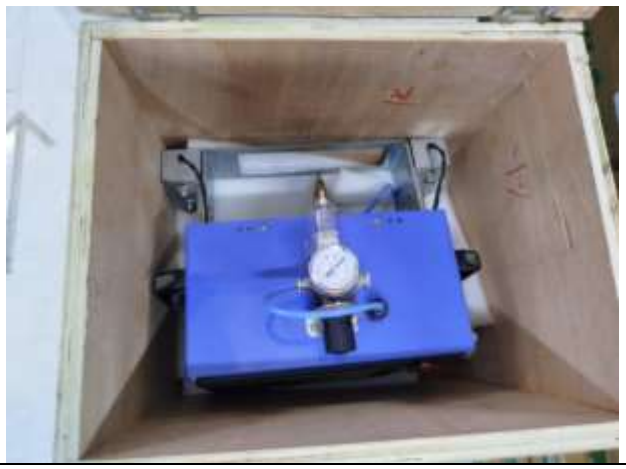
42. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO CON PROTECTOR PARA CAI BLINDADO. (4 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO CON PROTECTOR PARA CAI BLINDADO (4 UND) 1.50-16 LT APLICACIÓN PARA CARRETERAS CON CONDICIONES MIXTAS Y REGIONALES DISEÑO TRADICIONAL QUE PERMITIRA MAYO AGARRE Y MEJOR RESISTENCIA. CARCAZA DE ACERO QUE PERMITE MAYOR RESISTENCIA A CORTES Y MAXIMIZA LAS CAPACIDADES DE CARGA DISEÑO PARA POSICION TRADICCIONAL DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
43. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO BLINDADO CON PELÍCULA ANTI ESQUIRLAS. (4 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO BLINDADO CON PELICULA ANTI ESQUIRLAS (4 UND) NORMA UNE-EN MUNICION 1063 5,56 X 45 mN tipo ss-109 TOTAL 47.80 + PELICULA ANTIESQUIRLAS DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
44. SUMINISTRO DE EXTENSIÓN ESPECIAL 3x16x20 MTS. (5 und)	SE REALIZO SUMINISTRO DE EXTENSION ESPECIAL 3X16X20 MTS (5 UND) NORMA UNE-EN MUNICION 1063 5,56 X 45 mN tipo ss-109 TOTAL 47.80 + PELICULA ANTIESQUIRLAS DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
45. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ALARMA. PITO KTC 8 24 V DC LINEA PESADA. (5 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ALARMA. (5 UND) PITO KTC 8 24 V DC LINEA PESADA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

46. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCES POINT (1 UND) ENTRADA DE ADAPTADOR 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A. SALIDA DE ADAPTADOR 12V ⎓ 1.2A. PROCESADOR Quad-core CPU. INTERFACE 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports. FRECUENCIA 2.4 GHz and 5 GHz. SEGURIDAD INALAMBRICA WPA-PSK/WPA2-PSK, DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
47. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHAPA DIGITAL. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DIGITAL (1 UND) CERRADURA INTELIGENTE, PARA PUERTA DE VIDRIO, ACCESO POR HUELLA HASTA 100 USUARIOS, ACCESO POR CLAVE, Y CON CONECTIVIDAD POR BLUETOOH, A TRAVES DE LA APLICACIÓN TTLOCK. DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

48. SUMINISTRO DE DRON DE SEGURIDAD. (2 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE DRON DE SEGURIDAD (2 UND) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DISPARO VERTICAL VERDADERO, FOCUSTRACK (ACTIVETRACK, SPOTLIGHT Y PUNTO DE INTERÉS), MASTERSHOTS, TIMELAPSEDISPARO VERTICAL VERDADERO, FOCUSTRACK (ACTIVETRACK, SPOTLIGHT Y PUNTO DE INTERÉS), MASTERSHOTS, TIMELAPSE RANGO DE EDAD (DESCRIPCIÓN)ADULTO COLOR GRIS RESOLUCIÓN DE LA CAPTURA DE VIDEO 4 K RESOLUCIÓN INMÓVIL EFECTIVA 48 TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD USB.COMPONENTES INCLUIDOS HÉLICE, CÁMARA, BATERÍA, GIMBAL_PROTECTOR, CÁMARA, USB_TYPE-C_CABLE. NIVEL DE HABILIDAD PRINCIPIANTE O INTERMEDIO DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
49. MANTENIMIENTO DE VALLAS DE SEGURIDAD. (7 und)	SE REALIZO MANTENIMIENTO DE VALLAS DE SEGURIDAD. (7 UND) DECAPADO DE PINTURA. SOLDADURAS GENERALES. CAMBIO A LAMINA GALVANIZADA, PUBLICIDAD POR 2 CARAS, PINTURA ELECTROSTATICA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
50. SUMINISTRO DE CAUCHO CARGA PESADA REFERENCIA. (2 und)	SE REALIZO SUMINISTRO DE CAUCHO CARGA PESADA (2 UND) REFERENCIA (205/75 R 17.5) APLICACIÓN PARA CARRETERAS CON CONDICIONES MIXTAS Y REGIONALES DISEÑO TRADICIONAL QUE PERMITR MAYO AGARRE Y MEJOR RESISTENCIA CARCAZA DE ACERO QUE PERMITE MAYOR RESISTENCIA A CORTES Y MAXIMIZA LAS CAPACIDADES DE CARGA DISEÑO

	PARA POSICION TRADICCIONAL DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
51. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APOYO PISO GATOS. (8 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APOYO PISO GATOS (8 UND) GATO MECANICO TIPO TIJERA CAPACIDAD DE 2 TONELADAS CARGA, ALTURA MINIMA 100 MM ALTURA MAXIMA 390 MM DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
52. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR IMT DE MALLA DE SEGURIDAD PARA LAS VENTANAS. (4 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR IMT DE MALLA DE SEGURIDAD PARA VENTANAS (4 UND) MARCO PRINCIPAL FABRICADO EN TUBERIA 1 1/2 X 1 1/2 EN 2 mm MALLA INTERNA IMT, SOLDADURA MIG DE ALTA RESISTENCIA PINTURA ELECTROSTATICA DIMENSIONES 2 MTS X 1.90 DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
53. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR PARA LA PLANTA Y BATERÍA. (2 und)	SE REALIZO SUMINISTRO E INSTALACION PROTECTOR PARA LA PLANTA Y BATERIA (2 UND) FABRICADO EN TUBERIA CUADRADA 1 1/2 EN 2 mm Y MALLA IMT 25 mm CALIBRE 14 CON PORTA CANDADO, CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 16 GALVANIZADA 1.20 X 70 CM SOLDADURA MIG ALTA RESISTENCIA, PINTURA ELECTRSTATICA DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

54. SUMINISTRO DE USB 64 GB ANTENA RECEPTORA WIFI. (9 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE USB 64 GB ANTENA RECEPTORA DE WIFI (9 UND) ADAPTADOR USB INALÁMBRICO N DE 300 MBPS VELOCIDAD INALÁMBRICA DE 300 MBPS DISEÑO DE TAMAÑO MINI PARA UNA PORTABILIDAD CONVENIENTE CON UN ALTO RENDIMIENTO CONFIABLE - CONFIGURE FÁCILMENTE UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA SEGURA CON EL BOTÓN WPS DE UN SOLO TOQUE - COMPATIBLE CON WINDOWS 8.1/8/7/XP, MAC OS, LINUX" DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
55. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPAS 4x4. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE CSRPA 4x4 (1 UND) LONA VERANO: VINILICA DE MALLA ABIERTA CON SOPORTE EN FIBRA POLIESTER DE ALTA TENACIDAD. FABRICACION EN SELLADO ELECTRONICO 100 % IMPERMEABLE DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

56. SUMINISTRO MAQUINA GRABADORA DE METAL CNC. (1 und)	SE REALIZO SUMINISTRO Y ENTREGA DE MAQUINA GRABADORA DE METAL CNC (1 UND) PUNZONADORA NEUMATICA CON MARCADOR DE ALTA PRESISON SOFWARE INTEGRADO, PANTALLA TACTIL, FUENTE ALIMENTACION 110 -60 HZ, TEMPERATURA DE 0 A 40ª, COMPRESOR DE 20 LIBRAS CON ELECTRO IMAN, GAMA DE IMPRESIÓN DE 40 A 140 mm DE 1 A 30 CARASCTERES POR SEGUNDO. PROFUNDIDA DE 0.2 mm a 2. mm VELOCIDAD DE MARCADO DE 30 A 40 mm POR SEGUNDO, DIMENSIONES ALTURA 17 CM ANCHO 35 CM PRUNDIDA 26 CM DE ACUERDO A LO DESCRITO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)	
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	

Viviana Villabona Sanchez
C.C 1.090.456.492

Nombre y firma del contratista
VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ
C.C. 1090456492
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 1090456492-6

Nombre y firma del supervisor
DIEGO VILLAMIZAR SALINAS
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
C.C. 1090456492
