ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA:	Comité Técnico No. 07 - Zona Sur- Oriente – Contrato Interventoría 2024-3668 y Contrato Obra 2024-3653	
FECHA: 12 de Marzo de 2025.	HORA: 11:00 AM	LUGAR: Oficinas de la SDM

1. ASISTENTES	
NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
VER LISTADO ADJUNTO	

2. ORDEN DEL DÍA

A. Compromisos
B. Avance del contrato – OBRA
C. Garantías del Contrato
D. Avance del contrato – GEO
E. Temas varios

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A. Compromisos del Comité Anterior

Durante el segundo comité del contrato, se revisaron y evaluaron los compromisos asumidos en la sesión anterior:

1. Presentación SST en el informe semanal
   Ya está incluido el reporte de Seguridad salud en el trabajo


2. El tramite de la cuenta
   Ya están tramitadas las cuentas tanto de obra como interventoría

B. Avance del contrato – OBRA

VALORES PRESUPUESTALES - HOJA DE VIDA						
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTIÓN	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIA	TOTAL
ASIGNADOS	27	1	0	0	5	33
INSPECCIONES	7	0	0	0	5	12
POR INSPECCIONAR	20	0	0	0	0	20
POR IMPLEMENTAR	22	0	0	0	0	22
EN EJECUCIÓN	5	0	0	0	0	5
EJECUTADOS	0	0	0	0	5	5

TEMA:	Comité Técnico No. 07 - Zona Sur- Oriente – Contrato Interventoría 2024-3668 y Contrato Obra 2024-3653	
FECHA: 12 de Marzo de 2025.	HORA: 11:00 AM	LUGAR: Oficinas de la SDM

VALORES PRESUPUESTALES	
VALOR PROGRAMADO.	$ 1.407.860.507
VALOR EJECUTADO	$ 1.254.756.218
DIAS TRANSCURRIDOS	46
% DESVIACIÓN DEL CONTRATO	-4,57%
DESVIACIÓN EN DÍAS	18
VALOR FACTURADO	$ 830.138.961
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR EN EJECUCIÓN	$ 3.067.642.792
JORNADAS DE LLUVIA DIA	5
JORNADAS DE LLUVIA NOCHE	4

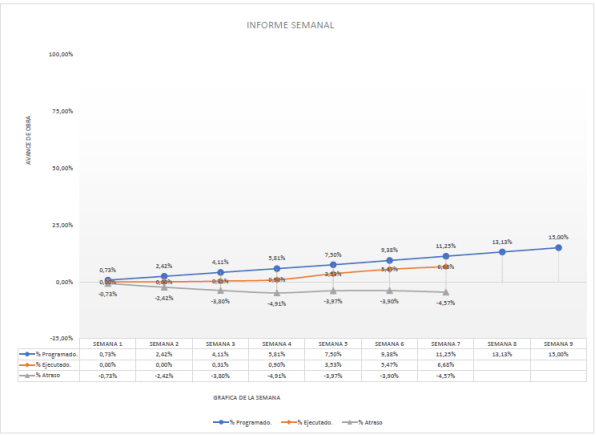

C. Garantías del Contrato

	COMUNICADOS		DISEÑOS		
VISITAS	SOLICITADOS	RESPUESTAS UT	DISEÑOS	ATENDIDOS	APORBADOS
3	0	0	0	0	0


CUENTA	DISEÑO	No. COMUNICADO INTERVEN ENVIADO A CONTRATISTA		COMUNICADOS Y ATENCION DE CONTRATISTA		OBSERVACIONES
		No. RADICADO SDM	No. RADICADO INTERVENTORÍA	ATENCION SI/NO	No.COMUNICADO	
1	MV_AV_BOYACA_941_09					
1	EX_05_93_1244_11					

D. Avance del contrato – GEO

VALORES EJECUCION - SIG								
CUENTA	ENTREGADOS	APROBADOS	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	CONTRATISTA	FECHA ENTREGA INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	FECHA ENTREGA SDM	SDM
1	EX_05_93_1244_11_C1	1	28/02/2025	0	28/02/2025	0	3/03/2025	0
1	EX_05_320_1561_10_C1	1	3/03/2025	0	4/03/2025	0	5/03/2025	1
1	EX_05_341_1561_10_C1	1	4/03/2025	0	4/03/2025	0	5/03/2025	1
1	MV_04_230_1561_10_C1(PMT SDM	1	4/03/2025	0	4/03/2025	0	5/03/2025	1
1	EX_04_211_1561_10_C1	1	4/03/2025	0	4/03/2025	0	5/03/2025	1
1	EX_04_044_1561_10_C1	1	5/03/2025	0	6/03/2025	0	6/03/2025	1
1	EX_05_119_1867_12_C1	0	6/05/2025	0	9/03/2025	0	0/01/1900	0
1	MV_05_122_1867_12_C1	0	11/03/2025	0	0/01/1900	1	0/01/1900	0
1	MV_BOYACA_941-09-C1-GEO	0	11/03/2025	0	0/01/1900	1	0/01/1900	0
2	-	-	-	-	-	-	-	-

TEMA:	Comité Técnico No. 07 - Zona Sur- Oriente – Contrato Interventoría 2024-3668 y Contrato Obra 2024-3653	
FECHA: 12 de Marzo de 2025.	HORA: 11:00 AM	LUGAR: Oficinas de la SDM

DATOS SIG	
ID EJECUTADOS 100 %	0
ID EN ELABORACIÓN DE GEO POR OBRA	0
ID ENTREGADOS DE OBRA A INTERVENTORIA	9
ID APROBADOS DE INTERVENTORÍA ENTREGADOS A SDM	6
ID VALIDADOS POR SDM	1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROCESO GEO.	0
ID PENDIENTE A LA FECHA	2

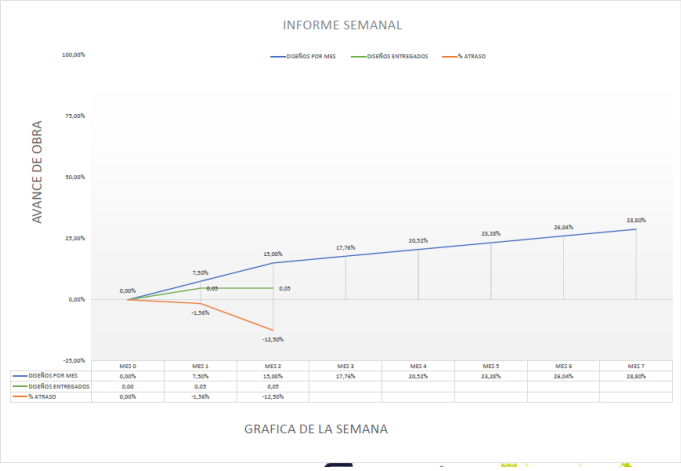

E. Temas varios

Se están implementando en campo nuevos pictogramas sobre diseños antiguos, lo que genera diferencias en la visualización. Se sugiere coordinar estos aspectos para evitar complicaciones en el proceso.

Además, se ha identificado una discrepancia entre las mediciones realizadas en campo por la interventoría y las zonas registradas, lo que genera observaciones que consumen tiempo adicional. Se recomienda revisar y corregir este proceso para optimizar los tiempos de trabajo.

Respecto a la medición, se ha establecido un margen de aceptación del 10 %. Si la variación supera este límite, se generan observaciones. Sin embargo, persisten diferencias en los dibujos, lo que requiere ajustes en el procedimiento. Se plantea la necesidad de cambiar la metodología para agilizar el proceso, asegurando que las mediciones en terreno y los dibujos sean consistentes.

El objetivo es que antes del 24 de marzo el tema GEO del 15 % esté cerrado y aprobado por Movilidad. Para ello, se debe radicar la documentación entre el 17 y el 21 de marzo, considerando que el 24 es una fecha límite. Dado que el tiempo es limitado, se enfatiza la importancia de cumplir con los plazos establecidos para evitar retrasos.

Por último, se informa que los planos récord serán revisados y deberán entregarse en formato PDF firmado. La Secretaría, en conjunto con el equipo legal, evaluará la posibilidad de recibirlos en formato digital.

TEMA:	Comité Técnico No. 07 - Zona Sur- Oriente – Contrato Interventoría 2024-3668 y Contrato Obra 2024-3653	
FECHA: 12 de Marzo de 2025.	HORA: 11:00 AM	LUGAR: Oficinas de la SDM

Se requiere cerrar y finalizar los PMT de emergencias los correspondientes al IDIGER. Actualmente, solo quedan pendientes los PMT relacionados con los pasacalles.

Se ha enviado el plano final, ya que anteriormente se remitió uno incorrecto. Se debe proceder con el cierre de los dos PMT restantes, asegurándose de que toda la documentación esté completa.

La única tarea pendiente es el envío del registro fotográfico de los PMT de emergencia por correo electrónico para dar por concluido el proceso. Además, es necesario dar seguimiento a la comunicación por correo, respondiendo a los involucrados con la documentación correspondiente y las fechas respectivas.

Se busca optimizar el proceso de radicación de cuentas para evitar demoras. En la primera cuenta se presentaron retrasos debido a la cantidad de documentos requeridos y observaciones recibidas. Sin embargo, para las siguientes cuentas se espera una reducción en la documentación necesaria, aunque los informes seguirán siendo obligatorios.

Un aspecto clave es la seguridad social, ya que los pagos parafiscales se efectúan entre el 5 y el 7 de cada mes, lo que condiciona el proceso. Además, las ventanillas suelen cerrar entre el 10 y el 12, por lo que es fundamental estar atentos a los plazos. Se enviarán correos recordatorios para evitar contratiempos.

El contratista debe cerrar el corte entre el 2 y el 5 de cada mes para que la interventoría pueda determinar el porcentaje correspondiente. Se acordó que el corte se realizará el 24, y a partir de esa fecha, los residentes diurnos y nocturnos deberán revisar y firmar las planillas. Una vez firmadas y valorizadas, se podrá proceder con la radicación y cobro.

Para mejorar la eficiencia, se propone realizar cortes semanales y entregar la información con al menos tres días de anticipación al cierre de la ventanilla. Esto permitirá agilizar los trámites y garantizar que toda la documentación esté lista en el tiempo estipulado.

En cuanto a la Vía al Llano, el proceso de implementación sigue en curso.

Si bien desde el CIV no se han reportado novedades, la ejecución en la Avenida Boyacá ha sido completada y se continúa avanzando en la señalización horizontal y en las expansiones programadas.

TEMA:	**Comité Técnico No. 07 - Zona Sur- Oriente – Contrato Interventoría 2024-3668 y Contrato Obra 2024-3653**	
FECHA: 12 de Marzo de 2025.	**HORA: 11:00 AM**	**LUGAR: Oficinas de la SDM**

3.1. COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLE**	**3.3 FECHAS**
1. La aprobación de la georreferenciación (GEO). 2. Finalizar el PMT de emergencia	Interventoría y Contratista Contratista	18-mar-25 18-mar-25

Aprobado:

Supervisor Secretaría Distrital de Movilidad

Director Interventoría

Director Obra
