ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	Versión 1.0

TEMA:	Comité Representantes Legales No. 1 - Zona 7 Sur Occidente – Contrato 2024-3653	
FECHA: 21 de febrero 2025	HORA: 11:30 AM	LUGAR: Sesión virtual

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
VER LISTADO ADJUNTO	

2. ORDEN DEL DÍA

1. Compromisos de comité anterior
2. Seguimiento a la implementación de los diseños asignados
3. Reporte de Avance e inspección de Obra
4. Control financiero
5. Registro fotográfico
6. Temas varios

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicia el comité con la presentación por parte del Arquitecto Juan Camilo Rodríguez, del personal de la SDM., quien concede la palabra al Ing. Jhon González, inicia comentado la situación compleja en que se encuentra la Ciudad, por la siniestralidad vial las cifras de año anterior ascendieron a 567 siniestros fatales, que en su gran mayoría gran porcentaje son motos, tambien motos con peatones, asociados a velocidad y conductas riesgosas, afirma que, a raíz de eso la SDM., ha venido trabajando los últimos años, para mantener las condiciones de seguridad vial adecuadas en la ciudad, para transitar en forma segura, da la bienvenida a todos y a afirma que vamos a estar trabajando muy fuerte, con el fin de solventar algunos retrasos, en términos de cómo está la Ciudad, que esta en obras en las vías principales.

Compromisos del comité anterior:

1. Inicia la Interventoría indicando el cumplimiento de los compromisos del acta anterior, teniendo en cuenta que es el primer comité de representantes legales, no hay compromisos adquiridos.

La interventoría realiza la presentación del seguimiento del avance de obra con corte a la semana No. 4, 17 de febrero de 2025;

TEMA:	Comité Representantes Legales No. 1 - Zona 7 Sur Occidente – Contrato 2024-3653	
FECHA: 21 de febrero 2025	HORA: 11:30 AM	LUGAR: Sesión virtual

Seguimiento a la implementación de diseños asignados:

VALORES EJECUCION - HOJA DE VIDA						
FECHA	ID	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA IMPLEMENTACIÓN	ESTADO	FECHA PROGRAMADA PARA CULMINAR EL ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE DEL ID
28/01/2025	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	USME	Vertical y Horizontal	En ejecución	28 de febrero de 2025	7%
28/01/2025	MV_05_122_1867_12	USME	Vertical y Horizontal	En ejecución	16 de marzo de 2025	10%
10/02/2025	SH-SV-PUNTO4-TMSA-V1	USME	Vertical y Horizontal	En ejecución	16 de febrero de 2025	55%
28/01/2025	EX_05_119_1867_12	USME	Vertical y Horizontal	En ejecución	31 de marzo de 2025	6%
28/01/2025	EX_05_93_1244_11	USME	Vertical y Horizontal	Programado con PMT - No iniciado	31 de marzo de 2025	6%
28/01/2025	EX_05_110_1867_12	USME	Vertical y Horizontal	Programado con PMT - No iniciado	4 de mayo de 2025	0%
28/01/2025	EX_05_053_1744_10	USME	Vertical y Horizontal	Programado con PMT - No iniciado	7 de abril de 2025	0%
28/01/2025	EX_05_108_1867_12	USME	-	-	-	-
28/01/2025	EX_05_003_1073_24	USME	-	-	-	-
28/01/2025	EX_05_113_1867_12	USME	-	-	--	-
28/01/2025	EX_05_005_1073_24	USME	-	-	-	-
28/01/2025	EX_05_004_1073_24	USME	-	-	-	-
28/01/2025	EX_04_261_1561_10	SAN CRISTOBAL	-	-	--	-

TEMA:	**Comité Representantes Legales No. 1 - Zona 7 Sur Occidente – Contrato 2024-3653**	
FECHA: 21 de febrero 2025	**HORA: 11:30 AM**	**LUGAR: Sesión virtual**

Reporte de Avance de Obra

RESUMEN ACUMULADO DE ASIGNACION Y EJECUCION						
ESTADO	DISEÑOS NORMALES	SUMINISTROS	MEDIDAS DE GESTION	COMPROMISOS PRIORITARIOS	EMERGENCIAS	TOTAL
ID ASIGNADOS	27	1	0	0	5	33
ID INSPECCIONADOS	7	0	0	0	0	7
ID POR INSPECCIONAR	20	0	0	0	5	25
ID EN IMPLEMENTACIÓN	5	0	0	0	0	5
ID IMPLEMENTADOS TOTAL	0	0	0	0	0	0
ID NO SE IMPLEMENTAN	0	0	0	0	0	0
ID POR IMPLEMENTAR	22	1	0	0	5	28

VALOR EJECUTADO MENSUAL				
CUENTA	VALOR VERTICAL	VALOR HORIZONTAL	SUMINISTROS	VALOR TOTAL (incluido A.I.U.)
MES 1	$8.959.169	$159.106.795	$0	$168.065.964

Valor ejecutado semana	4	$ 109.683.467	0,58%
VALOR ATRASO	$ 921.890.558	VALOR PROGRAMADO PARA LA SEMANA	$ 317.903.985,47
DIAS DE ATRASO	21	PORCENTAJE DE ATRASO	2,03%
Valor ejecutado Inicial Del Contrato :		$168.065.964	0,90%
Valor por ejecutar		$18.603.407.464	99,10%


OBSERVACIONES					
DIAS DE LLUVIA	6	VALOR DIAS DE LLUVIA		$ 272.489.130,41	
JORNADAS DE LLUVIA:	11	DIURNA	5	NOCTURNA	6
JORNADAS DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:	7	DIURNA	4	NOCTURNA	3

DIAS TRANSCURRIDOS DEL CONTRATO	25	DIAS PARA TERMINAR EL CONTRATO	1010	VALOR A EJECUTAR DIARIO	$18.419.215

TEMA:	Comité Representantes Legales No. 1 - Zona 7 Sur Occidente – Contrato 2024-3653	
FECHA: 21 de febrero 2025	HORA: 11:30 AM	LUGAR: Sesión virtual


GRAFICA DE AVANCE DE OBRA

VALORES PRESUPUESTALES	
VALOR PROGRAMADO EN LA SEMANA	$ 317.903.985
VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 109.683.467
DIAS TRANSCURRIDOS	25
% ATRASO DEL CONTRATO	-4,60%
DESVIACIÓN EN DÍAS	21
VALOR ATRASO	$ 921.890.558
VALOR ACUMULADO EJECUTADO	$ 168.065.964
VALOR PAGADO	$ 0
COSTO PROYECTADO TOTAL ID´s	$ 4.069.248.847
JORNADAS DE LLUVIA DIA	5
JORNADAS DE LLUVIA NOCHE	6

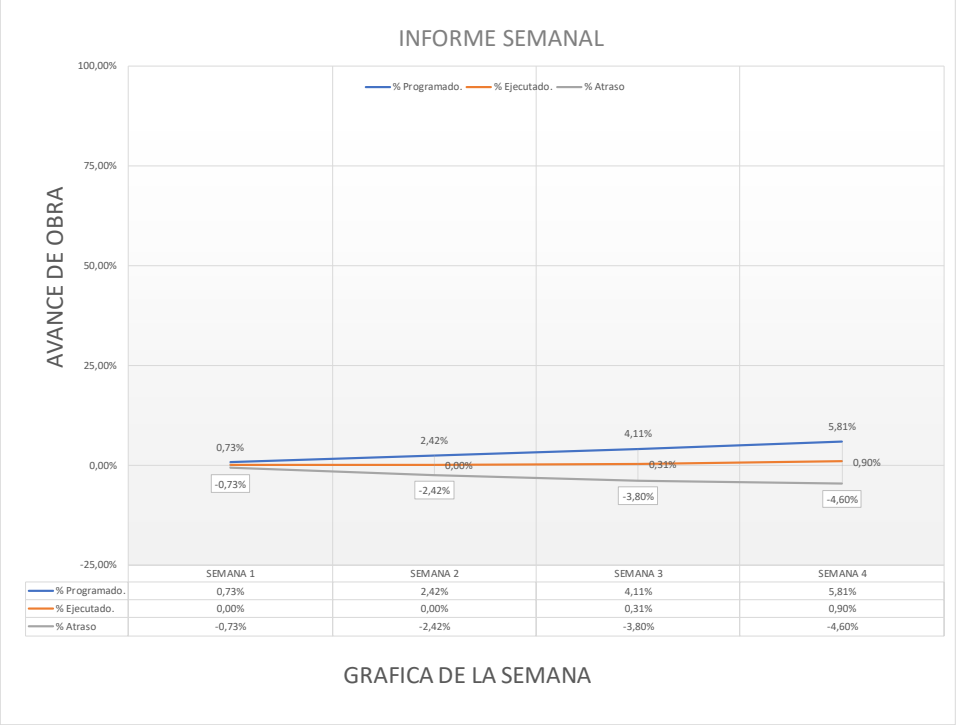

CONTROL FINANCIERO

TEMA:	Comité Representantes Legales No. 1 - Zona 7 Sur Occidente – Contrato 2024-3653	
FECHA: 21 de febrero 2025	HORA: 11:30 AM	LUGAR: Sesión virtual

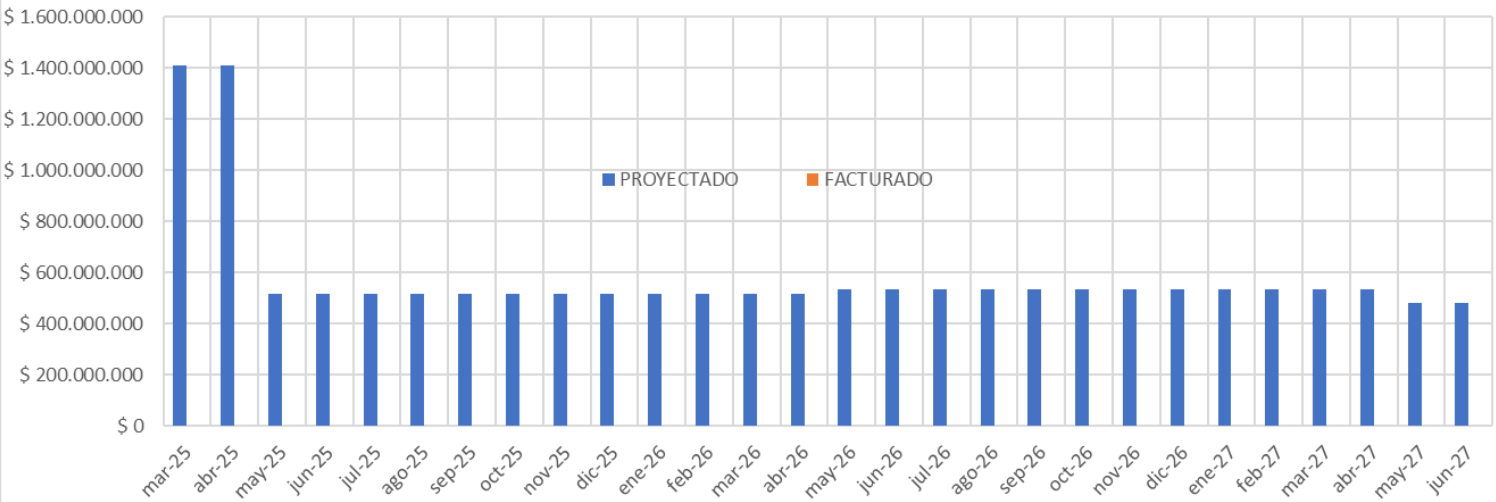

	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27
PROYECTADO	$ 1.	$ 1.	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 51	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 53	$ 47	$ 47
FACTURADO	$ 2	$ 3	$ 4	$ 5	$ 6	$ 7	$ 8	$ 9	$ 10	$ 11	$ 12	$ 13	$ 14	$ 15	$ 16	$ 17	$ 18	$ 19	$ 20	$ 21	$ 22	$ 23	$ 24	$ 25	$ 26	$ 27	$ 28	$ 29

CRP		
No.	VIGENCIA	VALOR
3649	2024	$ 2.815.721.000
20	2025	$ 6.209.487.857
2638	2026	$ 19.710.047.000

Temas varios:

Interviene el ingeniero Luis Fernando Rubiano, director del contrato de obra, quien comenta que el primer mes del proyecto, han recibidos los Ids, para implementación, se han realizado las inspecciones, se han valorado, presentado el cronograma correspondiente, de acuerdo con los lineamientos de los términos del contrato, afirma que tienen pista suficiente y cuentan con 5 frentes de trabajo y a partir de marzo un frente mas y en la medida en que las condiciones climáticas nos permite trabajar avanzamos, desafortunadamente desde el inicio del contrato las lluvias han sido intensas, no hemos podido avanzar al ritmo que se quiere, esperamos mejoren las condiciones climáticas, con el fin de mejorar el avance de obra.

Interviene el ingeniero Miguel Andrés Forero, informa que al contratista se le solicito implementar un plan de contingencia, abriendo frentes de señalización vertical, con el fin de disminuir el atraso, mientras que cesan las lluvias.

TEMA:	Comité Representantes Legales No. 1 - Zona 7 Sur Occidente – Contrato 2024-3653	
FECHA: 21 de febrero 2025	HORA: 11:30 AM	LUGAR: Sesión virtual

Interviene el Ing. Jesús Cortes, informando Que tienen gran cantidad de material tubería y están avanzando en la fabricación de señales verticales y las próximas semanas se va a tener un buen avance.

Termina el arquitecto Juan Camilo Rodríguez, indicando que va a estar muy pendiente de la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que hay un CRP de vigencia 2024, se debe facturar con el 70% de la reserva 2024 y el 30% de la vigencia 2025.

Siendo las 11:48 am termina el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Continuar con plan de contingencia con el fin de poner al día el contrato en ejecución.	Contratista	12-feb.-2025
2. Realizar facturación de la primera cuenta con 70% de reserva y 30% de vigencia 2025,	Contratista, Interventoría	12-feb.-2025

APROBADO:

Supervisor Secretaría Distrital de Movilidad

Representante Legal Interventoría

Representante Legal Contratista Obra
