ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

BOGOTÁ

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR ORIENTE

CTO SDM 2024-3653

INFORME MENSUAL No. 1

24 DE ENERO A 23 DE FEBRERO

UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

FEBRERO 2025

ICOVÍAS
INGENIERÍA VIAL S.A.S.
UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director De Proyecto MSc. Planeación de Transporte e Ingeniería	
REALIZÓ	Alba Avendaño Cipagauta	Coordinadora	

INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Ing. Sergio Valderrama Camargo	Director de interventoría	
APROBÓ	Ing. Julián Álvarez	Residente de interventoría	

MODIFICACIONES		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7

3. PERIODO DE REPORTE 9

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN) 10

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 11

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 12

7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 35

8. ASPECTOS TÉCNICOS 51

9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES 53

10. PLAN DE CALIDAD 55

11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS 56

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES 57

13. REPORTE ESTADISTICO 59

14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS 61

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN 62

16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN 66

17. ASPECTOS VARIOS 67

18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA 68

18.1 PERSONAL 68

18.2 EQUIPO 68

18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 68

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE. 70

20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES. 71

21. FACTOR SOCIAL 72

22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 73

23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 74

24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO 75

25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS 76

26. LISTADO DE PROVEEDORES 77

27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES 78

28. ESTADO PRESUPUESTAL 79

29. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 82

30. ANEXOS 83

Gráfica 1 Gráfica Curva S 80

Ilustración 1 Localización Zona 7 8
Ilustración 2 Precipitación mes de febrero 52

Tabla de contenido (Tablas)

Tabla 1 Datos generales del Contrato 7
Tabla 2 UPZ localidades asignadas 8
Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563 10
Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación 11
Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 1 35
Tabla 6 Inspecciones realizadas 51
Tabla 7 Actividades por componente 59
Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas 60
Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados 62
Tabla 10 Entrega suministro a almacen 65

Tabla 11 Estado Georeferenciación 67
Tabla 12 Personal mínimo 68
Tabla 13 Equipos empleados para la ejecución de las actividades 68
Tabla 14 Cantidades ejecutadas por ID 79
Tabla 15 Balance presupuestal 81

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de ENERO de 2018[1], se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en catorce (14) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3653 con la firma Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, el cual tiene por objeto "*Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. Zona Sur Oriete*", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar y y en los corredores de la Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano), o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 01, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, durante el periodo 24 de enero al 23 de febrero de 2025, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3653.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM 2024-3653
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. – ZONA SUR ORIENTE"
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	UT ECOSEÑALIZACION 2024
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	24 de enero 2025
Fecha de Terminación:	23 de noviembre del 2027
Valor Inicial:	$18.771.473.428
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: San Cristobal, Usme y Sumapaz, Corredores de Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano)
Interventoría:	JOYCO S.A.S BIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3668

Fuente: Elaboración propia

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la Zona 7 Sur Oriente , conformada por las localidades : San Cristobal, Usme y Sumapaz , también se ejecutarán actividades en los corredores asignados Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano) como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 1 Localización Zona 7



Fuente: Elaboración propia a partir de imagen en internet

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 2 UPZ localidades asignadas

4. San Cristóbal	5. Usme	20. Sumapaz
32 San Blas 33 Sosiego 34. 20 de Julio 50. La Gloria 51 Los Libertadores	52 La Flora 56 Danubio 57 Gran Yomasa 58 Comuneros 59 Alfonso Lopez 60 Parque Entre Nubes	Rio Blanco Río Sumapaz

Fuente: Elaboración propia

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024 en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3653, para el periodo del 24 de enero al 22 de febrero de 2025.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN)

Una vez firmada el Acta de Inicio No. SDM 2024-3653 (del 24 de enero de 2025), entre la Unión Temporal Ecoseñalización 2024 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía de seguros Mundial de Seguros a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 1. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos.:

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	24-1-2025	25-05-2030
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	(__% sobre el valor del anticipo)			
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	24-1-2025	25-05-2030
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	24-1-2025	25-05-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$3.754.294.686	24-1-2025	25-05-2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	24-1-2025	24-11-2027

Fuente: Elaboración propia

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
2	MV_05_122_1867_12	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
3	EX_05_119_1867_12	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
4	EX_05_93_1244_11	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
5	EX_05_110_1867_12	29/01/2025	USME	INSPECCIONADO
6	EX_05_053_1744_10	29/01/2025	USME	INSPECCIONADO
7	EX_05_108_1867_12	29/01/2025	USME	ASIGNADO
8	EX_05_003_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
9	EX_05_113_1867_12	29/01/2025	USME	ASIGNADO
10	EX_05_005_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
11	EX_05_004_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
12	EX_04_261_1561_10	29/01/2025	SAN CRISTOBAL	ASIGNADO
13	EX_05_352_1561_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
14	EX_05_101_1244_11	29/01/2025	USME	ASIGNADO
15	EX_05_002_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
16	EX_05_006_1744_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
17	EX_05_001_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
18	EX_05_280_1561_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
19	EX_05_007_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
20	EX_05_007_1445_14	29/01/2025	USME	ASIGNADO
21	EX_05_310_1561_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
22	EX_05_307_1561_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
23	EX_05_008_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
24	MV_20_526_943_10	29/01/2025	SUMAPAZ	ASIGNADO
25	MV_20_025_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	ASIGNADO
26	MV_20_021_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	ASIGNADO
27	SH_SV_PUNTO4_TMSA_V1	10/02/2025	USME	EN EJECUCIÓN
28	SDM-202461204315912 Y SDM-202461204636702	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
29	SDM-202461204158462	14/02/2025	USME	EJECUTADO
30	SDM- 202461203879272	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
31	SDM- 202461204426482	14/02/2025	SUMAPAZ	ASIGNADO
32	SDM-202561200270682	14/02/2025	USME	EJECUTADO
33	SUMINISTRO 1	18/02/2025	NA	EN EJECUCIÓN
34	SDM-202461204137592	20/02/2025	USME	EN EJECUCIÓN


Fuente: Elaboración propia


6. REGISTRO FOTOGRÁFICO


6.1 HORIZONTAL

MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	
ANTES	**DESPUÉS**
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14L	
	
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14I	
	

AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) CARRERA 14B	
	
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) CARRERA 14BBIS	
	

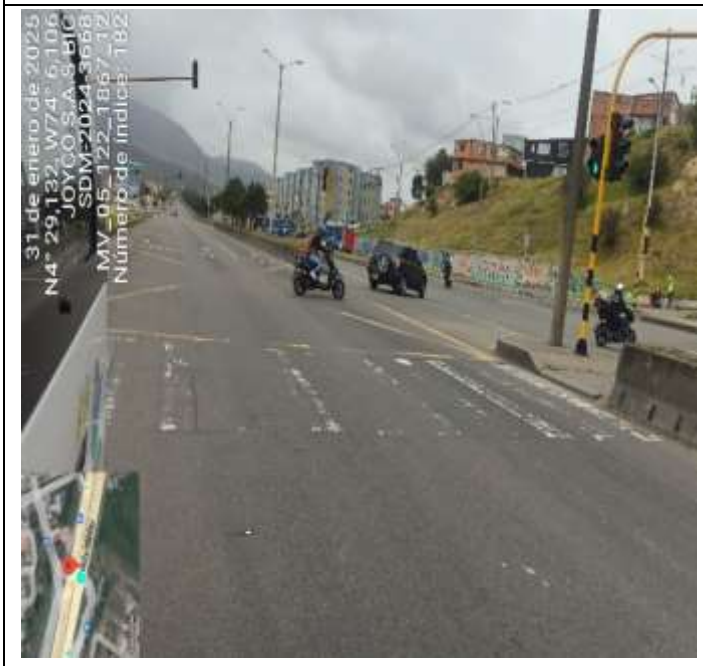MV_05_122_1867_12	
ANTES	**DESPUÉS**
AUTO AL LLANO (KR 1) CALLE 91 SUR	
	
AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CALLE 114 SUR	
	

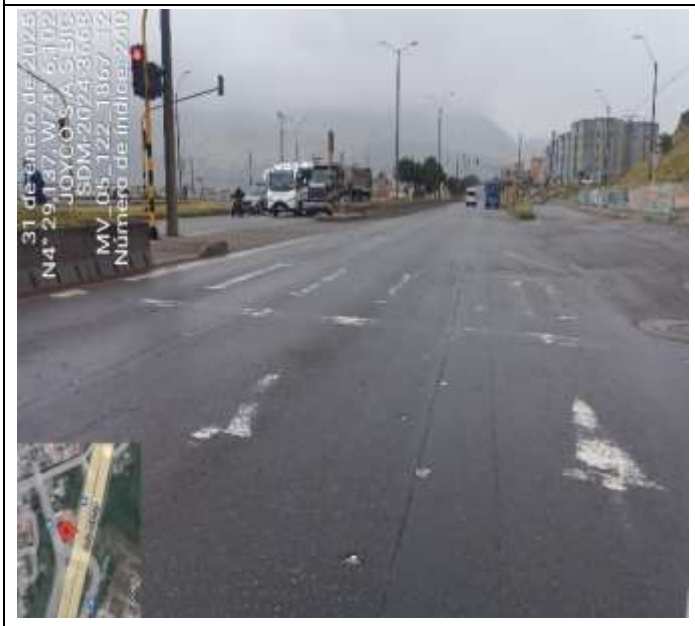AUTO AL LLANO (KR 1) CALLE 91 SUR	
	
AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) TRANSVERSAL 8 ESTE	
	

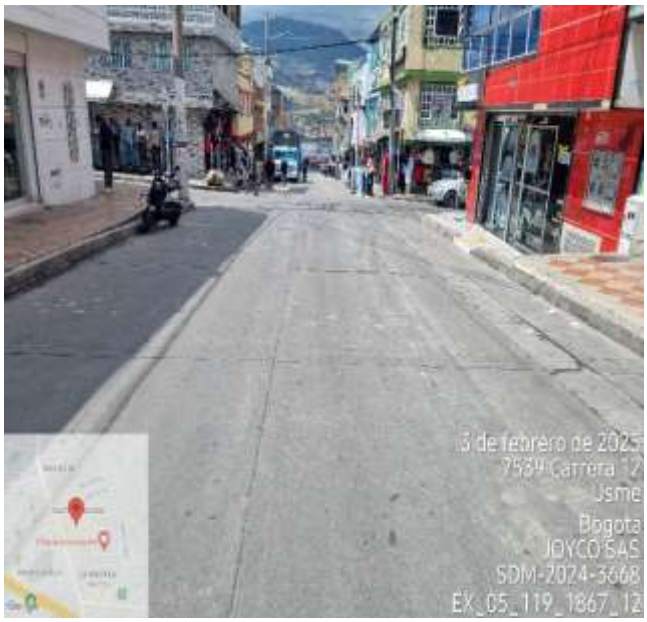
EX_05_119_1867_12	
ANTES	**DESPUÉS**
CARRERA 12 CL 75 SUR	
	
CARRERA 10 CL 75 SUR	
	


CARRERA 9B CL 75 SUR





CL 75A SUR CARRERA 9A

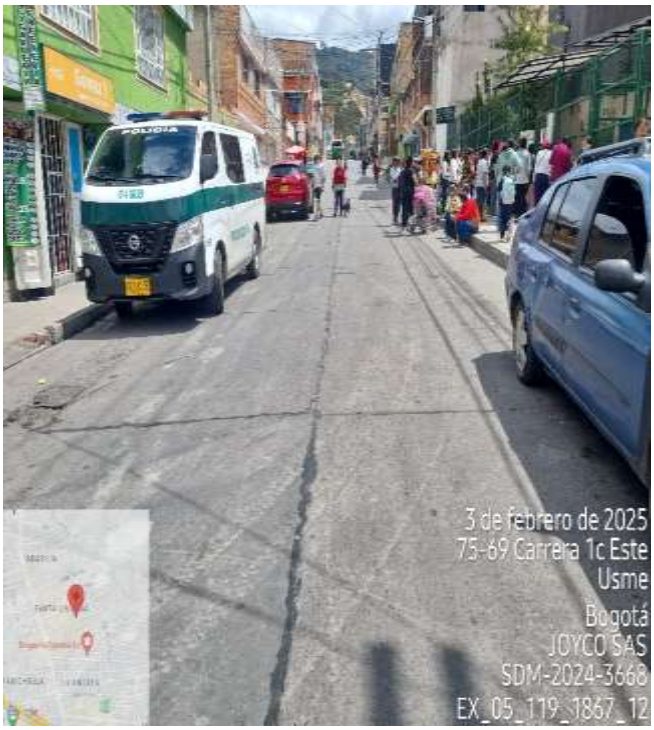

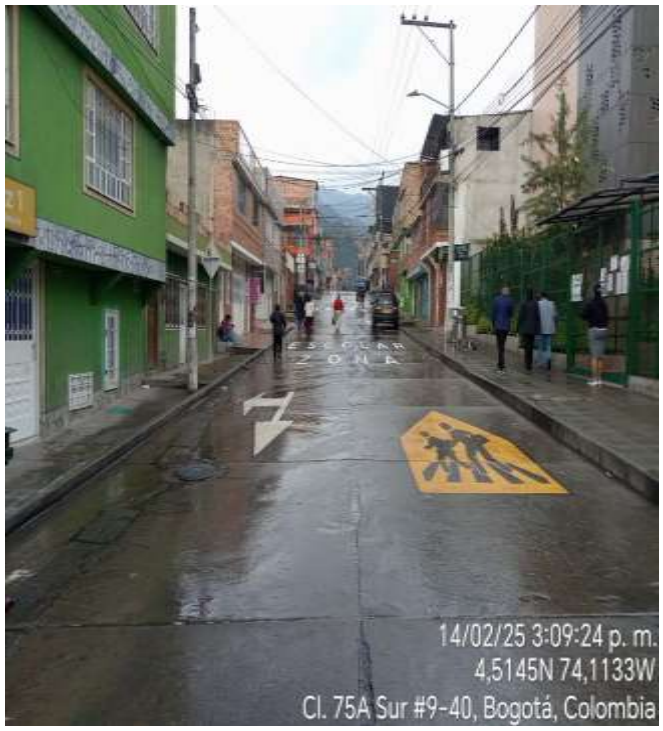

EX_05_93_1244_11	
ANTES	**DESPUÉS**
CALLE 73D SUR CARRERA 14R	
	
CALLE 73C SUR CARRERA 14R	
	

CALLE 73D SUR CARRERA 14R





CALLE 73D BIS SUR CARRERA 14R





6.2 VERTICAL

SH_SV_PUNTO4_TMSA	
CALZADA ORIENTAL - AC 71 SUR ENTRE DG 68A SUR Y DG 69C SUR	
	
	
	





PMT por EMERGENCIA propuesto en KR 14 No 136A 72 SUR - USME - 202461204426482

LOS LIBERTADORES












UNO A UNO




UNO A UNO




ZONA INESTABLE
TRANSITE CON
PRECAUCION

PMT DE EMERGENCIA SDM-202461204158462	
LOS LIBERTADORES	
	

26 feb 2025 8:39:07 a. m. # 111A-5 Carrera 8Ce Usme Bogotá, D.C.	26 feb 2025 9:14:36 a. m. # 8C-2 Calle 112 Sur Usme Bogotá, D.C.
26 feb 2025 8:40:45 a. m. # 8D-10 Calle 111 Sur Usme	DESVÍO AL SUR 26 feb 2025 9:15:41 a. m. # 8D-10 Calle 111 Sur Usme Bogotá, D.C.
26 feb 2025 8:48:40 a. m. # 111A-4 Carrera 9 Este Usme Bogotá, D.C.	DESVÍO AL NORTE 26 feb 2025 9:20:17 a. m. # 8C-97 Calle 111a Sur Usme Bogotá, D.C.

PMT DE EMERGENCIA SDM-202461204315912 y SDM-202461204636702	
LOS LIBERTADORES	
	


24 feb 2025 3:31:40 p. m.


24 feb 2025 3:51:28 p. m.
44-26 Transversal 3c Este
San Cristóbal
Bogotá


24 feb 2025 11:20:52 a. m.
San Cristóbal
Bogotá


24 feb 2025 1:26:39 p. m.
1-75 Calle 48a Sur
San Cristóbal
Bogotá


24 feb 2025 3:32:57 p. m.
44-12 Transversal 3c Este
San Cristóbal
Bogotá


DESVIO
24 feb 2025 3:52:39 p. m.
44-12 Transversal 3c Este
San Cristóbal
Bogotá


24 feb 2025 11:20:05 a. m.
San Cristóbal
Bogotá


24 feb 2025 4:50:32 p. m.
1-88 Calle 48a Bis Sur
San Cristóbal
Bogotá


24 feb 2025 1:06:24 p. m.
194 Carrera 1a
San Cristóbal
Bogotá


DESVIO
24 feb 2025 1:38:37 p. m.
43A-40 Carrera 1a
San Cristóbal
Bogotá, D.C.


24 feb 2025 1:06:04 p. m.
194 Carrera 1a
San Cristóbal
Bogotá


DESVIO
24 feb 2025 1:39:13 p. m.
43A-40 Carrera 1a
San Cristóbal
Bogotá, D.C.

24 feb 2025 11:18:26 a. m. 190 Calle 48 Sur San Cristóbal Bogotá	DESVÍO 24 feb 2025 1:28:22 p. m. 190 Calle 48 Sur San Cristóbal Bogotá
24 feb 2025 1:52:32 p. m. 47-27 Carrera 1 Este San Cristóbal Bogotá	24 feb 2025 2:43:48 p. m. 47-27 Carrera 1 Este San Cristóbal Bogotá

PMT DE EMERGENCIA SDM-202461203879272	
SAN CRISTOBAL	
	
	

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

PMT DE EMERGENCIA – SDM-202461204137592	
SAN CRISTOBAL	
	
	


27 feb 2025 2:49:51 p. m.


27 feb 2025 3:42:07 p. m.
10 Carrera 18 Este
San Cristóbal
Bogotá




DESVIO
27 feb 2025 12:14:01 p. m.


27 feb 2025 4:52:49 p. m.



27 feb 2025 5:09:17 p. m.
1825 Carrera 13 Este
San Cristóbal
Bogotá


27 feb 2025 5:32:37 p. m.


27 feb 2025 5:31:56 p. m.




27 feb 2025 12:21:41 p. m.

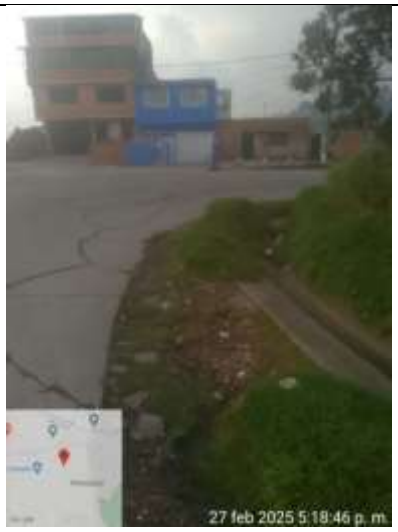
27 feb 2025 5:18:46 p. m.


27 feb 2025 5:33:45 p. m.

30
DESVIC
27 feb 2025 12:12:05 p. m.

7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 17 de enero de 2025, a su vez la Interventoría remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la Secretaría Distrital de Movilidad con radicado SDM 202561200352442. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531200443941 del 04 de febrero de 2025, informo que "…una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de demarcación e instalación de señalización vertical de la zona 7 localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz,, mediante el contrato del asunto, se emite autorización a la propuesta…" e indica que la vigencia de la autorización es desde la fecha del comunicado hasta el 03 de febrero de 2026.

En el periodo de este informe del 24 de enero al 23 de febrero de 2025, se solicitaron y tramitaron los siguientes PMTs:

Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 1

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
7	13/02/2025	3000	19012839	5003432	AUTO AL LLANO (AC 71 SUR) KR 4	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	19/02/2025
7	13/02/2025	3001	5003437	N/A	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 10	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	19/02/2025
7	13/02/2025	3002	19012839	5003368	AUTO AL LLANO (AC 71 SUR) KR 4	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 13	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	19/02/2025
7	13/02/2025	3003	5003432	5003440	AUTO AL LLANO (CL 85 SUR) KR 12	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	19/02/2025
7	13/02/2025	3004	5003438	5007936	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	AUTO AL LLANO (KR1) CL 90D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
7	13/02/2025	3005	5005454	50005303	AUTO AL LLANO (KR1) CL 90D SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 113 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
7	13/02/2025	3006	50005302	5007737	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 113 SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) 270m AL SUR DE LA TV 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
7	13/02/2025	3007	5003438	5007936	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	AUTO AL LLANO (KR1) CL 90D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
7	13/02/2025	3008	5005454	50005303	AUTO AL LLANO (KR1) CL 90D SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 113 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
7	13/02/2025	3009	50005302	5007737	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 113 SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) 270m AL SUR DE LA TV 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
7	13/02/2025	3010	5003798	5003821	CL 87C SUR AUTO AL LLANO (KR 1)	CL 87C SUR KR 2 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
7	13/02/2025	3011	5005398	5005455	CL 91 SUR KR 2	CL 91 SUR AUTO AL LLANO (KR1)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
7	13/02/2025	3012	5005619	N/A	CL 91 SUR AUTO AL LLANO (KR1)	CL 91 SUR KR 1BBIS ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
7	13/02/2025	3013	5007254	N/A	TV 7 ESTE CL 108 SUR	TV 7 ESTE AUTO AL LLANO (CL110 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACION DE EMERGENCIA	6/02/2025	20/02/2025
8	20/02/2025	3608	5002304	N/A	CL 76 SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 76 SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4079	5002118	50005014	KR 12 CL 75 SUR	KR 12 CL 76A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
8	20/02/2025	4080	5002088	5002324	KR 10 CL 75 SUR	KR 10 CL 76 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4081	5002009	5002065	KR 9B CL 75 SUR	KR 9B CL 75A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4082	5001984	5002336	KR 9A CL 75 SUR	KR 9A CL 76 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4083	5002016	5002666	KR 8D TV 8BBIS	KR 8D CL 78 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4084	5002095	5002286	KR 8C CL 75A SUR	KR 8C CL 75D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4085	5002084	5002582	KR 8B DG 75ABIS SUR	KR 8B CL 76C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4086	5002144	5002322	KR 8BIS CL 75B SUR	KR 8BIS CL 75D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4087	5002408	N/A	KR 8 CL 75D SUR	KR 8 CL 76A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4088	5009267	N/A	KR 8A CL76A SUR	KR 8A 45m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4089	5002412	5008252	KR 7 CL 75D SUR	KR 7 CL 77BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4090	5002347	5002599	KR 6 CL 75CBIS SUR	KR 6 CL 77BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
8	20/02/2025	4091	5002207	N/A	KR 6 CL 75BBIS SUR	KR 6 CL 75B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4092	5002434	5002563	KR 5 CL 75D SUR	KR 5 CL 77BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4093	5002560	N/A	KR 4 CL 76C SUR	KR 4 CL 77BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4094	5002153	5001994	CL 75A SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 75A SUR TV 8BBIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4095	5002177	N/A	KR 13 CL 75B SUR	KR 13 CL 75A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4096	5002291	N/A	CL 76 SUR KR 12	CL 76 SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4097	50005013	N/A	KR 10A CL 75B SUR	KR 10A KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4098	5002210	5002094	CL 75B SUR KR 12	CL 75B SUR KR 8B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4099	5002182	5002171	CL 75C SUR KR 8D	CL 75C SUR KR 8B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4100	50005070	5002282	CL 75CBIS SUR KR 8B	CL 75CBIS SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4101	5002287	5002348	CL 75D SUR KR 8D	CL 75D SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
8	20/02/2025	4102	5002343	N/A	CL 76 SUR KR 8D	CL 76 SUR KR 8B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4103	5002403	5002416	CL 76A SUR KR 8D	CL 76A SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4104	50000475	5002463	CL 76B SUR KR 8B	CL 76B SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4105	5002556	5002509	CL 76C SUR KR 8B	CL 76C SUR KR 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4106	5002613	5002559	CL 77BIS SUR 8B	CL 77BIS SUR KR 3A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4107	5002166	50000371	CL 75B SUR KR 8BIS	CL 75B SUR 28m AL ORIENTE DE LA KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4108	5002565	N/A	KR 11 CL 76B SUR	KR 11 CL 77 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4109	5002499	5002490	CL 76B SUR KR 11	CL 76B SUR KR 9B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4110	5002566	5002575	CL 77 SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 77 SUR KR 8D	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4111	5002660	N/A	KR 10 CL 77 SUR	KR 10 CL 78 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	24/02/2025
8	20/02/2025	4112	5009261	5002014	TV 8BBIS CL 75 SUR	TV 8BBIS KR 8B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	25/02/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
8	20/02/2025	4113	5002037	5002051	DG 75ABIS SUR KR 8B	DG 75ABIS SUR TV 8BIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	11/02/2025	25/02/2025
8	20/02/2025	4114	5001415	5001392	CL 73 SUR KR 14V	CL 73 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4115	5001566	5001529	CL 73B SUR KR 14L	CL 73B SUR KR 14A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4116	5001610	5001576	CL 73BBISA SUR KR 14I	CL 73BBISA SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4117	5001729	5001655	CL 73D SUR KR 14L	CL 73D SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4118	5001282	5001805	KR 14L CL 71F SUR	KR 14L CL 73DBIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4119	5001793	5007842	KR 14C CL 73DBIS SUR	KR 14C CL 74C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4120	5007854	5002351	KR 14R AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	KR 14R CL 76 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4121	5002648	5002476	KR 14L AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	KR 14L 76B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4122	5002441	N/A	KR 14F CL 76B SUR	KR 14F CL 76 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4123	5002994	N/A	KR14ABIS CL 78 SUR	KR 14ABIS AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
8	20/02/2025	4124	5002289	5002257	CL 76 SUR KR 14R	CL 76 SUR KR 14A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4125	5002381	5002442	CL 76B SUR KR 14L	CL 76B SUR KR 14F	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4126	5002431	5002477	CL 77 SUR KR 14R	CL 77 SUR KR 14L	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	13/02/2025	26/02/2025
8	20/02/2025	4127	5003163	N/A	CL 81A SUR KR 10	CL 81A SUR KR 9A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4128	5003354	N/A	KR 8C CL 81C SUR	KR 8C CL 83 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4129	5003246	N/A	KR 8CBIS CL 81BIS SUR	KR 8CBIS CL 81C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4130	5003176	5003161	CL 81C SUR KR 8B	CL 81C SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4131	5003256	N/A	KR 8 CL 81C SUR	KR 8 CL 82 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4132	5003057	5003059	CL 81BIS SUR KR 8	CL 81BIS SUR KR 6A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4133	5003051	N/A	KR 8 CL 81BIS SUR	KR 8 CL 81 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4134	5003215	5003204	CL 82 SUR KR 5	CL 82 SUR KR 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
8	20/02/2025	4135	5003333	5003346	CL 83 SUR KR 5	CL 83 SUR KR 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4136	5003156	5003145	CL 82 SUR KR 3A	CL 82 SUR KR 2	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4137	5003375	50005075	CL 83 SUR KR 3A	CL 83 SUR KR 2	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4138	5002977	5002700	CL 81 SUR KR 1 ESTE	CL 81 SUR KR 6D ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4139	5009335	N/A	CL 79 SUR CL 81 SUR	CL 79 SUR KR 10 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4140	5002735	5002703	CL 84 SUR KR 8 ESTE	CL 84 SUR KR 9 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4141	5002874	N/A	KR 8A ESTE CL 81 SUR	KR 8A ESTE CL 81A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4142	5002874	N/A	KR 9 ESTE CL 81 SUR	KR 9 ESTE 40m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
8	20/02/2025	4143	5010007	5010009	KR 10 ESTE 250m AL NORTE DE LA CL 79 SUR	KR 10 ESTE 80m AL SUR DE LA CL 79 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	FORMALIZACIÓN DE LA MERGENCIA	14/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	217	5001272	5001260	CL 72 SUR KR 14A	CL 72 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	218	5002895	N/A	CL 81 SUR KR 14BIS	CL 81 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	18/02/2025	294	5001293	5001296	CL 72BIS SUR KR 14GBIS	CL 72BIS SUR KR 14BISA	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	295	5001324	5001323	CL 72A SUR KR 14GBIS	CL 72A SUR KR 14A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	296	5001413	N/A	CL 73BIS SUR KR 14HBIS	CL 73BIS SUR KR 14C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	297	5001446	N/A	CL 73A SUR KR 14BISA	CL 73A SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	298	5001531	5001487	CL 73A SUR KR 14V	CL 73A SUR KR 14L	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	299	5001572	5001538	CL 73ABIS SUR KR 14T	CL 73ABIS SUR KR 14L	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	300	5001608	5001584	CL 73B SUR KR 14R	CL 73B SUR KR 14P	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	301	5001682	5001666	CL 73BBIS SUR KR 14T	CL 73BBIS SUR KR 14Q	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	302	5001750	5001694	CL 73C SUR AUTO AL LLANO (KR 14V)	CL 73C SUR KR 14L	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	303	5001671	5001653	CL 73C SUR KR 14L	CL 73C SUR KR 14C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	304	5001794	N/A	CL 73D SUR KR 14R	CL 73D SUR AUTO AL LLANO (KR 14V)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	18/02/2025	305	5001782	N/A	CL 73D SUR KR 14R	CL 73D SUR KR 14P	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	307	5001840	5001813	CL 74 SUR KR 14HBIS	CL 74 SUR KR 14C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	308	5001873	5001819	CL 74A SUR KR 14DBIS	CL 74A SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	309	5001920	5001877	CL 74B SUR KR 14HBIS	CL 74B SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	310	5001962	5001922	CL 74BBIS SUR KR 14H	CL 74BBIS SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	311	5001409	5001667	KR 14R CL 72A SUR	KR 14R CL 73BBIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	312	5001398	5001505	KR 14Q CL 72 SUR	KR 14Q CL 73A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	313	5001388	5001488	KR 14P CL 72A SUR	KR 14P CL 73A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	314	5001683	N/A	KR 14T CL 73ABIS SUR	KR 14T CL 73BBIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	315	5001650	5001706	KR 14Q CL 73B SUR	KR 14Q CL 73C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	316	5001575	5001824	KR 14P CL 73ABIS SUR	KR 14P CL 73DBIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	18/02/2025	317	5001767	5009246	KR 14R CL 73C SUR	KR 14R CL 73DBIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	318	5001466	5001654	KR 14I CL 73 SUR	KR 14I CL 73C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	319	5001345	5001395	KR 14HBIS CL 72 SUR	KR 14HBIS CL 73BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	320	5001340	N/A	KR 14H CL 72 SUR	KR 14H CL 72A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	321	5001322	N/A	KR 14GBIS CL 72BIS SUR	KR 14GBIS CL 72A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	322	5001412	5001537	KR 14C CL 73 SUR	KR 14C CL 73B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	323	5001591	N/A	KR 14D CL 73B SUR	KR 14D CL 73BBISA SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	324	5001921	N/A	KR 14HBIS CL 74 SUR	KR 14HBIS CL 74B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	325	5001919	N/A	KR 14H CL 74 SUR	KR 14H CL 74B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	326	5001874	5001899	KR 14DBIS CL 74 SUR	KR 14DBIS CL 74B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	327	5001986	N/A	KR 14H CL 74BBIS SUR	KR 14H 25m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	18/02/2025	328	5009248	N/A	KR 14GBIS CL 74BBIS SUR	KR 14GBIS 25m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	329	5002031	N/A	KR 14G CL 74BBIS SUR	KR 14G CL 74C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	330	5001848	N/A	KR14B CL 73DBIS SUR	KR14B CL 74A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	331	5001831	N/A	KR14A CL 73DBIS SUR	KR14A CL 74A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	332	5001820	N/A	KR14BIS CL 73DBIS SUR	KR14BIS CL 74A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	333	5001928	N/A	KR 14A CL74B SUR	KR 14A CL74BBIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	334	5001923	N/A	KR 14BIS CL74B SUR	KR 14BIS CL74BBIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	335	5002726	5002704	CL 78 SUR KR 14ABIS	CL 78 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	336	5002956	N/A	CL 81BIS SUR KR 14BIS	CL 81BIS SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	337	30000760	N/A	CL 81BISA SUR AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	CL 81BISA SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	338	5003032	N/A	KR 14A CL 78 SUR	KR 14A AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	18/02/2025	339	5002896	5002957	KR 14BIS CL 78 SUR	KR 14BIS CL 81BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	340	5001273	5001378	KR 14A CL 71G SUR	KR 14A CL 73 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	341	5001525	5001577	KR 14A CL 73S	KR 14A CL 73BBISA SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	20/02/2025	386	5001858	50009489	CL 73DBIS SUR AUTO AL LLANO (KR 14V)	CL 73DBIS SUR KR 14L	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	20/02/2025	6/03/2025
EMERGENCIAS	20/02/2025	387	5001811	5001717	CL 73DBIS SUR KR 14L	CL 73DBIS SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	20/02/2025	6/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	372	5003034	N/A	CL 81BIS SUR KR 8CBIS	CL 81BIS SUR KR 8C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	373	5003252	N/A	KR 7 CL 81BIS SUR	KR 7 CL 82 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	374	5003205	5003456	KR 4BIS CL 81 SUR	KR 4BIS AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	375	5003199	5003458	KR 4 CL 81 SUR	KR 4 AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	376	5003157	5003460	KR 3A CL 81 SUR	KR 3A AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	377	5003146	5003462	KR 3 CL 81 SUR	KR 3 AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	18/02/2025	378	5003376	5003464	KR 2 CL 82 SUR	KR 2 AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	18/02/2025	379	5002744	N/A	CL 80 SUR KR 2 ESTE	CL 80 SUR KR 3 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/02/2025	4/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	388	50009088	50009282	KR 11 70m AL NORTE DE LA CL 65C SUR	KR 11 CL 67ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	389	50009095	5000581	KR 11 CL 67ABIS SUR	KR 11 CL 68A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	390	50009087	N/A	CL 65C SUR KR 13	CL 65C SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	391	50009089	N/A	CL 67A SUR KR 13	CL 67A SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	392	50009090	N/A	CL 67A SUR KR 13	CL 67A SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	393	50009283	N/A	CL 67ABIS SUR KR 11	CL 67ABIS SUR KR 7H	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	394	50009092	N/A	CL 67D SUR KR 13	CL 67D SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	395	5000627	5000570	TV 7B CL 68B SUR	TV 7B CL 68 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	396	5000563	5000531	KR 7H CL 68 SUR	KR 7H CL 66A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	23/02/2025	27/02/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	21/02/2025	267	19012839	5003432	AUTO AL LLANO (AC 71 SUR) KR 4	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	268	5003435	5003437	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 11	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	269	19012839	5003368	AUTO AL LLANO (AC 71 SUR) KR 4	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 13	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	270	5003432	5003440	AUTO AL LLANO (CL 85 SUR) KR 12	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	271	5003438	5007936	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	272	5005454	50005302	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	273	5007736	5007737	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) 270m AL SUR DE LA TV 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	274	5003438	5007936	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	275	5005454	50005302	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	21/02/2025	276	5007736	5007737	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) 270m AL SUR DE LA TV 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	277	5003798	5003821	CL 87C SUR AUTO AL LLANO (KR 1)	CL 87C SUR KR 2 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	278	5005398	5005455	CL 91 SUR KR 2	CL 91 SUR AUTO AL LLANO (KR 1)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025
EMERGENCIAS	21/02/2025	279	5005619	N/A	CL 91 SUR AUTO AL LLANO (KR 1)	CL 91 SUR KR 1BBIS ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	21/02/2025	7/03/2025

Fuente: elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 2. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información detallada de cada autorización.

8. ASPECTOS TÉCNICOS

8.1 MODIFICACIONES REALIZADAS

- El día 10 de febrero de 2024 mediante correo electrónico se le asignó a la Union Temporal Ecoseñalizacion 2024 fue asignado el punto SH_SV_PUNTO4_TMSA_V1 DG 68A Sur con Av Boyacá, esto genera modificaciones en el ID MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3 entregado el 29 de enero de 2025

8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen las ejecutadas a la fecha:

- Revisión en plataforma SIGIDU
- Se realiza la solicitud de los planes de manejo de tránsito PMT para los puntos a intervenir.
- Socialización de actividades de implementación en colegios y zonas de alto flujo peatonal.
- Implementación de señalización horizontal y vertical de acuerdo a los planos inspeccionados e instalación de dispositivos según diseños.

8.3 INSPECCIONES

- A continuación se relacionan los diseños inspeccionados en el periodo al que hace referencia este informe (24 de enero a 23 de febrero de 2025)

Tabla 6 Inspecciones realizadas

No	ID Diseño	Localidad	Fecha de Asignación	Estado
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	USME	30/01/2025	INSPECCIONADO
2	MV_05_122_1867_12	USME	30/01/2025	INSPECCIONADO
3	EX_05_119_1867_12	USME	04/02/2025	INSPECCIONADO
4	EX_05_93_1244_11	USME	04/02/2025	INSPECCIONADO
5	EX_05_110_1867_12	USME	05/02/2025	INSPECCIONADO
6	EX_05_053_1744_10	USME	06/02/2025	INSPECCIONADO


Fuente: Elaboracion propia

En el Anexo 3 (3.1 Inspecciones) se encuentran los formatos de inspecciones.

8.4 ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo al que hace referencia este informe (24 de enero a 23 de febrero de 2025) se presentaron 19 días de lluvias.

Ilustración 2 Precipitación mes de febrero

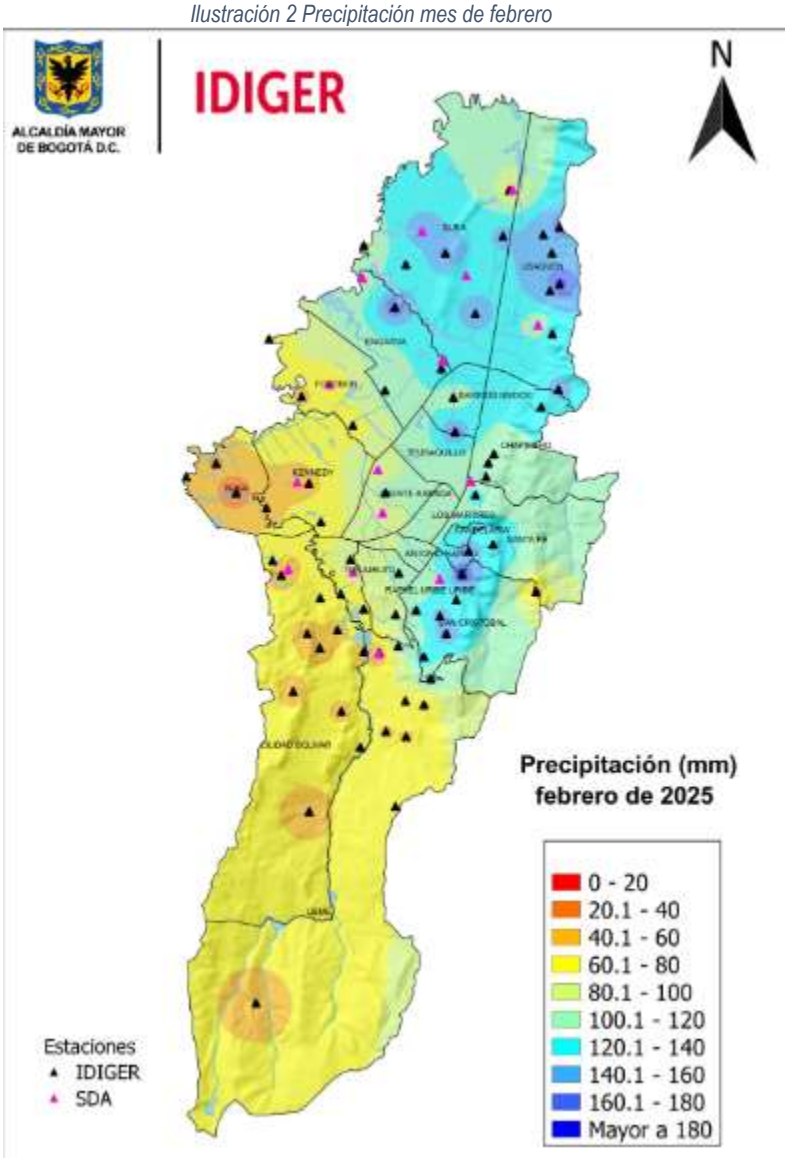

9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

A continuación, se relacionas las actividades de consulta por diseño, en los visores y entidades correspondientes.

DISEÑO	Geoportales		ENTIDADES CONSULTADAS
	https://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4	https://webidu.idu.gov.co/sigidu/	
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
MV_05_122_1867_12	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_05_119_1867_12	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_05_053_1744_10	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_05_93_1244_11	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial)

DISEÑO	Geoportales		ENTIDADES CONSULTADAS
	https://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4	https://webidu.idu.gov.co/sigidu/	
			-EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_05_110_1867_12	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU

En el Anexo 4, se encuentran las cartas radicadas a las diferentes entidades..

10. PLAN DE CALIDAD

La información referente al Plan de Calidad se encuentra en el Anexo 5.

11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS

La información respecto al protocolo de manejos de residuos se encuentra en el Anexo 6

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES

En el periodo al que se hace referencia en este informe se ejecutaron actividades en los siguientes corredores:

12.1 AV BOYACÁ

- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.
- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.
- Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.

12.2 VIA AL LLANO

- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744
- Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.

- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas
- Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica

13. REPORTE ESTADISTICO

13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 7 Actividades por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	% Ejecutado en el ID en Señalización vertical del periodo	Señalización Horizontal	% Ejecutado en el ID en Señalización Horizontal del periodo	Total, ejecutado en el periodo de informe
SH_SV_PUNTO4_TMSA	5- Usme	$ 12.235.496,00	100,00%		0,00%	$ 12.235.496,00
EX_05_93_1244	5- Usme		0,00%	$ 42.787.232,74	100,00%	$ 42.787.232,74
Suministro	NA		0,00%		0,00%	$ 88.935.514,00
SDM-202461204315912 Y SDM-202461204636702	4- San Cristobal	$ 8.199.410,00	100,00%		0,00%	$ 8.199.410,00
SDM-202461204158462	5- Usme	$ 2.328.163,00	100,00%		0,00%	$ 2.328.163,00
SDM- 202461203879272	4- San Cristobal	$ 2.055.197,00	100,00%		0,00%	$ 2.055.197,00
SDM-202461204137592	5- Usme	$ 2.648.273,00	100,00%		0,00%	$ 2.648.273,00
SDM-202461203879272	5- Usme	$ 12.673.759,00	100,00%		0,00%	$ 12.673.759,00
EX_05_119_1867_12	5- Usme		0,00%	$ 182.212.252,00	100,00%	$ 182.212.252,00
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	5- Usme		0,00%	$ 377.436.656,36	100,00%	$ 377.436.656,36
MV_05_122_1867_12	5- Usme		0,00%	$ 162.230.791,33	100,00%	$ 162.230.791,33
TOTAL		**$ 40.140.298,00**		**$ 764.666.932,43**		**$ 893.742.744**

Fuente: Elaboración propia

El valor total ejecutado en el periodo al que hace referencia este informe es de **$893.742.744**, en la localidad de Usme se ejecutó un valor de $ 794.552.623,43 lo que corresponde al 88,90% de la ejecución total, en la localidad de San Cristobal se ejecutó un valor de $ 10.254.607,00 lo que corresponde a un 1,15% de la ejecución total, y se realizó la entrega de un suministro por valor de $ 88.935.514,00 que corresponde a un 9,95 % de lo ejecutado en este mes.

13.2 ZONAS ESCOLARES

A continuación, se relacionan las instituciones beneficiadas con la intervención:

Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas

INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA	ID DISEÑO	CIV	No SEÑAL
COLEGIO SAN GREGORIO HERNANDEZ	220	EX_05_119_1867_12	50005014	5
IED COLEGIO SANTA LIBRADA	850	EX_05_119_1867_12	50005014	5
			5002168	160
			5002154	170
			5002131	184
			5002117	194
			5002117	195
			5002087	220
			5002065	230
			5002064	231
COLEGIO JUAN RULFO	175	EX_05_119_1867_12	50005013	10
			5002211	128
			5002210	135
			5002130	187
			5002117	194
			5002117	195
JARDÍN SOCIAL CENTRO CRECER TEJAR	50	EX_05_119_1867_12	5002162	166
			5002094	211
			5002084	223
HOGAR INFANTIL BARQUITO DE PAPEL	150	EX_05_119_1867_12	5008374	27
COLEGIO ALMIRANTE PADILLA	320	EX_05_119_1867_12	5002574	34
			5002492	44
			5002403	58
JARDIN LOS PAYASITOS ICBF	125	EX_05_119_1867_12	5002171	155
TOTAL	**1890**			

Fuente: Elaboración propia

14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS

En el Anexo 7 se encuentra la información respecto a los certificados de calibración.

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

En el Anexo 8. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona la señalización vertical y los dispositivos viales instalados en el periodo del 24 de enero al 23 de febrero de 2025:

Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	35,85	$ 364.850,76	$ 116.752,24	N/A	$ 481.603,00	$ 17.265.467,55
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	65	$ 116.052,27	$ 37.136,73	65,00	$ 153.189,00	$ 9.957.285,00
3	UND	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	1	$ 145.683,33	$ 46.618,67	1,00	$ 192.302,00	$ 192.302,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	20	$ 283.821,21	$ 90.822,79	20,00	$ 374.644,00	$ 7.492.880,00
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	3	$ 449.300,00	$ 143.776,00	3,00	$ 593.076,00	$ 1.779.228,00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	0,2	$ 348.364,39	$ 111.476,61	N/A	$ 459.841,00	$ 91.968,20

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22	UND	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	1	$ 141.362,88	$ 45.236,12	1,00	$ 186.599,00	$ 186.599,00
26	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	59	$ 39.680,30	$ 12.697,70	N/A	$ 52.378,00	$ 3.090.302,00
28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	3	$ 21.279,55	$ 6.809,45	N/A	$ 28.089,00	$ 84.267,00
TOTAL								**$40.140.299**

VALOR EN LETRAS	CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Fuente: Acta de Recibo a Satisfacción 34

Tabla 10 Entrega suministro a almacen

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
6S	UND	Barricada, ancho 2,4 m, 3 listones de 20 cm de ancho en material reflectivo tipo iv o superior (blanco y naranja), altura min 1,5m, figura 7-14 resolución 20243040045005 del 17/09/2024.	$ 441.240	10	4.412.400
10S	UND	Bastón luminoso Bicolor	$ 128.767	334	43.008.178
1S	UND	Suministro de cono vial construido en material sintetico flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	$ 98.185	258	25.331.730
9S	UND	Dispositivos luminosos tipo flasher para cono	$ 40.591	14	568.274
12S	UND	Dispositivos luminosos tipo flasher para valla puesto de control	$ 48.973	20	979.460
11S	UND	Señales temporales SR- SP con apoyo trípode NO ADELANTAR SR-26 PORTATIL CON APOYO TRIPODE	$ 325.558	4	1.302.232
7S	UND	Señal pare/siga en papel retroreflectivo tipo IV o superior (30 cm)	$ 50.411	32	1.613.152
11S	UND	SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON APOYO TRIPODE SR-04 SR-05 SR-06 SR-07 SR-08 (4 DE CADA UNA)	$ 325.558	20	6.511.160
11S	UND	SEÑALTEMPORAL ACCIDENTE PEE-01 PORTATIL CON APOYO TRIPODE	$ 325.558	11	3.581.138
11S	UND	SEÑALES TEMPORALES SR- SP CON APOYO TRIPODE VEL MAX SR-30 PORTATIL	$ 325.558	5	1.627.790
				Valor Total de la Entrega	**$88.935.514**

16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN

En el periodo al que hace referencia este informe no se realizó entrega de señales retiradas en vía, sin embargo, cuando se realicen entregas, la información se encontrará en el Anexo 9.

17. ASPECTOS VARIOS

17.1 GEOREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación del Obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 23 de febrero de 2025.

Tabla 11 Estado Georeferenciación

CUENTA	ID	ENTREGA	ESTADO
1	EX_05_93_1244_11	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_119_1867_12	6-mar-25	EN REVISION INTERVENTORIA
1	MV_05_122_1867_12		CONTRATISTA
1	MV_AV_BOYACA_941_09		CONTRATISTA
1	MV_04_230_1561_10	5-mar-25	EN REVISION SDM
1	EX_04_044_1561_10	6-mar-25	EN REVISION SDM
1	EX_04_211_1561_10	5-mar-25	EN REVISION SDM
1	EX_05_320_1561_10	5-mar-25	EN REVISION SDM
1	EX_05_341_1561_10	5-mar-25	EN REVISION SDM

Elaboración: Fuente propia

18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA

18.1 PERSONAL

Tabla 12 Personal mínimo

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DEL PROYECTO	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	DIANA PAOLA PARADA SIERRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DIURNO	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	DIEGO GUALTEROS CHAVEZ
TRABAJADOR SOCIAL	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBÓN
PROFESIONAL STT	YULID LILIANA GELVES HERRERA
TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	GIOVANNY ALEXANDER BRITO NÚÑEZ
CONDUCTOR DIURNO	WILMER SIERRA
CONDUCTOR NOCTURNO	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO
SECRETARIA	YOLIMA PATIÑO LOBATON
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA

Fuente: Elaboración propia

18.2 EQUIPO

Tabla 13 Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Maquina	Serie	Tipo de Vehículo	Placa	Marca
Aplicación de pintura liquida	-	Camión	VFB357	Chevrolet
Maquina autopropulsable TITAN 1000	TAPT002	Camión	WEP027	Jac
Aplicación de plástico en frio	IAPT001	Camión	WNN061	Jac
Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN	1. 1439800069 2. 1439800007 3. 1439800083	N/A	N/A	Titan
Featherlite	2001-454	N/A	N/A	ThermoMark II
Hydra M 4000, W FILTE/ (433- 801)	120700042	N/A	N/A	Titan

Fuente: Elaboración propia

18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

21. FACTOR SOCIAL

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La información referente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el Anexo 11.

23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

24.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el primer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de enero al 23 de febrero del 2025 se realizaron actividades administrativas como:

- Revisión de documentación contractual.
- Revisión de Anexo técnico.
- Requerimientos mediante oficios.
- Respuestas a requerimientos de Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría,
- Asistencia a comités técnicos y mesas de trabajo y revisión de acta de comité.
- Asistencia comités de representantes legales.
- Entrega y firma de planillas de implementación señalización horizontal y vertical.
- Atención a las solicitudes de Interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad, en desarrollo del objeto del contrato vigilado.
- Entrega financiera del contrato de obra

24.2 ASPECTO JURIDICO

En el primer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de enero al 23 de febrero del 2025 se realizaron actividades s jurídicas como
:

- Ejecución del Contrato de Obra dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos para el mismo.
- Solicitudes de reclamaciones por parte de la interventoría.
- No se generaron reclamaciones por parte del contratista .
- No se generaron requerimientos de suspensión o prórroga del contrato de obra.

24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Estas planillas se encuentran en el Anexo 11, Gestión SST, anexos, anexo A Seguridad Social.

25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS

Esta certificación se encuentra en el Anexo 12 Certificación salarios y honorarios.

26. LISTADO DE PROVEEDORES

La Unión Temporal cuenta con los siguientes proveedores:

- Pintuflex :Pintura en plástico en frio metilmetacrilato (spray) :
- Ecotraffic: Pintura de plástico en frio metilmetacrilato (llana)
- Ecotraffic: Imprimante acrílico negro

27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES

Esta certificación se encuentra en el Anexo 13 Certificación pago proveedores.

28. ESTADO PRESUPUESTAL

29.1 RESUMEN CUENTA 1

Tabla 14 Cantidades ejecutadas por ID

No	Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado	% Ejecutado
1	SH_SV_PUNTO4_TMSA	5- Usme	$ 50.090.478,00	$ 12.235.496,00	24,43%
2	EX_05_93_1244	5- Usme	$ 699.289.833,00	$ 42.787.232,74	6,12%
3	Suministro	NA	$ 136.618.488,85	$ 88.935.514,00	65,10%
4	SDM-202461204315912 Y SDM-202461204636702	4- San Cristóbal	$ 8.199.410,00	$ 8.199.410,00	100,00%
5	SDM-202461204158462	5- Usme	$ 2.328.163,00	$ 2.328.163,00	100,00%
6	SDM- 202461203879272	4- San Cristóbal	$ 2.055.197,00	$ 2.055.197,00	100,00%
7	SDM-202461204137592	5- Usme	$ 2.648.273,00	$ 2.648.273,00	100,00%
8	SDM-202461203879272	5- Usme	$ 14.536.980,00	$ 12.673.759,00	87,18%
9	EX_05_119_1867_12	5- Usme	$ 922.913.984,00	$ 182.212.252,00	19,74%
10	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	5- Usme	$ 723.774.810,00	$ 377.436.656,36	52,15%
11	MV_05_122_1867_12	5- Usme	$ 1.079.073.835,00	$ 162.230.791,33	15,03%
TOTAL			**$ 3.641.529.452**	**$ 893.742.744**	


GEO SIN APROBAR	$	120.721.085,00
VALOR X COBRAR	**$**	**773.021.659,43**

En el Anexo 14 se encuentran las planillas de obra, acta parcial de obra y suministro.

29.2 AVANCE PARCIAL

A continuación , se presenta el avance parcial y acumulado respecto al mes de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar de acuerdo con lo estipulado por la interventoría, el cual representa un valor de **7,5%** del valor total del contrato, lo ejecutado en este periodo equivale al **4,12%** lo que representa un atraso del **3, 38%.**

Gráfica 1 Gráfica Curva S

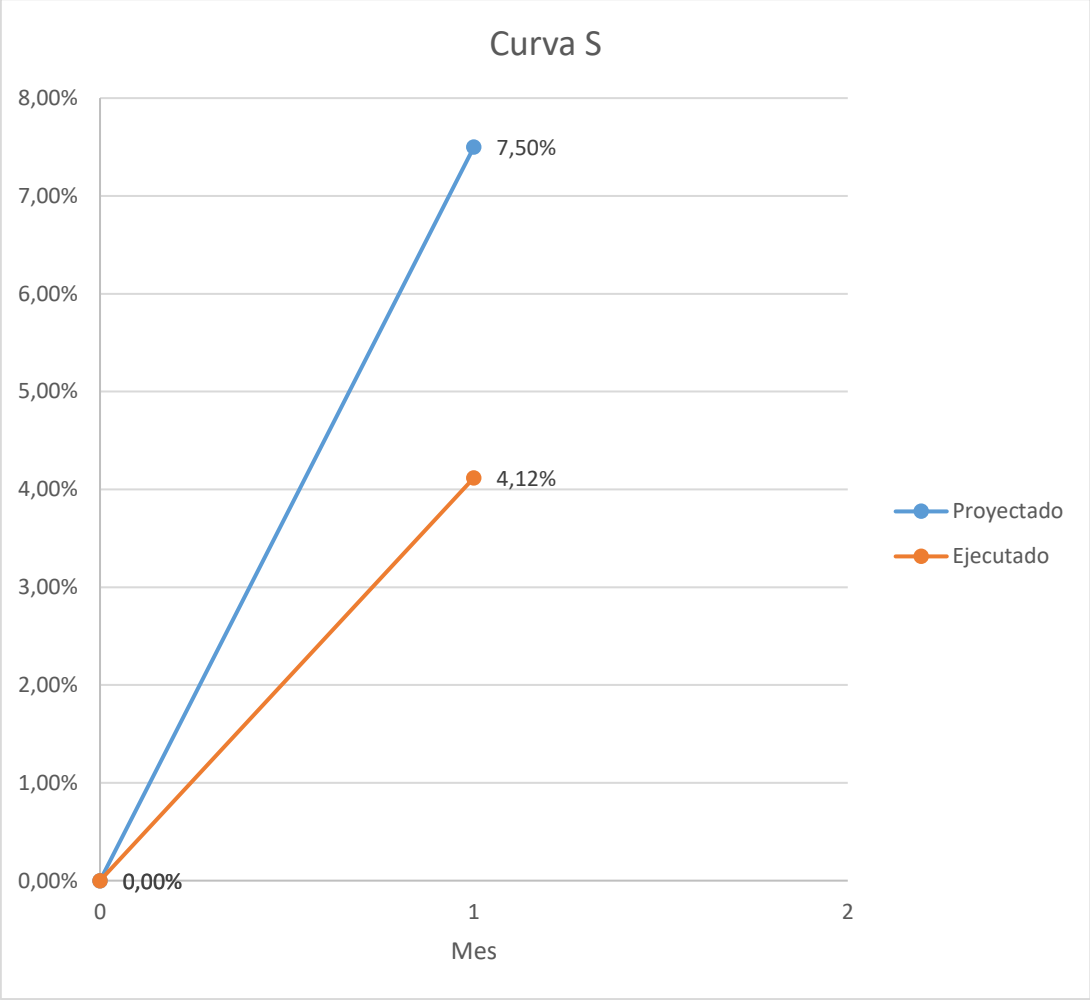

29.3 BALANCE PRESUPUESTAL

Tabla 15 Balance presupuestal

VALOR VIGENCIA 2024	$	2.815.721.000,00
VALOR VIGENCIA 2025	$	6.209.487.857,00
VALOR VIGENCIA 2026	$	6.423.895.143,00
VALOR VIGENCIA 2027	$	3.322.369.428,00
VALOR TOTAL	**$**	**18.771.473.428,00**

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 1	24 de enero al 23 de febrero de 2025	$ 518.247.080,00	$ 165.839.066,00	$ 88.935.514,00	$ 773.021.660,00	$ 38.651.083,00	$ 734.370.577,00	EN TRAMITE
TOTAL		**$ 518.247.080,00**	**$ 165.839.066,00**		**$ 773.021.660,00**	**$ 38.651.083,00**	**$ 734.370.577,00**	

TOTAL, FACTURADO ACTA No 1	$	773.021.660
TOTAL FACTURADO , ACUMULADO	$	773.021.660
SALDO POR FACTURAR	**$**	**17.998.451.768,00**

29. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta un atraso del 4,12% en la ejecución respecto a lo solicitado en el anexo técnico, sin embargo, se informa que en este primer mes las condiciones climáticas no fueron favorables lo cual tiene una incidencia directa en la ejecución de actividades. Por otro lado en uno de los diseños asignados SH_SV_PUNTO4_TMSA_V1se presentan inconvenientes para la demarcación horizontal puesto que hay presencia continua de trafico vehicular pesado (volquetas) y presencia de SITP.

- Se entregan avancen parciales de Georeferenciacion a interventoría de los diseños ejecutados en la cuenta 1.

- Con el fin de tener varios frentes activos se realizaron inspecciones en varios diseños.

- Se realiza la entrega de dotación y los respectivos elementos de protección personal para el inicio de actividades.

30. ANEXOS

ANEXO 1. Pólizas

ANEXO 2. Plan de Manejo de Tránsito

ANEXO 3. Aspectos Técnicos

ANEXO 4. Consultas Reservas

ANEXO 5. Plan de Calidad

ANEXO 6. Protocolo de Manejos y Residuos

ANEXO 7. Acta de entrega a almacén

ANEXO 8. Certificados de calibración

ANEXO 9. Señales retiradas en vía

ANEXO 10. Gestión social

ANEXO 11. Gestión seguridad y salud en el trabajo

ANEXO 12. Certificación honorarios y parafiscales

ANEXO 13. Certificación pago de proveedores

ANEXO 14. Balance presupuestal
