COPIA CONTROLADA

| GOBIERNO DE CALDAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO | **Codigo:** HS-FO-08<br>**Versión:** 02<br>**Fecha Modificación:** 05/06/2019 |
|---|---|---|

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 21 . PERÍODO: MAR. 10 A MAR. 16 DE 2025**

| | |
|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO CMCPV10-0824 |
| **CONTRATO INTERVENTORÍA:** | 04102024-1380 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA |
| **No. DE CONTRATO:** | 04102024-1377 |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 02, QUINCE (15) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS) |

**CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Iniciación:** | 21 DE OCTUBRE DE 2024 | **Fecha de vencimiento inicial:** | 20 DE ABRIL DE 2025 |
| **Plazo:** | SEIS (6) MESES | **Fecha de vencimiento final:** | |
| **Fecha de suspensión No1:** | | **Fecha de suspensión No 2:** | |
| **Fecha de reiniciación No 1:** | | **Fecha de reiniciación No 2:** | |
| **Prorrogas en plazo No. 1:** | | **Prorrogas en plazo No. 2:** | |
| **Prorrogas en plazo No. 3:** | | **Prorrogas en plazo No. 4:** | |

**CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor inicial:** | $ 959,966,691 | **Adición en valor No. 1:** | |
| **Valor con adición:** | | **Adición en valor No. 2:** | |
| **Valor acta No.1:** | $ 60,375,039 | **Valor acta No.2:** | $ 181,953,325 |
| **Valor acta No.3:** | $ 52,390,551 | **Valor acta No.4:** | |

**PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayudantes | 12 | Oficiales | 7 | Maestros | 1 | Supervisor | | Residente: | 1 |
| Almacenista | 0 | Operadores | | Cadeneros | | Topógrafo | |

**PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA:**

Auxiliares: 0 Ingenieros: 1

**AVANCE DE LA OBRA:**

| | INICIAL | ADICIÓN No 1 | ADICIÓN No. 2 | ADICIÓN No. 3 | TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % Inversión acumulada programada: | 452,566,249 | | | | 452,566,249 | 47.14% |
| % Inversión acumulada ejecutada: | 334,752,108 | | | | 334,752,108 | 34.87% |
| % Plazo transcurrido: | 147 | | | | 147 | 80.77% |

**REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):**
A la fecha del informe no se han reportado accidentes

| **SEÑALIZACION DE LA OBRA:** | SI | NO |
|---|---|---|
| Valla informativa: | | X |
| Vallas preventivas: | | X |
| Postes, cintas y señales preventivas: | | X |

COPIA CONTROLADA

| GOBIERNO DE CALDAS | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO | **Codigo:** HS-FO-08<br>**Versión:** 02<br>**Fecha Modificación:** 05/06/2019 |
|---|---|---|

**POLIZAS**

| GARANTÍA | NOMBRE ASEGURADORA | NUMERO POLIZA | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | EC-100036577-2 | 21/10/2024 | 21/08/2025 | $ 191,993,338.20 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | EC-100036577-2 | 21/10/2024 | 21/04/2028 | $ 191,993,338.20 |
| ESTABILIDAD | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | EC-100036577-2 | 21/10/2024 | 21/04/2027 | $ 287,990,007.30 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | EC-100011179-2 | 21/10/2024 | 21/06/2025 | $ 260,000,000.00 |

**COMENTARIOS GENERALES (favor incluir análisis y si la situación generada lo amerita amplíe en el cuadro de "ACTUACIONES"):**

Durante la semana se mejoro mucho la asistencia de personal operativo, terminando semana en un promedio de 12 ayuadantes y 7 oficiales, se funde concreto vigas cimentacion vivienda 7 se realizan actividades de pega de ladrillo en viviendas 1-2-14, se ejecutan excavaciones de explanacion y perfilamiento de taludes en lotes 8 y 7, igualmente excavaciones para redes sanitarias, tambien excavaciones para conformar filtra paralelo al eje E en viviendas 7 y 8, se funde concreto para cajas de aguas residueles externas 60*60 para viviendas 1-2-3, con su cañuela y respectiva tapa, se funde zarpa complemento por mayor altura en vivienda 6.

La obra presenta atraso del 12,27% , aunque se mejoro mucho en presencia de personal opertavio, deberan tomarse otras medidas que logren mejorar el avance de obra de una manera mucho mas significativa.

**ACTUACIONES:**

| SITUACION (DESCRIPCIÓN) | ANÁLISIS (Relacione las consecuencias derivadas de la situación) | TIPO DE CONSECUENCIA (Señale con una "X") | | | | | | ACTUACION | COMUNICACIÓN GENERADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Técnica | Jurídica | Económica | Ambiental | S&SO | (*) Otra (Cual) | | Dirigida a: (Persona y Entidad) | Número |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**(*) Otra. Cual:**

**Compromisos adquiridos y cumplidos: Contratista de Obra, Interventoria, Entidad Contratante, otros (información resultante del Comité de Obra Semanal)**

**OTRA CORRESPONDENCIA ENVIADA**

| Número | Dirigida a: | Asunto / Comentarios |
|---|---|---|
| 18 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA | (13032025) SOLICITUD POR SEGUNDA VEZ APUS NO PREVISTOS ELECTRICOS |
| | | |

**CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

| Número | Dirigida a: | Asunto / Comentarios |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Manizales, Marzo 20 de 2025

**R.L. CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES**
Ingeniero Interventor Obra

COPIA CONTROLADA

| | | |
|---|---|---|
| GOBIERNO DE CALDAS | **LISTA DE CHEQUEO DE CONTROL DE INTERVENTORÍA** | Codigo: HS-FO-08<br>Versión: 02<br>Fecha Modificación: 05/06/2019 |

| **Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional** | | | |
|---|---|---|---|
| | **SI** | **NO** | **NA** |
| a) Verificó estado de Fachadas y Aleros de Construcciones aledañas.<br>INCLUIR FOTOS. | **X** | | |
| b) Verificó interferencia y cruce de otras líneas de servicios que puedan generar peligro.<br>INCLUIR FOTOS. | **X** | | |
| c) Verificó que todo el personal laborando en obra estuviera afiliado a EPS, ARP, Pensiones y Caja de Compensación. | **X** | | |
| d) Verificó que toda excavación o talud estuviera debidamente entibado y apuntalado.<br>INCLUIR FOTOS. | | | **X** |
| e) Verificó que todo el personal tuviera los elementos de protección personal necesarios para las labores desarrolladas.<br>INCLUIR FOTOS. | **X** | | |
| f) Verificó que toda excavación o abertura estuviera señalizada.<br>INCLUIR FOTOS. | | | **X** |
| g) Verificó que todos los accesos a residencias y cruces peatonales estuvieran debidamente construidos.<br>INCLUIR FOTOS. | | | **X** |
| **Aspectos Ambientales** | | | |
| a) Verificó que el perímetro de la obra esté protegido con lona.<br>INCLUIR FOTOS. | | | **X** |
| b) Verificó que el producto de las demoliciones y retiro de sobrantes se llevarán a Escombreras autorizadas.<br>INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION. | | | **X** |
| c) Verificó que el producto de sobrantes de plástico y residuos no degradables se lleven al relleno sanitario.<br>INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION. | | | **X** |
| d) Verificó que los vehículos (Volquetas, Camionetas, etc) utilizadas en obra tuvieran el certificado ambiental vehicular vigente.<br>INCLUIR FOTOS Y COPIAS DE LOS CERTIFICADOS. | | | **X** |
| e) Verificó que las volquetas utilizadas en obra tengan la lona de protección para el vuelco.<br>INCLUIR FOTOS. | **X** | | |

R.L. CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
Ingeniero Interventor Obra

| GOBIERNO DE CALDAS | PRESUPUESTOS- CONTRATO No. 04102024-1377 | Codigo: HS-FO-08<br>Versión: 02<br>Fecha Modificación: 05/06/2019 |
|---|---|---|

**PRESUPUESTOS - CONTRATO Nº 04102024-1377 (CONTRATISTA)**

**MUNICIPIO: Anserma**

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 1 | EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.01 | REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN. | m2 | 718.20 | 1,449 | 1,040,672 | 0.00 | 720.00 | 718.20 | 0 | 1,043,280 | 1,040,672 |
| 1.02 | REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | 718.20 | 2,205 | 1,583,631 | 0.00 | 720.00 | 718.20 | 0 | 1,587,600 | 1,583,631 |
| 1.03 | REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS | ml | 479.40 | 3,103 | 1,487,578 | 0.00 | 98.00 | 479.40 | 0 | 304,094 | 1,487,578 |
| 2 | EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS | | | | | | | | | | |
| 2.01 | REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m3 | 129.41 | 19,648 | 2,542,667 | 0.00 | 255.05 | 129.41 | 0 | 5,011,222 | 2,542,667 |
| 2.02 | REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m3 | 52.49 | 19,648 | 1,031,373 | 0.00 | 37.18 | 52.49 | 0 | 730,513 | 1,031,373 |
| 2.03 | REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | 504.37 | 3,524 | 1,777,396 | 0.00 | 514.65 | 504.37 | 0 | 1,813,627 | 1,777,396 |
| 2.04 | REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km) | m3 | 170.91 | 26,394 | 4,510,908 | 0.00 | 75.14 | 170.91 | 0 | 1,983,245 | 4,510,908 |
| NP.3 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | m3 | | 22,184 | 0 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0 | 2,151,848 | 0 |
| NP.6 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PLASTICO NEGRO CALIBRE 6 PARA SUBMURACIONES, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | | 4,993 | 0 | 0.00 | 200.40 | 0.00 | 0 | 1,000,597 | 0 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 5 | CONSTRUIR CIMENTACIÓN | | | | | | | | | | |
| 5.01 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m3 | 64.71 | 333,499 | 21,579,220 | 3.20 | 67.18 | 64.71 | 1,067,197 | 22,404,463 | 21,579,220 |
| 5.02 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m3 | 64.71 | 516,507 | 33,420,844 | 4.08 | 57.12 | 64.71 | 2,107,349 | 29,502,880 | 33,420,844 |
| 6 | CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO | | | | | | | | | | |
| 6.01 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | 643.35 | 63,686 | 40,972,388 | 0.00 | 475.20 | 643.35 | 0 | 30,263,587 | 40,972,388 |
| 6.02 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | 540.45 | 29,034 | 15,691,425 | 0.00 | 0.00 | 540.45 | 0 | 0 | 15,691,425 |
| 6.03 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | 810.30 | 30,002 | 24,310,621 | 0.00 | 0.00 | 810.30 | 0 | 0 | 24,310,621 |
| 6.04 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | 822.75 | 18,484 | 15,207,711 | 0.00 | 0.00 | 822.75 | 0 | 0 | 15,207,711 |
| 6.06 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM | m2 | 643.35 | 18,314 | 11,782,312 | 0.00 | 0.00 | 643.35 | 0 | 0 | 11,782,312 |
| 6.07 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 | Kg | 10340.98 | 7,427 | 76,802,455 | 440.30 | 7293.38 | 10340.98 | 3,270,108 | 54,167,933 | 76,802,455 |
| 6.08 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2 | Kg | 1020.94 | 7,427 | 7,582,492 | 31.97 | 437.81 | 1020.94 | 237,441 | 3,251,615 | 7,582,492 |
| 6.09 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2 | Kg | 2927.21 | 7,427 | 21,740,407 | 0.00 | 1237.15 | 2927.21 | 0 | 9,188,313 | 21,740,407 |
| NP.7 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15CM | m2 | | 13,267 | 0 | 0.00 | 522.28 | 0.00 | 0 | 6,929,089 | 0 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| NP.8 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO COLUMNA 30X30, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | | 80,380 | 0 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0 | 13,262,700 | 0 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 7 | INSTALAR MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | |
| 7,01-comp | EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S) | m2 | 1214.81 | 24,034 | 29,196,623 | 0.00 | 0.00 | 1214.81 | 0 | 0 | 29,196,623 |
| NP.1 | SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S) | m2 | | 59,750 | 0 | 81.40 | 197.13 | 0.00 | 4,863,650 | 11,778,757 | 0 |
| NP.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL E=12CMS (12X0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S) | m2 | | 92,865 | 0 | 0.00 | 103.60 | 0.00 | 0 | 9,620,814 | 0 |
| NP.5 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO GROUTING 21MPA, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | | 10,739 | 0 | 0.00 | 128.32 | 0.00 | 0 | 1,378,028 | 0 |
| 8 | INSTALAR CUBIERTA | | | | | | | | | | |
| 8.01 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | 720.00 | 60,009 | 43,206,480 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0 | 0 | 43,206,480 |
| 8.02 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | 711.90 | 30,966 | 22,044,695 | 0.00 | 0.00 | 711.90 | 0 | 0 | 22,044,695 |
| 8.03 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS. | ml | 60.00 | 450,679 | 27,040,740 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 0 | 27,040,740 |
| 8.04 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM. CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. d/ 0.50 m. | ml | 127.50 | 194,497 | 24,798,368 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 0 | 0 | 24,798,368 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 8.05 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | 90.00 | 40,647 | 3,658,230 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0 | 0 | 3,658,230 |
| 8.06 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | un | 15.00 | 75,442 | 1,131,630 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 1,131,630 |
| NP.2 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | | 45,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CONSTRUIR ACABADOS | | | | | | | | | | |
| 9.01 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | 136.17 | 60,910 | 8,294,115 | 0.00 | 0.00 | 136.17 | 0 | 0 | 8,294,115 |
| 9.02 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | ml | 62.55 | 38,292 | 2,395,165 | 0.00 | 0.00 | 62.55 | 0 | 0 | 2,395,165 |
| 9.03 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | 32.61 | 62,872 | 2,050,256 | 0.00 | 0.00 | 32.61 | 0 | 0 | 2,050,256 |
| 9.06 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD. | m2 | 143.10 | 20,244 | 2,896,916 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | 0 | 0 | 2,896,916 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 9.07 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | 91.44 | 16,166 | 1,478,219 | 0.00 | 0.00 | 91.44 | 0 | 0 | 1,478,219 |
| 9.08 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. | m2 | 143.10 | 28,880 | 4,132,728 | 0.00 | 0.00 | 143.10 | 0 | 0 | 4,132,728 |
| 9.09 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA. | un | 15.00 | 232,258 | 3,483,870 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 3,483,870 |
| 10 | INSTALAR CARPINTERIA METÁLICA | | | | | | | | | | |
| 10.01 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1) | un | 30.00 | 227,716 | 6,831,480 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 0 | 6,831,480 |
| 10.02 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2) | un | 30.00 | 163,421 | 4,902,630 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 0 | 4,902,630 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 10.04 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2) | un | 30.00 | 424,380 | 12,731,400 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 0 | 12,731,400 |

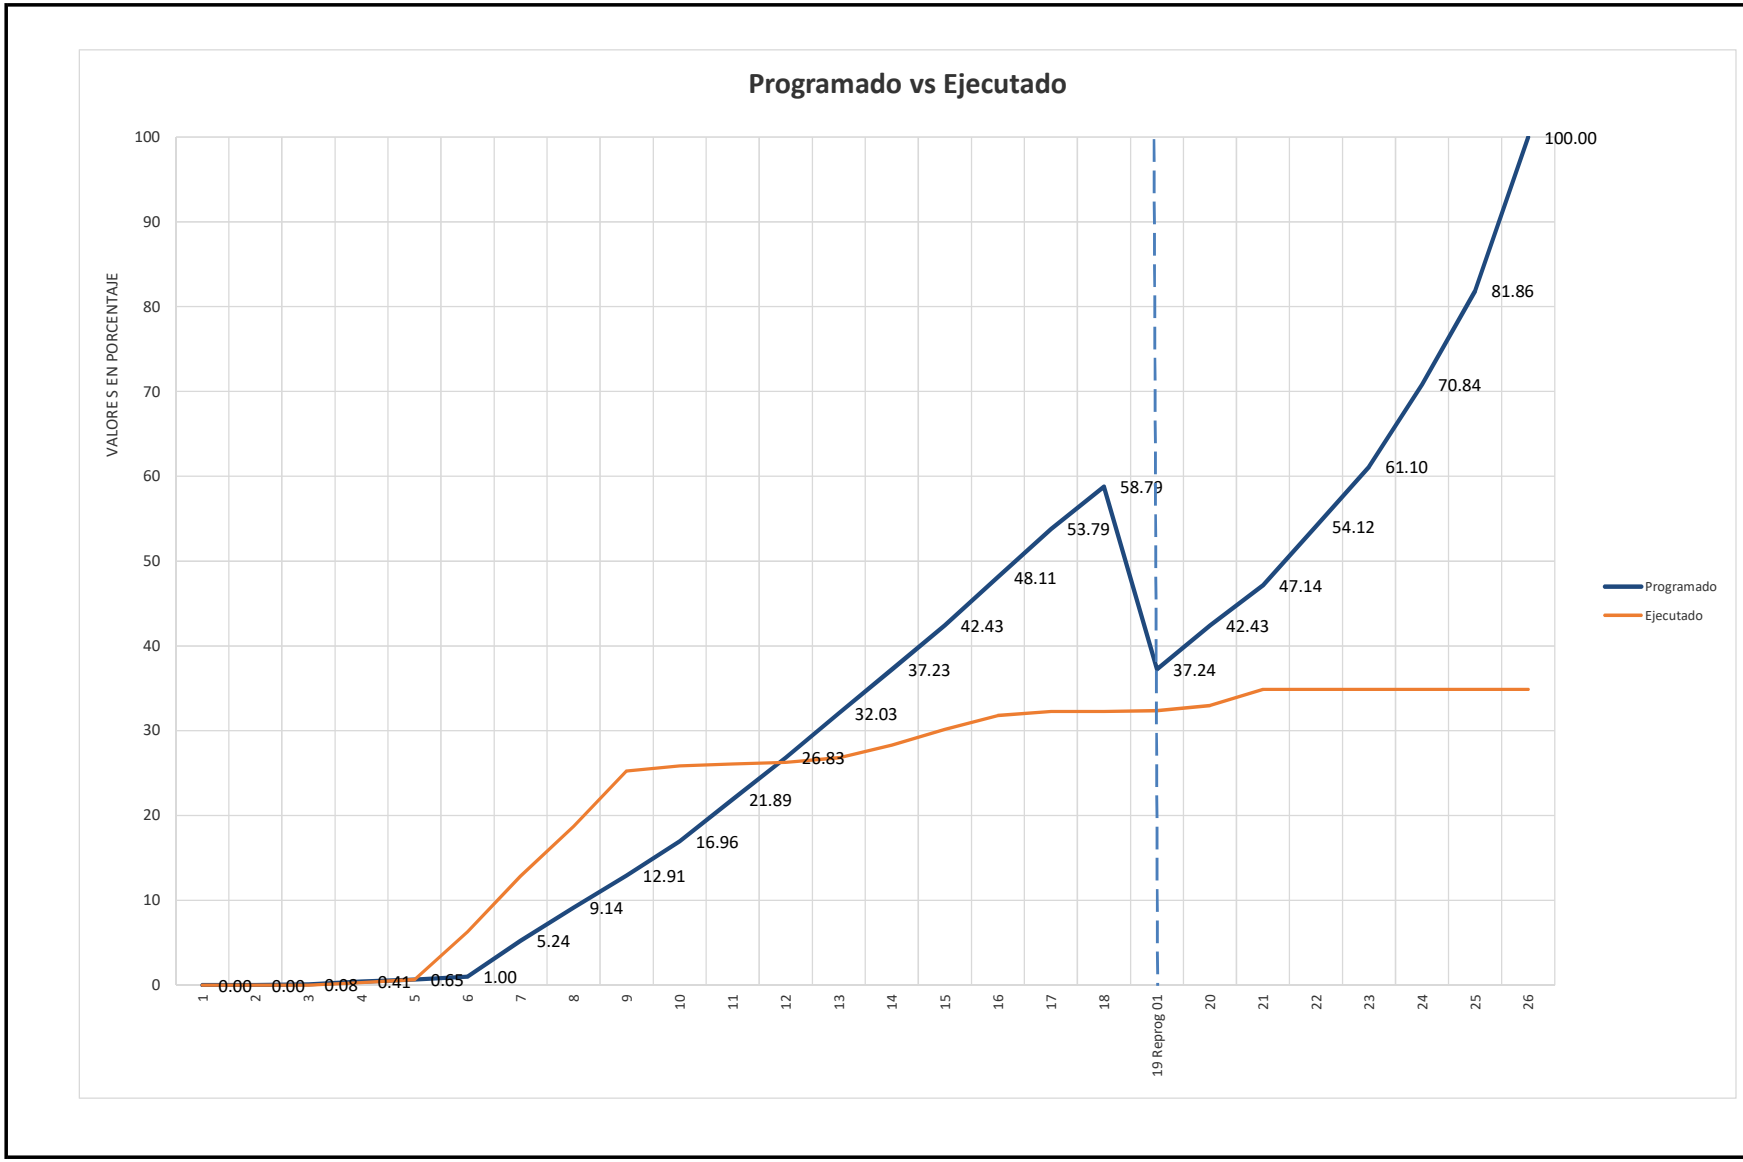
| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 11 | INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | |
| 11.01 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA | un | 15.00 | 358,632 | 5,379,480 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 5,379,480 |
| 11.02 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA) | un | 15.00 | 38,474 | 577,110 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 577,110 |
| 11.03 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0.1X0.04m. | ml | 16.50 | 15,726 | 259,479 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0 | 0 | 259,479 |
| 11.04 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL) | un | 15.00 | 210,554 | 3,158,310 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 3,158,310 |
| 11.05 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE | un | 15.00 | 1,171,329 | 17,569,935 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 17,569,935 |
| 12 | EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS | | | | | | | | | | |
| 12.01 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4" | un | 30.00 | 49,483 | 1,484,490 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 0 | 1,484,490 |
| 12.02 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2" | un | 120.00 | 43,124 | 5,174,880 | 0.00 | 66.00 | 120.00 | 0 | 2,846,184 | 5,174,880 |
| 12.03 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5. | ml | 360.00 | 9,859 | 3,549,240 | 0.00 | 36.00 | 360.00 | 0 | 354,924 | 3,549,240 |
| 12.04 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2". | un | 30.00 | 29,680 | 890,400 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 0 | 890,400 |
| 12.05 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO | un | 15.00 | 433,180 | 6,497,700 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 6,497,700 |
| 12.06 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES | un | 90.00 | 54,595 | 4,913,550 | 0.00 | 72.00 | 90.00 | 0 | 3,930,840 | 4,913,550 |
| 12.07 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES | un | 15.00 | 90,900 | 1,363,500 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 0 | 1,090,800 | 1,363,500 |
| 12.08 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2" | ml | 120.00 | 19,493 | 2,339,160 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0 | 0 | 2,339,160 |
| 12.09 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4" | ml | 150.00 | 34,936 | 5,240,400 | 0.00 | 93.60 | 150.00 | 0 | 3,270,010 | 5,240,400 |
| 12.11 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS) | ml | 45.00 | 23,550 | 1,059,750 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0 | 0 | 1,059,750 |
| 12.12 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | un | 90.00 | 77,454 | 6,970,860 | 0.00 | 11.00 | 90.00 | 0 | 851,994 | 6,970,860 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 12.13 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ml | 90.00 | 29,324 | 2,639,160 | 0.00 | 10.20 | 90.00 | 0 | 299,105 | 2,639,160 |
| 12.14 | SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF) | un | 30.00 | 43,859 | 1,315,770 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 0 | 1,315,770 |
| 12.15 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm | un | 15.00 | 135,180 | 2,027,700 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 0 | 1,622,160 | 2,027,700 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| 12.16 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm | un | 15.00 | 204,981 | 3,074,715 | 3.00 | 8.00 | 15.00 | 614,943 | 1,639,848 | 3,074,715 |
| 12.17 | SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN) | ml | 53.10 | 151,921 | 8,067,005 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | 0 | 0 | 8,067,005 |
| 12.18 | REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES | ml | 33.00 | 14,084 | 464,772 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0 | 0 | 464,772 |
| 13 | EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | |
| 13.01 | SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO. | un | 180.00 | 87,597 | 15,767,460 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0 | 0 | 15,767,460 |
| 13.02 | SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO. | un | 45.00 | 97,055 | 4,367,475 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0 | 0 | 4,367,475 |
| 13.03 | SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO | un | 90.00 | 64,228 | 5,780,520 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0 | 0 | 5,780,520 |
| 13.04 | SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL | un | 30.00 | 68,505 | 2,055,150 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 0 | 2,055,150 |
| 13.05 | SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA | un | 90.00 | 80,481 | 7,243,290 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0 | 0 | 7,243,290 |
| 13.06 | SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A) | un | 15.00 | 285,993 | 4,289,895 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 4,289,895 |
| 13.07 | SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO | ml | 105.00 | 20,806 | 2,184,630 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0 | 0 | 2,184,630 |
| 13.08 | SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR | ml | 255.00 | 31,284 | 7,977,420 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0 | 0 | 7,977,420 |
| 13.09 | SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N | un | 15.00 | 394,088 | 5,911,320 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 5,911,320 |
| 13.1 | SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA) | un | 15.00 | 111,965 | 1,679,475 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 1,679,475 |
| 13,1. | SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8 | un | 15.00 | 222,105 | 3,331,575 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 3,331,575 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***COSTO DIRECTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR*** | | **627,943,222.03** | | | **12,160,688** | **223,280,070** | **627,943,221** |
| *ADMINISTRACIÓN* | 42.93% | 269,571,444 | ADMINISTRACIÓN | 42.93% | 5,220,495 | 95,852,505 | 269,571,443 |
| *IMPREVISTOS* | 2.00% | 12,558,864 | IMPREVISTOS | | 0 | 0 | 0 |
| *UTILIDAD* | 5.00% | 31,397,161 | UTILIDAD | 5.00% | 608,034 | 11,164,004 | 31,397,161 |
| *AIU* | 49.93% | 313,527,469 | AIU | 49.93% | 5,828,529 | 107,016,509 | 300,968,604 |

| ÍTEM | DESCRIPCION | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES | | | | CANTIDAD SEMANAL | CANTIDAD ACUMULADA | CANTIDAD PROYECTADA | VR. TOTAL SEMANA | VR. TOTAL ACUMULADO | VR. TOTAL PROYECTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANT. | VR. UNIT | VR. TOTAL | | | | | | |
| | *IVA SOBRE UTILIDAD* | | | 19.00% | 5,965,462 | | IVA SOBRE UTILIDAD | | 0 | 0 | 0 |
| | ***VALOR TOTAL PROYECTO*** | | | | **947,436,153** | | | | **17,989,217** | **330,296,579** | **928,911,825** |
| | *REALIZAR PGIO - PAPSO* | | | | 12,530,538 | | | | 242,665 | 4,455,529 | 12,530,538 |
| | | | | | | | | | | | |
| | ***VALOR TOTAL*** | | | | **959,966,691** | | | | 18,231,882 | 334,752,108 | 941,442,363 |


Programado vs Ejecutado
VALORES EN PORCENTAJE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.00
0.00
0.08
0.41
0.65
1.00
5.24
9.14
12.91
16.96
21.89
26.83
32.03
37.23
42.43
48.11
53.79
58.79
37.24
42.43
47.14
54.12
61.10
70.84
81.86
100.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Reprog 01
20
21
22
23
24
25
26
Programado
Ejecutado
