Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

INFORME No:			**15**		FECHA:	24	de	**ABRIL**	de	2025	
PERIODO:	DEL	**20**	de	**SEPTIEMBRE**	de	**2024**	AL	24	de	**ABRIL**	de	**2025**
CONVENIO No:		**2786**		DE	**2023**						

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA"

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se desarrollo en las instalaciones de la Institucion Educativa Nuestra Señora de la Antigua del municipio de Nuevo Colón

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		**MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
ING. MARCELA BLANCO PEDROZA		**JUAN DAVID REYES VARGAS**	
Teléfono: **3002374117**	Dirección	Teléfono: **3157969192**	Dirección Calle 4 #4-60
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	02 DE ENERO 2024	10 DE DICIEMBRE 2024	
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.107.792.679,95	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.107.792.679,95**
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	LP-02-2023	LICITACION PUBLICA
Aviso de Convocatoria o Invitación	27 DE JULIO DE 2023	
Estudios Previos	27 DE JULIO DE 2023	
Proyecto de pliego de condiciones	27 DE JULIO DE 2023	
Pliego de condiciones definitivos	15 DE AGOSTO DE 2023	
Acto de adjudicación	25 DE OCTUBRE DE 2023	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	CMA-04-2023	CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS
Aviso de Convocatoria o Invitación	23 DE AGOSTO DE 2023	
Estudios Previos	23 DE AGOSTO DE 2023	
Proyecto de pliego de condiciones	23 DE AGOSTO DE 2023	
Pliego de condiciones definitivos	1 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
Acto de adjudicación	27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA				
ENTIDAD CONTRATANTE:			VALOR:	
MUNICIPIO DE NUEVO COLON			**$ 1.035.246.637,40**	
OBJETO:				
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:		
CONSORCIO SAN JOSE 2023		**JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA**		
Teléfono:	Dirección:	Teléfono: 3125269528	Dirección:	TRANSV. 9C Nº 28-53 TUNJA

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
ENTIDAD CONTRATANTE:			VALOR:	
MUNICIPIO NUEVO COLON			**$ 72.472.413,37**	
OBJETO:				
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:		
CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO		**N/A**		
Teléfono: **3213179856**	Dirección:	Teléfono:	Dirección:	


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023	10	1	2024	10	1	2024
PLAZO INICIAL	5 MESES			5 MESES			5 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023	9	6	2024	9	6	2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	30	11	2023						
FECHA DE REINICIO	10	1	2024						
ADICIONES EN PLAZO	5 MESES								
FECHA DE SUSPENSIÓN	4	6	2024	4	6	2024	4	6	2024
FECHA DE REINICIO	12	8	2024	12	8	2024	12	8	2024
ADICIONES EN PLAZO	1 MES			1 MES			1 MES		
FECHA DE SUSPENSIÓN				12	9	2024	12	9	2024
FECHA DE REINICIO				15	10	2024	15	10	2024
ADICIONES EN PLAZO				30 DIAS			30 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	20	9	2024	15	11	2025	15	11	2025
FECHA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION				13	12	2024	13	12	2024

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045**
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**81,86%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**100,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**100,00%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**76,84%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**100,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**100,00%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**90,00%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A LA FECHA LOS CONTRATOS DERIVADOS DE OBRA E INTERVENTORIA SE ENCUENTRAN LIQUIDADOS; ASIMISMO LAS ACTIVIDADES DE OBRA PACTADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2786 DE 2023 SE ENCUENTRAN EJECUTADAS EN UN 100%

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	
Acta de Suspension N° 01	30	11	2023	
Acta de Reinicio N° 01	10	1	2024	
Acta de Suspensión N° 02	4	6	2024	
Acta de Reinicio N° 02	12	8	2024	
Acta de Terminacion	20	9	2024	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	10	1	2024	
Acta Parcial No.1	22	4	2024	$307.819.465,00
Acta de mayores y Menores cantidades de obra	15	5	2024	
Suspension	4	6	2024	
Reinicio	12	8	2024	
Acta de Modificacion N° 01	12	8	2024	
Acta Parcial No.2 (AVANCE)	29	8	2024	$ 60.000.000,00
Acta de Modificacion N° 02	2	9	2024	
Acta Parcial No.2 (SALDO)	11	9	2024	$ 328.495.867,20
Suspension No. 2	12	9	2024	
Reinicio No. 2	15	10	2024	
Acta de Modificacion Nº 03	16	10	2024	
Acta de Terminacion	15	11	2024	

CONTRATO INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	10	1	2024	
Suspension No. 1	4	6	2024	
Reinicio No. 1	12	8	2024	
Suspensión N° 02	12	9	2024	
Reinicio No. 2	15	10	2024	
Prorroga No. 1	16	10	2024	
Modificacion No. 1	16	10	2024	
Acta Parcial No.1	13	11	2024	$ 65.225.172,03
Acta de Terminacion	15	11	2024	

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	71975	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							9	4	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO CONTRATO	10	1	2024	18	3	2025	$ 220.667.107,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10	1	2024	18	11	2027	$ 220.667.107,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	12	2024	15	12	2029	$ 331.000.660,07

No PÓLIZA	20977	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							17	10	2024

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10	1	2024	18	11	2024	$ 650.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	39-44-101156552	ANEXO No.	11	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S,A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							10	4	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO CONTRATO	10	1	2024	15	5	2025	$ 14.494.482,67
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10	1	2024	15	1	2028	$ 14.494.482,67
CALIDAD DE SERVICIO	13	12	2024	13	12	2027	$ 21.741.724,01

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN EL PLAZO N° 1	$ 0	CINCO (5) MESES
2	ADICIONAL EN EL PLAZO N° 2	$ 0	UN (1) MES
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	$ 0,00	SEIS (06) MESES

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN EL PLAZO Y VALOR N° 01	$ 46.547.504,28	UN (1) MES
2	ADICIONAL EN EL PLAZO Y VALOR N° 02	$ 68.088.896,18	TREINTA (30) DIAS
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	$ 114.636.400,46	UN (1) MES Y TREINTA (30) DIAS

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL EN EL PLAZO N° 01	$ 0	UN (1) MES
2	ADICIONAL EN EL PLAZO N° 02	$ 0	TREINTA (30) DIAS
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	$ 0,00	UN (1) MES Y TREINTA (30) DIAS

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	616945366	BANCO:	Banco Bogota	SUCURSAL:	616 Tunja
NOMBRE CUENTA:	"MUNICIPIO DE NUEVO COLON- EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA "				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
ANTICIPO	30%	12	4	2024	$ 332.337.803,99
PARCIAL N° 01	52%	20	8	2024	$ 574.536.701,72
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 906.874.505,71**

CONTRATO DE OBRA

CUENTA No.	60600003989	BANCO:	Bancolombia	SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:	Cuenta de ahorros persona Juridica - CONSORCIO SAN JOSE				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Acta Parcial No. 01	27,90%	22	4	2024	$ 307.819.465,00
Acta Parcial No. 02 (AVANCE)	5,44%	29	8	2024	$ 60.000.000,00
Acta Parcial No. 02 (SALDO)	29,77%	11	9	2024	$ 328.495.867,20
Acta Parcial No. 03	13,73%	11	9	2024	$ 151.451.450,40
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 847.766.782,60**

INTERVENTORIA

CUENTA No.	4-150-30-38075-1	BANCO:	Banco Agrario	SUCURSAL:	Toca
NOMBRE CUENTA:	Cuenta de ahorros				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Acta Parcial No. 01	90,00%	13	11	2024	$ 65.225.172,03
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
MODULO CERRAMIENTO 2,50MX1,30M EN PERFIL METÁLICO SEGÚN DISEÑO	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL (3 MTS)	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
PRADIZACIÓN(PASTO)	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN**
Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones del contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad contratante, previo concepto de la interventoria	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
Controlare inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada señalización de los sitios de trabajo y las vías aledañas al sitio de las obras. Establecer vallas informativas y preventivas suficientes las cuales deben de cumplir con la normatividad vigente	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
Verificar la correcta instalación de la valla informativa del contrato de acuerdo con las especificaciones entregadas al contratista	I.E. Nuestra Señora de la Antigua
Presentar informes mensuales de avance de obra e interventoría	I.E. Nuestra Señora de la Antigua

TRAMITE DE CORRESPONDENCIA

FECHA	INTERESADO	ASUNTO	TRAMITE
28-feb-24	Interventor	Requerimiento de informacion referente a actividades de interventoria	Requerimiento
12-mar-24	Alcaldia municipal	Solicitud documentacion municipio, para proceso de anticipacion	Solicitud
21-mar-24	Interventor	Requerimiento de informacion , contrato de interventoria INT-05-2023	Requerimiento
15-abr-24	Alcaldia municipal	Solicitud implementación recomendaciones, según visita realizada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Antigua Nuevo Colón.	Solicitud
17-abr-24	Interventor	Requerimiento contratos derivados del Convenio interadministrativo 2786-2023	Requerimiento
6-may-24	Alcaldia municipal	Solicitud balance contrato de obra enmarcado dentro del convenio 2786 – 2023, en ejecución en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Antigua municipio de Nuevo Colón.	Solicitud

15-may-24	Alcaldia municipal	Solicitud documentacion municipio	Solicitud
16-may-24	Supervisora de la gobernacion	Supervisora del convenio interadministrativo 2786-2023	respuesta
16-may-24	interventor	oficio de citacion al concejo municipal de Nuevo Colón	Solicitud
21-may-24	Interventor	Devolucion de informes	Requerimiento
29-may-24	Alcaldia municipal	solicitud de balance y documentos de los contratos derivados	Solicitud
6-ago-24	Interventor	solicitud de reinicio y prorroga contratos derivados	Solicitud
12-sep-24	Interventor	solicitud de suspension N° 2 contratos derivados de obra e interventoria	Solicitud
15-oct-24	Interventor	solicitud de reinicio contratos derivados	Solicitud
16-oct-24	Constratista de Obra	solicitud de prorroga y adicion contrato de obra	Solicitud
16-oct-24	Interventor	solicitud de prorroga contrato de interventoria	Solicitud

RELACION DE COMITES REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

DESCRIPCION	FECHA			OBSERVACION
	dd	mm	aaaa	
Acta de comité Tecnico 001	15	1	2024	
Acta de comité Tecnico 002	8	2	2024	
Acta de comité tecnico gobernacion 001	12	4	2024	Comité desarrollado con la supervisora de Gobernacion la Ingeniera Marcela Blanco
Acta de Comité Tecnico 003	26	4	2024	
Acta de Comite Tecnico 004	10	5	2024	
Acta de Comité Tecnico 005	28	5	2024	
Acta de Comite Tecnico con Gobernacion 002	4	6	2024	Se diron terminos de suspensión

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 1	4	7	2023	3	8	2023	RADICADO
INFORME 2	4	8	2023	3	9	2023	RADICADO
INFORME 3	4	9	2023	3	10	2023	RADICADO
INFORME 4	4	10	2023	3	11	2023	RADICADO
INFORME 5	4	11	2023	30	11	2023	RADICADO
INFORME 6	1	12	2023	31	12	2023	RADICADO
INFORME 7	1	1	2024	10	1	2024	RADICADO
INFORME 8	11	1	2024	10	2	2024	RADICADO
INFORME 9	11	2	2024	10	3	2024	RADICADO
INFORME 10	11	3	2024	10	4	2024	RADICADO
INFORME 11	11	4	2024	10	5	2024	RADICADO
INFORME 12	11	5	2024	4	6	2024	RADICADO
INFORME 13	5	6	2024	11	8	2024	RADICADO
INFORME 14	12	8	2024	20	9	2024	RADICADO
INFORME 15	20	9	2024	10	4	2025	PRESENTE INFORME

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

A LA FECHA EL CONVENIO INTERADMNIISTRATIVO 2786 DE 2024 TIENE UN AVANCE DEL 100% Y LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA TINENEN UN AVANCE DEL 100,00% ASI MISMO SE REALIZA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA DE TERMINACION CONVENIO

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoria para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoria	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoria	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoria	YA SE RADICO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoria:	YA SE RADICO	
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoria presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación	YA SE RADICO	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	49-55
Control de pólizas y garantias (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	1
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	2--23
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	56-61
Bitácora de obra	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI	24--25
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	YA SE RADICO	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	YA SE RADICO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	YA SE RADICO	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	YA SE RADICO	
Generales		
Registro fotográfico	SI	16-23
Correspondencia enviada y recibida	YA SE RADICO	
Registro de instalación Valla informativa	YA SE RADICO	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 01/Junio/2019

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoria		
Copia de Informes de Interventoria presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación	YA SE RADICO	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoria	YA SE RADICO	
Control de pólizas y garantias (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	26
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoria	SI	27--31
El personal de interventoria cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoria		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoria	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoria	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoria		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	YA SE RADICO	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	YA SE RADICO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoria	YA SE RADICO	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	YA SE RADICO	
Generales		
Registro fotográfico	SI	16-23
Correspondencia enviada y recibida	YA SE RADICO	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoria al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Seceretario de planeacion y obras publicas

NOMBRE: JUAN DAVID REYES VARGAS

FIRMA:

Alcaldesa Municipal

NOMBRE: LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS

Gobernación de Boyacá
Contratación

TRAMITADO
ANA MARIA ROJAS BERNAL
Fecha: 29.04.2025

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO SAN JOSE 2023 **TV 9C -28 A-53 BARRIO MALDONADO** **TUNJA** **BOYACA** **NIT: 9017688666** **Teléf. 3125269528**	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**71975 / 8**

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 09/04/2025.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 09/04/2025,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 15/12/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0071975 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN **CALLE 4 N.4-60** **NUEVO COLÓN** **BOYACA** **NIT: 8000330620** **Teléf. 7353035**	**MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN** **CALLE 4 N.4-60** **NUEVO COLÓN** **BOYACA** **NIT: 8000330620** **Teléf. 7353035**

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050007197500086BOG202504091045363

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /

INTERMEDIARIOS :
PROSER Y COMPAÑIA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900102

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO SAN JOSE 2023	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**71975 / 8**
TV 9C -28 A-53 BARRIO MALDONADO **TUNJA** **BOYACA**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** BOGOTÁ, D.C., 09/04/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 09/04/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 15/12/2029.	
NIT: 9017688666 **Teléf. 3125269528**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0071975 / 000**

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA -RECIBO FINAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024 SE MODIFICA LA TASA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0007 EMITIDO EN FECHA 21/11/2024 Y SEGUN ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE FECHA 15/11/2024, SE ACTUALIZA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0006 EMITIDO EN FECHA 17/10/2024 Y SEGUN ADICIÓN No. 02 Y PRORROGA No. 02 DE FECHA 16/10/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0005 EMITIDO EN FECHA 16/10/2024 Y SEGUN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 DE FECHA 12/09/2024 Y ACTA DE REINICIACIÓN N° 02 DE FECHA 15/10/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 16/08/2024 Y SEGUN ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 14/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 13/08/2024 Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 04/06/2024 Y ACTA DE REINICIACIÓN DE FECHA 12/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/01/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 12/01/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. COP-09-2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONSORCIO SAN JOSE 2023 CONFORMADO POR:
SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC) NIT 900354526-6 PARTICIPACION 99%
JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES C.C 7.183.503 PARTICIPACION 01%
R/L JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA C.C 6756142 DE TUNJA

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO SAN JOSE 2023	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**71975 / 8**
TV 9C -28 A-53 BARRIO MALDONADO **TUNJA** **BOYACA**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** BOGOTÁ, D.C., 09/04/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 09/04/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 15/12/2029.	
NIT: 9017688666 **Teléf. 3125269528**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0071975 / 000**

CARATULA

ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 220.667.107,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 10/01/2024, hasta las 0 hs del 18/03/2025

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 220.667.107,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 10/01/2024, hasta las 0 hs del 18/11/2027

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 331.000.660,07
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 15/12/2024, hasta las 0 hs del 15/12/2029
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB005%

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
03052022-1347-P-05-CUES07-000I y 03052022-1347-NTP-05-CUES06-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO SAN JOSE 2023 **TV 9C -28 A-53 BARRIO MALDONADO** **TUNJA** **BOYACA** **NIT: 9017688666** **Teléf. 3125269528**	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**71975 / 8**

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 09/04/2025.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 09/04/2025,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 15/12/2029.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0071975 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN **CALLE 4 N.4-60** **NUEVO COLÓN** **BOYACA** **NIT: 8000330620** **Teléf. 7353035**	**MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN** **CALLE 4 N.4-60** **NUEVO COLÓN** **BOYACA** **NIT: 8000330620** **Teléf. 7353035**

MODIFICACION CON VALOR

CODIGO DE VERIFICACION :
050007197500086BOG202504091045363

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	COP 0,00	/ /

INTERMEDIARIOS :
PROSER Y COMPAÑIA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 900102

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 03052022-1347-P-05-CUES07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
Grandes Contribuyentes. Responsable de Impuesto a las Ventas. Agente Retenedor de IVA. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada

EL TOMADOR

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO SAN JOSE 2023	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**71975 / 8**
TV 9C -28 A-53 BARRIO MALDONADO **TUNJA** **BOYACA**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** BOGOTÁ, D.C., 09/04/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 09/04/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 15/12/2029.	
NIT: 9017688666 **Teléf. 3125269528**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0071975 / 000**

CARATULA

POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA -RECIBO FINAL DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024 SE MODIFICA LA TASA DE LA POLIZA,
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0007 EMITIDO EN FECHA 21/11/2024 Y SEGUN ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE FECHA 15/11/2024, SE ACTUALIZA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0006 EMITIDO EN FECHA 17/10/2024 Y SEGUN ADICIÓN No. 02 Y PRORROGA No. 02 DE FECHA 16/10/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0005 EMITIDO EN FECHA 16/10/2024 Y SEGUN ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 DE FECHA 12/09/2024 Y ACTA DE REINICIACIÓN N° 02 DE FECHA 15/10/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0004 EMITIDO EN FECHA 16/08/2024 Y SEGUN ADICIÓN No. 01 Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 14/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0003 EMITIDO EN FECHA 13/08/2024 Y SEGUN ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 04/06/2024 Y ACTA DE REINICIACIÓN DE FECHA 12/08/2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0002 EMITIDO EN FECHA 19/01/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2024 DE LA POLIZA.

POR MEDIO DEL ENDOSO 0001 EMITIDO EN FECHA 12/01/2024 Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 09 DE ENERO DE 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. COP-09-2023 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONSORCIO SAN JOSE 2023 CONFORMADO POR:
SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS (SINCOC) NIT 900354526-6 PARTICIPACION 99%
JAIRO ENRIQUE RINCON CACERES C.C 7.183.503 PARTICIPACION 01%
R/L JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA C.C 6756142 DE TUNJA

NOTA: SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ESTABILIDAD ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE

CONTINUA

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO SAN JOSE 2023	**CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**	**71975 / 8**
TV 9C -28 A-53 BARRIO MALDONADO **TUNJA** **BOYACA**	**LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA** BOGOTÁ, D.C., 09/04/2025. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 09/04/2025, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 15/12/2029.	
NIT: 9017688666 **Teléf. 3125269528**	**NUMERO DE FACTURA**	**05 - 0071975 / 000**

CARATULA

ENTREGA.

SE MODIFICA/N LA/S COBERTURA/S :

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 220.667.107,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 10/01/2024, hasta las 0 hs del 18/03/2025

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 220.667.107,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 10/01/2024, hasta las 0 hs del 18/11/2027

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 331.000.660,07
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 15/12/2024, hasta las 0 hs del 15/12/2029
Prima de la Cobertura : COP %PRIMACOB005%

ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	13 de Diciembre de 2024		
CONTRATO	COP-09-2023	**FECHA**	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**PROCESO No.:**	LP-02-2022
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR CONTRATADO:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE. ($ 988.699.133,12)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE 2023		
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA		
INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de enero de 2024		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	09 de junio de 2024		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	UN (01) MES
2	TREINTA (30) DIAS

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
1	$ 46.547.504,28
2	$ 68.088.896,18

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
SUSPENSION N° 01	04 de Junio de 2024
REINICIO N° 01	12 de Agosto de 2024
SUSPENSION N° 02	12 de Septiembre de 2024
REINICIO N° 02	15 de Octubre de 2024

VALOR TOTAL CONTRATADO:	MIL CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.103.335.533,58)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	15 de noviembre de 2024

Que, en virtud de lo pactado en el contrato de INTERVENTORIA N° **INT-05-2023** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMETARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA",** respecto lo referido en la CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, segun numeral 1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, ***1.22. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion a la ejecucion del contrato*** y segun numeral 4. FUNCIONES DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Y DE LA OBRA, 5. FUNCIONES JURIDICAS, ***5.7. Proyectar , aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrea y recibo a satisfaccion de obra y acta de liquidacion del contrato de obra y del contrato de interventoria, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la Entidad.*** Se permite consignar lo siguiente;

En Nuevo Colón, a los TRECE (13) días del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA como representante legal de CONSORCIO SAN JOSE 2023 como contratista y el ingeniero CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO como INTERVENTOR contratado por el Municipio de Nuevo

ACTA - RECIBO FINAL

Colon con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del INTERVENTOR de las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día QUINCE (15) del mes de NOVIEMBRE de 2024

A. OBRA EJECUTADA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**CERRAMIENTO**				
1.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	164,31	$ 64.490,00	$ 10.596.351,90
1.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	32,76	$ 95.220,00	$ 3.119.407,20
1.3	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	90,78	$ 639.440,00	$ 58.048.363,20
1.4	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	26,38	$ 1.106.730,00	$ 29.195.537,40
1.5	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	27,39	$ 1.071.120,00	$ 29.337.976,80
1.6	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA	M3	8,98	$ 1.896.550,00	$ 17.031.019,00
1.7	MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.	M2	249,31	$ 124.580,00	$ 31.059.039,80
1.8	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	4,25	$ 1.381.770,00	$ 5.872.522,50
1.9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	8.583,81	$ 9.040,00	$ 77.597.642,40
1.10	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	0,00	$ 7.920,00	$ 0,00
1.11	MODULO CERRAMIENTO 2,50MX1,30M EN PERFIL METÁLICO SEGÚN DISEÑO	U	155,00	$ 998.710,00	$ 154.800.050,00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL (3 MTS)	U	3,00	$ 2.842.480,00	$ 8.527.440,00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR (4 MTS)	U	1,00	$ 3.764.370,00	$ 3.764.370,00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ 273.250,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 428.949.720,20**
2	**URBANISMO Y EMPRADIZACIONES**				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	389,68	$ 64.490,00	$ 25.130.463,20
2.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	183,62	$ 95.220,00	$ 17.484.296,40
2.3	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	979,22	$ 9.490,00	$ 9.292.797,80
2.4	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	181,55	$ 88.040,00	$ 15.983.662,00
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	0,00	$ 68.170,00	$ 0,00
2.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	3.782,23	$ 9.040,00	$ 34.191.359,20

ACTA - RECIBO FINAL

2.7	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	0,00	$ 7.920,00	$ 0,00
2.8	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	25,99	$ 899.410,00	$ 23.375.665,90
2.9	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	323,10	$ 89.900,00	$ 29.046.690,00
2.10	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	379,39	$ 167.920,00	$ 63.707.168,80
2.11	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) M3	M3	3,91	$ 1.960.890,00	$ 7.667.079,90
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	300,00	$ 592.790,00	$ 177.837.000,00
2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	81,10	$ 70.930,00	$ 5.752.423,00
2.14	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	U	15,00	$ 145.850,00	$ 2.187.750,00
2.15	PRADIZACIÓN(PASTO	M2	768,95	$ 33.710,00	$ 25.921.139,80
	SUBTOTAL				**$ 437.577.496,00**
3	**MALLA CONTRA IMPACTO**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA Y MALLA CONTRAIMPACTO H=5.0 M	ML	80,22	$ 1.543.620,00	$ 123.829.196,40
3.2	PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)	ML	36,00	$ 599.010,00	$ 21.564.360,00
3.3	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	9,81	$ 1.071.120,00	$ 10.507.687,20
3.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	1.417,94	$ 9.040,00	$ 12.818.177,60
3.5	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	0,00	$ 7.920,00	$ 0,00
	SUBTOTAL ESTRUCTURAS				**$ 168.719.421,20**
4	**CANCHA DEPORTIVA - ITEMS NUEVOS**				
4.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3	89,60	$ 21.358,00	$ 1.913.676,80
4.2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	67,20	$ 95.220,00	$ 6.398.784,00
4.3	PLACA BASE EN CONCRETO E=0,10 M CONCRETO 2500 PSI	M2	448,00	$ 107.118,00	$ 47.988.864,00
4.4	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	931,84	$ 9.490,00	$ 8.843.161,60
4.5	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E= 0,08 M	ML	303,61	$ 9.698,00	$ 2.944.409,78
	SUBTOTAL MAMPOSTERÍA				**$ 68.088.896,18**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 1.103.335.533,58**
	A.I.U. 30%				$ 254.615.892,36
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 1.103.335.533,58**

ACTA - RECIBO FINAL

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL

El contratista presentó y fueron tramitadas TRES (03) actas de pago parcial correspondientes a la ejecución del cotrato de obra

en el periodo comprendido entre 10/01/2024 al 29/02/2024 por un valor total de $ 307.819.465,00 un segundo pago

en el periodo comprendido entre 01/03/2024 al 30/04/2024 por un valor total de $ 388.495.867,20 y un tercer pago

en el periodo comprendido entre 01/05/2024 al 31/05/2024 por un valor total de $ 151.451.450,40

C. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha 15 de 12 de 2024 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. Asi mismo se certifica el cumplimiento de los compromisos pactados en el acta de visita realizada con delegados de la gobernacion del convenio que genera la contratacion de este proyecto.

Se anexa acta de compromisos y soporte de cumplimiento y subsanacion de los mismos.

En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada al INTERVENTOR y este la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CONSORCIO SAN JOSE 2023
R/L JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
Contratista

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
INTERVENTOR

INFORME DE AVANCE DE OBRA
COMPROMISOS CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

CONSORCIO SAN JOSÉ 2023
R/L JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
CONTRATISTA

CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO
INTERVENTOR

CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA
SUPERVISOR

MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETO DEL INFORME 4
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 4
- CONTRATO DE OBRA 4
- RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS 5
- ACTAS DE VISITA Y/O COMPROMISOS 5
- PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO 8

GARANTÍAS DEL CONTRATO 8
- PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 8

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
COMPROMISOS CONTRATISTA 10

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo dar respuesta a los compromisos adquiridos por parte del contratista según lo indicado en el acta de visita y/o compromisos, con fecha del 24 de septiembre de 2024 para el contrato de obra Pública No. COP-09-2023, que tiene como objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", el cual se dio inicio el día 10 de enero de 2024.

OBJETO DEL INFORME

Con la elaboración de este informe se pretende presentar a la entidad Contratante, los compromisos asumidos en obra según el acta de visita y/o compromisos del contrato de obra pública No. COP-09-2023, teniendo en cuenta las fechas estipuladas para el mismo.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

- **CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO N°	No. COP-09-2023
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."
PLAZO O TÉRMINO	CINCO (5) MESES
PLAZO O TÉRMINO	CINCO (1) MES
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 988.699.133,12
VALOR ADICIONAL (14/08/2024)	$ 46.547.504,28
VALOR ADICIONAL (16/10/2024)	$ 68.088.896,18
VALOR TOTAL CONTRATO ACTUAL	$ 1.103.335.533,58
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE ENERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	04 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE REINICIO	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	17 DE NOVIEMBRE DE 2024

- **RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	ACTA DE INICIO DE OBRA	10 DE ENERO DE 2024
2	ACTA PARCIAL No. 01	28 DE FEBRERO DE 2024
3	ACTA PARCIAL No. 02	30 DE ABRIL DE 2024
4	ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 01	04 DE JUNIO DE 2024
5	ACTA DE REINICIO No. 01	12 DE AGOSTO DE 2024
6	ACTA PRORROGA Y ADICIÓN No. 01	14 DE AGOSTO DE 2024
7	ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA No. 02	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
8	ACTA DE REINICIO No. 02	15 DE OCTUBRE DE 2024
9	ACTA ADICIÓN No. 02	16 DE OCTUBRE DE 2024
10	ACTA PARCIAL No. 03	30 DE MAYO DE 2024

- **ACTAS DE VISITA Y/O COMPROMISOS**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	ACTA DE VISTA Y/O COMPROMISOS	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: CH-P04-F02
ACTA DE VISITA Y/O COMPROMISOS		**FECHA: 19/05/2016**

Fecha: 24 de Septiembre de 2024	**Lugar:** Colegio Nuestra Señora de la Antigua
Municipio: Nuevo Colon	**Departamento:** Boyacá
Hora de Inicio: 09:00 AM	**Hora de Terminación:** 10:00 AM

Entidades Participantes:
Delegado Gobernación de Boyacá – Dilsa Mireya Rodriguez
Alcaldesa Municipal y Delegados – Alba Merly Maranta Contreras
Secretario de Planeación y Obras Publicas – Carlos Andrés García Pedraza
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación – Juan David Reyes Vargas
Delegado Interventoría Proyecto – Oscar David Sarmiento
Representante Legal Contratista de Obra – Jairo Enrique Rincón Velandia
Apoyo Contratista de Obra – Dora Lina Martínez Bernal
Apoyo Contratista de Obra – SISO – Sonia Paola Molina
Rector de IE Nuestra Señora de la Antigua – Gustavo Pua Herrera

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Visita de Obra con Animo de Suscribir Acta de Preentrega del Convenio Interadministrativo N° 2786 cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA."**

DESARROLLO DE LA REUNION

Se reúnen las entidades participantes en el lugar correspondiente a Colegio Nuestra Señora de la Antigua, en el Municipio de Nuevo Colon, departamento de Boyacá; seguido de lo anterior delegado de la gobernación de Boyacá indica que el motivo de la reunión es realizar un recorrido par las instalaciones y observar cuales fueron las actividades de obra que se desarrollaron con animo de suscribir la preentrega del proyecto en cuestión.

Posteriormente se procede a realizar el recorrido correspondiente y se atienden las observaciones expuestas por las partes intervinientes teniendo en cuenta que es necesario realizar algunas subsanaciones que permitirán suscribir recibo definitivo de los trabajos, adicionalmente se le indica a los directivos de la institución educativa que existen algunas situaciones que no pueden ser subsanadas por el responsable de obra actual, puesto que algunos elementos fueron construidos en otros contratos, sin embargo, en esta ocasión los compromisos de este proyecto en quedaran enlistados para subsanar.

Finalmente se deja un registro fotográfico y se acuerdan suscribir un acta en donde se enumeran los compromisos pactados según el desarrollo de la visita y recorrido de obra, asimismo se indica por parte de delegados de la gobernación que el proceso de recibo y liquidación procede siempre y cuando se de cumplimiento a las observaciones enunciadas y se presenten todos los documentos del caso.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: CH-P04-F02
ACTA DE VISITA Y/O COMPROMISOS		**FECHA: 19/05/2016**

COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1.	Corregir Pendiente de Cuneta Revestida Localizada en el costado lateral del Bloque C (Prescolar) de la Institución Educativa.	Contratista de Obra Interventoría
2.	Adecuar espacio ubicado en la esquina de cancha de juego colindante a graderías, con ánimo de terminar la cuneta revestida en el mencionado lugar.	Contratista de Obra Interventoría
3.	Verificar si cada uno de los tubos rectangulares de la estructura de acero del cerramiento instalado cuentan con sus respectivas tapas.	Contratista de Obra Interventoría
4.	Mejorar el acabado de la cara transversal de las columnas construidas para el cerramiento, garantizando tapar aceros expuestos.	Contratista de Obra Interventoría
5.	Remover los restos de material utilizados en la conformación de elementos a nivel general y7o todas las partes que se intervinieron ne el proyecto (alambres, varillas, etc).	Contratista de Obra Interventoría
6.	Remover sobrantes de material granular como arena y grava utilizados en la ejecución del proyecto, así como el campamento de obra y demás herramientas de construcción.	Contratista de Obra Interventoría
7.	Realizar el continuo y correcto regado a la pradizacion instalada en los sitios correspondientes.	Contratista de Obra Interventoría Municipio
8.	Instalar un sifón de salida a las aguas que resumen de la cuneta y llegan al punto de cafetería con el sistema de manejo de aguas.	Contratista de Obra Interventoría
9.	Realizar limpieza final de obra para entrega definitiva.	

INFORMACIÓN ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO/TELÉFONO	FIRMA
JAIRO E RINCON V.	CONTRATISTA	jairorincon2006@yahoo.es - 3123269528	
OSCAR DAVID SARMIENTO	DELEGADO INTERVENTORIA	oscar.sarmiento@upl.edu.co	
Dilsa Rodriguez	Profesional Universitario	dmrodriguez@sedboyaca.gov.co	
[illegible]	APOYO A CONTRATISTA.	lina_mar@hotmail.com.	
JUAN DAVID REYES VARGAS	APOYO SEC. PLANEACION	regdavid.nuevocolon@gmail.com	
Carlos Andrés García P.	Sec. Planeación	Planeacion@nuevocolon-boyaca.gov.co.	
Nilda Maria Margarita C	Alcaldesa	[illegible]	
Juana Paola Molina Contreras	SISO-Contratista.	paolamolina180698@gmail.com.	

- **PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO**

ENTIDAD

INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO
SUPERVISOR	CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA

CONTRATISTA

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ 2023
REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA

GARANTÍAS DEL CONTRATO

- **PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el contrato de obra pública No. COP-09-2023, las cuales se encuentran vigentes.

TIPO DE PÓLIZA	NÚMERO	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	71975 / 6	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A NIT 900.814.916-1	$220.667.107,00	10/01/2024	18/03/2025
SALARIOS			$220.667.107,00	10/01/2024	18/11/2027
ESTABILIDAD			$331.000.660,07	5 años	
RCE	20977 / 7		$650.000.000,00	10/01/2024	18/11/2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La siguiente ilustración, presenta la localización de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA NUEVO COLÓN, construcción de obras complementarias en la dirección Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

FIGURA 1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA NUEVO COLÓN



Fuente: IE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA NUEVO COLÓN

COMPROMISOS CONTRATISTA

1. Corrección de la pendiente de la cuneta revestida Localizada en el costado lateral del Bloque C (Prescolar) de la Institución Educativa.





2. Adecuación del espacio ubicado en la esquina de la cancha de juego colindando a graderías, con ánimo de terminar la cuneta revestida en el mencionado lugar.



3. Verificación de cada uno de los tubos rectangulares de la estructura de acero del cerramiento instalado con sus respectivas tapas.



4. Mejoramiento en los acabados de la cara transversal de las columnas construidas para el cerramiento, garantizando tapar aceros expuestos.





5. Retiro de los restos de material utilizados en la conformación de elementos a nivel general y/o y todas las partes que se intervinieron en el proyecto (alambres, varillas, etc.).





6. Retiro de los sobrantes de material granular como arena y grava utilizados en la ejecución del proyecto, así como el campamento de obra y demás herramientas de construcción.





7. Continuo y corrector regado a la pradización instalada en los sitios correspondiente.





8. Instalación de un sifón de salida las aguas que resumen de la cuneta y llegan al punto de cafetería con el sistema de manejo de aguas.



9. Limpieza final de obra para entrega definitiva







Elaboro

JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA
CONTRATISTA

Reviso

CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO
INTERVENTOR

ACTA - LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	9 de abril de 2025		
CONTRATO No.:	COP-09-2023	**FECHA:**	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**PROCESO No.:**	LP-02-2023
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR INICIAL CONTRATADO	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE. ($ 988.699.133,12)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE 2023		
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA		
SUPERVISOR :	JUAN DAVID REYES VARGAS		
INTERVENTOR	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 de enero de 2024		
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 de junio de 2024		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	UN (01) MES
2	TREINTA (30) DIAS

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
1	$ 46.547.504.28
2	$ 68.088.896.18

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
SUSPENSIÓN N° 01	04 de Junio de 2024
REINICIO N° 01	12 de Agosto de 2024
SUSPENSION N° 02	12 de Septiembre de 2024
REINICIO N° 02	15 de Octubre de 2024

VALOR TOTAL CONTRATADO:	MIL CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.103.335.533,58)
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	15 de noviembre de 2024

En el municipio de Nuevo Colón, a los NUEVE (09) días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA como representante legal de CONSORCIO SAN JOSE 2023 como contratista, el ingeniero JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor y CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO como interventor, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas obras fueron ejecutadas, terminadas y entregadas por el Contratista y recibidas por el interventor el TRECE (13) de DICIEMBRE de 2025 las cuales están descritas en el Acta de Recibo Final de Cantidades de obra, la cual es parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que segun modificacion N° 3 del contrato suscrito se estableció la siguiente forma de pago: "La cancelación del valor total del contrato se hará mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, el Interventor y el Supervisor del Contrato delegado por el municipio, acompañadas del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Liquidación del Contrato. La primera acta parcial deberá corresponder como mínimo a la ejecución de un treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, actas parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato hasta completar el noventa por ciento (90%) de avance de ejecución y el diez por ciento (10%) restante se pagará a la respectiva Acta de Liquidación del Contrato. Se entiende que el presente contrato estará a precios unitarios fijos."

3. Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el contrato No. COP-09-2023.

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre de 2024

5. Que el contratista presento informe final de ejecución de obra.

EJECUTADA

CONTRATADO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Contrato No. COP-09-2023	01/011/2024	$ 988.699.133.12
Adicional No. 01		$ 46.547.504.28
Adicional No. 02		$ 68.088.896.18
SUMAS IGUALES		**$ 1.103.335.533.58**

EJECUTADO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Acta parcial 1		$ 307.819.465.00
Acta parcial 2		$ 388.495.867.20
Acta parcial 3		$ 151.451.450.40
Acta de liquidacion		$ 255.568.750.98
Valor no ejecutado		$ 0.00
		$ 1.103.335.533.58

ACTA - LIQUIDACIÓN

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPOS ENTREGADOS		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
		$ 0.00
		$ 0.00
SUMAS IGUALES		$ 0.00

VALOR AMORTIZADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
		$ 0.00
Anticipo no amortizado		$ 0.00
		$ 0.00

DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO

VALOR CONTRATADO		
CONCEPTO		VALOR
Contrato No. COP-09-2023	01/011/2024	$988.699.133.12
Adicional No. 01		$46.547.504.28
Adicional No. 02		$68.088.896.18
SUMAS IGUALES		$ 1.103.335.533.58

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta parcial 1		$ 307.819.465.00
Acta parcial 2		$ 388.495.867.20
Acta parcial 3		$ 151.451.450.40
Valor contratado no pagado		$ 255.568.750.98
Saldo a favor del municipio		$0.00
		$ 1.103.335.533.58

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 988.699.133.12		
VALOR ADICIONES	$ 114.636.400.46		
VALOR ANTICIPO INICIAL			
VALOR ACTAS PARCIALES		$ 847.766.782.60	$ 847.766.782.60
VALOR NO EJECUTADO		$ 0.00	
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 255.568.750.98	
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN			$ 255.568.750.98
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$ 0.00
TOTALES	**$ 1.103.335.533.58**	**$ 1.103.335.533.58**	**$ 1.103.335.533.58**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			**$ 255.568.750.98**

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($255.568.760.98)

ACTAS GENERADAS

ACTAS SUSCRITAS	FECHA
ACTA DE INICIO	10/01/2024
ACTA DE SUSPENSION Nº 1	4/06/2024
ACTA DE REINCIO Nº1	12/08/2024
MODIFICACION Nº1	12/08/2024
PRORROGA Y ADICION Nº1	14/08/2024
MODIFICACION Nº2	2/09/2024
ACTA DE SUSPENSION Nº2	12/09/2024
ACTA DE REINICIO Nº2	15/10/2024
PRORROGA Y ADICION Nº2	16/10/2024
MODIFICACION Nº3	16/10/2024
ACTA DE TERMINACION	15/11/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	13/12/2024

ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
1	10 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	COM-2024000159	29/04/2024	$ 307.819.465.00
2	01 DE MARZO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024	COM-2024000375	13/09/2024	$ 388.495.867.20
3	01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024	COM-2024000498	8/11/2024	$ 151.451.450.40
TOTALES				$ 847.766.782.60

ACTA - LIQUIDACIÓN

GARANTÍAS

RIESGO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	71975	$ 220.667.107.00	10/01/2024	18/03/2025	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SAS
SALARIOS		$ 220.667.107.00	10/01/2024	18/11/2025	
ESTABILIDAD	ENDOSO No. 7	$ 331.000.660.07	15/11/2024	15/11/2029	

RIESGO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	71975	$ 220.667.107.00	10/01/2024	18/03/2025	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SAS
SALARIOS		$ 220.667.107.00	10/01/2024	18/11/2025	
ESTABILIDAD	ENDOSO No. 8	$ 331.000.660.07	15/12/2024	15/12/2029	

Las anteriores garantias fueron aprobadas mediante acta de aprobacion de polizas

El suscrito supervisor certifica que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción, que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Articulo 50 de la Ley 789-2002. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
R/L CONSORCIO SAN JOSE 2023
Contratista

JUAN DAVID REYES VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
INTERVENTOR

LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS
ALCALDESA ENCARGADA



ZONIFICACION DE ACTIVIDADES

CONVENCIONES

CERRAMIENTO:	
COLUMNAS CERRAMIENTO	
COLUMNAS PORTONES	
ANDEN LATERAL	
ANDEN CANCHA DEPORTIVA	
RAMPA AGROINDUSTRIA	
RAMPA PAE	
RAMPA DE ACCESO LATERAL PAE	
RAMPA DE ACCESO A LA IENSA	
RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL	
RAMPA DE CONEXION ANDEN LATERAL	
RAMPA CANCHA DEPORTIVA	
CAFETERIA	
GRADERIAS CANCHA DEPORTIVA	
ESCALERAS	
ANDEN SISTEMAS	
CUNETAS BLOQUE A	
CUNETAS BLOQUE B	
CUNETAS PREESCOLAR	
CUNETA ADMINISTRATIVO	
CUNETA AGROINDUSTRIA	
CUNETA POSTERIOR AULA MULTIPLE	
CASETA CAFETERIA	
MALLA CONTRA IMPACTO: PILOTES	
VIGAS	
MALLA C IMPACTO	
PLAZOLETA DE ACCESO	
ANDENES PORTERIA LATERAL POSTERIOR	
PRADIZACION	
BARANDA	
AREA PARQUE INFANTIL	
PLAZOLETA CASETA	
TUBERIA DESAGUES	
PUNTO DE DESAGUES	

DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE NUEVO COLON

Contratista:
CONSORCIO SAN JOSE 2023
CONSORCIO SAN JOSE
NIT: 901.768.866-6

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA

INTERVENTOR:
CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
INGENIERO CIVIL
INTERVENTOR DE PROYECTOS
CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
C.C. 7.173.308

Contiene :
PLANOS RECORD OBRAS COLEGIO
NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA

FECHA : NOVIEMBRE DE 2024
ESCALA : 1:200

PLANO No. 1 de 1
ESCALA DE PLOTTER: 1:200
ARCHIVO:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101156552	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	04	2025	10	01	2024	00:00	15	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CARDOZO AREVALO, CESAR AUGUSTO		CC: 7.173.308
DIRECCIÓN: CL 4 BIS A NRO. 4 E - 31 CASA 10 MANZANA K	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO:	7438874

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE NUEVO COLON		NIT: 800.033.062-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 4-60	CIUDAD: NUEVO COLON, BOYACA	TELÉFONO	7353035
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON, CONTRATO DE INTERVENTORIA No INT-05-2023

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/01/2024	15/05/2025	$14,494,482.67	$14,494,482.67
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/01/2024	15/01/2028	$14,494,482.67	$14,494,482.67
CALIDAD DEL SERVICIO	10/01/2024	13/12/2027	$21,741,724.01	$21,741,724.01

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2024 SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD ASI

DESDE 13/12/2024 HASTA 13/12/2027

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******50,730,689.35	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101156552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101156552	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	04	2025	10	01	2024	00:00	15	02	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CARDOZO AREVALO, CESAR AUGUSTO		CC: 7.173.308
DIRECCIÓN: CL 4 BIS A NRO. 4 E - 31 CASA 10 MANZANA K	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7438874

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE NUEVO COLON		NIT: 800.033.062-0
DIRECCIÓN: CALLE 4 NO. 4-60	**CIUDAD:** NUEVO COLON, BOYACA	**TELÉFONO:**	7353035

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101156552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF004715A

ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	13 de diciembre de 2024		
CONTRATO	INT-05-2023	**FECHA**	12 de octubre de 2023
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA	**PROCESO No.:**	CMA-04-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR CONTRATADO:	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($72.472.413,37) M/CTE		
CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO		
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO DE 2024		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	09 DE JUNIO DE 2024		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	UN (1) MES
2	TREINTA DIAS (30)

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	INICIO
Acta de suspension No 1	4/06/2024
Acta de Reinicio Nº1	12/08/2024
Acta de suspension Nº 2	12/09/2024
Acta de Reinicio Nº2	15/10/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO:	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($72.472.413,37) M/CTE
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

En Nuevo Colón, a los TRECE (13) días del mes de DICIEMBRE del año 2024 se reunieron CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO como contratista y el ingeniero JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de constatar el estado de las actividades objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor de los servicios ejecutados.

Dichas actividades fueron terminadas el día QUINCE (15) del mes de NOVIEMBRE de 2024

A. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O SERVICIOS EJECUTADOS

COSTOS DIRECTOS						
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**RENDIMIENTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.1	INGENIERO DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	3.00	50%	$ 3.500.000.00	$ 5.250.000.00
1.2	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	3.00	100%	$ 3.000.000.00	$ 9.000.000.00
1.3	INGENIERO ESPECIALISTA HSEQ	MES	3.00	100%	$ 2.100.000.00	$ 6.300.000.00
2	Personal tecnico					
3	Otro personal					
3.1	Topografo inspector	MES	3.00	100%	$ 1.500.000.00	$ 4.500.000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 25.050.000.00
	Factor multiplicador					2.30

COSTOS INDIRECTOS					
4	**SERVICIOS**	**UND**	**VALOR UNIT**	**CANT**	**VR TOTAL**
4.1	Edicion de informes, reproduccion de documentos, papeleria y otros	Mes	$ 750.000.00	3	$ 2.250.000.00
4.2	Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros	und	$ 500.000.00	3	$ 1.500.000.00

4.3	Alquiler camioneta, incluye conductor y combustible	Mes	$ 2.500.000.00	3	$ 7.500.000.00
4.4	Comunicaciones	Mes	$ 411.740.44	3	$ 1.235.221.32
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 12.485.221.32
	IVA 19%				$ 2.372.192.05
	Total servicios				$ 14.857.413.37

COSTO PERSONAL	***$ 25.050.000.00***
FACTOR MULTIPLICADOR 2.3	***$ 57.615.000.00***
SERVICIOS	***$ 14.857.413.37***
TOTAL	***$ 72.472.413.37***

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
Contratista

JUAN DAVID REYES VARGAS
Secretario de Planaacion y Obras Publicas
Supervisor

ACTA - LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:	10 de abril de 2025		
CONTRATO No.:	INT-05-2023	**FECHA:**	12 de octubre de 2023
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA	**PROCESO No.:**	CMA-04-2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR INICIAL CONTRATADO	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($72.472.413,37) M/CTE		
CONTRATISTA:	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO		
SUPERVISOR :	JUAN DAVID REYES VARGAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE ENERO DE 2024		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	09 DE JUNIO DE 2024		

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	UN (1) MES
2	TREINTA DIAS (30)

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
Acta de suspension No. 1	4/06/2024
Acta de suspension No. 2	12/08/2024
Acta de suspension Nº 2	12/09/2024
Acta de suspension Nº 2	15/10/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO:	SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($72.472.413,37) M/CTE
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el municipio de Nuevo Colón, a los DIEZ (10) días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO como contratista, el ingeniero JUAN DAVID REYES VARGAS como supervisor y con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas actividades ejecutadas y terminadas, estas fueron entregadas por el TRECE (13) de DICIEMBRE DE 2024 las cuales están descritas en el Acta de Recibo Final, la cual es parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que segun modificatorio nº 1 se estableció la siguiente forma de pago: "La primera acta parcial debera corresponder como minimo a la ejecucion de iun treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, sobre el avance de la ejecucion del contrato de obra objeto de la interventoria, previa prestacion y aprobacion de informes de avance en la ejecucion del objeto contratado, actas parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, sobre el avance de la ejecucion del objeto contrato de obra objeto de la interventoria, previa presentacion y aprobacion de informes de avance de ejecucion del objeto contratado. PAGO FINAL: Se realizara un pago final equivalente al saldo, que representara el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, a la entrega de la obra a satisfaccion del municipio de Nuevo Colon objeto de la interventoria, previa liquidacion del contrato de obra, entrega del informe final de interventoria y suscripcion del acta de liquidacion de la interventoria."

3. Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el contrato No. INT-05-2023

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre de 2024

5. Que el contratista presento informe final de ejecución de Interventoria

EJECUTADA

CONTRATADO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Contrato No. INT-05-2023	10 de Enero de 2024.	$ 72.472.413.37
SUMAS IGUALES		**$ 72.472.413.37**

EJECUTADO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Acta parcial 1	13/11/2024	$ 65.225.172.03
Acta de liquidacion		$ 7.247.241.34
Valor no ejecutado		
		$ 72.472.413.37

ACTA - LIQUIDACIÓN

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPOS ENTREGADOS		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
		$ 0.00
		$ 0.00
SUMAS IGUALES		**$ 0.00**

VALOR AMORTIZADO		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
		$ 0.00
Anticipo no amortizado		$ 0.00
		$ 0.00

DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO

VALOR CONTRATADO		
CONCEPTO		**VALOR**
Contrato No. INT-05-2023	10 de Enero de 2024.	$72.472.413.37
SUMAS IGUALES		**$ 72.472.413.37**

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**
Acta parcial 1	13/11/2024	$ 65.225.172.03
Valor contratado no pagado		$0.00
Saldo a favor del municipio		$7.247.241.34
		$ 72.472.413.37

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 72.472.413.37		
VALOR ADICIONES	$ 0.00		
VALOR ANTICIPO INICIAL			
VALOR ACTAS PARCIALES		$ 65.225.172.03	$ 65.225.172.03
VALOR NO EJECUTADO		$ 0.00	
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		$ 7.247.241.34	
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACIÓN			$ 7.247.241.34
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$ 0.00
TOTALES	**$ 72.472.413.37**	**$ 72.472.413.37**	**$ 72.472.413.37**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			**$ 7.247.241.34**

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: SIETE MILLONES DOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($7.247.241.34) M/CTE

ACTAS GENERADAS

ACTAS SUSCRITAS	FECHA
ACTA DE INICIO	10/01/2024
ACTA DE SUSPENSION Nº1	4/06/2024
ACTA DE REINICIO Nº1	12/08/2024
SOLICITUD DE PRORROGA Nº 1	14/08/2024
PRORROGA Nº 1	14/08/2024
ACTA DE SUSPENSION Nº 2	12/09/2024
ACTA DE REINICIO Nº 2	15/10/2024
SOLICITUD DE PRORROGA Nº2 Y MODIFICACION Nº1	16/10/2024
PRORROGA Nº2 Y MODIFICACION Nº1	16/10/2024
ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15/11/2024
ACTA DE RECIBO FINAL	13/12/2024

ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
ACTA DE PARCIAL Nº1	10 DE ENERO DE 2024 AL 04 DE JUNIO DEL 2024	COM-2024000522	22/11/2024	$ 65.225.172.03
TOTALES				$ 65.225.172.03

ACTA - LIQUIDACIÓN

GARANTÍAS

RIESGO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		COMPAÑÍA
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	39-44-101156552	$ 3.871.903.00	10/01/2024	15/05/2025	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
SALARIOS		$ 3.871.903.00	10/01/2024	15/01/2028	
ESTABILIDAD	ANEXO No. 11	$ 7.743.806.00	13/01/2024	13/12/2027	

Las anteriores garantías fueron aprobadas mediante acta de aprobacion de polizas

El suscrito supervisor certifica que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción, que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Articulo 50 de la Ley 789-2002. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
INTERVENTOR

JUAN DAVID REYES VARGAS
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS
ALCALDESA (E)

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-09 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CONSORCIO SAN JOSE 2023-Rep. Legal: Ing. Jairo Enrique Rincón Velandia, ha cumplido con las afiliaciones y aportes de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales del contrato de obra, de conformidad con la normatividad vigente.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-09 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CONSORCIO SAN JOSE 2023-Rep. Legal: Ing. Jairo Enrique Rincón Velandia, ha cumplido con las especificaciones técnicas y procesos constructivos del contrato de obra.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-09 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CONSORCIO SAN JOSE 2023-Rep. Legal: Ing. Jairo Enrique Rincón Velandia, ha cumplido con la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental del contrato de obra.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-09 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CONSORCIO SAN JOSE 2023-Rep. Legal: Ing. Jairo Enrique Rincón Velandia, ha cumplido con la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental del contrato de obra.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-09 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CONSORCIO SAN JOSE 2023-Rep. Legal: Ing. Jairo Enrique Rincón Velandia, ha cumplido con el equipo de trabajo, de acuerdo con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales y su dedicación.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-09 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CONSORCIO SAN JOSE 2023-Rep. Legal: Ing. Jairo Enrique Rincón Velandia, ha cumplido con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional en el contrato de obra.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. COP-09 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CONSORCIO SAN JOSE 2023-Rep. Legal: Ing. Jairo Enrique Rincón Velandia, ha cumplido con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional en el contrato de obra.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- CONTRATISTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INT -05 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO, ha cumplido con las afiliaciones y aportes de seguridad social, riesgos profesionales y parafiscales del contrato de Interventoría, de conformidad con la normatividad vigente.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- CONTRATISTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INT -05 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"


CERTIFICA

Que el Contratista CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO, ha cumplido con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional del contrato de Interventoría, de conformidad con la normatividad vigente.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- CONTRATISTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INT -05 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO, ha cumplido con la realización de pruebas, ensayos, laboratorios, y control de especificaciones técnicas y procesos constructivos de obra, implementadas por la interventoría.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- CONTRATISTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INT -05 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"

CERTIFICA

Que el Contratista CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO, ha cumplido con el equipo de trabajo, de acuerdo con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales y su dedicación.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,

Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO- CONTRATISTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. INT -05 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DEL MUNICPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 2786 DEL 2023"


CERTIFICA

Que el Contratista CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO, ha cumplido con el equipo de trabajo, de acuerdo con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales y su dedicación.

La presente certificación corresponde al periodo de ejecución del 10 de Enero de 2024 al 15 de Noviembre de 2024

Se expide a los 24 días del mes de Abril de 2025.

Cordialmente,



Ing. Cesar Augusto Cardozo Arévalo

Interventor

LAS SUSCRITAS ALCALDESA (E) Y CONTADORA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON

CERTIFICAN:

Que, la **Alcaldía Municipal de Nuevo Colón** con **NIT. 800.033.062-0**, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigible, ha realizado el pago de los Aportes de Seguridad Social y Aportes Parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a **Paz y Salvo** por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide en la ciudad de Nuevo Colón a los nueve (09) días del mes de abril de 2025.

LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS
Alcaldesa Municipal (E)

DIANA M. MARTINEZ RUBIANO
Contadora Municipio
T.P. 132957-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 3 2 5 3 9 0 8 1 4 4 E A 0 A 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARGARITA MARTINEZ RUBIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23782267 de MONIQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 132957-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN

CERTIFICA:

Que, una vez revisado el software con el que cuenta el municipio, durante el periodo comprendido entre el mes de julio del 2023 al 10 de abril de 2025 la cuenta corriente 616945366 denominada **CONVENIO NO. 2786/2023 CERRAMIENTO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA**, ha generado rendimientos por valor de $ 1.866.575.

Que dichos rendimientos fueron devueltos a la cuenta bancaria que dispuso la gobernación de Boyacá para tal fin.

La presente se expide en Nuevo Colón a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

NATALIA MARÍA CRUZ PUERTO
Secretaria de Hacienda

GOBERNACION DE BOYACA
NIT. 891800498-1

FECHA (D/M/A): 22/04/2025 — INGRESO: CONSIGNACION Nº 3476
CUENTA Nº: 61610827-0 — BANCO DE BOGOTA
CLASIFICACION: VIGENCIA ACTUAL
CONCEPTO: REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No 2786 DE 2023 / REG BPPID: 2023 00415 0135 / CONSIG 10/04/2025

CENTRO UTILIDAD:
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE NUEVO COLON — C.C. ó NIT: 800033062
LA SUMA DE : UN MILLóN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS EN M/CTE

Imputación Contable			Distribución en Usos y/o Rubros	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	USO Y/O RUBRO	VALOR
111005010114	$1.866.575,00	$0,00	0302 - 120502053 - 1006-Rendimientos Financieros	1.866.575,00
31090101	$0,00	$1.866.575,00		
	$1.866.575,00	$1.866.575,00		

TOTAL EFECTIVO: 1.866.575,00 — TOTAL CHEQUE: 0,00 — *TOTAL:* $1.866.575,00

ELABORADO POR
Tesorería General del Departamento

ORIGINAL
Elaboro: DIANA

Powered by CamScanner

	MUNICIPIO DE NUEVO COLON	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000153

Nit: 800033062-0

jueves, 10 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	10-abr-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GOBERNACIÓN DE BOYACA

DIRECCION PLAZA DE BOLIVAR

BANCO

CUENTA

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

DESCRIPCION

CC o NIT 891800498 DV 1

TELEFONO

TIPO CUENTA CTA AH

VALOR PAGO 1,866,575.00

DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO No, 2786/2023 CERRAMIENTO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA.

SON UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110050316		Bogotá 616945366 Conv. No.2786/2023 Cerramiento Coleg. Antigua	00.00	1,866,575.00			
24072620		Rend. 45366 Conv. No.2786/2023 Cerramiento Coleg.Antigua	1,866,575.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	1,866,575.00	1,866,575.00			

Elaboró NATALIA Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS ALCALDESA MUNICIPAL (E.)	NATALIA MARIA CRUZ PUERTO SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit

Bogotá, 11 de 04 de 2025

SEÑOR

MUNICIPIO DE NUEVO COLON

CIUDAD
Bogotá D.C

Asunto: Intereses pagados Cuenta corriente

A continuación nos permitimos informar el valor de los intereses pagados para la Cuenta corriente No.616945366

PERIODO	PROMEDIO	INTERESES
Julio/2023	$0.00	$0.00
Agosto/2023	$0.00	$0.00
Septiembre/2023	$0.00	$0.00
Octubre/2023	$0.00	$0.00
Noviembre/2023	$0.00	$0.00
Diciembre/2023	$0.00	$0.00
Enero/2024	$0.00	$0.00
Febrero/2024	$0.00	$0.00
Marzo/2024	$0.00	$0.00
Abril/2024	$201,646,582.46	$609,953.00
Mayo/2024	$67,322,728.99	$177,537.00
Junio/2024	$64,022,475.89	$163,369.00
Julio/2024	$61,503,592.99	$52,235.00
Agosto/2024	$57,686,335.24	$48,980.00
Septiembre/2024	$305,279,710.43	$373,690.00
Octubre/2024	$219,754,937.51	$278,070.00
Noviembre/2024	$108,593,237.79	$109,908.00
Diciembre/2024	$37,851,754.88	$32,158.00
Enero/2025	$9,003,632.88	$7,636.00
Febrero/2025	$8,050,308.08	$6,188.00
Marzo/2025	$8,056,496.08	$6,851.00

El saldo de la Cuenta corriente 616945366 a corte Marzo/2025 es de $8,056,275.08

Cordialmente,

Firma Autorizada,

Le recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero, la cual podrá contactar al teléfono: 3320101, a través del correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co o en dirección Calle 36 No 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá.

NOTARIA SEGUNDA

CÍRCULO DE RAMIRIQUÍ - BOYACÁ

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOS (002).

FECHA DE OTORGAMIENTO: NUEVE (09) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2.025). ----------

==========

En Ramiriquí, Departamento de Boyacá, República de Colombia, lugar donde está ubicada la Notaría Segunda, a **NUEVE (09) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2.025)**, siendo Notaria Encargada **ELIANA ANDREA MUÑOZ MUÑOZ, según decreto 004 de fecha siete (07) de enero de 2025 expedido por la Alcaldía Municipal de Ramiriquí**, comparece **LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS,** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **1.049.644.666** expedida en **TUNJA,** domiciliada en el municipio de Nuevo Colón (Boyacá), de estado civil soltera, de profesión Abogada, a quien identifiqué con la cédula antes anotada y manifestó: ----------

==========

PRIMERO: Que mediante Decreto número 0014 del 03 de enero 2025 "*POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON*", expedido por el Gobernador del Departamento de Boyacá, la compareciente, fue Encargada como **ALCALDESA (E) DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON**, Departamento de Boyacá, República de Colombia, durante el periodo "hasta tanto se declare la elección de Alcalde del Municipio de Nuevo Colón mientras se surte el proceso respectivo y se convocan a nuevas elecciones", según lo acredita el decreto antes mencionado, documento del cual se protocoliza copia auténtica con la presente escritura pública. ----------

==========

SEGUNDO: Que teniendo como fundamento lo establecido en la Constitución Política de Colombia, especialmente los artículos 314 y 315 de la misma Constitución, así como lo señalado en el artículo 94 de la Ley 136 de 1994, su Decreto Reglamentario 2626 de 1994, y lo señalado en el Decreto 1083 de 2015, es su obligación y voluntad tomar posesión del cargo para el cual fue Encargada. -----

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

==========

TERCERO: Para tal efecto presentó ante el despacho de la Notaría Segunda para su protocolización, los siguientes documentos exigidos por la Ley, a saber: ----------

1. Copia de la cédula de ciudadanía número 1.049.644.666 expedida en Tunja.
2. Juramento sobre el monto de sus bienes y rentas. ----------
3. Certificado consulta antecedentes judiciales. ----------
4. Certificados antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación. -
5. Certificado antecedentes Contraloría General de la Nación. ----------
6. Declaración de bienes y rentas -formato -SIGEP. ----------
7. Hoja de vida SIGEP- Aprobado. ----------
8. Declaración juramentada en la que consta la ausencia de inhabilidades o incompatibilidades para el ejercicio del cargo. ----------
9. Certificado del REDAM. ----------
10. Certificado médico de aptitud física y mental. ----------
11. Decreto 0014 del 03 de enero 2025, expedido por el Gobernador del Departamento de Boyacá. ----------

==========

CUARTO: Que en los términos y para los fines previstos en la Ley 136 de 1994, artículo 94, el Decreto Reglamentario 2626 de 1994 artículo 134, y lo señalado en el Decreto 1083 de 2015, la suscrita Notaria Segunda (e), procede a realizar la toma de juramento y posesión del cargo de la compareciente como ALCALDESA ENCARGADA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLON (BOYACÁ), en los siguientes términos: **"Juro a Dios y prometo al pueblo de cumplir fielmente la Constitución política de Colombia, las leyes, las ordenanzas y los acuerdos".** ----------

Esta posesión surte efectos fiscales a partir del día nueve (09) de enero del año dos mil veinticinco (2.025). ----------

==========

QUINTO. ADVERTENCIAS AL OTORGANTE: La compareciente hace constar que ha verificado cuidadosamente su nombre completo, el estado civil, el número de su documento de identidad, declara que toda la información consignada en la presente escritura pública es correcta y, en consecuencia, asume la responsabilidad que se deriva de cualquier inexactitud en los mismos. Conoce la ley y sabe que el Notario

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

responde de la regularidad formal de las escrituras que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados. ----------

==========

SEXTO. OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. Leída en forma legal el contenido de la presente escritura por el compareciente que se elaboró conforme a sus declaraciones e instrucciones y, reunidos los requisitos legales, manifiesta que la acepta, aprueba y firma en señal de su aprobación junto con el suscrito notario, quien en esta forma la autoriza. ----------

==========

Papel notarial número: Aa101857941, Aa101857942.

LA COMPARECIENTE,

LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS

C.C. NRO.: 1049644666

DIRECCIÓN: Nuevo Calén

TELÉFONO: 312 326 9886

CORREO ELECTRONICO sofiacastelblanco@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO (A) ENCARGADO (A)
NOTARIA SEGUNDA DE RAMIRIQUÍ

ELIANA ANDREA MUÑOZ MUÑOZ

NOTARIA SEGUNDA (E) DEL CÍRCULO DE RAMIRIQUÍ

República de Colombia cadena.
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial.
Aa101857942 Ca504920777
NOTARIA SEGUNDA RAMIRIQUI
20-08-24 18-08-24
cadena.

RESOLUCIÓN 00773 DEL 26 DE ENERO DE 2024	
Derechos Notariales	$81900
Retefuente	------
Fondo Nal. de Notariado	$8.700
Supernotariado	$8.700
Iva	$61.161

ESCRITURACIÓN

RECIBIÓ _____ RADICÓ _____

DIGITÓ _____ VoBo _____

IDENTIFICÓ _____ HUELLAS/FOTO P.O. _____

LIQUIDÓ 1 _____ LIQUIDÓ 2 _____

REV. LEGAL _____ DERBO _____

ORGANIZÓ _____

ES Primera COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

LA QUE EXPIDO EN 46 HOJAS UTILES CON

DESTINO A: Los interesados

RAMIRIQUÍ: 09 ENE 2025

Luis Hernando [illegible]
Notaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIO (A) ENCARGADO (A)
NOTARIA SEGUNDA DE RAMIRIQUI

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.049.644.666**

CASTELBLANCO CASALLAS

APELLIDOS

LINA SOFIA

NOMBRES

Lina Sofia Castelblanco

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1996**

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-ENE-2014 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0700100-00550008-F-1049644666-20140225 **0037**40511A 2 41546734

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150601802

(415)7707212489984(8020) 000014115060180 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 3 0 6 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MUNICIPIO DE NUEVO COLON

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Nuevo Colón 4 9 4

41. Dirección principal
CL 4 4 60

42. Correo electrónico alcaldia@nuevocolon-boyaca.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 7 3 5 3 0 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 8 8 0 9 1 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																				

07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JIMENEZ PACHECO JESUS RICARDO

985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141150601802

(415)7707212489984(8020) **000014115060180 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 3 0 6 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	3 0
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 7	
72. Número	1	
73. Fecha	1 5 3 8 0 1 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	4 9 4	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	1 5 3 8 0 1 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141150601802

(415)7707212489984(8020) **000014115060180 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 0 3 3 0 6 2	0	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 2 1 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 4 9 6 4 4 6 6 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTELBLANCO	CASALLAS	LINA	SOFIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141150601802

(415)7707212489984(8020) **000014115060180 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 7 8 2 2 6 7	8	1 3 2 9 5 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	RUBIANO	DIANA	MARGARITA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 1 2 1 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA:	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLON PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATO:	2786 DE 2023
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SAN JOSE 2023
INTERVENTOR:	CESAR AUGUSTO CARDOZO
V. INICIAL	$ 1.107.792.679,95
V. ADICIONAL	
VALOR TOTAL	$ 1.107.792.679,95

1 HOJA DE

FECHA DE INICIACIÓN REAL 4/07/2023
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 3/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20/09/2024

ACTA PARCIAL:_____ $ 906.874.505,71
ACTA FINAL: _____ $ 200.844.545,06
ACTA No. _____ FINAL
FECHA: _____ 24/04/2025
MES: _____

													% OBRA EJECT.				% TIEMPO			
													OBRA EJECUTADA							
													MODIFICACIONES (insertar columnas según numero de modificaciones)		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
	CONDICIONES ORIGINALES CONVENIO 2786							CONDICIONES OIGINALES CONTRATO DE OBRA COP-009-2023 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA INT-005-2023												
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Unit. + Incremento**	**Valor. Unit. + AIU**	**Valor. Total**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**		**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
1	**CERRAMIENTO**					**$ 14.948.376,92**	**$ 334.810.997,88**			**$ 415.645.645,00**					**$ 57.179.990,30**		**$ 371.769.729,90**		**$ 428.949.720,20**
1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	120,91	$ 51.943,58	-	$ 67.526,65	$ 6.280.498,26	120,91	$ 64.490,00	$ 7.797.485,90	+	43,40	2.798.866,00	43,40	$ 2.798.866,00	120,91	$ 7.797.485,90	164,31	$ 10.596.351,90
1,2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	30,18	$ 73.747,12	$ 76.697,00	$ 99.706,10	$ 2.314.715,60	30,18	$ 95.220,00	$ 2.873.739,60	+	2,58	245.667,60	2,58	$ 245.667,60	30,18	$ 2.873.739,60	32,76	$ 3.119.407,20
1,3	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	20,38	$ 495.243,91	$ 515.053,67	$ 669.569,77	$ 10.496.793,72	20,38	$ 639.440,00	$ 13.031.787,20	+	70,40	45.016.576,00	70,40	$ 45.016.576,00	20,38	$ 13.031.787,20	90,78	$ 58.048.363,20
1,4	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	30,58	$ 857.158,32	$ 891.444,65	$ 1.158.878,05	$ 27.260.377,48	30,58	$ 1.106.730,00	$ 33.843.803,40	-	-4,20	-4.648.266,00	-3,97	-$ 4.393.718,10	30,35	$ 33.589.255,50	26,38	$ 29.195.537,40
1,5	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	36,06	$ 829.581,32	$ 862.764,57	$ 1.121.593,94	$ 31.111.290,50	36,06	$ 1.071.120,00	$ 38.624.587,20	-	-8,67	-9.286.610,40	-0,98	-$ 1.049.697,60	28,37	$ 30.387.674,40	27,39	$ 29.337.976,80
1,6	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	8,39	$ 1.468.876,24	$ 1.527.631,29	$ 1.985.920,68	$ 12.816.826,52	8,39	$ 1.896.550,00	$ 15.912.054,50	+	0,59	1.118.964,50	0,59	$ 1.118.964,50	8,39	$ 15.912.054,50	8,98	$ 17.031.019,00
1,7	MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.	M2	248,10	$ 96.488,74	$ 100.348,29	$ 130.452,78	$ 24.896.410,65	248,10	$ 124.580,00	$ 30.908.298,00	+	1,21	150.741,80	1,21	$ 150.741,80	248,10	$ 30.908.298,00	249,31	$ 31.059.039,80
1,8	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	5,28	$ 1.070.182,40	$ 1.112.989,70	$ 1.446.886,61	$ 5.876.585,59	5,28	$ 1.381.770,00	$ 7.295.745,60	-	-1,03	-1.423.223,10	-0,75	-$ 1.036.327,50	5,00	$ 6.908.850,00	4,25	$ 5.872.522,50
1,9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	7.627,865	$ 7.002,12	$ 7.282,20	$ 9.466,86	$ 55.547.638,71	7.627,86	$ 9.040,00	$ 68.955.854,40	+	955,95	8.641.788,00	956,19	$ 8.643.957,60	7.627,62	$ 68.953.684,80	8.583,81	$ 77.597.642,40
1,10	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	3.095,51	$ 6.137,74	$ 6.383,25	$ 8.298,23	$ 19.759.412,97	3.095,51	$ 7.920,00	$ 24.516.439,20	-	-3.095,51	-24.516.439,20	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
1,11	MODULO CERRAMIENTO 2,50MX1,30M EN PERFIL METÁLICO SEGÚN DISEÑO	U	165,00	$ 773.500,00	$ 804.440,00	$ 1.045.772,00	$ 132.732.600,00	165,00	$ 998.710,00	$ 164.787.150,00	-	-10,00	-9.987.100,00	0,00	$ 0,00	155,00	$ 154.800.050,00	155,00	$ 154.800.050,00
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL (3 MTS)	U	1,00	$ 2.201.500,00	$ 2.289.560,00	$ 2.976.428,00	$ 2.289.560,00	1,00	$ 2.842.480,00	$ 2.842.480,00	+	2,00	5.684.960,00	2,00	$ 5.684.960,00	1,00	$ 2.842.480,00	3,00	$ 8.527.440,00
1,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR (4 MTS)	U	1,00	$ 2.915.500,00	$ 3.032.120,00	$ 3.941.756,00	$ 3.032.120,00	1,00	$ 3.764.370,00	$ 3.764.370,00	=		0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.764.370,00	1,00	$ 3.764.370,00
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	$ 211.628,14	$ 220.093,27	$ 286.121,25	$ 396.167,88	1,80	$ 273.250,00	$ 491.850,00	-	-1,80	-491.850,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2	**URBANISMO Y EMPRADIZACIONES**						**$ 312.689.917,79**			$ 388.198.147,10					**$ 120.878.794,40**		**$ 316.698.701,60**		**$ 437.577.496,00**
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	386,64	$ 51.943,58	-	$ 67.526,65	$ 20.083.465,77	386,64	$ 64.490,00	$ 24.934.413,60	+	3,04	196.049,60	5,01	$ 323.094,90	384,67	$ 24.807.368,30	389,68	$ 25.130.463,20
2,2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	229,47	$ 73.747,12	$ 76.697,00	$ 99.706,10	$ 17.599.661,69	229,47	$ 95.220,00	$ 21.850.133,40	-	-45,85	-4.365.837,00	2,95	$ 280.899,00	180,67	$ 17.203.397,40	183,62	$ 17.484.296,40
2,3	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	KG	531,46	$ 7.349,45	$ 7.643,43	$ 9.936,46	$ 4.062.176,24	531,46	$ 9.490,00	$ 5.043.555,40	+	447,76	4.249.242,40	447,76	$ 4.249.242,40	531,46	$ 5.043.555,40	979,22	$ 9.292.797,80
2,4	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	201,45	$ 68.183,43	$ 70.910,77	$ 92.184,00	$ 14.284.974,05	201,45	$ 88.040,00	$ 17.735.658,00	-	-19,90	-1.751.996,00	-19,90	-$ 1.751.996,00	201,45	$ 17.735.658,00	181,55	$ 15.983.662,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109	ML	222,96	$ 52.796,51	$ 54.908,37	$ 71.380,88	$ 12.242.370,26	222,96	$ 68.170,00	$ 15.199.183,20	-	-222,96	-15.199.183,20	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	1.507,77	$ 7.002,12	$ 7.282,20	$ 9.466,86	$ 10.979.889,93	1.507,77	$ 9.040,00	$ 13.630.240,80	+	2.274,46	20.561.118,40	2.274,72	$ 20.563.468,80	1.507,51	$ 13.627.890,40	3.782,23	$ 34.191.359,20
2,7	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	1.719,40	$ 6.137,74	$ 6.383,25	$ 8.298,23	$ 10.975.359,36	1.719,40	$ 7.920,00	$ 13.617.648,00	-	-1.719,40	-13.617.648,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,8	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	27,84	$ 696.589,21	$ 724.452,78	$ 941.788,61	$ 20.168.765,35	27,84	$ 899.410,00	$ 25.039.574,40	-	-1,85	-1.663.908,50	0,00	$ 0,00	25,99	$ 23.375.665,90	25,99	$ 23.375.665,90
2,9	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	102,66	$ 69.628,59	$ 72.413,73	$ 94.137,85	$ 7.433.993,89	102,66	$ 89.900,00	$ 9.229.134,00	+	220,44	19.817.556,00	220,44	$ 19.817.556,00	102,66	$ 9.229.134,00	323,10	$ 29.046.690,00
2,10	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	92,39	$ 130.054,93	$ 135.257,13	$ 175.834,27	$ 12.496.405,98	92,39	$ 167.920,00	$ 15.514.128,80	+	287,00	48.193.040,00	287,00	$ 48.193.040,00	92,39	$ 15.514.128,80	379,39	$ 63.707.168,80
2,11	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) M3	M3	5,57	$ 1.518.710,44	$ 1.579.458,86	$ 2.053.296,52	$ 8.797.585,84	5,57	$ 1.960.890,00	$ 10.922.157,30	-	-1,66	-3.255.077,40	0,35	$ 686.311,50	3,56	$ 6.980.768,40	3,91	$ 7.667.079,90

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ																				VERSIÓN: 0	
	FORMATO																			CÓDIGO: A-AD-GC-F-028	
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS																			FECHA: 24/Jul/2019	
2,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	300,57	$ 459.119,02	$ 477.483,78	$ 620.728,91	$ 143.517.300,00		300,57	$ 592.790,00	$ 178.174.890,30	-	-0,57	-337.890,30	0,00	$ 0,00	300,00	$ 177.837.000,00	300,00	$ 177.837.000,00
2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	ML	120,00	$ 54.934,97	$ 57.132,37	$ 74.272,08	$ 6.855.884,26		120,00	$ 70.930,00	$ 8.511.600,00	-	-38,90	-2.759.177,00	36,60	$ 2.596.038,00	44,50	$ 3.156.385,00	81,10	$ 5.752.423,00
2,14	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	U	20,00	$ 112.957,53	$ 117.475,83	$ 152.718,58	$ 2.349.516,62		20,00	$ 145.850,00	$ 2.917.000,00	-	-5,00	-729.250,00	0,00	$ 0,00	15,00	$ 2.187.750,00	15,00	$ 2.187.750,00
2,15	PRADIZACIÓN(PASTO	M2	767,69	$ 26.105,50	$ 27.149,72	$ 35.294,64	$ 20.842.568,55		767,69	$ 33.710,00	$ 25.878.829,90	+	1,26	42.309,90	768,95	$ 25.921.139,80		$ 0,00	768,95	$ 25.921.139,80
3	**MALLA CONTRA IMPACTO**						**$ 148.899.285,59**				$ 184.855.341,02					**$ 12.248.087,20**		**$ 156.471.334,00**		**$ 168.719.421,20**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA Y MALLA CONTRAIMPACTO H=5.0 M	ML	96,00	$ 1.195.533,00	$ 1.243.354,32	$ 1.616.360,62	$ 119.362.014,72		96,00	$ 1.543.620,00	$ 148.187.520,00	-	-15,78	-24.358.323,60	0,62	$ 957.044,40	79,60	$ 122.872.152,00	80,22	$ 123.829.196,40
3,2	PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)	ML	31,00	$ 463.936,38	$ 482.493,84	$ 627.241,99	$ 14.957.308,89		31,00	$ 599.010,00	$ 18.569.310,00	+	5,00	2.995.050,00	5,00	$ 2.995.050,00	31,00	$ 18.569.310,00	36,00	$ 21.564.360,00
3,3	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	7,80	$ 829.581,32	$ 862.764,57	$ 1.121.593,94	$ 6.729.563,67		7,80	$ 1.071.120,00	$ 8.354.736,00	+	2,01	2.152.951,20	2,01	$ 2.152.951,20	7,80	$ 8.354.736,00	9,81	$ 10.507.687,20
3,4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	738,40	$ 7.002,12	$ 7.282,20	$ 9.466,86	$ 5.377.180,02		738,40	$ 9.040,00	$ 6.675.136,00	+	679,54	6.143.041,60	679,54	$ 6.143.041,60	738,40	$ 6.675.136,00	1.417,94	$ 12.818.177,60
3,5	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	387,45	$ 6.137,74	$ 6.383,25	$ 8.298,23	$ 2.473.218,29		387,45	$ 7.920,00	$ 3.068.639,02	-	-387,45	-3.068.639,02	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS						$ 796.400.201,26				$ 988.699.133,12					$ 190.306.871,90		$ 844.939.765,50		$ 1.035.246.637,40
	A.I.U. __%						$ 238.920.060,38				$ 228.161.338,41					$ 43.264.581,88		$ 228.161.338,41		$ 228.161.338,41
	COSTO DIRECTO + AIU						$ 1.035.320.261,64				$ 988.699.133,12					$ 190.306.871,90		$ 844.939.765,50		$ 1.035.246.637,40
	INTERVENTORIA						$ 72.472.418,31				$ 72.472.413,37					$ 10.537.673,16		$ 61.934.740,21		$ 72.472.413,37
	TOTAL CONVENIO						$ 1.107.792.679,95				$ 1.061.171.546,49					$ 200.844.545,06		$ 906.874.505,71		$ 1.107.719.050,77

VALOR OBRAS EJECUTADAS	**1.107.719.050,77**
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	906.874.505,71
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	**200.844.545,06**

SON: DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 200.844.545,06) M/CTE

LINA SOFIA CASTELBLANCO CASALLAS
CONTRATISTA ALCALDESA (E) MUNICIPIO DE NUEVO COLOP

JUAN DAVID REYES VARGAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

JAIRO ENRRIQUE RINCON VELANDIA
R/L CONSORCIO SAN JOSE
CONTRATISTA CONTRATO DE OBRA COP-09-2023

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
INTERVENTOR
CONTRATISTA CONTRATO DE INTERVENTORIA INT-05-2023

Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar tambien el acta de Recursos Fisicos

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS
MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**OBJETO:**	**"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**				
INTERVENTOR:	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**CONTRATO No.**	**COP-09-2023**	**VALOR CONTRATO:**	$ 988.699.133,12	**Acta No.**	FINAL
SUPERVISOR:	JUAN DAVID REYES VARGAS	**FECHA ACTA DE INICIO:**	**10 DE ENERO DE 2024**	**VALOR ADICIONAL:**	$ 46.547.504,28	**MES:**	NOVIEMBRE
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 255.568.750,98**	**FECHA ACTA DE TERMINACION:**	**15 DE NOVIEMBRE DE 2024**	**VALOR ADICIONAL N° 02:**	$ 68.088.896,18	**PERIODO DE PAGO:**	10 /ENERO/2024 - 15/NOVIEMBRE/2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	**23,16%**			**VALOR TOTAL ACTUAL:**	$ 1.103.335.533,58	**FECHA:**	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
% AVANCE DE OBRA	**100,00%**	**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE**					

OBRA CONTRATADA						ACTA DE PAGO No. 001		OBRA A AJECUTAR					ACTA DE PAGO No. 02		OBRA A AJECUTAR					OBRA A AJECUTAR					ACTA DE PAGO No. 03		OBRA A AJECUTAR					PRESENTE ACTA No. 04		ACUMULADO ACTUAL EJECUTADO	
								MODIFICACION No.01			CONDICIONES ACTUALIZADAS				MODIFICACION No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ADICION No.02			CONDICIONES ACTUALIZADAS Y ADICION N° 02				MODIFICACION No.03			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR	CANT.	VALOR	+/-	CANT.	VALOR	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR	+/-	CANT.	VALOR	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR	CANT.	VALOR	+/-	CANT.	VALOR	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**CERRAMIENTO**																																	
1.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	120,91	$ 64.490,00	$ 7.797.485,90	99,13	$ 6.392.893,70	+	1,69	$ 108.988,10	122,60	$ 7.906.474,00	21,78	$ 1.404.592,20	+	6,03	$ 388.874,70	128,63	$ 8.295.348,70	=		$ -	128,63	$ 8.295.348,70	0,00	$ 0,00	+	35,68	$ 2.301.003,20	164,31	$ 10.596.351,90	43,40	$ 2.798.866,00	164,31	$ 10.596.351,90
1.02	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	30,18	$ 95.220,00	$ 2.873.739,60	24,00	$ 2.285.280,00	+	3,25	$ 309.465,00	33,43	$ 3.183.204,60	6,18	$ 588.459,60	=		$ -	33,43	$ 3.183.204,60	=		$ -	33,43	$ 3.183.204,60	0,00	$ 0,00	-	-0,67	-$ 63.797,40	32,76	$ 3.119.407,20	2,58	$ 245.667,60	32,76	$ 3.119.407,20
1.03	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	20,38	$ 639.440,00	$ 13.031.787,20	10,60	$ 6.778.064,00	+	70,16	$ 44.863.110,40	90,54	$ 57.894.897,60	9,78	$ 6.253.723,20	=		$ -	90,54	$ 57.894.897,60	=		$ -	90,54	$ 57.894.897,60	0,00	$ 0,00	+	0,24	$ 153.465,60	90,78	$ 58.048.363,20	70,40	$ 45.016.576,00	90,78	$ 58.048.363,20
1.04	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	M3	30,58	$ 1.106.730,00	$ 33.843.803,40	15,90	$ 17.597.007,00	-	-0,23	-$ 254.547,90	30,35	$ 33.589.255,50	12,00	$ 13.280.760,00	=		$ -	30,35	$ 33.589.255,50	=		$ -	30,35	$ 33.589.255,50	0,00	$ 0,00	-	-3,97	-$ 4.393.718,10	26,38	$ 29.195.537,40	-1,52	-$ 1.682.229,60	26,38	$ 29.195.537,40
1.05	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	36,06	$ 1.071.120,00	$ 38.624.587,20	18,75	$ 20.083.500,00	-	-7,69	-$ 8.236.912,80	28,37	$ 30.387.674,40	9,62	$ 10.304.174,40	+	0,34	$ 364.180,80	28,71	$ 30.751.855,20	=		$ -	28,71	$ 30.751.855,20	0,00	$ 0,00	-	-1,32	-$ 1.413.878,40	27,39	$ 29.337.976,80	-0,98	-$ 1.049.697,60	27,39	$ 29.337.976,80
1.06	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	M3	8,39	$ 1.896.550,00	$ 15.912.054,50	1,08	$ 2.048.274,00	+	0,50	$ 948.275,00	8,89	$ 16.860.329,50	7,31	$ 13.863.780,50	=		$ -	8,89	$ 16.860.329,50	=		$ -	8,89	$ 16.860.329,50	0,00	$ 0,00	+	0,09	$ 170.689,50	8,98	$ 17.031.019,00	0,59	$ 1.118.964,50	8,98	$ 17.031.019,00
1.07	MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.	M2	248,10	$ 124.580,00	$ 30.908.298,00	94,50	$ 11.772.810,00	+	19,10	$ 2.379.478,00	267,20	$ 33.287.776,00	153,60	$ 19.135.488,00	-	-15,74	-$ 1.960.889,20	251,46	$ 31.326.886,80	=		$ -	251,46	$ 31.326.886,80	0,00	$ 0,00	-	-2,15	-$ 267.847,00	249,31	$ 31.059.039,80	1,21	$ 150.741,80	249,31	$ 31.059.039,80
1.08	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	M3	5,28	$ 1.381.770,00	$ 7.295.745,60	0,14	$ 193.447,80	-	-0,28	-$ 386.895,60	5,00	$ 6.908.850,00	4,86	$ 6.715.402,20	=		$ -	5,00	$ 6.908.850,00	=		$ -	5,00	$ 6.908.850,00	0,00	$ 0,00	-	-0,75	-$ 1.036.327,50	4,25	$ 5.872.522,50	-0,75	-$ 1.036.327,50	4,25	$ 5.872.522,50
1.09	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	7.627,86	$ 9.040,00	$ 68.955.854,40	3678,95	$ 33.257.708,00	+	1.250,36	$ 11.303.254,40	8.878,22	$ 80.259.108,80	3948,64	$ 35.695.705,60	-	-39,92	-$ 360.876,80	8.838,30	$ 79.898.232,00	=		$ -	8.838,30	$ 79.898.232,00	0,00	$ 0,00	-	-254,49	-$ 2.300.589,60	8.583,81	$ 77.597.642,40	956,22	$ 8.644.228,80	8583,81	$ 77.597.642,40
1.10	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	KG	3.095,51	$ 7.920,00	$ 24.516.439,20		$ 0,00	-	-3.095,51	-$ 24.516.439,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	=		$ -	0,00	$ 0,00	=		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	=		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.11	MODULO CERRAMIENTO 2.50MX1.30M EN PERFIL METÁLICO SEGÚN DISEÑO	U	165,00	$ 998.710,00	$ 164.787.150,00		$ 0,00	-	-10,00	-$ 9.987.100,00	155,00	$ 154.800.050,00	146,00	$ 145.811.660,00	+	1,00	$ 998.710,00	156,00	$ 155.798.760,00	=		$ -	156,00	$ 155.798.760,00	10,00	$ 9.987.100,00	-	1,00	$ 998.710,00	155,00	$ 154.800.050,00	-1,00	-$ 998.710,00	155,00	$ 154.800.050,00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL (3 MTS)	U	1,00	$ 2.842.480,00	$ 2.842.480,00		$ 0,00	+	2,00	$ 5.684.960,00	3,00	$ 8.527.440,00	1,00	$ 2.842.480,00	=		$ -	3,00	$ 8.527.440,00	=		$ -	3,00	$ 8.527.440,00	0,00	$ 0,00	=		$ -	3,00	$ 8.527.440,00	2,00	$ 5.684.960,00	3,00	$ 8.527.440,00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR (4 MTS)	U	1,00	$ 3.764.370,00	$ 3.764.370,00		$ 0,00	=		$ -	1,00	$ 3.764.370,00	1,00	$ 3.764.370,00	=		$ -	1,00	$ 3.764.370,00	=		$ -	1,00	$ 3.764.370,00	0,00	$ 0,00	=		$ -	1,00	$ 3.764.370,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.764.370,00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,80	$ 273.250,00	$ 491.850,00		$ 0,00	=		$ -	1,80	$ 491.850,00		$ 0,00	-	-1,80	-$ 491.850,00	0,00	$ 0,00	=		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	=		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

| | | |

| | | |


Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-

Mes: 11

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



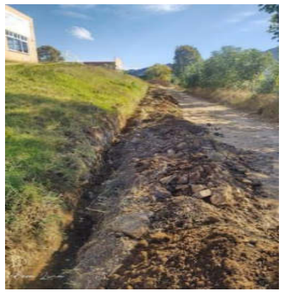







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	EXCAVACIÓN PARA CERRAMIENTO	300,00	0,40	0,30		36,00
ACTA 1	EXCAVACIONES PARA ZAPATAS	0,70	1,05	0,70	100,00	51,45
ACTA 1	VIGA MALLA CONTRA IMPACTO EN CANCHA	65,00	0,30	0,40		7,80
ACTA 1	PILOTE DE MALLA CONTRA IMPACTO	1,00	0,13		31,00	3,88
	Σ ACTA 1					99,13
ACTA 2	VIGA MALLA CONTRA IMPACTO EN CANCHA	23,50	0,30	0,40		2,82
ACTA 2	EXCAVACION PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO	0,40	1,00	0,40	36,00	5,76
ACTA 2	EXCAVACION TUBO AGUA POTABLE	18,60	0,20	0,20		0,74
ACTA 2	EXCAVACION PARA ZAPATAS CIMENTACION CAFETERIA	1,00	0,75	1,00		0,75
ACTA2	EXCAVACION PARA PISO CAFETERIA	8,68	0,30	4,50		11,71
	Σ ACTA 2					21,78
ACTA 4	CORRECCIÓN LONGITUD VIGA MALLA CONTRA IMPACTO EN CANCHA	-6,80	0,30	0,40		-0,82
ACTA 4	CORRECCIÓN DEL ACTA 1 (PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO)	1,00	0,13		-31,00	-3,88
ACTA 4	CORRECCIÓN DEL ACTA 2 (EXCAVACION PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO)	0,40	1,00	0,40	-36,00	-5,76
ACTA 4	EXCAVACIÓN PARA CICLOPEO CERRAMIENTO DE VIGAS	54,75	0,40	0,40		8,76
ACTA 4	EXCAVACIÓN PARA CICLOPEO VIGA PORTON VEHICULAR	4,60	0,60	0,40		1,10
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS PORTON - PLAZOLETA	1,70	0,50	0,70		1,01
ACTA 4	CICLOPEO CASETA PLAZOLETA (MURO)	5,50	0,70	0,40		1,54
ACTA 4	EXCAVACIÓN PARA COLUMNETAS	0,70	1,05	0,70	52	26,75
ACTA 4	EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS COLUMNAS PUERTAS	1,00	1,05	1,00	6,00	6,30
ACTA 4	CORRECCIÓN DEL ACTA 2 (EXCAVACION TUBO AGUA POTABLE)	-18,60	0,20	0,20		-0,74
ACTA 4	EXCAVACION PARA ZAPATAS CIMENTACION CAFETERIA	1,00	0,75	1,00	5	3,75
ACTA 4	EXCAVACION PARA VIGAS CIMENTACION CAFETERIA	39,05	0,25	0,25		2,44
ACTA 4	EXCAVACION PARA PISO CAFETERIA	9,59	0,30	0,63		1,81
ACTA 4	EXCAVACION ZAPATAS PLAZOLETA DE ACCESO	0,70	0,50	0,70	3	0,74
ACTA 4	EXCAVACION PARA VIGAS CIMENTACION PLAZOLETA DE ACCESO	9,37	0,25	0,25		0,40
	Σ ACTA 4					43,40
				PASAN	UND	164,31
	TOTAL				**M3**	**164,31**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.02	M3	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA ZAPATAS PEDESTALES	0,70	0,30	0,70	100,00	14,70
ACTA 1	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA ZAPATAS PUERTAS	1,00	0,30	1,00	4,00	1,20
ACTA 1	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA CERRAMIENTO	270,00	0,10	0,30	1,00	8,10
	Σ ACTA 1					24,00
ACTA 2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA ZAPATAS PUERTAS	1,00	0,30	1,00	1,00	0,30
ACTA 2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA ZAPATAS PEDESTALES	0,70	0,30	0,70	38	5,59
ACTA 2	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA CERRAMIENTO	9,80	0,10	0,30	1	0,29
	Σ ACTA 2					6,18
ACTA 4	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA ZAPATAS PEDESTALES	0,70	0,30	0,70	14	2,05
ACTA 4	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA ZAPATAS PUERTAS	1,00	0,30	1,00	1,00	0,30
ACTA 4	CORRECCIÓN DEL ACTA 2 (BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO PARA CERRAMIENTO)	-7,00	0,10	0,30		-0,21
ACTA 4	BASE MATERIAL DE AFIRMADO COLUMNAS PLAZOLETA DE ACCESO	0,70	0,30	0,70	3,00	0,44
	Σ ACTA 4					2,58
				PASAN	UND	32,76
				TOTAL	**M3**	**32,76**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.03	M3	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA








FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	CICLOPEO ZAPATAS PEDESTALES	0,70	0,20	0,70	100	9,80
ACTA 1	CICLOPEO ZAPATAS PORTONES	1,00	0,20	1,00	4	0,80
Σ ACTA 1						10,60
ACTA 2	CICLOPEO ZAPATAS CERRAMIENTO	0,70	0,25	0,70	**78**	9,56
ACTA 2	CICLOPEO VIGAS AMARRE CERRAMIENTO LATERAL Y FRONTAL	**1,40**	0,40	0,40	1	0,22
Σ ACTA 2						9,78
ACTA 4	CORRECCIÓN CICLOPEO ZAPATAS CERRAMIENTO	0,70	0,04	0,70	-36	-0,74
ACTA 4	CICLOPEO ZAPATAS PORTONES	1,00	0,20	1,00	2	0,40
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS AMARRE CERRAMIENTO TOTAL	4,25	0,40	0,40		0,68
ACTA 4	BASE VIGA AMARRE CERRAMIENTO VIA	12,60	0,40	0,40		2,02
ACTA 4	BASE VIGA CERRAMIENTO VIA	5,40	0,40	0,40		0,86
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO VIA	3,60	0,40	0,40		0,58
ACTA 4	BASE VIGAS PLAZOLETA ACCESO	1,30	0,40	0,20		0,10
ACTA 4	BASE VIGAS PLAZOLETA ACCESO	1,05	0,40	0,60		0,25
ACTA 4	BASE VIGAS PLAZOLETA ACCESO	1,70	0,40	0,75		0,51
ACTA 4	BASE VIGAS PLAZOLETA ACCESO	0,50	0,40	0,25		0,05
ACTA 4	BASE VIGAS PLAZOLETA ACCESO	3,40	0,40	0,40		0,54
ACTA 4	BASE VIGAS PLAZOLETA ACCESO	5,20	0,40	0,20		0,42
ACTA 4	CICLOPEO VIGA PORTON VEHICULAR	3,50	0,25	0,20		0,18
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO LAT. CASETA	4,50	0,40	0,60		1,08
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO LATERAL parqueos	12,60	0,40	0,40		2,02
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADERO	18,00	0,40	0,40		2,88
ACTA 4	BASE VIGAS LATERAL PARQUEOS	10,80	0,40	0,40		1,73
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEOS	11,25	0,60	0,30		2,03
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO VIA	5,40	0,40	0,40		0,86
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO VIA	3,60	0,40	0,40		0,58
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO VIA	21,60	0,40	0,40		3,46
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1,60	0,45	0,40		0,29
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1,80	0,50	0,50		0,45
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1,60	0,50	0,60		0,48
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	3,60	0,60	0,60		1,30
ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	2,15	0,50	0,65		0,70
ACTA 4	CICLOPEO BASE VIGAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	3,25	0,40	0,50		0,65

ACTA 4	BASE VIGAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	10,80	0,50	0,50		2,70
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS CERRAMIENTO POSTERIOR	16,20	0,50	0,50		4,05
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS CERRAMIENTO POSTERIOR	5,40	0,50	0,50		1,35
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS CERRAMIENTO POSTERIOR	5,40	0,50	0,50		1,35
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS CERRAMIENTO POSTERIOR	4,50	0,50	1,80		4,05
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS CERRAMIENTO POSTERIOS	3,60	0,50	0,50		0,90
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS CERRAMIENTO LATERAL TANQUE	27,00	0,50	0,50		6,75
ACTA 4	CICLOPEO CERRAMIENTO VIGAS TANQUES	12,00	0,40	0,40		1,92
ACTA 4	CICLOPEO CERRAMIENTO VIGAS TANQUES	2,20	0,40	0,40		0,35
ACTA 4	CICLOPEO CERRAMIENTO VIGAS TANQUES	2,50	0,40	0,40		0,40
ACTA 4	CICLOPEO CERRAMIENTO VIGAS TANQUES	4,00	0,40	0,40		0,64
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS LATERAL DESPUES DE LOS TANQUES	20,00	0,40	0,40		3,20
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS CERRAMIENTO DESPUES DE TANQUE	10,80	0,40	0,40		1,73
ACTA 4	CICLOPEO VIGAS DESPUES DE LOS TANQUES	8,60	0,40	0,40		1,38
ACTA 4	CICLOPEO CERRAMIENTO VIGAS VIA FINAL	10,60	0,40	0,40		1,70
ACTA 4	MURO EN CICLOPEO PARA RAMPA BIBLIOTECA	15,80	0,25	0,60		2,37
ACTA 4	CICLOPEO MUROS CAJA DE GAS	4,82	0,30	0,25	1	0,36
ACTA 4	CICLOPEO MUROS CAJA DE GAS	1,60	1,00	0,25	2	0,80
ACTA 4	BASE NIVELACION EN CICLOPEO RAMPA DE ACCESO	11,00	0,40	0,60		2,64
ACTA 4	MURO RAMPA ACCESO PEATONAL	1,20	0,45	0,28		0,15
ACTA 4	MURO CICLOPEO LATERAL PORTERIA	5,55	0,58	0,22		0,71
ACTA 4	MURO CICLOPEO PLAZOLETA	5,25	1,35	0,25		1,77
ACTA 4	MURO CICLOPEO LATERAL PLAZOLETA ACCESO	3,40	0,45	0,25		0,38
ACTA 4	CONCRETO CICLOPEO ZAPATAS CAFETERIA	1,00	0,20	1,00	6	1,20
ACTA 4	VIGA CICLOPEO CAFETERIA	45,05	0,25	0,25		2,82
ACTA 4	CICLOPEO COLUMNAS PLAZOLETA DE ACCESO	0,70	0,25	0,70	3	0,37
Σ ACTA 4						70,40
	PASAN				UND	90,78
	TOTAL				**M3**	**90,78**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-

Mes: 11

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.04	M3	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPa - (3000 PSI)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO PEDESTALES	0,70	0,30	0,70	100,00	14,70
ACTA 1	ZAPATAS COLUMNAS PORTONES	1,00	0,30	1,00	4,00	1,20
Σ ACTA 1						15,90
ACTA 2	ZAPATAS PORTONES	1,00	0,30	1,00	2,00	0,60
ACTA 2	ZAPATAS PEDESTALES	0,70	0,35	0,70	56,00	9,60
ACTA 2	ZAPATAS CAFETERIA	1,00	0,30	1,00	6,00	1,80
Σ ACTA 2						12,00
ACTA 4	CORRECCIÓN DEL ACTA 2 (ZAPATAS PEDESTALES)	0,70	1,00	0,70	-4,00	-1,96
ACTA 4	ZAPATAS COLUMNAS MURO PLAZOLETA DE ACCESO	0,70	0,30	0,70	3,00	0,44
Σ ACTA 4						-1,52
				PASAN	UND	26,38
	TOTAL				M3	26,38

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO AVANCE DE OBRA	1	15/11/2024	5 de 34

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:** 11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.05	M3	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA








FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO	300,00	0,25	0,25		18,75
Σ ACTA 1						18,75
ACTA 2	VIGA PORTON VEHICULAR Y PEATONAL	7,50	0,25	0,25		0,47
ACTA 2	VIGA CERRAMIENTO	120,00	0,25	0,25		7,50
ACTA 2	VIGAS DE CIMENTACION CAFETERIA	26,40	0,25	0,25		1,65
Σ ACTA 2						9,62
ACTA 4	CORRECCIÓN DEL ACTA 2 (VIGA PORTON VEHICULAR Y PEATONAL)	-0,40	0,25	0,25		-0,03
ACTA 4	CORRECCIÓN DEL ACTA 2 (VIGA CERRAMIENTO)	-23,99	0,25	0,25		-1,50
ACTA 4	VIGAS DE CIMENTACION CAFETERIA	8,73	0,25	0,25		0,55
Σ ACTA 4						-0,98
				PASAN	UND	27,39
	TOTAL				M3	27,39

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO	1	15/11/2024	6 de 34
	AVANCE DE OBRA			

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:** 11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.06	M3	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROS FORMALETA METALICA	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	COLUMNAS PORTONES	0,25	2,40	0,25	4	0,60
ACTA 1	COLUMNAS PEDESTALES	0,25	0,70	0,25	11	0,48
Σ ACTA 1						1,08
ACTA 2	COLUMNAS EN CONCRETO PARA PEDESTALES CERRAMIENTO TOTAL	0,25	0,70	0,25	139	6,08
ACTA 2	COLUMNAS EN CONCRETO PARA PUERTAS	0,25	2,40	0,25	2	0,30
ACTA 2	COLUMNAS EN CONCRETO ZONA MEDIDOR GAS Y MURO PLAZOLETA DE ACCESO	0,25	1,40	0,25	4	0,33
ACTA 2	COLUMNAS CAFETERIA	0,25	2,40	0,25	4	0,60
Σ ACTA 2						7,31
ACTA 4	COLUMNAS EN CONCRETO PARA PEDESTALES CERRAMIENTO TOTAL	0,25	0,70	0,25	2	0,09
ACTA 4	COLUMNAS EN CONCRETO ZONA MEDIDOR GAS Y MURO PLAZOLETA DE ACCESO	0,25	1,40	0,25	2	0,20
ACTA 4	COLUMNAS CAFETERIA	0,25	2,40	0,25	2	0,30
Σ ACTA 4						0,59
				PASAN	UND	8,98
	TOTAL				**M3**	**8,98**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.07	M2	MURO SEMIPRENSADO TIPO MAGUNCIA E=0.12 mts.	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	CERRAMIENTO	2,25	0,60		70	94,50
Σ ACTA 1						94,50
ACTA 2	MUROS CERRAMIENTO	256,00	0,60			153,60
Σ ACTA 2						153,60
ACTA 4	CORRECCIÓN ACTA 2 (MUROS CERRAMIENTO)	-70,14	0,60			-42,08
ACTA 4	MUROS CAFETERIA	6,10	2,20			13,42
ACTA 4	MUROS CAFETERIA	5,16	1,00			5,16
ACTA 4	MUROS GRADERIAS CANCHA DEPORTIVA (1)	18,00	0,35		1	6,30
ACTA 4	MUROS GRADERIAS CANCHA DEPORTIVA (2 Y 3)	18,00	0,40		2	14,40
ACTA 4	MUROS MATERA	1,23	0,85			1,05
ACTA 4	MUROS MATERA	2,16	0,55			1,19
ACTA 4	MUROS MATERA	1,12	0,50			0,56
ACTA 4	MUROS MATERA	1,07	0,25			0,27
ACTA 4	MURO ENTRADA COSTADO MATERAS	1,52	0,62			0,94
Σ ACTA 4						1,21
				PASAN	UND	249,31
	TOTAL				**M2**	**249,31**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.08	M3	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 MPa - (3000 PSI)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADERO	2,25	0,10	0,12	5	0,14
Σ ACTA 1						0,14
ACTA 2	CERRAMIENTO TOTAL SOBRE MUROS	348,00	0,10	0,12	1	4,18
ACTA2	VIGA SOBRE MURO CAFETERIA	17,00	0,20	0,20	1	0,68
Σ ACTA 2						4,86
ACTA 4	CORRECCIÓN ACTA 2 (CERRAMIENTO TOTAL SOBRE MUROS)	-17,00	0,10	0,12		-0,20
ACTA 4	CORRECCIÓN VIGA SOBRE MURO CAFETERIA	-17,00	0,20	0,20		-0,68
ACTA 4	VIGA SOBRE MATERAS	5,60	0,20	0,12		0,13
Σ ACTA 4						-0,75
				PASAN	UND	4,25
	TOTAL				M3	4,25

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.09	KG	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA






FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES				No. ELEM.	TOTAL
		Diametro	Cantidad Varilla	Longitud	Kg/ml		
ACTA 1	ZAPATA 1 - 2 CERRAMIENTO VIA	1/2"	12,00	1,00	0,994	2	23,86
ACTA 1	COLUMNAS DE ACCESO CERRAMIENTO VIA	1/2"	6,00	2,90	0,994	2	34,59
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO VIA Y MURO	1/2"	8,00	0,75	0,994	8	47,71
ACTA 1	COLUMNAS PORTON DE ACCESO - MURO	1/2"	6,00	1,50	0,994	8	71,57
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO VIA	1/2"	4,00	2,60	0,994	5	51,69
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO INICIAL	1/2"	4,00	3,60	0,994	1	14,31
ACTA 1	VIGA PERIMETRAL PLAZOLETA	1/2"	4,00	26,10	0,994		103,77
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO INICIAL	1/2"	4,00	2,60	0,994	3	31,01
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO VIA	1/2"	6,00	1,50	0,994	2	17,89
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO VIA	1/2"	8,00	0,75	0,994	2	11,93
ACTA 1	ZAPATAS PORTON PEATONAL	1/2"	12,00	1,00	0,994	2	23,86
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO ACCESO	1/2"	8,00	0,75	0,994	2	11,93
ACTA 1	ZAPATAS PORTON VEHICULAR	1/2"	12,00	1,00	0,994	2	23,86
ACTA 1	VIGA PORTON VEHICULAR	1/2"	6,00	4,50	0,994		27,00
ACTA 1	COLUMNA PORTON VEHICULAR	1/2"	6,00	3,00	0,994	2	35,78
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO ACCESO LATERAL	1/2"	6,00	1,50	0,994	2	17,89
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO ACCESO LATERAL	1/2"	4,00	2,00	0,994		7,95
ACTA 1	ACERO VIGAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEO	1/2"	4,00	4,50	0,994		17,89
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADERO	1/2"	4,00	2,50	0,994	7	69,58
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEO	1/2"	8,00	0,75	0,994	7	41,75
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADERO	1/2"	6,00	1,50	0,994	7	62,62
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEO	1/2"	4,00	2,50	0,994	4	39,76
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEO	1/2"	8,00	0,75	0,994	7	41,75
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADERO	1/2"	6,00	1,50	0,994	7	62,62
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEO	1/2"	8,00	0,75	0,994	10	59,64
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEO	1/2"	4,00	2,50	0,994	4	39,76
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADERO	1/2"	6,00	1,50	0,994	10	89,46
ACTA 1	ACERO VIGAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEO	1/2"	4,00	2,50	0,994	3	29,82
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO VIA	1/2"	6,00	1,50	0,994	6	53,68
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO VIA	1/2"	8,00	0,75	0,994	12	71,57
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO VIA	1/2"	4,00	2,50	0,994	6	59,64
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADEROS	1/2"	4,00	2,50	0,994	6	59,64
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADEROS	1/2"	4,00	2,50	0,994	7	69,58
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEOS	1/2"	6,00	1,50	0,994	1	8,95
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO VIA	1/2"	4,00	2,50	0,994	3	29,82
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO VIA	1/2"	6,00	1,50	0,994	8	71,57
ACTA 1	CERRAMIENTO VIA - COLUMNAS (4V)	1/2"	6,00	1,50	0,994	3	26,84
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO VIA	1/2"	4,00	2,50	0,994	8	79,52
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO VIA	1/2"	8,00	0,75	0,994	7	41,75
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO VIA	1/2"	6,00	1,50	0,994	2	17,89
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1/2"	8,00	0,75	0,994	3	17,89
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1/2"	6,00	1,50	0,994	3	26,84
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1/2"	8,00	0,75	0,994	7	41,75
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1/2"	6,00	1,50	0,994	7	62,62
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1/2"	8,00	0,75	0,994	3	17,89

ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1/2"	6,00	1,50	0,994	3	26,84
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS	1/2"	8,00	0,75	0,994	3	17,89
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO POSTERIOR	1/2"	6,00	1,50	0,994	3	26,84
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADEROS	1/2"	4,00	2,50	0,994	3	29,82
ACTA 1	ZAPATAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEO	1/2"	8,00	0,75	0,994	8	47,71
ACTA 1	VIGA SOBRE MURO LATERLA PARQUEADERO	1/2"	2,00	2,50	0,994	2	9,94
ACTA 1	VIGA SOBRE MURO LATERLA PARQUEADERO	1/2"	2,00	2,50	0,994	3	14,91
ACTA 1	COLUMNAS ACCESO FLEJES - PORTON	3/8"		0,81	0,56	10	4,54
ACTA 1	FLEJES COLUMNAS ACCESO - PORTON	3/8"		0,81	0,56	10	4,54
ACTA 1	FLEJES COLUMNAS CERRAMIENTO (8 COL - 11 COL)	3/8"		0,81	0,56	80	36,29
ACTA 1	FLEJES VIGA CERRAMIENTO (C.15)	3/8"		0,81	0,56	96	43,55
ACTA 1	FLEJES VIGA PERIMETRAL PLAZOLETA	3/8"		0,81	0,56	146	66,23
ACTA 1	FLEJES VIGA CERRAMIENTO VÍA	3/8"		0,81	0,56	50	22,68
ACTA 1	COLUMNA CERRAMIENTO VÍA (2) (11X COL)	1/2"		0,81	1,00	22	17,82
ACTA 1	VIGA PORTÓN VEHICULAR (C.15)	1/2"		0,81	1,00	30	24,30
ACTA 1	COLUMNA PORTÓN VEHICULAR (C.08)	1/2"		0,81	1,00	60	48,60
ACTA 1	COLUMNA PORTÓN PEATONAL (C.08)	1/2"		0,81	1,00	60	48,60
ACTA 1	COLUMNA ACCESO LATERAL (11 FL)	1/2"		0,81	1,00	22	17,82
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO ACCESO LATERAL (C.15)	1/2"		0,81	1,00	12	9,72
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PORTERÍA (C.15)	1/2"		0,81	1,00	30	24,30
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEOS (C.15)	1/2"		0,81	1,00	117	94,77
ACTA 1	COLUMNA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEOS (C.08)	1/2"		0,81	1,00	77	62,37
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADERO (C.15)	1/2"		0,81	1,00	68	55,08
ACTA 1	COLUMNAS LATERAL CERRAMIENTO PARQUEADERO (C.08)	1/2"		0,81	1,00	77	62,37
ACTA 1	VIGAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEOS (C.15)	1/2"		0,81	1,00	68	55,08
ACTA 1	COLUMNAS LATERAL PARQUEO (C.08)	1/2"		0,81	1,00	110	89,10
ACTA 1	VIGAS CERRAMIENTO (C.05)	1/2"		0,81	1,00	51	41,31
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO (C.08)	1/2"		0,81	1,00	66	53,46
ACTA 1	VIGAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEOS (C.15)	1/2"		0,81	1,00	100	81,00
ACTA 1	VIGAS CERRAMIENTO LATERAL PARQUEOS (C.15)	1/2"		0,81	1,00	120	97,20
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO (C.08)	1/2"		0,81	1,00	11	8,91
ACTA 1	FLEJES VIGAS LATERAL PARQUEOS (C.15)	3/8"		0,81	0,56	117	53,07
ACTA 1	FLEJES VIGAS CERRAMIENTO VIA (C.15)	3/8"		0,81	0,56	50	22,68
ACTA 1	FLEJES COLUMNA CERRAMIENTO VIA (C.08)	3/8"		0,81	0,56	88	39,92
ACTA 1	FLEJES COLUMNAS CERRAMIENTO VIA (C.08)	3/8"		0,81	0,56	33	14,97
ACTA 1	FLEJES VIGAS CERRAMIENTO VIA (C.15)	3/8"		0,81	0,56	136	61,69
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO VIA (C.08)	1/2"		0,81	1,00	30	24,30
ACTA 1	FLEJES FALTANTES A TODAS LAS COLUMNAS (C.08)	3/8"		0,81	0,56	256	116,12
ACTA 1	FLEJES COLUMNAS CERRAMIENTO DIAGONAL (C.08)	3/8"		0,81	0,56	45	20,41
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS (C.08)	1/2"		0,81	1,00	105	85,05
ACTA 1	COLUMNAS CERRAMIENTO DIAGONAL PARQUEOS (C.08)	1/2"		0,81	1,00	45	36,45
ACTA 1	VIGA CERRAMIENTO LATERAL PARQUEADERO (C.08)	1/2"		0,81	1,00	45	36,45
ACTA 1	VIGA SOBRE MURO LATERLA PARQUEADERO (C.15)	1/2"		0,81	1,00	51	41,31
ACTA 1	VIGA SOBRE MURO LATERLA PARQUEADERO (C.25)	1/2"		0,19	1,00	30	5,70
ACTA 1	VIGA SOBRE MURO LATERLA PARQUEADERO (C.25)	1/2"		0,19	1,00	45	8,55
Σ ACTA 1							3678,95

ACTA 2	VIGA CERRAMIENTO TOTAL	1/2"	4,00	204,00	0,99	1	811,10
ACTA 2	VIGA PORTON VEHICULAR	1/2"	6,00	4,50	0,99		26,84
ACTA 2	VIGA SOBRE MURO TOTAL	1/2"	2,00	360,00	0,99		715,68
ACTA 2	FLEJES COLUMNAS PORTONES (30 FLEJES C/U)	3/8"		0,81	0,56	180	81,65
ACTA 2	FLEJES COLUMNAS CERRAMIENTO (15 FLEJES C/U)	3/8"		0,81	0,56	2250	1020,60
ACTA 2	FLEJES VIGA CERRAMIENTO (C.15)	3/8"		0,81	0,56	2635	1195,24
ACTA 2	FLEJES VIGA PERIMETRAL PLAZOLETA	3/8"		0,81	0,56	146	66,23
ACTA 2	FLEJES COLUMNAS CERRAMIENTO GAS Y ESQUINA ACC 1,25H (20FL C/U)	3/8"		0,81	0,56	60	27,22

ACTA 2	FLEJES COLUMNAS CERRAMIENTO MURO PLAZOLETA 1,60H (25FL C/U)	3/8"		0,81	0,56	9	4,08
Σ ACTA 2							3948,64
ACTA 4	CORRECCION ACTA 1 (ZAPATAS CERRAMIENTO TOTAL)	1/2"	8,00	0,90	0,994	-2	-14,32
ACTA 4	COLUMNAS CERRAMIENTO 0,60H	1/2"	6,00	1,50	0,994	4	35,78
ACTA 4	COLUMNAS CERRAMIENTO GAS Y ESQUINA ACC 1,25H	1/2"	6,00	2,20	0,994	3	39,36
ACTA 4	COLUMNAS CERRAMIENTO MURO PLAZOLETA 1,60H	1/2"	6,00	2,35	0,994	3	42,05
ACTA 4	VIGA CERRAMIENTO TOTAL + TRANSLAPOR Y GANCHOS	1/2"	4,00	16,52	0,994	1	65,69
ACTA 4	VIGA PORTON VEHICULAR	1/2"	6,00	0,40	0,994		2,38
ACTA 4	CORRECCION ACTA 2 (VIGA SOBRE MURO TOTAL + GANCHOS (DESPERDICIOS))	1/2"	2,00	-24,70	0,994		-49,10
ACTA 4	FLEJES COLUMNAS CERRAMIENTO (15 FLEJES C/U)	3/8"		0,81	0,56	30	13,61
ACTA 4	CORRECCION ACTA 2 (FLEJES VIGA CERRAMIENTO (C.15))	3/8"		0,81	0,56	-68,27	-30,97
ACTA 4	FLEJES VIGA PERIMETRAL PLAZOLETA (C.15)	3/8"		0,81	0,56	28	12,70
ACTA 4	FLEJES COLUMNAS CERRAMIENTO MURO PLAZOLETA 1,60H (25FL C/U)	3/8"		0,81	0,56	66	29,94
ACTA 4	FLEJES VIGA SOBRE MURO TOTAL (C 0,15)	3/8"		0,19	0,56	2289	243,56
ACTA 4	ZAPATAS CAFETERIA 1/2"	1/2"	12,00	1,20	0,994	6	85,88
ACTA 4	COLUMNAS CAFETERIA 1/2"	1/2"	6,00	2,90	0,994	6	103,77
ACTA 4	VIGAS CAFETERIA 1/2"	1/2"	4,00	35,13	0,994	1	139,68
ACTA 4	BORDILLOS CAFETERIA 1/2"	1/2"	2,00	4,68	0,994	1	9,30
ACTA 4	FLEJES COLUMNAS CAFETERIA	3/8"		0,81	0,56	180	81,65
ACTA 4	FLEJES VIGAS CAFETERIA	3/8"		0,81	0,56	234,2	106,23
ACTA 4	FLEJES BORDILLOS CAFETERIA	3/8"		0,41	0,56	170	39,03
Σ ACTA 4							956,22
					PASAN	UND	8583,81
	TOTAL					**KG**	**8583,81**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.11	U	MODULO CERRAMIENTO 2,50MX1,30M EN PERFIL METÁLICO SEGÚN DISEÑO	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Cantidad	Longitud	Kg/ml		
ACTA 2	CERRAMIENTO TOTAL	2,50	1,30		146	146,00
	Σ ACTA 2					146,00
ACTA 3	CERRAMIENTO TOTAL	10			10,00	10
	Σ ACTA 3					10,00
ACTA 4	CORRECCION ACTA 3 (CERRAMIENTO TOTAL)				-1	-1,00
	Σ ACTA 4					-1
				PASAN	UND	155,00
	TOTAL				U	155,00

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
1.12	U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL (3 MTS)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto			
ACTA 2	ACCESO PRINCIPAL				1	1,00
Σ ACTA 2						1,00
ACTA 4	ACCESO PAE 1,5 MTS				1	1,00
ACTA 4	ACCESO POSTERIOR				1	1,00
Σ ACTA 4						2,00
				PASAN	UND	3,00
	TOTAL				U	3,00

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN
1.13	U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR (4 MTS)	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Cantidad	Longitud	Kg/ml		
ACTA 2	ACCESO PRINCIPAL				1	1,00
Σ ACTA 2						1,00
				PASAN	UND	1,00
	TOTAL				U	1,00

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor


Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
2.01	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	EXCAVACIÓN CUNETA LATERAL Y POSTERIOR BLOQUE A	17,80	0,35	0,70		4,36
ACTA 1	EXCAVACIÓN CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	92,14	0,35	0,70		22,57
ACTA 1	ANDEN LATERAL CON SARDINEL	24,00	0,20	2,00		9,60
ACTA 1	ANDEN LATERAL CON SARDINEL	23,00	0,20	2,00		9,20
ACTA 1	CUNETA FRONTAL BLOQUE A	36,30	0,60	0,70		15,25
ACTA 1	CUNETA FRONTAL BLOQUE A	17,00	0,60	0,70		7,14
ACTA 1	EXCAVACIÓN ANDEN LATERAL BLOQUE B	16,70	0,30	0,70		3,51
ACTA 1	CUNETA BLOQUE B	15,80	0,30	0,70		3,32
ACTA 1	EXCAVACIÓN ANDEN LATERAL	13,70	0,30	1,80		7,40
ACTA 1	CUNETA ESCALERA BLOQUE B	5,70	0,30	0,70		1,20
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR PREESCOLAR	16,70	0,25	0,70		2,92
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR EDIFICIO MÚLTIPLE	29,00	0,30	1,10		9,57
ACTA 1	CUNETA LATERAL PREESCOLAR	9,50	0,30	0,70		2,00
ACTA 1	ANDEN FRENTE AULA MÚLTIPLE	6,40	0,50	1,80		5,76
ACTA 1	RAMPA ACCESO LATERAL CASETA	15,10	0,30	1,80		8,15
ACTA 1	ANDEN LATERA	24,00	0,20	1,80		8,64
ACTA 1	ANDEN LATERA	14,60	0,20	1,80		5,26
ACTA 1	EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE 4”	30,00	0,50	0,20		3,00
ACTA 1	ANDEN LATERAL	7,50	0,20	1,80		2,70
ACTA 1	EXCAVACIÓN ESCALERA 1 BLOQUE A	5,00	0,30	1,80		2,70
ACTA 1	ANDEN LATERAL SALÓN SISTEMAS	10,30	0,15	2,00		3,09
ACTA 1	ESCALERA 2 FRENTE BLOQUE 2	2,88	0,20	1,80		1,04
ACTA 1	RAMPA LATERAL CANCHA DEPORTIVA	8,00	0,30	2,00		4,80
ACTA 1	RAMPA LATERAL CANCHA DEPORTIVA	4,50	0,20	2,00		1,80
ACTA 1	EXCAVACIÓN BORDILLO ANDEN LATERAL	16,60	0,23	0,20		0,76
ACTA 1	CONEXIÓN TUBO DESAGÜE	2,40	0,20	0,20		0,10
ACTA 1	BORDILLO ANDENES	30,00	0,25	0,20		1,50
ACTA 1	BORDILLO ANDENES	15,00	0,25	0,20		0,75
ACTA 1	EXCAVACIÓN BORDILLO ANDEN	30,45	0,25	0,20		1,52
ACTA 1	CUNETA LATERAL AGROINDUSTRIA	13,00	0,25	0,70		2,28
ACTA 1	EXCAVACIÓN ANDEN CANCHA	6,40	0,20	1,80		2,30
Σ ACTA 1						154,19
ACTA 2	EXCAVACION ANDENES TOTAL	20,01	0,35	2,00		14,01
ACTA 2	EXCAVACIÓN BORDILLO ANDENES	140,20	0,25	0,20		7,01
ACTA 2	EXCAVACION RAMPA ACCESO LATERAL CASETA	15,10	0,35	1,80		9,51

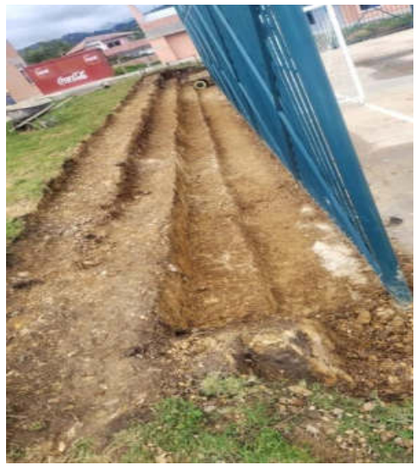

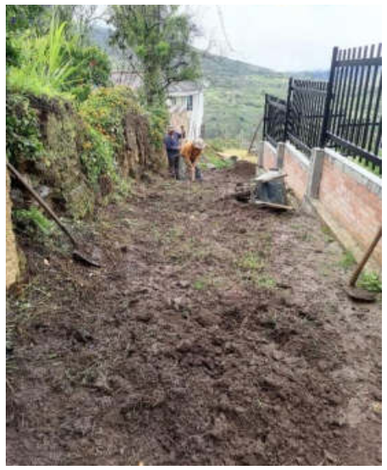



ACTA 2	RAMPA LATERAL CANCHA DEPORTIVA	12,50	0,35	2,00		8,75
ACTA 2	EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE 4”	32,40	0,50	0,20		3,24
ACTA 2	EXCAVACIÓN ESCALERAS (2) FRENTE BLOQUE A	7,88	0,35	1,80		4,96
ACTA 2	EXCAVACION PRADIZACION Y NIVELACION DE TERRENO	767,69	0,10	1,00		76,77
ACTA 2	EXCAVACION ANDENES PROPUESTOS: PORTERIA LAT Y POST,	12,20	0,30	1,80		6,59
ACTA 2	EXCAVACION RAMPAS PROPUESTAS AGROINDUSTRIA Y PAE	10,70	0,30	1,80		5,78
ACTA 2	EXCAVACION GRADERIAS ATRÁS DE LA MALLA C. I	18,00	0,45	0,50	4	16,20
ACTA 2	EXCAVACION AREA PARQUE INFANTIL	11,67	0,30	8,07		28,25
ACTA 2	EXCAVACION RAMPA ACCESO LATERAL PAE	17,00	0,50	2,50		21,25
ACTA 2	EXCAVACION BORDILLO RAMPA LATERAL PAE	22,00	0,20	0,20		0,88
ACTA 2	EXCAVACIÓN RAMPA DE ACCESO A LA INSTITUCION	14,00	0,35	5,20		25,48
ACTA 2	EXCAVACION BORDILLO RAMPA DE ACCESO A LA INSTITUCION	24,40	0,25	0,20		1,22
ACTA 2	EXCAVACION BORDILLO RAMPA DE ACCESO AL ANDEN LATERAL	14,50	0,20	0,20		0,58
Σ ACTA 2						230,48
ACTA 4	EXCAVACION PRADIZACION Y NIVELACION DE TERRENO	1,21	0,10	1,00		0,12
ACTA 4	EXCAVACION TUBO AGUA POTABLE	18,60	0,20	0,20		0,74
ACTA 4	EXCAVACIÓN PARA DESAGÜE 4” INSTALACION TUBERIA DESAGUE CAFETERIA	17,30	0,80	0,30		4,15
Σ ACTA 4						5,01
				PASAN	UND	389,68
	TOTAL				**M3**	**389,68**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
2.02	M3	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	CUNETAS POSTERIOR LATERAL BLOQUE A	36,09	0,32	0,70		8,08
ACTA 1	CUNETAS POSTERIOR BLOQUE A	73,85	0,25	0,70		12,92
ACTA 1	CUNETAS POSTERIOR BLOQUE A	30,00	0,20	0,70		4,20
ACTA 1	CUNETAS FRENTE BLOQUE A	48,26	0,15	0,70		5,07
ACTA 1	ESCALERA 1 FRENTE BLOQUE A	5,00	0,15	1,80		1,35
ACTA 1	ANDEN LATERAL	36,00	0,10	2,00		7,20
ACTA 1	ANDEN LATERAL SISTEMAS	1,80	0,22	14,30		5,66
ACTA 1	ESCALERA 2 FRENTE BLOQUE A	2,82	0,10	1,80		0,51
ACTA 1	CUNETA LATERAL BLOQUE B (ESCALERA)	15,70	0,15	0,60		1,41
ACTA 1	CUNETAS POSTERIOR BLOQUE B (BAÑO)	16,70	0,15	0,60		1,50
ACTA 1	CUNETAS LATERAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	8,10	0,10	0,60		0,49
ACTA 1	ANDEN RAMPA LATERAL BIBLIOTECA	15,80	0,60	2,00		18,96
ACTA 1	CUNETAS LATERAL Y POSTERIOR PREESCOLAR	26,90	0,15	0,70		2,82
ACTA 1	CUNETAS POSTERIOR ESCALERA BLOQUE B	9,10	0,15	0,70		0,96
ACTA 1	ANDEN LATERAL	16,00	0,20	1,80		5,76
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR AULA MÚLTIPLE	30,45	0,20	1,00		6,09
ACTA 1	ANDEN LATERAL FINAL	9,80	0,20	1,80		3,53
ACTA 1	CUNETA LATERAL AGROINDUSTRIA	13,00	0,15	0,70		1,37
ACTA 1	ANDEN ACCESO CASETA	15,10	0,20	2,00		6,04
ACTA 1	ANDEN LATERAL CASETA	4,70	0,40	1,00		1,88
ACTA 1	ANDEN FRENTE AULA MÚLTIPLE	6,40	0,20	1,80		2,30
ACTA 1	ANDEN FRENTE AULA MÚLTIPLE	19,60	0,20	2,00		7,84
ACTA 1	BASE COMPACTADO PLAZOLETA	5,60	0,75	4,30		18,06
ACTA 1	BASE COMPACTADO RAMPA ACCESO	11,00	0,40	2,00		8,80
ACTA 1	BASE COMPACTADO RAMPA ACCESO VIA	1,50	0,30	3,00		1,35
Σ ACTA 1						134,15
ACTA 2	BASE COMPACTADO ANDENES PROPUESTOS	**10,90**	0,15	1,50		2,45
ACTA 2	BASE COMPACTADO RAMPAS PROPUESTAS	10,70	0,15	1,80		2,89
ACTA 2	BASE COMPACTADO CAFETERIA PROPUESTA	8,70	0,15	4,50		5,87
ACTA 2	RAMPA ACCESO PRINCIPAL (VIA)	14,00	0,25	5,20		18,20
ACTA 2	BASE COMPACTADO RAMPA LATERAL ACCESO PAE	17,00	0,25	2,50		10,63
ACTA 2	BASE COMPACTADO GRADAERIAS CANCHA DEPORTIVA	18,00	0,20	0,60	**3**	6,48
Σ ACTA 2						46,52
ACTA 4	BASE COMPACTADO GRADAERIAS CANCHA DEPORTIVA	18,00	0,20	0,60	**1**	2,16
ACTA 4	BASE COMPACTADO CAFETERIA PROPUESTA	1,03	0,15	5,10		0,79
Σ ACTA 4						2,95
	PASAN				UND	183,62
	TOTAL				**M3**	**183,62**


Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
2.03	KG	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



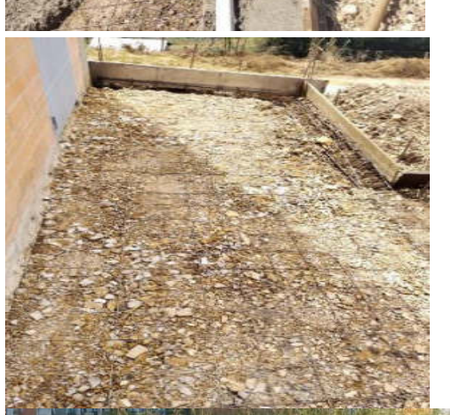



FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Ancho	Longitud	kg*m2		
ACTA 1	ANDEN LATERAL SISTEMAS	10,3	1,80	2,08		38,56
ACTA 1	ANDEN LATERAL SISTEMAS	4	1,80	2,08		14,98
ACTA 1	ANDEN LATERAL PREESCOLAR	11,3	1,80	2,08		42,31
ACTA 1	ANDEN LATERAL	11,1	1,80	2,08		41,56
ACTA 1	ANDEN LATERAL	8,4	2,00	2,08		34,94
ACTA 1	ANDEN LATERAL FINAL	14,5	1,80	2,08		54,29
ACTA 1	ANDEN LATERAL	14,4	2,05	2,08		61,40
ACTA 1	ANDEN INICIAL	19,3	2,00	2,08		80,29
ACTA 1	RAMPA DE ACCESO CASETA	15,1	2,00	2,08		62,82
ACTA 1	RAMPA DE LATERAL CANCHA	2	19,60	2,08		81,54
Σ ACTA 1						512,69
ACTA 2	ANDEN LATERAL	4,51	2,00	2,08		18,77
Σ ACTA 2						18,77
ACTA 4	ANDEN LATERAL	27,68	2,00	2,08		115,16
ACTA 4	CASETA CAFETERIA	3,90	4,05	2,08		32,85
ACTA 4	PLAZOLETA CAFETERIA	8,70	4,50	2,08		81,43
ACTA 4	RAMPAS PROPUESTAS	10,70	1,80	2,08		40,06
ACTA 4	MALLA GRADERIAS CANCHA DEPORTIVA	0,60	18,00	2,08	4	89,86
ACTA 4	MALLA ELECTROSOLDADA RAMPA LATERAL PAE	2,50	17,00	2,08		88,40
Σ ACTA 4						447,76
				PASAN	UND	979,22
	TOTAL				**KG**	**979,22**


Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
2.04	M2	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



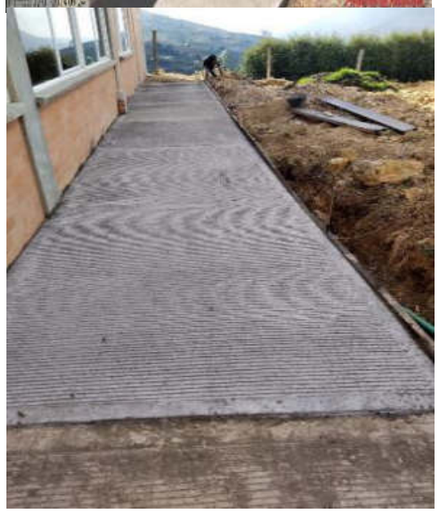


FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	ANDEN LATERAL SISTEMAS	10,3		1,8		18,54
ACTA 1	ANDEN LATERAL SISTEMAS	4		1,8		7,20
ACTA 1	ANDEN LATERAL PREESCOLAR	11,3		1,8		20,34
ACTA 1	ANDEN LATERAL	11,1		1,8		19,98
ACTA 1	ANDEN LATERAL	8,4		2		16,80
ACTA 1	ANDEN LATERAL FINAL	9,8		1,8		17,64
ACTA 1	ANDEN LATERAL	14,4		2,05		29,52
ACTA 1	ANDEN LATERAL INICIAL	15		2		30,00
ACTA 1	ANDEN LATERAL INICIAL	5,15		2		10,30
Σ ACTA 1						170,32
ACTA 2	PLAZOLETA DE ACCESO	6		5		29,21
ACTA 2	ANDEN LATERAL	1		1,92		1,92
Σ ACTA 2						31,13
ACTA 4	ANDEN LATERLA CANCHA DEPORTIVA	0,68		1,8		1,22
ACTA 4	ANDEN LATERAL	4,215		1,92		8,09
ACTA 4	CORRECCION ACTA 2 (PLAZOLETA DE ACCESO)	-5,842		5		-29,21
Σ ACTA 4						-19,90
				PASAN	UND	181,55
	TOTAL				**M2**	**181,55**


Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
2.06	KG	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



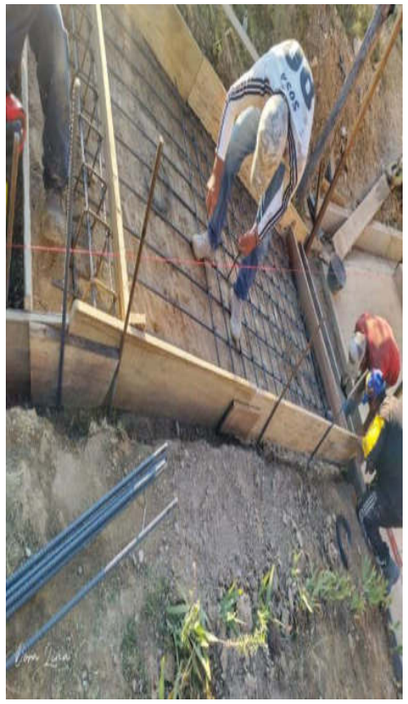







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Ø	kg/ml		
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	25,00	1/2"	0,994	4	99,40
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	25,00	1/2"	0,994	4	99,40
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	24,00	1/2"	0,994	4	95,42
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	28,00	1/2"	0,994	3	83,50
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	24,00	1/2"	0,994	4	95,42
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	20,00	1/2"	0,994	4	79,52
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	25,00	1/2"	0,994	4	99,40
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	7,00	1/2"	0,994	8	55,66
ACTA 1	ESCALERA 1 VIGAS (2) ANDEN LATERAL	18,00	1/2"	0,994		17,89
ACTA 1	ACERO ESCALERA 1	7,74	1/2"	0,994	10	76,94
ACTA 1	ACERO VIGA (2) ESCALERA 2	18,00	1/2"	0,994		17,89
ACTA 1	ACERO ESCALERA 2	5,04	1/2"	0,994	10	50,10
ACTA 1	ANDEN LATERAL ACERO BORDILLO (2V)	6,00	1/2"	0,994	2	11,93
ACTA 1	BORDILLO ANDENES (2V)	6,00	1/2"	0,994	12	71,57
ACTA 1	ACERO CUNETAS	18,00	1/2"	0,994	4	71,57
ACTA 1	ACERO CUNETAS	18,00	1/2"	0,994	3	53,68
ACTA 1	ACERO BORDILLO ANDENES	18,00	1/2"	0,994	2	35,78
ACTA 1	ACERO CUNETAS AULA MÚLTIPLE (3,87 TRANSLAPO)	42,57	1/2"	0,994	2	84,63
ACTA 1	ACERO CUNETAS AGROINDUSTRIA	28,00	1/2"	0,994		27,83
ACTA 1	ACERO BORDILLO ANDENES	42,00	1/2"	0,994	2	83,50
ACTA 1	ACERO BORDILLO RAMPA LATERAL CANCHA DEPORTIVA (2V) +3,87 translapo	42,57	1/2"	0,994	2	84,63
ACTA 1	ACERO BORDILLO ANDEN CANCHA	12,80	1/2"	0,994	2	25,45
ACTA 1	ACERO BORDILLO RAMPA ACCESO (1,10 TRANSLAPO)	23,87	1/2"	0,994	2	47,45
Σ ACTA 1						1468,56
ACTA 2	(0,56 KG/ML) CUNETA POSTERIOR BLOQUE A (FLEJES)	0,94	3/8"	0,56	74	38,95
Σ ACTA 2						38,95
ACTA 4	ACERO CUNETAS AULA MÚLTIPLE (3,87 TRANSLAPO)	24,58	1/2"	0,994	1	24,43
ACTA 4	(0,56 KG/ML) CUNETA POSTERIOR BLOQUE A (FLEJES)	0,94	3/8"	0,56	170	89,49
ACTA 4	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	0,94	3/8"	0,56	183	96,33
ACTA 4	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	0,94	3/8"	0,56	176	92,65
ACTA 4	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	0,94	3/8"	0,56	165	86,86
ACTA 4	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	0,94	3/8"	0,56	167	87,91
ACTA 4	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	0,94	3/8"	0,56	148	77,91
ACTA 4	FLEJES ESQUINA CUNETAS	1,07	3/8"	0,56	8	4,79





ACTA 4	FLEJES CUNETA	0,94	3/8"	0,56	180	94,75
ACTA 4	FLEJES CUNETA	0,94	3/8"	0,56	111	58,43
ACTA 4	FLEJES VIGAS 15X20 ESCALERA	0,90	3/8"	0,56	20	10,08
ACTA 4	FLEJES VIGAS 15X20 ESCALERA	0,90	3/8"	0,56	20	10,08
ACTA 4	FLEJES SARDINEL ANDEN LATERAL	0,41	3/8"	0,56	24	5,51
ACTA 4	FLEJES SARDINEL	0,41	3/8"	0,56	144	33,06
ACTA 4	CUNETAS - FLEJES	0,94	3/8"	0,56	148	77,91
ACTA 4	CUNETAS - FLEJES	0,94	3/8"	0,56	120	63,17
ACTA 4	FLEJES S. SARDINEL	0,41	3/8"	0,56	112	25,72
ACTA 4	FLEJES BORDILLO RAMPA LATERAL CANCHA DEPORTIVA	0,41	3/8"	0,56	154	35,36
ACTA 4	CANCHA DEPORTIVA BORDILLO ANDENES	0,41	3/8"	0,56	168	38,57
ACTA 4	BORDILLO ANDEN CANCHA	0,41	3/8"	0,56	52	11,94
ACTA 4	BORDILLO RAMPA ACCESO	0,41	3/8"	0,56	55	12,63
ACTA 4	FLEJES SARDINEL RAMPA ACCESO	0,41	3/8"	0,56	53	12,17
ACTA 4	ACERO PARRILLA RAMPA DE ACCESO C.20 LONGITUDINAL	14,70	1/2"	0,994	26	379,91
ACTA 4	ACERO PARRILLA RAMPA DE ACCESO C.20 TRANSVERSAL	5,20	1/2"	0,994	74	382,49
ACTA 4	ACERO PARRILLA RAMPA DE ACCESO PEATONAL C.20 LONGITUDINAL	1,30	1/2"	0,994	15	19,38
ACTA 4	ACERO PARRILLA RAMPA DE ACCESO PEATONAL C.20 TRANSVERSAL	3,20	3/8"	0,56	6	10,75
ACTA 4	ACERO BORDILLO RAMPA PAE	12,00	1/2"	0,994	2	23,86
ACTA 4	ACERO BORDILLO RAMPA AGROINDUSTRIA	6,40	1/2"	0,994	2	12,72
ACTA 4	ACERO BORDILLO RAMPA LATERAL ACCESO PAE	22,00	1/2"	0,994	2	43,74
ACTA 4	ACERO BORDILLO RAMPA ACCESO A LA INSTITUCION	24,40	1/2"	0,994	2	48,51
ACTA 4	ACERO BORDILLO ANDEN PORTERIA	5,20	1/2"	0,994	2	10,34
ACTA 4	ACERO BORDILLO RAMPA HACIA ANDEN	17,20	1/2"	0,994	2	34,19
ACTA 4	FLEJES BORDILLO RAMPA PAE	0,41	3/8"	0,56	80	18,37
ACTA 4	FLEJES BORDILLO RAMPA AGROINDUSTRIA	0,41	3/8"	0,56	43	9,87
ACTA 4	FLEJES BORDILLO RAMPA LATERAL ACCESO PAE	0,41	3/8"	0,56	147	33,75
ACTA 4	FLEJES BORDILLO RAMPA ACCESO A LA INSTITUCION	0,41	3/8"	0,56	163	37,42
ACTA 4	FLEJES BORDILLO ANDEN PORTERIA	0,41	3/8"	0,56	35	8,04
ACTA 4	ACERO PARRILLA ANDEN LATERAL PORTERIA C.20	86,70	3/8"	0,560	1	48,55
ACTA 4	ACERO PARRILLA ANDEN POSTERIOR PORTERIA C 0,20"	88,80	3/8"	0,56	1	49,73
ACTA 4	FLEJES BORDILLO RAMPA HACIA ANDEN	0,41	3/8"	0,56	60	13,78
ACTA 4	ACERO BORDILLO CAFETERIA	13,90	1/2"	0,994	2	27,63
ACTA 4	FLEJES BORDILLO CAFETERIA	0,41	3/8"	0,56	52	11,94
	Σ ACTA 4					2274,72
					PASAN UND	3782,23
	TOTAL				**KG**	**3782,23**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		


ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
2.08	M3	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







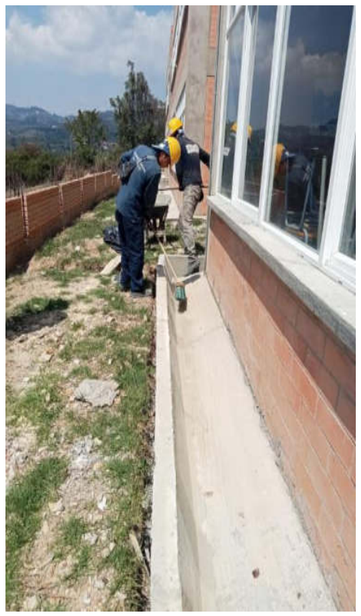

FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	10,80	0,10	0,78		0,84
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	12,00	0,12	0,78		1,12
ACTA 1	CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	22,80	0,12	0,78		2,13
ACTA 1	BASE CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	24,50	0,10	0,65		1,59
ACTA 1	BORDILLO CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	17,70	0,30	0,10		0,53
ACTA 1	BASE CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	32,26	0,10	0,60		1,94
ACTA 1	CUNETA FRENTE BLOQUE A (BASE)	16,00	0,10	0,60		0,96
ACTA 1	CUNETA LATERAL BLOQUE A (BASE)	15,10	0,10	0,60		0,91
ACTA 1	BORDILLO CUNETA FRENTE Y LATERAL BLOQUE A	64,26	0,25	0,10		1,61
ACTA 1	BASE CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	13,65	0,10	0,60		0,82
ACTA 1	BORDILLO CUNETA POSTERIOR	17,60	0,30	0,10		0,53
ACTA 1	BASE CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	2,45	0,10	0,60		0,15
ACTA 1	BASE CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	4,00	0,10	0,60		0,24
ACTA 1	BORDILLO CUNETA POSTERIOR BLOQUE A	11,15	0,30	0,10		0,33
ACTA 1	BASE CUNETA LATERAL ESCALERA BLOQUE B	15,70	0,10	0,60		0,94
ACTA 1	CUNETA BASE POSTERIOR BAÑO BLOQUE B	16,70	0,10	0,60		1,00
ACTA 1	BORDILLO CUNETA LATERAL ESCALERA BLOQUE B	15,70	0,30	0,10		0,47
ACTA 1	BASE CUNETA LATERAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	8,10	0,10	0,60		0,49
ACTA 1	BORDILLO CUNETA LATERAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	8,10	0,25	0,10		0,20
ACTA 1	BORDILLO CUNETA POSTERIOR BAÑOS BLOQQUE B	26,70	0,25	0,10		0,67
ACTA 1	BASE CUNETA PREESCOLAR	26,90	0,10	0,60		1,61
ACTA 1	BORDILLO CUNETA PREESCOLAR	26,90	0,25	0,10		0,67
ACTA 1	BASE CUNETA LATERAL ESCALERA BLOQUE B	9,10	0,10	0,60		0,55
ACTA 1	BORDILLO CUNETA LATERAL ESCALERA BLOQUE B	9,10	0,25	0,10		0,23
ACTA 1	BASE CUNETA POSTERIOR AULA MÚLTIPLE	32,65	0,15	0,60		2,94
ACTA 1	BORDILLO CUNETA POSTERIOR AULA MÚLTIPLE	32,65	0,25	0,10		0,82
ACTA 1	BASE CUNETA LATERAL AGROINDUSTRIAS	13,00	0,10	0,60		0,78
ACTA 1	BORDILLO CUNETA LATERAL AGROINDUSTRIAS	13,00	0,35	0,10		0,46
	Σ ACTA 1					25,53
ACTA 2	CUNETA AGROINDUSTRIA	5,20	0,11	0,80		0,46
	Σ ACTA 2					0,46
				PASAN	UND	25,99
	TOTAL				**M3**	**25,99**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
2.09	ML	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	ANDEN LATERAL SISTEMAS	16,6				16,60
ACTA 1	ANDEN LATERAL PREESCOLAR	11,3				11,30
ACTA 1	ANDEN LATERAL BIBLIOTECA	30,6				30,60
ACTA 1	ANDEN LATERAL FINAL	19,6				19,60
ACTA 1	ANDEN LATERAL	24,4				24,40
Σ ACTA 1						102,50
ACTA 2	ANDEN LATERAL AGROINDUSTRIA	0,16				0,16
Σ ACTA 2						0,16
ACTA 4	ANDEN LATERAL BIBLIOTECA	14				14,00
ACTA 4	ANDEN LATERAL	0,84				0,84
ACTA 4	ANDEN LATERAL AGROINDUSTRIA	34,2				34,20
ACTA 4	RAMPA CANCHA DEPORTIVA	38,7				38,70
ACTA 4	ANDEN CANCHA DEPORTIVA	12,8				12,80
ACTA 4	RAMPAS ACCESO	41,00				41,00
ACTA 4	BORDILLO RAMPA LATERAL ACCESO PAE	20,30				20,30
ACTA 4	BORDILLO RAMPA DE ACCESO A LA INSTITUCION	24,40				24,40
ACTA 4	BORDILLO ANDEN POSTERIOR A PORTERIA	6,00				6,00
ACTA 4	BORDILLO RAMPA HACIA ANDEN LATERAL	15,00				15,00
ACTA 4	BORDILLO CAFETERIA	13,20				13,20
Σ ACTA 4						220,44
				PASAN	UND	323,10
	TOTAL				**ML**	**323,10**


Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
2.10	M2	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA



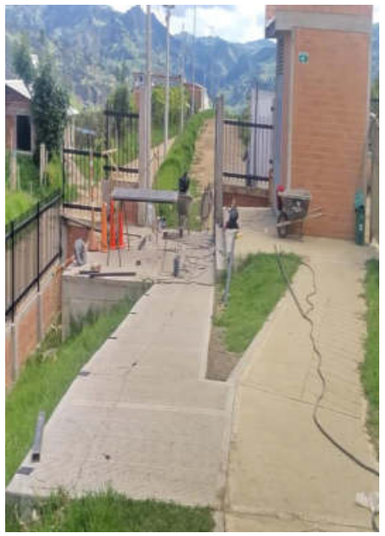



FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	ancho	alto		
ACTA 1	ACCESO AL ANDEN LATERAL + CASETA	15,1	2,00			30,20
ACTA 1	RAMPA LATERAL CANCHA DEPORTIVA	19,6	2,00			39,20
ACTA 1	RAMPA ACCESO	8,5	1,80			15,30
ACTA 1	RAMPA ACCESO	2,5	2,25			5,63
Σ ACTA 1						90,33
ACTA 2	RAMPA CONEXION ANDEN AGROINDUSTRIA	1,09	1,90			2,06
Σ ACTA 2						2,06
ACTA 3	RAMPA ACCESO	3,35	2,00			6,70
ACTA 3	PLAZOLETA ACCESO	5,00	6,00			30,00
ACTA 3	PLAZOLETA CATETERIA	4,05	3,90			15,80
ACTA 3	RAMPA ACCESO PAE	7,80	1,40			10,92
ACTA 3	RAMPA CONEXION ANDEN AGROINDUSTRIA	2,00	1,90			3,80
ACTA 3	ACCESO A LA INSTITUCION (VIA)	14,00	5,20			72,80
ACTA 3	RAMPA LATERAL ACCESO PAE	13,05	2,40			31,31
ACTA 3	LATERAL PORTERIA	4,80	1,20			5,76
ACTA 3	POSTERIOR PORTERIA	5,50	1,60			8,80
ACTA 3	PLAZOLETA CAFETERIA PROPUESTA	9,12	4,70			42,86
ACTA 3	GRADERIAS CANCHA DEPORTIVA	69,81	0,70			48,87
Σ ACTA 3						277,62
ACTA 4	CORRECION ACTA 1 (RAMPA ACCESO)	-2,50	2,25			-5,63
ACTA 4	RAMPA CONEXION ANDEN AGROINDUSTRIA	0,12	1,90			0,22
ACTA 4	ACCESO A LA INSTITUCION PEATONAL	1,4	3,00			4,20
ACTA 4	RAMPA LATERAL ACCESO PAE	2,26	2,40			5,41
ACTA 4	PLAZOLETA CAFETERIA PROPUESTA	9,12	0,40			3,65
ACTA 4	GRADERIAS CANCHA DEPORTIVA	2,19	0,70			1,53
Σ ACTA 4						9,38
				PASAN	UND	379,39
	TOTAL				**M2**	**379,39**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO	1	15/11/2024	21 de 34
	AVANCE DE OBRA			

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
2.11	M3	ESCALERA MACIZA 21 MPa - (3000 PSI) M3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
U	ESCALERA 1 FINAL ANDEN LATERAL	5,00	0,25	1,80		2,25
U	ESCALERA 2 LATERAL SISTEMAS	2,90	0,25	1,80		1,31
Σ ACTA 1						3,56
ACTA 4	ESCALERA DE ACCESO A CASETA DE ENTRADA	6,00	0,20	0,29		0,35
Σ ACTA 4						0,35
	PASAN				UND	3,91
	TOTAL				**M3**	**3,91**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-

Mes: 11

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN
2.12	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 2	RAMPAS Y ESCALERAS	81,00				81,00
Σ ACTA 2						81,00
ACTA 3	ACCESOS PRINCIPAL HASTA EL MEDIDOR DE GAS	85,22				85,22
ACTA 3	ANDEN LATERAL	59,78				59,78
ACTA 3	RAMPA CONEXIÓN ANDEN LATERAL	15,00				15,00
Σ ACTA 3						160,00
ACTA 4	ANDEN TRANSVERSAL	4,43				4,43
ACTA 4	RAMPA ASCENSOR	12,00				12,00
ACTA 4	ANDEN ASCENSOR	9,30				9,30
ACTA 4	ANDEN LATERAL	24,42				24,42
ACTA 4	ANDEN SISTEMAS	8,85				8,85
Σ ACTA 4						59
				PASAN	UND	300,00
	TOTAL				ML	300,00

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO	1	15/11/2024	23 de 34
	AVANCE DE OBRA			

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
2.13	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	POSTERIOR BLOQUE A	30,00				30,00
ACTA 1	FRENTE BLOQUE A	2,10				2,10
ACTA 1	LATERAL ESCALERA BLOQUE B	2,40				2,40
	Σ ACTA 1					34,50
ACTA 2	DESAGUES GENERAL	10,00				10,00
	Σ ACTA 2					10,00
ACTA 4	DESAGUES GENERAL	3,30				3,30
ACTA 4	ACCESO PRINCIPAL	12,00				12,00
ACTA 4	CONEXIÓN CUNETA PREESCOLAR	4,00				4,00
ACTA 4	INSTALACION TUBERIA DESAGUE CAFETERIA	17,30				17,30
	Σ ACTA 4					36,60
				PASAN	UND	81,10
	TOTAL				ML	81,10


Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-

Mes: 11

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN
2.14	U	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA

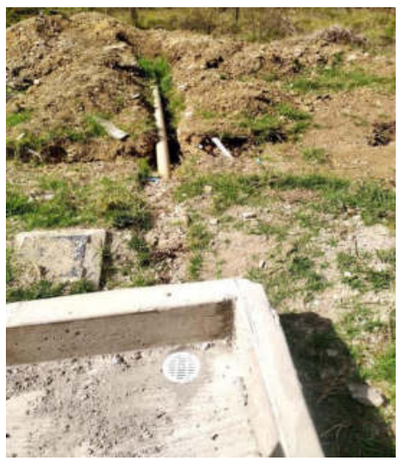

FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	POSTERIOR BLOQUE A				5	5,00
ACTA 1	FRENTE BLOQUE A				2	2,00
ACTA 1	LATERAL ESCALERA BLOQUE B				1	1,00
Σ ACTA 1						8,00
ACTA 2	ESCALERA BLOQUE B				1	1,00
ACTA 2	CUNETAS				5	5,00
ACTA 2	ANDEN PORTERIA				1	1,00
Σ ACTA 2						7,00
	PASAN				UND	15,00
	TOTAL				**U**	**15,00**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO	1	15/11/2024	25 de 34
	AVANCE DE OBRA			

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:** 11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
2.15	M2	PRADIZACIÓN(PASTO)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 4	AREA 1	15,982		7,26	116,029	116,029
ACTA 4	AREA 2	28,07		3,80	106,666	106,666
ACTA 4	AREA 3	24,03		8,46	203,294	203,294
ACTA 4	AREA 4	28,00		4,73	132,440	132,440
ACTA 4	AREA 5	8,95		7,26	64,977	64,977
ACTA 4	AREA 6	30,77		4,73	145,539	145,54
Σ ACTA 4						768,9
	PASAN				UND	768,95
	TOTAL				**M2**	**768,95**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
3.01	ML	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTRUCTURA Y MALLA CONTRAIMPACTO H=5.0 M		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	SECCIÓN 1 (LONGITUD TOTAL = 10.14 ML)	10,00				10,00
ACTA 1	SECCIÓN 2 (LONGITUD TOTAL = 11.44 ML)	10,00				10,00
ACTA 1	SECCIÓN 3 (LONGITUD TOTAL = 18.19 ML)	15,00				15,00
ACTA 1	SECCIÓN 4 (LONGITUD TOTAL = 15.07 ML)	5,00				5,00
Σ ACTA 1						40,00
ACTA 2	SECCIÓN 4 (LONGITUD TOTAL = 15.07 ML)	10,00				10,00
ACTA 2	SECCIÓN 5 (LONGITUD TOTAL = 10.24 ML)	10,00				10,00
ACTA 2	SECCIÓN 6 (LONGITUD TOTAL = 15.14 ML)	15,00				15,00
Σ ACTA 2						35,00
ACTA 4	SECCIÓN 1 (LONGITUD TOTAL = 10.14 ML)	0,14				0,14
ACTA 4	SECCIÓN 2 (LONGITUD TOTAL = 11.44 ML)	1,44				1,44
ACTA 4	SECCIÓN 3 (LONGITUD TOTAL = 18.19 ML)	3,19				3,19
ACTA 4	SECCIÓN 4 (LONGITUD TOTAL = 15.07 ML)	0,07				0,07
ACTA 4	SECCIÓN 5 (LONGITUD TOTAL = 10.24 ML)	0,24				0,24
ACTA 4	SECCIÓN 6 (LONGITUD TOTAL = 15.14 ML)	0,14				0,14
Σ ACTA 4						5,22
				PASAN	UND	80,22
	TOTAL				**ML**	**80,22**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO AVANCE DE OBRA	1	15/11/2024	27 de 34

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
3.02	ML	PILOTE D=40 CM CONCRETO 21MPa - (3000 PSI) NO INCLUYE REFUERZO (INCL. EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPO)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES Alto			No. ELEM.	TOTAL
ACTA 1	CONCRETO PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO	1,00			7	7,00
ACTA 1	CONCRETO PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO	1,00			12	12,00
ACTA 1	CONCRETO PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO	1,00			7	7,00
ACTA 1	CONCRETO PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO	1,00			4	4,00
ACTA 1	CONCRETO PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO	1,00			1	1,00
Σ ACTA 1						31,00
ACTA 4	CONCRETO PILOTES MALLA CONTRA IMPACTO SECCION 6	1,00			5	5,00
Σ ACTA 4						5,00
				PASAN	UND	36,00
	TOTAL				**ML**	**36,00**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-

Mes: 11

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
3.03	M3	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
ACTA 1	VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	15,80	0,30	0,40		1,90
ACTA 1	VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	16,80	0,30	0,40		2,02
ACTA 1	VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	10,00	0,30	0,40		1,20
ACTA 1	VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	15,00	0,30	0,40		1,80
Σ ACTA 1						6,92
ACTA 2	VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	7,30	0,30	0,40		0,88
Σ ACTA 2						0,88
ACTA 4	VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	2,70	0,30	0,40		0,32
ACTA 4	VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	14,10	0,30	0,40		1,69
Σ ACTA 4						2,01
				PASAN	UND	9,81
	TOTAL				M3	9,81

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
3.04	KG	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Diametro	Longitud	Kg/ml		
ACTA 1	VIGA AMARRE 15 ML	1/2"	17,30	0,994	4	68,78
ACTA 1	VIGA AMARRE 15 ML	1/2"	17,30	0,994	4	68,78
ACTA 1	VIGA AMARRE 15 ML	1/2"	17,30	0,994	4	68,78
ACTA 1	VIGA AMARRE 10 ML	1/2"	11,00	0,994	4	43,74
ACTA 1	VIGA AMARRE 10 ML	1/2"	11,00	0,994	4	43,74
ACTA 1	PILOTES MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	1/2"	12,00	0,994	15	178,92
ACTA 1	PILOTES MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	1/2"	12,00	0,994	4	47,71
ACTA 1	PILOTES MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	1/2"	12,00	0,994	7	83,50
ACTA 1	PILOTES MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	1/2"	12,00	0,994	4	47,71
Σ ACTA 1						651,66
ACTA 2	PILOTES MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	1/2"	12,00	0,994	3	35,78
ACTA 2	FLEJES VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO 3 VIGAS (15 ML)	3/8"	1,16	0,56	78	50,67
Σ ACTA 2						86,45
ACTA 4	VIGA AMARRE 10 ML	1/2"	2,39	0,994		2,38
ACTA 4	VIGA AMARRE 10 ML	1/2"	2,39	0,994		2,38
ACTA 4	VIGA AMARRE 11 ML	1/2"	12,70	0,994	4	50,50
ACTA 4	PILOTES MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	1/2"	1,80	0,994	68	121,67
ACTA 4	FLEJES VIGA AMARRE MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO 3 VIGAS (78,6 ML)	3/8"	1,16	0,56	331	215,02
ACTA 4	FLEJES PILOTES MALLA CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO (36PIL)	3/8"	1,02	0,56	504	287,88
Σ ACTA 4						679,83
				PASAN	UND	1417,94
	TOTAL				**KG**	**1417,94**

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO**
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO AVANCE DE OBRA	1	15/11/2024	30 de 34

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:** 11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
4.01	M3	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
CANCHA	EXCAVACION	28,00	0,20	16,00		89,60
Σ ACTA 4						89,60
				PASAN	UND	89,60
	TOTAL				M3	89,60

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO	1	15/11/2024	31 de 34
	AVANCE DE OBRA			

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:** 11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
4.02	M3	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA







FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Espesor	Ancho		
CANCHA	AFIRMADO COMPACTADO	28,00	0,15	16,00		67,20
	Σ ACTA 4					67,20

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO AVANCE DE OBRA	1	15/11/2024	32 de 34

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	CARLOS ANDRÉS GARCÍA PEDRAZA	**Mes:**	11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	JUAN DAVID REYES VARGAS		

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
4.03	M2	PLACA BASE EN CONCRETO E=0,10 M CONCRETO 2500 PSI	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
CANCHA	PLACA BASE EN CONCRETO	28,00		16,00		448,00
Σ ACTA 4						448,00

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO	1	15/11/2024	33 de 34
	AVANCE DE OBRA			

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:** 11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	
4.04	KG	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	W/M	Ancho		
CANCHA	MALLA ELECTOSOLDADA PARA CANCHA	28,00	2,08	16,00		931,84
	Σ ACTA 4					931,84

CONSORCIO San Jose 2023	DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:	Fecha:	Páginas
	MEMORIAS DE CALCULO	1	15/11/2024	34 de 34
	AVANCE DE OBRA			

Entidad:	MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN – BOYACÁ	**Contratista**	CONSORCIO SAN JOSE 2023 R/L: JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	**Supervisor:**	JUAN DAVID REYES VARGAS	**Mes:** 11
Contrato No.	COP-09-2023	**Interventor:**	CESAR AUGUSTO CARDOZO ARÉVALO	**Apoyo a la supervisión:**	-	

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Transversal 2 No. 1 - 42, Nuevo Colón, Boyacá.
4.05	ML	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO E= 0,08 M		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MEMORIA





FRENTE	LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	TOTAL
		Longitud	Alto	Ancho		
CANCHA	DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO	303,61				303,61
	Σ ACTA 4					303,61
				PASAN	UND	303,61
	TOTAL				ML	303,61

Elaboro	Reviso	Aprobo
JAIRO ENRIQUE RINCÓN CACERES	JAIRO ENRIQUE RINCÓN VELANDIA	CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	Interventor
