DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ab44a601315ad4fb9bd4cf4327377553b776f8589c2314925dc69b10ece90f2ae778f88a04a6e265de746073a562a5fe

Número de Factura: FEVC-1
Fecha de Emisión: 30/04/2025
Fecha de Vencimiento: 30/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
Nombre Comercial: CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
Nit del Emisor: 901899116
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4390

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: DG 62 43 151
Teléfono / Móvil: 3125486349
Correo: admonservicivil@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890270948
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: CARRERA 2 50 25
Teléfono / Móvil: 6076223474
Correo: imancera@transitobarrancabermeja.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72103301	Acta parcial No 1 contra to de obra publica cuyo objeto Construccion e in talacion de dispositivos de seguridad vial en el di strito de Barrancaberme ja	NIU	1,00	$ 158.549.443,13	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.549.443,13
2	72103301	Administración 30	NIU	1,00	$ 47.564.832,94	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.564.832,94
3	72103301	Imprevistos 1	NIU	1,00	$ 1.585.494,43	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.585.494,43
4	72103301	Utilidad 4	NIU	1,00	$ 6.341.977,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.204.975,77	19.00			$ 6.341.977,73

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/04/2025 11:01:59
Documento validado por la DIAN:
30/04/2025 11:01:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	214041748.23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	214041748.23
IVA	1204975.77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1204975.77
Total neto factura (=)	215246724
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 215246724

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	214.041.748,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	214.041.748,23
IVA	1.204.975,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.204.975,77
Total neto factura (=)	215.246.724,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$215.246.724,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092199100 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-04-22

ACTA PARCIAL No. 01
CONTRATO DE OBRA No. 137 DE 2024

CONTRATANTE	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.270.948-3
CONTRATISTA	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
NIT:	901.899.116-2
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C:	13.893.413 DE BARRANCABERMEJA
DIRECCION	DIAGONAL 62 # 43 – 151 BARRIO LAS GRANJAS
OBJETO	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
VALOR TOTAL	QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($528.359.372,30).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	·CDP No. 0326 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 0420 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR	ARQ. CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE ENERO 2025
FECHA DE SUSPENSION 1	DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2025
FECHA PRORROGA N°1 A LA SUSPENSION N°1	TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025
FECHA PRORROGA N°2 A LA SUSPENSION N°1	CINCO (05) DE FEBRERO DE 2025
FECHA PRORROGA N°3 A LA SUSPENSION N°1	VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE REINICIO	VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE 2025
FECHA ADICIONAL EN PLAZO N°1	QUINCE (15) DE ABRIL DEL 2025
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL	·DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	OCHO (08) DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE FINALIZACION FINAL	QUINCE (15) DE JUNIO DEL 2025

Entre los suscritos a saber: Por una parte, el Director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, arquitecto CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA, en calidad de Supervisor del Contrato No. 137-2024, JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No 13.893.413 de Barrancabermeja, Representante Legal de la empresa CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024 identificada con NIT. 901.899.116-2, quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA, identificada con cedula de ciudadanía No. 13.721.570 de Barrancabermeja, Representante Legal de la interventoría del contrato de obra, se reúnen para suscribir el Acta Parcial No. 01 del contrato de Obra No. 137-24, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA", de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja suscribió el contrato de obra No.137-24 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.".

2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del NUEVE (09) de ENERO de 2025.

3. Que el contratista ha ejecutado parcialmente las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE **($ 215.246.724,00)** como consta en el archivo adjunto.

4. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 528.359.372,30	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 528.353.462,60	
TOTAL, ACTA PARCIAL No. 01		$ 215.246.724,00
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		$ 313.106.738,60
SUMAS IGUALES	$ 528.353.462,60	$ 528.353.462,60

5. El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Suscribir el Acta parcial No. 01 donde se da cumplimiento por parte del contratista JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con 13.893.413 de Barrancabermeja, Representante Legal de la empresa CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024 identificada con NIT. 901.899.116-2, las actividades objeto del contrato, ejecutados durante el periodo (9 de enero de 2025 al 17 de enero de 2025 y del 28 de marzo de 2025 al 10 de abril de 2025), las cuales se relacionan en las memorias de cálculo presentado por el contratista y a su vez la interventoría delegada certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento de las obligaciones contractuales constatados, dejando constancia que están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

2. Las cantidades y los valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría y el contratista realizan las mediciones de campo y las revisiones efectuadas por la supervisión.

3. Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma de **DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 215.246.724,00)**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los 28 días de abril del 2025.

POR LA ITTB,

CESAR AGUSTO GUZMAN AREIZA
DIRECTOR DE LA ITTB

CONTRATISTA,

JORGE TRUJILLO NIÑO
R.L CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
Nit: 901.899.116-2

INTERVENTORIA,

MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
R.L INGAP S.A.S

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137-2024

TIPO Y No. DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 137 DEL 2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
INTERVENTOR:	INGAP S.A.S
SUPERVISOR :	ARQ. CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA - DIRECTOR ITTB

A los VEINTIOCHO (28) días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron el arquitecto CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA,Director de la ITTB, supervisor del contrato, MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA, Representante legal de la Interventoria y por otra parte, JORGE TRUJILLO NIÑO, en calidad de contratista, para realizar la presente Acta de Recibo Parcial No. 01, según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES SEGÚN MOD. No.01		ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO		SALDO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT MODIFICADA	V/PARCIAL MODIFICADO	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
1,0	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN												
1,01	Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lamina galvanizada cal. 16 Duplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	UND	109,00	$ 891.664,00	$ 97.191.376,00	92,00	$ 82.033.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,00	$ 82.033.088,00
				Subtotal =	**$ 97.191.376,00**		**$ 82.033.088,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 82.033.088,00**
2,0	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.												
2,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 3 días y ancho 3,7m	ML	206,20	$ 1.686.649,00	$ 347.787.023,80	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,02	Suministro e Instalacion de resalto plastico de ingenieria de alta resistencia al impacto de 1,0m x 0,35m x 0,05m	ML	184,50	$ 314.825,00	$ 58.085.212,50	166,00	$ 52.260.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	166,00	$ 52.260.950,00
2,03	Suministro e instalacion de tachas reflectivas con espigo	UND	840,00	$ 30.114,00	$ 25.295.760,00	584,00	$ 17.586.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	584,00	$ 17.586.576,00
				Subtotal =	**$ 431.167.996,30**		**$ 69.847.526,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 69.847.526,00**
3,0	ITEMS NO PREVISTOS												
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML	0,00	$ 2.021.096,00	$ 0,00	166,10	$ 335.704.045,60	106,50	$ 215.246.724,00	106,50	$ 215.246.724,00	59,60	$ 120.457.321,60
				Subtotal =	**$ 0,00**		**$ 335.704.045,60**		**$ 215.246.724,00**		**$ 215.246.724,00**		**$ 120.457.321,60**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 528.359.372,30**		**$ 487.584.659,60**		**$ 215.246.724,00**		**$ 215.246.724,00**		**$ 272.337.935,60**
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT). ITEM NO PREVISTO						**$ 40.768.803,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	COSTO TOTAL				**528.359.372,30**		**$ 528.353.462,60**		**$ 215.246.724,00**		**$ 215.246.724,00**		**$ 272.337.935,60**
	VALOR ACTA PARCIAL								**$ 215.246.724,00**				

CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA
DIRECTOR INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JORGE TRUJILLO NIÑO
Representante Legal
CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024

MAYERLI PAOLA GIRALDO OLAYA
Representante Legal
INGAP S.A.S - INTERVENTORIA

C O N S O R C I O
DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
NIT: 901.899.116-2

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

Barrancabermeja, 30 de abril de 2025

Señores:
INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA ITTB
La Ciudad

Yo JORGE TRUJILLO NIÑO identificado con cedula de ciudadanía N. 13.893.413, en calidad de representante Legal del Consorcio Dispositivos Seguridad Vial Barrancabermeja 2024 con NIT: 901.899.116-2, solicito que la factura electrónica número FEVC-1 correspondiente al acta parcial No. 1 del contrato de obra pública 137-24, cuyo objeto "Construcción e Instalación de Dispositivos de Seguridad Vial en el Distrito de Barrancabermeja", sean consignados a la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES SABAOTH SAS identificada con NIT: 900.977.057-2, a la cuenta de ahorros 49661034407 del banco Bancolombia.

Cordialmente

JORGE TRUJILLO NIÑO
c.c. 13.893.413
Representante Legal

Certificado
Bancario

Lunes, 30 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVICIOS INDUSTRIALES SABAOTH SAS identificado(a) con NIT 900977057, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	49661034407	2016/06/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-28, 04:25:46 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 77080092

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 28/04/2025

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS		
ocumento	CC1098736267	**Dirección**	CR 33 #67 - 60
ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6017514
ipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
iudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
epresentante Legal		**Identificación**	
otal Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
dentificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
1098736267	JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 275.000	2,436	$ 2.200.000	$ 53.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 0	$ 352.000	$ 275.000	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.600	$ 5.900	$ 686.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-28, 04:20:13 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2025
Empresa	JORGE LUIS TRUJILLO VANEGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1098736267
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	77080092
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1440332206
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 686.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 352.000	$ 3.000
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 275.000	$ 2.400
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	1	$ 53.600	$ 500
		SubTotales:		$ 680.600	$ 5.900
		Total a Pagar:			$ 686.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899116-2	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL	DIAG 62 NUMERO 43 151 BARRIO LAS	3125486349	admonservicivil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-02	2025-01	E	06/02/2025	83985319	TOTAL A PAGAR	
					$104.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	13.400	0		0		0	0	0	0	13.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	53.400	0	0	0	0	0	0		53.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	23.300				23.300	0	0	23.300			233	23.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	13.900	0	0	13.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	13.400	13.400
Pensión	1	53.400	53.400
Riesgos Laborales	1	23.300	23.300
CCF	1	13.900	13.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	104.000	104.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899116-2	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL	DIAG 62 NUMERO 43 151 BARRIO LAS	3125486349	admonservicivil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B -- menos de 200 c			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	06/02/2025	83985319	$104.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1096250484	OSORIO LAZARO CAMILA ANDREA	1	0			S	X	X															230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS037	333.334	13.400	14-4	333.334	5	23.300	CCF38	347.100	13.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCBERMEJA 2024	**NIT:**	901899116
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2025
Número de Radicación:	83985319	**Total a pagar:**	$104,000
Fecha de vencimiento:	06/02/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	06/02/2025	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1247995817
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1		$0	$23,300
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$53,400
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$13,900
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$13,400
						$104,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899116-2	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL	DIAG 62 NUMERO 43 151 BARRIO LAS	3125486349	admonservicivil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	22/04/2025	85942190	$62.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	8.000	0		0		0	18	100	0	8.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	32.000	0	0	0	0	18	400	0	32.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	14.000				14.000	18	200	14.200			140	14.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	8.000	18	100	8.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	18	0	0	0
ICBF				
0	18	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	8.000	8.100
Pensión	1	32.000	32.400
Riesgos Laborales	1	14.000	14.200
CCF	1	8.000	8.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	62.000	62.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899116-2	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL	DIAG 62 NUMERO 43 151 BARRIO LAS	3125486349	admonservicivil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	22/04/2025	85942190	$62.800	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colpensi	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1096250484	OSORIO LAZARO CAMILA ANDREA	1	0			S	X																23030 1	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS037	200.000	8.000	14-4	200.000	5	14.000	CCF38	200.000	8.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCBERMEJA 2024	**NIT:**	901899116
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	marzo 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2025
Número de Radicación:	85942190	**Total a pagar:**	$62,800
Fecha de vencimiento:	04/04/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	22/04/2025	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1426065498
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1		$0	$14,200
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$32,400
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$8,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$8,100
						$62,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 85942190, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899116-2	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL	DIAG 62 NUMERO 43 151 BARRIO LAS	3125486349	admonservicivil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	30/04/2025	85942538	$619.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	139.200				139.200	0	0	139.200			1.392	139.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	80.000	0	0	80.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	80.000	80.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	139.200	139.200
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	619.200	619.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901899116-2	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL	DIAG 62 NUMERO 43 151 BARRIO LAS	3125486349	admonservicivil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-05	2025-04	E	30/04/2025	85942538	$619.200

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1096250484	OSORIO LAZARO CAMILA ANDREA	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF38	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCBERMEJA 2024	**NIT:**	901899116
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	abril 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	mayo 2025
Número de Radicación:	85942538	**Total a pagar:**	$619,200
Fecha de vencimiento:	07/05/2025	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	30/04/2025	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1443712829
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		


Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1		$0	$139,200
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$320,000
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$80,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0	$80,000
						$619,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO
DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
NIT: 901.899.116-2

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

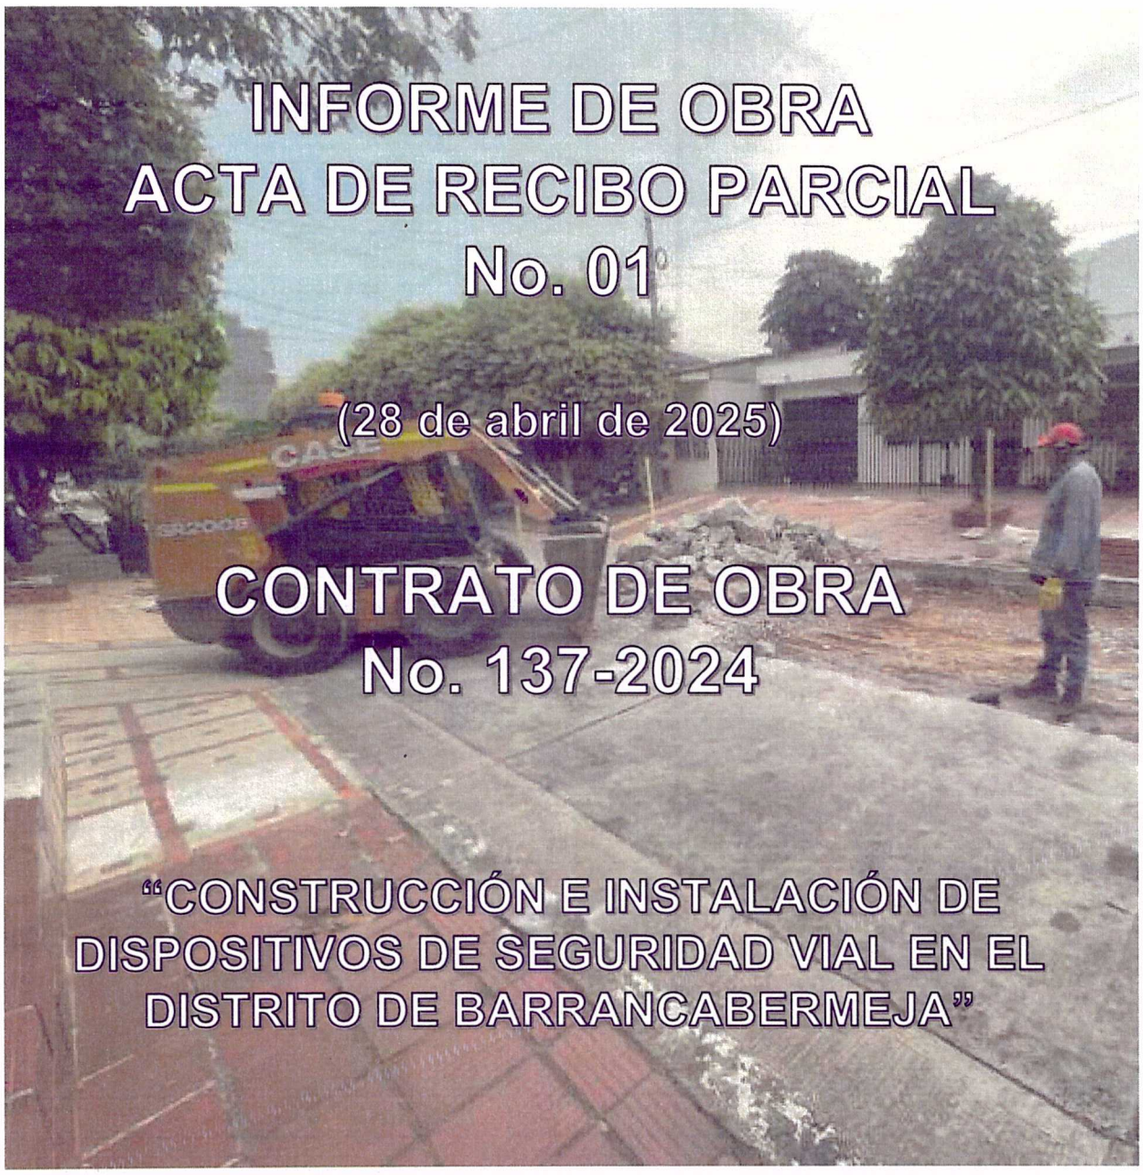

INFORME DE OBRA
ACTA DE RECIBO PARCIAL
No. 01

(28 de abril de 2025)

CONTRATO DE OBRA
No. 137-2024

"CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
2.1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 7
2.2 OBJETO DEL PROYECTO 8
2.3 ALCANCE DEL PROYECTO 8
3. ASPECTOS CONTRACTUALES 9
3.1 CONTRATOS SUSCRITOS 9
3.1.1 CONTRATO DE OBRA 9
4. ACTIVIDADES REALIZADAS. 11
4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO A LA FECHA, ABRIL 25 DE 2025 11
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12

TABLAS

Tabla 1: Presupuesto de obra y Cantidades a ejecutar contractualmente. 6
Tabla 2: Contrato de obra 10

FIGURAS

Figura 1. Municipio de Barrancabermeja 5

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra tiene como objeto el realizar un breve resumen de las cantidades ejecutadas para el presente periodo del Acta de Recibo Parcial No. 01, del contrato de obra pública No. 137-2024 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

En este informe, se registra el soporte técnico de las cantidades ejecutadas y sustentadas en las memorias de cálculo para el corte comprendido del 9 de enero de 2025 al 17 de enero de 2025 y del 28 de marzo de 2025 al 28 de abril de 2025, realizado por la empresa CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla én el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, la cual cuenta con una temperatura de 27,6° promedio y a 75,94 msnm.

Limita al norte con el norte municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Rafael de Chucuri, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucuri y Girón, y al occidente con el rio Magdalena.

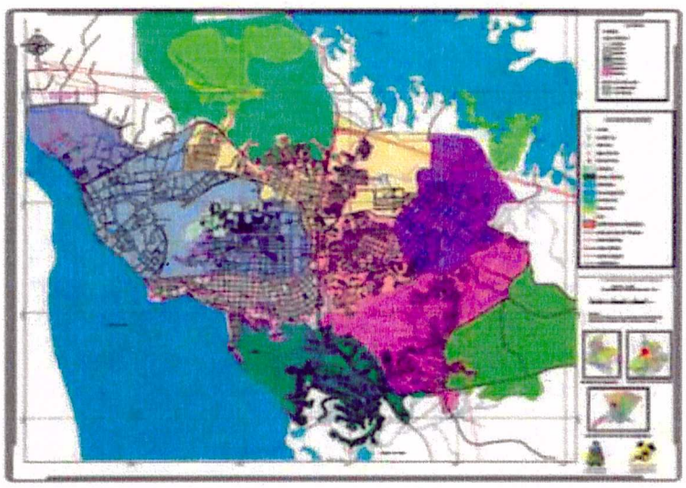


Figura 1. Municipio de Barrancabermeja

- CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Se ubica en toda el área del Distrito de Barrancabermeja, posee como objetivo de ejecución las cantidades de acuerdo con la modificatoria No.01 de fecha 16 de abril de 2025:

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
1,0	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN						
1,01	Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lamina galvanizada cal. 16 Duplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	UND	109,00	$ 891.664,00	$ 97.191.376,00	92,00	$ 82.033.088,00
				Subtotal =	$ 97.191.376,00		$ 82.833.088,00
2,0	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.						
2,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 3 días y ancho 3,7m	ML	206,20	$ 1.686.649,00	$ 347.787.023,80	0,00	$ 0,00
2,02	Suministro e Instalacion de resalto plastico de ingenieria de alta resistencia al impacto de 1,0m x 0,35m x 0,05m	ML	184,50	$ 314.825,00	$ 58.085.212,50	166,00	$ 52.260.950,00
2,03	Suministro e instalacion de tachas reflectivas con espigo	UND	840,00	$ 30.114,00	$ 25.295.760,00	584,00	$ 17.586.576,00
				Subtotal =	$ 431.167.996,30		$ 69.847.526,00
3,0	ITEMS NO PREVISTOS						
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML	0,00	$ 2.021.096,00	$ 0,00	166,10	$ 335.704.045,60
				Subtotal =	$ 0,00		$ 335.704.045,60
					SUBTOTAL OBRAS		$ 487.584.659,60
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT). ITEM NO PREVISTO						$ 40.768.803,10
					COSTO TOTAL	$ 528.359.372,30	$ 528.353.462,70

Tabla 1: Cantidades contractuales.

Las obras se realizan en las siguientes direcciones, según la necesidad que presenta actualmente el Distrito:

COMUNA	BARRIO	DIRECCION
1	BUENOS AIRES	Calle 47 entre 17-18 –Nom Antiguo ALDIA LTDA
		Calle 47 entre 16-17. Nom 16-69
		Calle 48 entre 17-18 Nom 17-07
		Carrera 17 entre 46-47. Nom 46-72
	COLOMBIA	Calle 51 entre carrera 19-20
	RECREO	calle 44 entre 28-27
2	EL PARNASO	Calle 64 entre 20 y 19 nom.64 # 19A-10
	TOROCOROMA	Calle 61 entre 18 y 18A nom.61 # 18-46
		Calle 53 entre 18 y 19. Nom 19-25
		Carrera 17A entre 55 y 56. Nom 55-33
		Calle 55 entre 17A-18 Nom 18-13
	CIUDAD BOLIVAR	Carrera 31 A entre calles 56-57 Nom 56-47
		Carrera 31 A entre calles 57-58 Nom 57-15
	LAS COLINAS	Calle 60 entre carrera 15C-16 Jardin Infantil Pequeños Gigantes
3	CRISTO REY	Diagonal 60 carrera 38 # 72A - 45 Poste 7122802
		Diagonal 60 casa 4
		calle 72A # 37E-03
	LA PAZ	Carrera 37 # 75-42
		Calle 75 entre 36b y 37 Nom 36A-33
		Calle 75 entre 37A y 37 Nom 37-17
		carrera 37A entre 75A y 75C nom 75A - 80
	COLINAS DEL NORTE	Carrera 36 # 75-88
		Carrera 36 # 75A poste 30506
	JORGE ELIECER GAITAN	Calle 65 entre carrera 34 y diagonal 60. Nom 34c-75
		Diagonal 65 entre carrera 34 y 34 A. Nom 34A-80
	FLORESTA	Carrera 32 entre calles 65 y 67
		Calle 71 entre carreras 31 y 32
		Calle 74 entre carrera 30 - 31 costado colegio Bambino
4	LOS PINOS	Calle 34 entre carrera 38y 39

		carrera 39 entre calle 33-34
		Carrera 35 # 30-98
	VILLA DE LEYVA	Carrera 42 con calle 37 poste 8792763
	LA PENINSULA	Carrera 41 entre carrera 24 y transversal 37. Nomenclatura 24-566
		Carrera 41 entre carrera 24 y transversal 37. Nomenclatura 24-358
		Carrera 41 entre carrera 24 y transversal 37. Nomenclatura 24-229
	CINCUENTENARIO	Calle 34 entre carrera 28-30 Escuela Cincuentenario
	EL CASTILLO	Calle 29B entre carrera 41-42
		Carrera 41 entre calles 30-29B
5	SANTA ANA	Transversal 34B entre Diagonal 52 y Calle 53
		Carrera 34B No 53-23
		Calle 53entre carrera 34 B y Transversal 34B
		Diagonal 52 entre Carrera 34 y Transversal 34B.
	LA TORA	Calle 34 B – Entrada esquina de la cancha
		Calle 58 entre 34 y 34Bis Nom 34 bis 17.
		Carrera 34 Bis entre 58-57 Nom 58-46
		Carrera 34A Nom 55A-13 casa 15
		Calle 34C Nom 57-61.
6	LAS GRANJAS	*Diagonal 59 entre Diagonal 43 y transv 43* No *43A-89*
	PROGRESO II	Transversal 43c # 56D-52
		Diagonal 52 entre transversal 42-43 Nom 43-49
		Diagonal 57 entre transversal 42-43 Nom 43-47
		Diagonal 56 entre transversal 42-43 Nom 43-58
	ORO NEGRO	calle 50 con 44
		Calle 50 vía pozo 7
	RAFAEL RANGEL	Transversal 48 con 53 B Nom 53B-19 Luminaria 5041
		Transversal 48 con 53 B CLINICA DEL EXOSTO poste 30800
	SAN MARTIN	Diagonal 55A Casa 83 .
		Diagonal 56 con transversal 51. Luminaria 2673, Nomenclatura 56-27
		Diagonal 55A. Nomenclatura 49-11
		Diagonal 51 con 54A. Luminaria 3314, Nomenclatura 54ª-45
7	VILLA AURA	Calle 50E # 50Bls 25 luminaria 24411
		Calle 50E # 50Bls 88 luminaria 24370
	PABLO ACUÑA	Calle 50 Poste 8721025
		Calle 50 # 63-17 Luminaria 43733
		Transversal 41A casa 35g
		Transversal 42A Transfromador
	MARIA EUGENIA	Calle 42 entre carrera 52-53 Nom 52-57

Tabla 2: Listado de direcciones donde se ejecutará el proyecto.

2.1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

En respuesta a los altos índices de accidentabilidad en el Distrito de Barrancabermeja y la necesidad urgente de fortalecer las medidas de seguridad vial, se pone en marcha el proyecto cuyo objetivo es mejorar la infraestructura y reducir los riesgos asociados al tránsito vehicular y peatonal.

Este proyecto nace como una iniciativa para mitigar los factores de riesgo en la movilidad urbana, garantizando condiciones más seguras para conductores y peatones. Para ello, se ha definido la implementación de nuevos dispositivos de

seguridad vial, diseñados para prevenir accidentes y mejorar la circulación en puntos críticos de la ciudad. En respuesta a esta problemática, se establece la convocatoria para el proceso cuyo objeto es la construcción e instalación de dispositivos de seguridad vial, dicha convocatoria busca garantizar que las obras sean ejecutadas con los más altos estándares de calidad y eficiencia, priorizando aquellas zonas con mayores registros de siniestralidad.

Teniendo como antecedente los aspectos técnicos antes anunciados, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB), decide realizar los estudios pertinentes con los profesionales del área para gestionar el desarrollo del alcance al proyecto de "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA." a través del proceso número LOP-002-2024.

La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB), adjudica el contrato de obra pública No. 137-2024 a la empresa CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024 y el contrato de interventoría No. 138-2024 a la empresa INGAP S.A.S. para iniciar la ejecución y seguimiento al proyecto.

2.2 OBJETO DEL PROYECTO

Ejecutar para el municipio de Barrancabermeja la obra consistente en la CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA mediante el contrato de obra pública No. 137-24 realizado entre la Inspección de Tránsito de Barrancabermeja y la empresa CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024. De acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por el municipio, según lo establecido en los pliegos de condiciones.

2.3 ALCANCE DEL PROYECTO

Realizar la construcción e instalación de dispositivos de seguridad vial en el distrito de Barrancabermeja

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS

A continuación, se relaciona la información actualizada del contrato de obra para la ejecución del presente proyecto:

3.1.1 CONTRATO DE OBRA

Los datos generales del contrato de obra se presentan en la siguiente tabla:

INFORME DE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 **FECHA:** 28-04-2025	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 137-2024**
INFORMACION BASICA	**Objeto**: "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA". **Contratista: Consorcio dispositivos seguridad vial Barrancabermeja 2024** **NIT:** 901.899.116-2 **Valor Inicial del Contrato:** $528.359.372,30 **Fecha de Inicio:** 09 de enero de 2025 **Plazo de Ejecución:** Un (1) mes contado a partir del acta de inicio. **Fecha de terminación inicial:** 08 de febrero de 2025 **Fecha suspensión N°1:** 17 de enero de 2025 **Fecha prorroga N°1 a la suspensión N°1:** 31 de enero de 2025 **Fecha prorroga N°2 a la suspensión N°1:** 05 de febrero de 2025 **Fecha prorroga N°3 a la suspensión N°1:** 28 de febrero de 2025 **Fecha de reinicio:** 28 de marzo de 2025 **Fecha de adicional en plazo N°1:** 15 de abril de 2025 **Fecha de terminación final:** 15 de junio de 2025

<table>
<tr><td></td><td>Interventoría: Ingeniería para Aguas y Pavimentos – INGAP S.A.S.

NIT: 829.000.043-4

Supervisor: Arq. CESAR AUGUSTO GUZMAN AREIZA – Director ITTB</td></tr>
<tr><td>ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:</td><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>CTO 137-2024 (Según Mod No. 01)</td><td>$528.353.462,60</td></tr>
<tr><td>COBRO ACTA No. 01</td><td>$215.246.724,00</td></tr>
<tr><td>SALDO POR EJECUTAR</td><td>$313.106.738,60</td></tr>
</table>
El Contrato presenta un avance de ejecución presupuestal de obra del 44,15%.
</td></tr>
<tr><td>RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS</td><td>La Obra cuenta con el siguiente personal administrativo para la ejecución de las actividades

PERSONAL

• Ingeniero director de Obra
• Ingeniero Residente de Obra
• Maestro de Obra
• Ayudantes</td></tr>
<tr><td>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS</td><td>
<table>
<tr><td>GARANTÍAS</td><td>VALOR</td><td>vigencia inicial (dd/mm/aa)</td><td>Vigencia final (dd/mm/aa)</td></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>$ 105.671.874,40</td><td>23/12/2024</td><td>23/05/2025</td></tr>
<tr><td>SAL Y PRESTAC</td><td>$ 52.835.937,20</td><td>23/12/2024</td><td>23/01/2028</td></tr>
<tr><td>ESTABILIDAD DE LA OBRA</td><td>$ 105.671.874,40</td><td>SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td></tr>
<tr><td>PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES</td><td>$260.000.000,00</td><td>23/12/2024</td><td>23/01/2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Tabla 3: Contrato de obra.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS.

Durante el periodo que comprende el presente informa, se realizaron actividades del ítem 3.01 Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 día y ancho 3,7m, según se relaciona a continuación:

BARRIO	DIRECCIÓN	ANCHO CALZADA (M)	DISTANCIA BORDE	LONGITUD EFECTIVA (M)
BUENOS AIRES	Calle 47 entre 17-18 –Nom Antiguo ALDIA LTDA	8	0,5	7,50
	Calle 47 entre 16-17. Nom 16-69	8	0,5	7,50
COLOMBIA	Calle 51 entre carrera 19-20	7	0,5	6,50
EL PARNASO	Calle 64 entre 20 y 19 nom.64 # 19A-10	8	0,5	7,50
	Calle 61 entre 18 y 18A nom.61 # 18-46	8	0,5	7,50
TORCOROMA	Calle 53 entre 18 y 19. Nom 19-25	6	0,5	5,50
	Carrera 17A entre 55 y 56. Nom 55-33	6	0,5	5,50
	Calle 55 entre 17A-18 Nom 18-13	6	0,5	5,50
CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 31 A entre calles 56-57 Nom 56-47	7	0,5	6,50
	Carrera 31 A entre calles 57-58 Nom 57-15	7	0,5	6,50
CRISTO REY	Diagonal 60 carrera 38 # 72A - 45 Poste 7122802	10	0,5	9,50
	Diagonal 60 casa 4	10	0,5	9,50
COLINAS DEL NORTE	Carrera 36 # 75-88	8,4	0,4	8,00
	Carrera 36 # 75A poste 30506	8,4	0,4	8,00
GAITÁN	Diagonal 65 entre carrera 34 y 34 A. Nom 34A-80	6	0,5	5,50
TOTAL				106,50

Tabla 4: Sitios donde se ejecutaron actividades durante el periodo del presente informe.

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO A LA FECHA, ABRIL 25 DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
1,0	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN								
1,01	Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lamina galvanizada cal. 16 Duplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	UND	92,00	$ 891.664,00	$ 82.033.088,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 82.033.088,00		$ 0,00		$ 0,00
2,0	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.								
2,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 3 días y ancho 3,7m	ML	0,00	$ 1.686.649,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,02	Suministro e Instalacion de resalto plastico de ingenieria de alta resistencia al impacto de 1,0m x 0,35m x 0,05m	ML	166,00	$ 314.825,00	$ 52.260.950,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,03	Suministro e instalacion de tachas reflectivas con espigo	UND	584,00	$ 30.114,00	$ 17.586.576,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
				Subtotal =	$ 69.847.526,00		$ 0,00		$ 0,00
3,0	ITEMS NO PREVISTOS								
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML	166,10	$ 2.021.096,00	$ 335.704.045,60	106,50	$ 215.246.724,00	106,50	$ 215.246.724,00
				Subtotal =	$ 335.704.045,60		$ 215.246.724,00		$ 215.246.724,00
	SUBTOTAL OBRAS				$ 487.584.659,60		$ 215.246.724,00		$ 215.246.724,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 40.768.803,10		$ 0,00		$ 0,00
	COSTO TOTAL				$ 528.353.462,70		$ 215.246.724,00		$ 215.246.724,00
	VALOR ACTA PARCIAL						$ 215.246.724,00		

Tabla 5: Cantidades ejecutadas durante el periodo.

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto se viene ejecutado en sin contratiempos, alcanzando un 44,15% de cumplimiento con respecto a las actividades programadas para el presente periodo, comprendido del 9 de enero de 2025 al 17 de enero de 2025 y del 28 de marzo de 2025 al 25 de abril de 2025.

Durante el desarrollo del presente corte, se llevó a cabo la realización del item: Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parabólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m., con un 64,90% de ejecución de dicha actividad.

La implementación del Plan de Manejo de Tráfico es fundamental, ya que se garantiza el correcto control de tráfico, evitando inconvenientes con conductores en las vías intervenidas, las cuales presentan alto flujo vehicular.

El presente corte refleja un valor de avance de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 215.246.724,00).

El proyecto se viene ejecutando cumpliendo con los términos contractuales y los estándares de calidad establecidos.

JORGE TRUJILLO NIÑO
Representante Legal
CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
Nit. 901.899.116-2

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Barrio Buenos Aìres (Calle 47 entre 16-17. Nom 16-69) y Barrio Buenos Aires (Calle 47 entre 17-18 –Nom Antiguo ALDIA LTDA). Se realiza nivelación y compactación de la base, colocación de malla de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Reductor parabólico en concreto Barrio Torcoroma (Calle 53 entre 18 y 19 Nom 19-25). Se realiza trazo y replanteo sobre pavimento, para realizar corte sobre asfalto y excavación hasta la cota de fondo.

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Reductor parabólico en concreto Barrio Parnaso (Calle 64 entre 20 y 19 nom.64 # 19A-10) . Se realiza trazo y replanteo sobre pavimento, para realizar corte sobre asfalto y excavación hasta la cota de fondo.

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Reductor parabólico en concreto Barrio Torcoroma (Carrera 17A entre 55 y 56. Nom 55-33). Se realiza trazo y replanteo sobre pavimento, para realizar corte sobre asfalto y excavación hasta la cota de fondo.

CONSORCIO
DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
NIT: 901.899.116-2

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Reductor parabólico en concreto Barrio Parnaso (Calle 64 entre 20 y 19 nom.64 # 19A-10). Se realiza nivelación y compactación de la base, colocación de malla de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Reductor parabólico en concreto Barrio Parnaso (Calle 61 entre 18 y 18A nom.61 # 18-46). Se realiza nivelación y compactación de la base, colocación de malla de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Reductor parabólico en concreto Barrio Torcoroma (Carrera 17A entre 55 y 56. Nom 55-33). Se realiza nivelación y compactación de la base, colocación de malla de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Reductor parabólico en concreto Barrio Torcoroma (Calle 55 entre 17A-18 Nom 18-13). Se realiza nivelación y compactación de la base, colocación de malla de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Reductor parabólico en concreto Barrio Torcoroma (Calle 53 entre 18 y 19. Nom 19-25). Se realiza nivelación y compactación de la base, colocación de malla de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Barrio Buenos Aires (Calle 47 entre 16-17. Nom 16-69). Se realiza nivelación y compactación de la base, colocación de malla de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER



Descripción: Barrio Buenos Aires (Calle 47 entre 17-18). Se realiza nivelación y compactación de la base, colocación de malla de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO No	137-2024
ACTA	1

CAPITULO	DESCRIPCION
3	ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML

1. Intervencion del resalto ubicado en el barrio torcoroma en la calle 53 entre calle 18 y 18A






BARRIO	DIRECCIÓN	ANCHO CALZADA (M)	DISTANCIA BORDE	LONGITUD EFECTIVA (M)
BUENOS AIRES	Calle 47 entre 17-18 –Nom Antiguo ALDIA LTDA	8	0,5	7,50
	Calle 47 entre 16-17. Nom 16-69	8	0,5	7,50
COLOMBIA	Calle 51 entre carrera 19-20	7	0,5	6,50
EL PARNASO	Calle 64 entre 20 y 19 nom.64 # 19A-10	8	0,5	7,50
	Calle 61 entre 18 y 18A nom.61 # 18-46	8	0,5	7,50
TORCOROMA	Calle 53 entre 18 y 19. Nom 19-25	6	0,5	5,50
	Carrera 17A entre 55 y 56. Nom 55-33	6	0,5	5,50
	Calle 55 entre 17A-18 Nom 18-13	6	0,5	5,50
CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 31 A entre calles 56-57 Nom 56-47	7	0,5	6,50
	Carrera 31 A entre calles 57-58 Nom 57-15	7	0,5	6,50
CRISTO REY	Diagonal 60 carrera 38 # 72A - 45 Poste 7122802	10	0,5	9,50
	Diagonal 60 casa 4	10	0,5	9,50
COLINAS DEL NORTE	Carrera 36 # 75-88	8,4	0,4	8,00
	Carrera 36 # 75A poste 30506	8,4	0,4	8,00
GAITÁN	Diagonal 65 entre carrera 34 y 34 A. Nom 34A-80	6	0,5	5,50
TOTAL				106,50

TOTAL ACTIVIDAD	106,50
ACUMULADO	106,50

FIRMA			
CARGO	CONTRATISTA OBRA	INTERVENTORIA	SUPERVISION

MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO No	137-2024
ACTA	1

CAPITULO	DESCRIPCION
3	ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML

2. Carrera 17A entre 55 y 56. Nom 55-33






3. Carrera 17A entre 55 y 56. Nom 55-33





	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA	SUPERVISION
FIRMA			
CARGO			

MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024	CONTRATO No 137-2024
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	ACTA 1


CAPITULO	DESCRIPCION
3	ITEMS NO PREVISTOS


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML

4. Calle 47 entre 17-18 –Nom Antiguo ALDIA LTDA



5. Calle 47 entre 16-17. Nom 16-69







FIRMA			
CARGO	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA	SUPERVISION

	MEMORIA DE CALCULO		
	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024	CONTRATO No	**137-2024**
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	ACTA	1

CAPITULO	DESCRIPCION
3	ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML

6. Calle 64 entre 20 y 19 nom.64 # 19A-10









7. Calle 47 entre 16-17. Nom 16-69







FIRMA			
CARGO	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA	SUPERVISION

MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024	CONTRATO No 137-2024
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	ACTA 1

CAPITULO	DESCRIPCION
3	ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML

8. Calle 51 entre carrera 19-20







9. Carrera 31 A entre calles 56-57 Nom 56-47










	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA	SUPERVISION
FIRMA			
CARGO			

	MEMORIA DE CALCULO		
	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024	CONTRATO No	**137-2024**
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	ACTA	1

CAPITULO	DESCRIPCION	
3	ITEMS NO PREVISTOS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML

10. Carrera 31 A entre calles 57-58 Nom 57-15






FIRMA			
CARGO	CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA	SUPERVISION

DIAG. 62 #43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO DE OBRA No. 137-2024

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

INFORME PROGRAMA GERENCIA DE PROYECTOS

9 de enero al 25 de abril de 2025

CONTRATISTA

CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
Firma:



Jorge Trujillo Niño
Representante legal

PROFESIONAL RESPONSABLE

Firma:

María Fernanda Delgado Pardo

María Fernanda Delgado Pardo
Especialista en Gerencia de Proyectos

1 Aspectos Generales

1.1 Descripción y alcance del proyecto

El contrato de obra No. 137-2024 tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA de conformidad con las especificaciones suministradas en el anexo técnico.

1.2 Componentes iniciales del proyecto

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1,0	**INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN**		
1,01	Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lámina galvanizada cal. 16 Duplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	UND	109,00
2,0	**CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD**		
Servicios de excavación y movimiento de tierra			
2,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 3 días y ancho 3,7m	ML	206,20
2,02	Suministro e Instalación de resalto plástico de ingeniería de alta resistencia al impacto de 1,0m x 0,35m x 0,05m	ML	184,50
2,03	Suministro e instalación de tachas reflectivas con espigo	UND	840,00

2 Contexto Administrativo

2.1 Objeto

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2.2 Plazo Contractual

El plazo fijado para la ejecución del contrato 137-2024 es de tres (03) meses.

2.3 Resumen Administrativo

- CONTRATISTA:	CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024
- CONTRATO No.:	137-2024
- VALOR INICIAL:	$ 528.359.372,30
- PLAZO INICIAL:	1 MES
- FECHA DE INICIO:	09/01/2025
- FECHA DE TERMINACIÓN 1:	08/02/2025
- FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	17/01/2025

- FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1: 08/02/2025
- FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 1: 09/01/2025
- FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 1: 08/02/2025
- FECHA DE REINICIO 1: 28/03/2025
- FECHA DE MODIFICACIÓN 1: 04/04/2025
- VALOR MODIFICADO: $ 528.353.462,70
- FECHA DE TERMINACIÓN 2: 16/04/2025
- FECHA DE ADICIONAL EN PLAZO 1: 15/04/2025
- PLAZO ADICIONAL : 2 MESES
- PLAZO TOTAL: 3 MESES
- FECHA DE TERMINACIÓN 2: 15/04/2025

2.4 Avance de la Ejecución

A la fecha del presente informe han trascurrido 36 días de ejecución de los 90 días disponibles, lo cual representa un 40,00% del plazo contractual consumido.

El siguiente es el resumen del seguimiento a la ejecución Vs la programación de obra correspondiente al periodo que va desde el 9 de enero al 17 de enero y del 28 de marzo al 25 de abril de de 2025.:

% Programado acumulado	% Ejecutado acumulado	% Adelanto o atraso
37,50%	40,74%	3,24%

Valor ($) programado acumulado	Valor ($) ejecutado acumulado	Valor ($) ejecutado adelantado o atrasado
$ 198.144.630	$ 215.246.724	$ 17.102.094

Los anteriores valores nos arrojan un porcentaje de adelanto del 3,24% con respecto a la programación de obra, ejecutado Vs Programado. Que se traducen en $ 17.102.094 de adelanto medido en recursos financieros.

3 Estado del Proyecto

3.1 Informe estado de los recursos humanos del proyecto

Durante la ejecución del proyecto desde sus inicios, se cuenta con un personal administrativo y técnico, que no tuvo cambios, y cuyas hojas de vida fueron objeto de revisión y aprobación por parte de interventoría; dicho personal se encontró vinculado a la obra desde el mes de enero de 2025 a abril de 2025, los cuales son:

NOMBRE	CARGO	CANTIDAD
JORGE TRUJILLO	DIRECTOR DE OBRA	1
CAMILA ANDREA OSORIO LAZARO	RESIDENTE DE OBRA	1

De acuerdo a los reportes entregados por el área de seguridad y salud en el trabajo, se tiene al siguiente personal vinculado en el área operativa:

NOMBRE	CÉDULA
EUDIS RODRIGUEZ FONSECA	1.001.805.756
ALBERTO ELIAS PATERNINA	1.096.200.662
CARLOS RUIZ	17.596.809
LUIS ENRIQUE ARNACHE HERRERA	12.402.632
EFREN DE JESÚS CAAMAÑO BELLIDO	91.431.843
JHON EDUARD DAZA MARIN	1.042.210.021

El personal que se encuentra laborando en el proyecto cuenta con las afiliaciones al sistema de protección social, así como la legalización formal de su contrato obra labor.

3.2 Informe de actividades ejecutadas en el periodo.

En los informes de seguimiento al programa de gerencia de obra, se reportaron las actividades ejecutadas durante el periodo que comprende el presente informe., a saber

- Trazado y replanteo
- Corte en concreto
- Demolición
- Retiro de escombros
- Excavación
- Nivelación y compactación de la base
- Suministro e instalación de acero de refuerzo
- Vaciado de concreto
- Pintura
- Aseo y limpieza

Los sitios donde se desarrollaron dichas actividades fueron los siguientes

BARRIO	DIRECCIÓN	ANCHO CALZADA (M)	DISTANCIA BORDE	LONGITUD EFECTIVA (M)
BUENOS AIRES	Calle 47 entre 17-18 –Nom Antiguo ALDIA LTDA	8	0,5	7,50
	Calle 47 entre 16-17. Nom 16-69	8	0,5	7,50
COLOMBIA	Calle 51 entre carrera 19-20	7	0,5	6,50

EL PARNASO	Calle 64 entre 20 y 19 nom.64 # 19A-10	8	0,5	7,50
	Calle 61 entre 18 y 18A nom.61 # 18-46	8	0,5	7,50
TORCOROMA	Calle 53 entre 18 y 19. Nom 19-25	6	0,5	5,50
	Carrera 17A entre 55 y 56. Nom 55-33	6	0,5	5,50
	Calle 55 entre 17A-18 Nom 18-13	6	0,5	5,50
CIUDAD BOLÍVAR	Carrera 31 A entre calles 56-57 Nom 56-47	7	0,5	6,50
	Carrera 31 A entre calles 57-58 Nom 57-15	7	0,5	6,50
CRISTO REY	Diagonal 60 carrera 38 # 72A - 45 Poste 7122802	10	0,5	9,50
	Diagonal 60 casa 4	10	0,5	9,50
COLINAS DEL NORTE	Carrera 36 # 75-88	8,4	0,4	8,00
	Carrera 36 # 75A poste 30506	8,4	0,4	8,00
GAITÁN	Diagonal 65 entre carrera 34 y 34 A. Nom 34A-80	6	0,5	5,50
TOTAL				**106,50**

3.3 Informe estado de las condiciones administrativas y legales del contrato

Con respecto a los aspectos legales, es de mencionar que el contrato se encuentra amparado de acuerdo a las exigencias del contrato de obra 137-2024 con la entidad aseguradora Seguros del Estado S.A.

Póliza No. 62-44-101020784 Anexo 4		
Amparo	**Vigencia**	**Suma asegurada**
Cumplimiento del contrato	16/08/2025	$ 105.671.874,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/04/2028	$ 52.835.937,20
Estabilidad y calidad de la obra	16/04/2030	$ 105.671.874,40
Póliza No. 62-40-101011868 Anexo 3		
Amparo	**Vigencia**	**Suma asegurada**
Responsabilidad civil extracontractual	16/04/2025	$ 260.000.000,00

Las pólizas en garantía se encuentran actualizadas y aprobadas a la fecha.

4 Alcance del Programa de Gerencia de Proyectos

Desde la formulación del programa de gerencia de proyecto se identificó, las partes interesadas para lo cual en presente periodo la dinámica entre las partes es activa y cumple con las trazabilidades y el conducto regular establecido en el plan de calidad.

5 Elementos de Entrada del Programa de Gerencia de Proyectos

Dentro de los elementos de entrada para el programa de gerencia de proyectos, se identificó la documentación que hace parte integral del contrato de obra, con los que se establecen las obligaciones del contrato de obra y las pautas para el seguimiento a la ejecución de e implementación del presente programa de gerencia de proyectos.

Dichos elementos fueron objeto de análisis y base fundamental para la formulación del programa de gerencia de proyectos.

Partiendo de estos documentos, se desprenden los documentos de salida, tales como:

- Programación de obra
- Programa de Seguridad y Salud en el trabajo
- Planes de inspección y ensayo según especificación definidas en el anexo técnico

5.1 Plan de Gestión de los Requisitos

Cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades asociadas a los requisitos y qué se informará sobre éstas

Los requisitos para la ejecución de las actividades y reportes de las mismas están definidos en los estudios previos, anexo técnico del proyecto y especificaciones técnica. Se entregan informes de las actividades desarrolladas mensualmente a interventoría.

5.2 Plan de Gestión del Cronograma

De acuerdo a lo informado en el programa de gerencia de proyectos, CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024, implementó la programación de obra herramienta Microsoft Project: Diagrama de Gantt con ruta crítica, para lo cual en la evaluación y seguimiento se hace a partir de las líneas bases, para de esta manera cuantificar los avances financieros con respecto al programado vs el ejecutado.

Con respecto al seguimiento a la programación de obra, en el presente periodo se obtiene un avance en 40,74%, mayor al programado que es de 37,50%, cumpliendo con las metas establecidas contractualmente.

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

5.3 Plan de Gestión de los Costos.

La obligación del Contratista es terminar la ejecución de su objeto dentro del alcance, tiempo y costo señalados en el contrato. Para ello, el Contratista y la interventoría realizan el seguimiento al contrato reportando porcentajes conciliados de avance de las actividades y de los entregables que equivalen a un porcentaje (%) completado físico de las actividades propias del contrato. Los avances se hacen medición con base en la programación de obra, con la herramienta flujo de caja.

CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024, se encuentra en la evaluación continua, con el fin de tener claro los costos de ejecución con base en presupuesto de la obra.

El Procedimiento para el registro de los costos del proyecto se realiza en conjunto con la interventoría, previo al inicio de las obras.

5.4 Plan de Gestión de la Calidad

Con respecto al plan de calidad la obra, cuenta con este y la implementación de este plan, el cual se encuentra vigente e integrado al programa de gerencia de obra.

El informe del plan de calidad, se fundamenta en la normatividad vigente, y su seguimiento, hace parte integral de este programa, por tal razón su implementación es fundamental, ya que dentro de su alcance es establecer mecanismos que permitan una ejecución de la obra, con lineamientos claros, que finalmente se traduce en las obras con calidad, con evidencia de sus procesos que garantizan la entrega a satisfacción a nuestro cliente.

5.5 Plan de Gestión de los Recursos

- **Identificación de recursos.**

Los recursos definidos son los exigidos en el pliego de la licitación. Los recursos del personal profesional son:

Personal Profesional de Obra: Director de obra, Residente de obra.

Personal Asesor: Asesor en Gerencia de Proyectos.

Los recursos físicos son los definidos en los APU adjuntos en la propuesta que incluyen los equipos utilizados.

- **Adquisición de recursos.**

Orientación sobre cómo adquirir los recursos del equipo y los recursos para el proyecto. En el plan de calidad se especifica que se cuenta con un procedimiento de Compras, que permite adquirir los recursos necesarios para la ejecución de las actividades del contrato de obra que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto.

En cuanto la gestión de los recursos, el equipo de profesionales durante el periodo se encuentra conformado y en ejercicio de sus funciones.

Con respecto a la adquisición de recursos, se mantiene la metodología y trazabilidad dada descrita en el plan de calidad, en cuanto a su seguimiento desde la gerencia de proyectos, se evidencia el control en la identificación de proveedores, la estimación de la calidad de los productos, fechas de entrega y entrega de fichas técnicas y protocolos para la preservación de los materiales especiales.

5.6 Plan de la Gestión de las Comunicaciones

Desde el área documental se hace un enfoque de operación basado en procesos, que busca gestionar los recursos de manera eficaz, definiendo responsables de la producción, tratamiento y custodia de la documentación, identificando la relación con los otros procesos, definiendo la necesidad de esta información como entrada o correspondencia recibida, y de salida como la correspondencia de salida.

Es por ello que de manera paralela se lleva control tanto en los documentos y registros que surgen con el desarrollo de la obra, como los documentos matrices que surgen desde el contratante en este caso la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

Con respecto a este análisis, y luego de llevar un periodo de ejecución de 74 días, se identifican ya que los procesos se encuentran establecidos y que se lleva los registros de manera adecuada, es decir en esta etapa, ya hay una sinapsis entre los integrantes del equipo de profesionales, así como en los operativos que integran la mano de obra del proyecto. Bajo las pautas dadas en el plan de calidad se observa que los integrantes asimilan las necesidades del proyecto y la trazabilidad para obtener los resultados previstos, a su vez se da cumplimiento oportuno en las respuestas a las solicitudes y requerimientos impartidos por la interventoría.

De otra parte, con la documentación que hace parte integral del contrato, actas de comités, actas de inicio, acuerdo de precios para ítems no previstos, son resguardados y tramitados, directamente desde la interventoría, quien a su vez hace su debida gestión ante el ente contratante. Los mismos finalmente tiene traslado al archivo de CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024.

5.7 Plan de la Gestión de los Riesgos

En la identificación de los riesgos se toma la matriz de riesgos del anexo Matriz 3 – Matriz de riesgos

De acuerdo a la matriz de riesgos adjunta, y la cual hace parte integral del proceso de contratación, se evidencia que el formato no cuenta con descripción de los riesgos, ni su valoración para realizar análisis respectivo.

5.8 Plan de la Gestión de las Adquisiciones

En el plan de calidad se especifica que se cuenta con un procedimiento de Compras. Las compras de los insumos y servicios para la ejecución del proyecto serán realizadas por CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024 y/o subcontratistas autorizados involucrados en la ejecución del contrato de obra.

En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Todos los subcontratos serán gestionados por el director de obra y residente de obra.

Los proveedores utilizados en contratos anteriores de la zona y con experiencia en obras civiles.

5.9 Plan del Involucramiento de los Interesados

Estrategias o enfoques para involucrar a individuos o grupos de interesados.

- Serán definidas de común acuerdo con la interventoría del contrato en caso que se necesiten como requisitos del contrato principal.
- Las estrategias para el involucramiento con los ciudadanos están definidas en los documentos contractuales.

6 Líneas Base

6.1 Línea Base del Alcance

Enunciado del Alcance del Proyecto.

El alcance del proyecto fue definido por la INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA en el Anexo de condiciones de la siguiente manera:

- Realizar la obra pública de CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, según las especificaciones detalladas en el anexo técnico que hace parte del presente proceso contractual, respetando ítems, cantidades, calidades, planos, normas y demás requisitos allí exigidos.

- Desarrollar el objeto, en el plazo fijado, de conformidad con las especificaciones y condiciones técnicas establecidas por la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, con los valores planteados en la oferta económica, así como las demás disposiciones legales.

- Reemplazar los insumos, o cualquier elemento del suministro que resulte defectuoso en el momento de su instalación, de acuerdo a las condiciones de calidad, y según las especificaciones técnicas de la obra.

- Sin prejuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y recomendaciones que le efectúe la entidad por intermedio del Supervisor designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución contractual, al igual que las recomendaciones que efectúe el interventor.


- Informar oportunamente al Interventor como al Supervisor del contrato sobre los obstáculos, problemas o sugerencias que encuentre en el desarrollo del contrato.

- Las demás que sean inherentes al objeto contractual.

Las actividades y obras ejecutadas dentro del alcance del proyecto y que se encuentran recibidas por interventoría, se adjuntan en los formatos de actas y memorias de calculo que hacen parte integral del informe técnico.

6.2 Línea Base del Cronograma

El cronograma y/o programación de obra se encuentra aprobado por la interventora, y con este insumo importante se hace el seguimiento semanal. para el presente informe, se hace un compilado del seguimiento con línea base a fin de cada uno de los meses, con las observaciones que arroja dicho análisis.

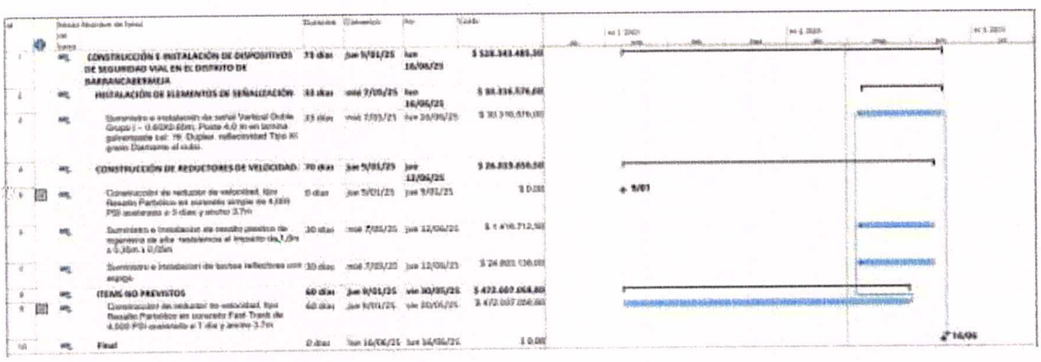

Se establece una línea base en la programación en Microsoft Project, con una fecha de estado del 25 de abril de 2025, encontrando que a la fecha de corte se tiene un costo presupuesto del trabajo programado (CPTP): $198.144.630, el cual fue superado por la ejecución del ítem 3.01 Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m.


6.3 Línea Base de Costos

La línea base de los costos es el presupuesto aprobado por el Municipio con la propuesta del contratista a través de la INPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE

BARRANCABERMEJA, de acuerdo a los avances se hace una medición de los costos de los mismos, encontrando que a la fecha se encuentran dentro del presupuesto sin necesidad de adiciones en recursos.


A continuación, se presenta el flujo de caja con el valor planeado o CPTP (Costo presupuestado del trabajo programado), Este es el costo (o línea de base) presupuestado de tareas estimado al inicio del plan de proyecto, basado en los costos de Recursos asignados a dichas tareas, más cualquier coste fijo asociado a las tareas, hasta la fecha de estado es decir 25 de abril de 2025, obteniendo:

Que el valor programado corresponde a $198.144.630,00 valor que refiere al valor parcial del contrato, el cual contrasta con un valor real ejecutado de $215.246.724,00, lo cual informa que hay una diferencia del 3,24% en el avance de ejecución, siendo la actividad que apalanca el avance la Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m.

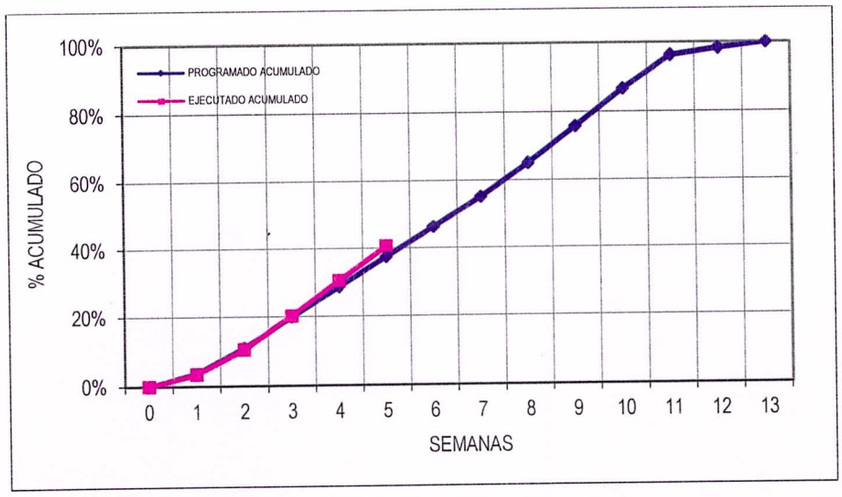

Grafica de avance físico del contrato

DIAG. 62 # 43-151 B. LAS GRANJAS
TELEFAX. 6102194 - CEL. 312 548 6349 BARRANCABERMEJA – SANTANDER

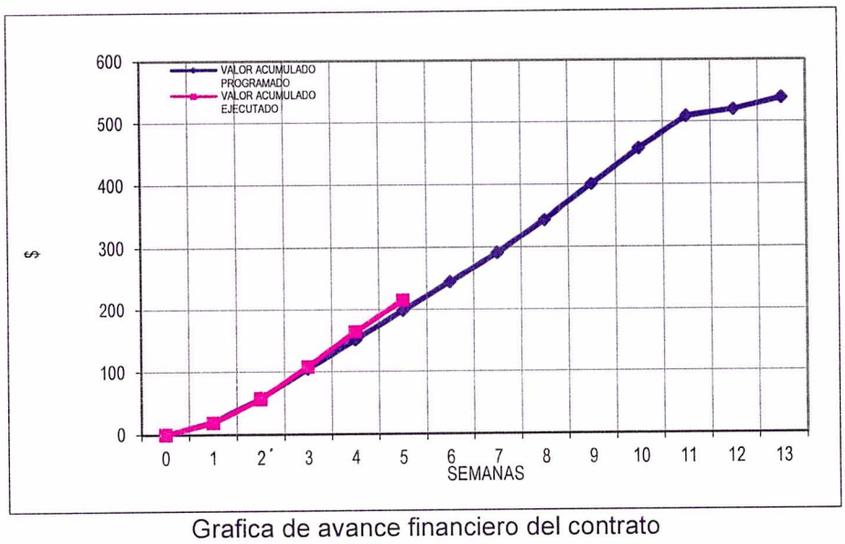

Grafica de avance financiero del contrato

SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
0	0,00%	0,00%
1	3,72%	3,50%
2	10,98%	10,60%
3	19,82%	20,10%
4	28,66%	30,50%
5	37,50%	40,74%

7 Componentes adicionales

7.1 Plan de Gestión de Cambios

Si por circunstancias previamente revisadas y aprobadas por el INTERVENTOR y validadas por la ITTB, se requiere modificar el contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y procedimientos establecidos en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos vigentes durante la ejecución del Contrato.

Con respecto a lo anterior, el contrato presentó una modificación de fecha 4 de abril de 2025, quedando de la siguiente manera:

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/PARCIAL	CANT	V/PARCIAL
1,0	INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN						
1,01	Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lamina galvanizada cal. 16 Duplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	UND	109,00	$ 891.664,00	$ 97.191.376,00	92,00	$ 82.033.088,00
				Subtotal =	$ 97.191.376,00		$ 82.833.088,00

2,0	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD.						
2,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 3 días y ancho 3,7m	ML	206,20	$ 1.686.649,00	$ 347.787.023,80	0,00	$ 0,00
2,02	Suministro e Instalacion de resalto plastico de ingenieria de alta resistencia al impacto de 1,0m x 0,35m x 0,05m	ML	184,50	$ 314.825,00	$ 58.085.212,50	166,00	$ 52.260.950,00
2,03	Suministro e instalacion de tachas reflectivas con espigo	UND	840,00	$ 30.114,00	$ 25.295.760,00	584,00	$ 17.586.576,00
				Subtotal =	$ 431.167.996,30		$ 69.847.526,00
3,0	ITEMS NO PREVISTOS						
3,01	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto Parbólico en concreto simple de 4,000 PSI acelerado a 1 días y ancho 3,7m	ML	0,00	$ 2.021.096,00	$ 0,00	166,10	$ 335.704.045,60
				Subtotal =	$ 0,00		$ 335.704.045,60
				SUBTOTAL OBRAS			$ 487.584.659,60
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT). ITEM NO PREVISTO			$ 40.768.803,10
				COSTO TOTAL	$ 528.359.372,30		$ 528.353.462,70

7.2 Plan de Gestión de la Configuración

Con respecto a este plan de gestión de la configuración, es de aclarar que aunque el proyecto, tiene bien definido el alcance y cada actividad cuenta con las especificaciones, también es cierto que a medida que surjan los ítems no previstos, los mismos serán objeto de elaboración de nuevas especificaciones, las cuales serán revisadas y complementadas por la interventoría, para que de esa manera se complemente la aprobación de los ítems no previstos que requiera el proyecto.

En cuanto a la planificación del presente contrato, se estableció un plazo de ejecución de un mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, para lo cual en el ejercicio de las intervenciones y de acuerdo a las razones que motivaron la solicitud de ampliación en tiempo, esta configuración cambia, llevando al contrato a una extensión de su plazo, terminando ahora con un lapso de ejecución de tres (3) meses, para dar fiel cumplimento al objeto contractual. De acuerdo a lo anterior, la supervisión del contrato recomienda esta ampliación en plazo, generándose así el documento acta de adicional al plazo No.1, adjunta en el informe técnico.

7.3 Línea Base Para la Medición del Desempeño

El CRONOGRAMA DE TRABAJO aprobado por la interventoría y aceptado por la ITTB es la Línea Base sobre la cual se efectúa el seguimiento y control del avance del proyecto durante su ejecución. La línea base para la fecha de corte del presente informe presenta un 37,50% de avance programado contra un 40,74% de avance ejecutado.

7.4 Ciclo de vida del proyecto

En el plan de Calidad se establece que las etapas del ciclo de vida serán: Planeación, Ejecución y Control.

8 Enfoque de desarrollo.

Para el desarrollo del proyecto se eligió un modelo predictivo, definido el modelo en el programa de gerencia de proyectos y con los datos recolectados, se puede evidenciar que el proyecto tuvo un inicio con un rendimiento en crecimiento, dado que se trata de una obra de impacto en la dinámica del tráfico vehicular y que, en su medida, se han tomado las acciones correctivas que le permitan al proyecto, continuar en su ejecución.

Para el mes de abril de 2025, se encuentra que el avance es de acuerdo a la programación, y que en este periodo se establece como prioridad avanzar en la ejecución de las actividades representativas tales como el de la construcción de resaltos en concreto, para de esta manera superar los porcentajes planeados y cumplir en el plazo con el objeto contractual.

9 Revisiones de la gestión

En el Cronograma se establece la manera en la que se le realizará el seguimiento a la ejecución de las actividades de obra del proyecto, durante la ejecución de la obra, se cumple con las expectativas, estableciendo que mecanismos y planes que trazaron la mejor ruta para realizar las intervenciones que permitieron el cumplimiento en los plazos establecidos en el contrato 137-2024.

CONTRATISTA

CONSORCIO DISPOSITIVOS SEGURIDAD VIAL BARRANCABERMEJA 2024

Firma:

Jorge Trujillo Niño
Representante legal

PROFESIONAL RESPONSABLE

Firma:

María Fernanda Delgado Pardo

María Fernanda Delgado Pardo
Especialista en Gerencia de Proyectos
