AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	24 de diciembre de 2024
Semana No.	**23**	**Del :**	16 de diciembre de 2024	**al**	22 de diciembre de 2024

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	159	días	**Tiempo restante**	297 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	34,87%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,70%	35,49%	**(%) Ejecutado**	2,452%	24,16%
Valor programado ($)	$41.964.804,82	$877.167.108,41	**Valor ejecutado ($)**	$60.608.360,00	$597.083.490,19
			Porcentaje Adelanto/Atraso		-11,33%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 280.083.618,22

OBSERVACIONES

De acuerdo con la programación, a continuación se detallan las actividades sin iniciar, las ya iniciadas pero que no han culminado

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**71,37%**	**46,78%**	**-24,59%**	**en ejecución**
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100,00%	137,90%	**37,90%**	**en ejecución - mayor cantidad**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100,00%	64,10%	**-35,90%**	**en ejecución - con retraso**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100,00%	58,99%	**-41,01%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100,00%	37,68%	**-62,32%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 20 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	48,74%	**-51,26%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) (incorporador de aire al 6%) cubierta	92,31%	0,00%	**-92,31%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	33,33%	**-66,67%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Piso en adoquin referencia Piazza liso 15 x 15. (incluye cama de arena de 5 cm)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**en ejecución - con retraso**
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).	100,00%	44,62%	**-55,38%**	**en ejecución - con retraso**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**100,00%**	**3,06%**	**-96,94%**	**en ejecución - con retraso**
TUBERIA PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
S/CODO PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
CODO PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
YEE PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
TEE PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
UNIÓN PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO LAVAMANOS 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO SIFÓN 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
TRAGANTE 4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	100,00%	7,81%	**-92,19%**	**en ejecución - con retraso**
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
RETIRO DE SOBRANTES	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
SUMINISTRO Y CONFORMACION ARENA DE PEÑA	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO SIFÓN 4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**

Equipo Hidroneumático 1 hp 60 Litros Horizontal Horiz	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
VÁLVULA DE CORTE 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BRIDA 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
CHEQUE 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TUBERIA PVC-P 1"	100,00%	95,75%	-4,25%	en ejecución - con retraso
CODO PVC-P 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TEE PVC-P 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
ADAPTADOR MACHO 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
CODO PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TEE PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
UNIÓN PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO DUCHA 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**66,50%**	**0,00%**	**-66,50%**	**sin iniciar**
Suministro e instalacion de Alimentador 3x350N + 4/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalacion de Alimentador 3x350F + 4/0N + 4/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 350 MCM Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Bajante apantallamiento 1/0 AWG Cu - 3/4" IMC	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra apantallamiento (sin soldadura, ni electrodo) incluye grapa de conexión bimetalica y curva IMC 3/4	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	50,00%	0,00%	-50,00%	sin iniciar

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ:
1. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS No.20
2.RADICACIÓN ACTA DE COBRO 01 DE OBRA Y 05 DE INTERVENTORÍA
3. VISTO BUENO A AJUSTE PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

ACTIVIDADES DIARIAS

LUNES 16 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Corte, figurado y armado de acero para vigas de cimentación. * Relleno y compactación con apisonador tipo Canguro. * Ingreso de materiales de construcción, Gravilla 15.5
MARTES 17 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Armado de encofrado para vigas de cimentación * Figurado de acero * Relleno y compactación con apisonador tipo canguro * Evacuación de aguas con motobomba de 2" * Levante de cajas de registro en zona verde. * Ingreso de 3 trabajadores nuevos. Ingreso de materiales de construcción (42 tablas) - 18 de 2x1x3 mt - 24 de 2x2x3 mt
MIÉRCOLES 18 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Construcción de cajas de registro. * Armado de encofrado para vigas de cimentación
JUEVES 19 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 6:00 PM	* Fundida de Vigas de cimentación concreto 3000 PSI * Construcción y levante de cajas de registro. * Toma de muestra de concreto para prueba de cilindros.
VIERNES 20 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Excavación de Canalización. * Levante de Registro en zona verde. * Desencofrado de vigas de cimentación. * Manejo de Aguas. * Intalación de 8 tubos de 4"
SÁBADO 21 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 12:00 PM	* Excavación de Registros. * Relleno y compactación en el área de subestación con pison manual.
DOMINGO 22 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Lunes 16/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “prevencion de las lesiones osteomusculares”
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de corte, figurado y armado de acero para vigas de cimentación
- Se realiza socialización - programación de vuelos
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de seguridad
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de relleno y compactación

Martes 17/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Exposicion al ruido”
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de armado de encofrado para vigas de cimentación
- Se realiza apoyo SST durante la actividad de levante de cajas de registro en zona verde
- Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de Figurado de acero
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de seguridad

Miércoles 18/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Exposicion ambiental”
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza apoyo SST durante la actividad de armado de encofrado para vigas de cimentación
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de construcción de cajas de registro
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de seguridad

Jueves 19/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "El agua y la seguridad en el trabajo"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Fundida de Vigas de cimentación concreto 3000 PSI
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de construcción y levante de cajas de registro
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad defundida de solado
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Viernes 20/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Residuos en obra"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Excavación de Canalización
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de desencofrado de vigas de cimentación
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Sábado 21/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Prevencion y manejo de accidente ofidicos"
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de relleno y compactación en el área de subestación con pison manual
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Excavación de Registro

Domingo 22/12/2024
- Día no laborado

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO		
Actividad en Obra	**Programa de manejo ambiental**	**Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra**
1. Relleno y compactación con apisonador tipo canguro. **2.** Corte, figurado y armado de acero. **3.** Fundida de viga de cimentación concreto 3000 PSI. **4.** Ingreso de material de construcción (gravilla y madera). **5.** Trasiego de materiales. **6.** Construcción de caja de registro **7.** Armado de encofrado para vigas de cimentación. **8.** Desencofrado de viga de cimentación. **9.** Evacuación de agua de canalización con motobomba de 2"	**MANEJO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN - MACA-** **MACA #3 - Manejo de cortes, rellenos y ZODMES(Movimiento de Tierra)** **MACA # 4 - Manejo de material de Construcción** **MACA # 7 - Señalización en áreas de Construcción**	**1. **Almacenamiento temporal de materiales**** Los materiales de construcción en el sitio de obra se resguardan mediante un cerramiento provisional cubiertos y demarcados que incluye cinta de advertencia, malla de protección, señalización conforme al programa establecido de seguridad y señalización, garantizando la prevención de riesgos asociados. **2. **Manipulación segura de materiales**** La manipulación de materiales se realiza de manera controlada, asegurando que no representen peligro para los transeúntes, el personal de obra y terceros, al tiempo que se evitan impactos negativos sobre los elementos ambientales circundantes. **3. **Demarcación de áreas de advertencia**** Las áreas de trabajo se señalizan , de acuerdo con las normativas de seguridad, para delimitar zonas críticas y evitar accesos no autorizados. **4. ** Manejo de cortes, rellenos y ZODMES (Movimiento de Tierra)** El material removido resultante de los cortes y excavaciones en el área de subestación fue utilizado para la conformación de los rellenos, compactando cada 20cm con pison, con el objeto de afectar lo menos posible el suelo y el subsuelo del área del proyecto.
10. Actividad de limpieza y organización del área de trabajo. **11.** Capacitación sobre control y manejo de fauna presente en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha.	**Ficha EA-1 - Subprograma Educación Ambiental**	**5. ** Limpieza y organización del área de trabajo**** Con el próposito de mantener un ambiente seguro, saludable, mejorar la productividad y el bienestar de los empleados se programó para el día sábado 21 de diciembre del 2024 la organización del container que contiene los materiales de construcción y la segregación de la madera utilizada para el encofrado zapatas y pedestales, para su recuperación y reutilización, en aras de darle un manejo ambientalmente adecuado. **6. ** Capacitación sobre el control y manejo adecuado de fauna presente en el Aeropuerto Almirante Padilla**** Debido a las manifestaciones de los trabajadores sobre avistamientos y encuentros frecuentes en el área de trabajo y construcción de la subestación eléctrica con serpientes, se dá a conocer por parte de la residente ambiental de interventoría esta situación a la biologa Daniela Rodríguez, quién hace parte del área encargada de control y manejo de fauna de la Aerocivil, con el próposito de aplicar las medidas de manejo adecuadas para tal eventualidad de acuerdo al protocolo establecido por la entidad aeroportuaria. Por ello, se programó y realizó el día sábado 21 de diciembre del 2024, previo al desarrollo de las actividades constructivas, una capacitación dirigida por la biologa al personal del proyecto, espacio en el cual les compartió información relacionada al tipo de serpientes avistadas, siendo estas una especie de poco riesgo para el ser humano al no ser venenosa, solo cazadora de roedores, sin embargo, compartió recomendaciones para el manejo y prevención de accidentes ofídicos(mordedura de serpientes), relacionando la importancia de mantener los Elementos de Protección Personal (EPP) y establecer el orden y aseo en el área de trabajo, además como medida de ahuyentamiento se exparcirá Creolina diluida por el área de container para evitar el acercamiento y lograr el alejamiento de las especies sin causarles daños, manteniendo así los cuidados al personal de obra y el equilibrio ambiental del entorno. personal encargado de control y manejo de fauna de la Aeronautica Civil, quienes para el día sábado 21 de diciembre del 2024, realizan una capacitación en cabeza de la biologa Daniela Rodriguez
12. Evacuación de residuos sólidos no aprovechables generados en obra.	**Ficha PGR - 4 - Subprograma Gestión de Residuos Sólidos.**	**7. ** Disposición final de Residuos sólidos no aprovechales **** Se realizó acompañamiento en la evacuación de 2.5 kg de residuos sólidos no aprovechables, los cuales fueron dispuestos en el punto de almacenamiento temporal del aeropuerto para ser posteriormente recogidos por la empresa prestadora del servicio municipal Interaseo, en aras de prevenir impactos ambientales y al ser humano asociados a la acumulación, manejo inadecuado o retención en obra de los mismos.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


1. SE ADELANTA LA FUNDIDA DE TODAS LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN DE LA SUBESTACIÓN
2. LLENO SELECCIONADO HAST NIVEL DE PLAVA DE CONTRAPISO
3. CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN
4. CONSTRUCCIÓN CAJAS DE REGISTRO CANALIZACIÓN


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
NA	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Apisonador tipo canguro:** 1 **Mezcladora de concreto:** 1 **Taladro Pecutor: 1**
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	11
Total Personal	17





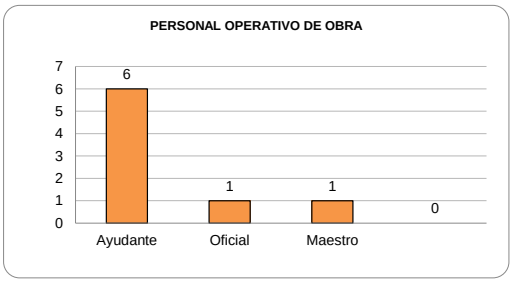

CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. CS. UAAC-INT-518-089-2024 Solicitud de ajustes a los informes semanales 20 y 21 de CONSTRUCARIBE 2024
2. CS. UAAC-INT-518-090 -2024 Solicitud plan de contingencia
3. CS. UAAC-INT-518-091-2024 Entrega de Informe semanal No 22 elaborado por la interventoría
4. CS. UAAC-INT-518-092-2024 Observaciones generales informe mensual 4:
5. CS. UAAC-INT-518-093-2024 Observaciones generales al reporte de información correspondiente a las acciones ambientales ejecutadas en obra
6. CS. UAAC-INT-518-094-2024 Entrega acta de cobro de interventoría No. 04 período del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024
7. CS. UAAC-INT-518-095-2024 Entrega acta cobro interv. 05

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72.340.149,00
Total Acumulado	**$ 72.340.149,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 72.340.149,00
% Avance facturado Acumulado
2,93%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27.115.133,00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11.466.118,00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11.466.118,00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11.466.118,00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27.984.159,00
Total Acumulado	**$ 89.497.646,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 89.497.646,00
% Avance facturado Acumulado
10,46%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



corte, figurado y armado de vigas de cimentación





Armado de encofrado para vigas de cimentación




Fundida de Vigas de cimentación concreto 3000 PSI





Vigas de cimentación fundidas

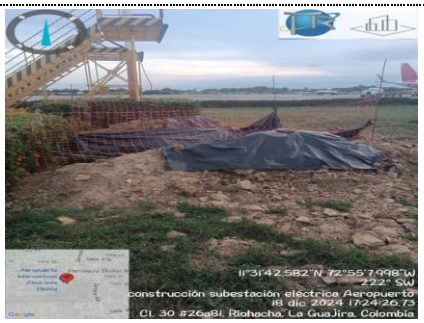 	 
Construcción de registro #3 ubicado en Area verde	Mejoramiento de excavaciones para registros e instalación de tubos de 4"
 	 
Desencofrado y segregación de tablas usadas en el proceso de fundida de vigas de cimentación.	Uso de plástico para evitar causar impactos ambientales al suelo, aire y vegetación.
 	 
Pesaje de residuos sólidos no aprovechables y posterior disposición en punto de almacenamiento temporal cerca a la entrada Alfa 4 para su recolección.	Capacitación y orientación sobre el control y manejo de fauna presente en el aeropuerto dirigida por la biologa de La Aerocivil Daniela Rodriguez.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
se observan mejoras en los rendimientos y avances de obra, sin embargo los plazos de retraso se mantienen, por lo que el plan de contingencia debe ajustarse para recuperar el retraso en menor tiempo.	ING. OMAR TRIGOS LACERA
