AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS **FECHA:** 31 de diciembre de 2024

Semana No. 24 **Del :** 23 de diciembre de 2024 **al** 29 de diciembre de 2024

Plazo total 456 días

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 166 días **Tiempo restante** 290 días

Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato 36,40%

Nombre del Supervisor : OMAR ESTEVEZ ROJAS

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,18%	36,67%	**(%) Ejecutado**	0,011%	24,17%
Valor programado ($)	$29.110.753,64	$906.277.862,05	**Valor ejecutado ($)**	$264.384,00	$597.347.874,19
			Porcentaje Adelanto/Atraso		-12,50%
			Evaluación	**Valor Adelanto/Atraso**	-$ 308.929.987,86

OBSERVACIONES

De acuerdo con la programación, a continuación se detallan las actividades sin iniciar, las ya iniciadas pero que no han culminado

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**74,01%**	**45,21%**	**-28,80%**	**en ejecución**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Localización y replanteo con equipo topográfico	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Cerca en tela verde H= 2.10 m	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Campamento 18 M2	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad	100,00%	106,86%	**6,86%**	**en ejecución - mayor cantidad**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecánicamente al 95% PM	100,00%	64,10%	**-35,90%**	**sin iniciar**
Cargue manual, transporte y disposición final de escombros a una distancia máxima de 10 km	100,00%	58,99%	**-41,01%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100,00%	37,68%	**-62,32%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de concreto de ciclópeo de 2500 psi relac.60c/40p	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 20 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	48,74%	**-51,26%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Construcción de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantía concreto = 0.31m3/m2 - según diseño) (no incluye acero de refuerzo) (incorporador de aire al 6%) cubierta	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aéreas. (No incluye refuerzo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	33,33%	**-66,67%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e máx. = 4.0 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Piso en adoquín referencia Piazza liso 15 x 15. (incluye cama de arena de 5 cm)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	35,29%	0,00%	**-35,29%**	**sin iniciar**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro e Instalación de Cámara subterránea (Estándar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Construcción de Canalización 4 ductos 4" PVC-TDP (Estándar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vías vehiculares).	100,00%	44,62%	**-55,38%**	**sin iniciar**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**100,00%**	**3,06%**	**-96,94%**	**sin iniciar**
TUBERIA PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
S/CODO PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
CODO PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
YEE PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
TEE PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
UNIÓN PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO LAVAMANOS 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
PUNTO SIFÓN 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
TRAGANTE 4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	100,00%	7,81%	**-92,19%**	**en ejecución - con retraso**
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**

SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
RETIRO DE SOBRANTES	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
SUMINISTRO Y CONFORMACION ARENA DE PEÑA	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO SIFÓN 4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Equipo Hidroneumático 1 hp 60 Litros Horizontal Horiz	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
VÁLVULA DE CORTE 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BRIDA 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
CHEQUE 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TUBERIA PVC-P 1"	100,00%	95,75%	-4,25%	en ejecución - con retraso
CODO PVC-P 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TEE PVC-P 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
ADAPTADOR MACHO 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
CODO PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TEE PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
UNIÓN PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
PUNTO DUCHA 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**69,95%**	**0,00%**	**-69,95%**	**sin iniciar**
Suministro e instalación de Alimentador 3x350N + 4/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de Alimentador 3x350F + 4/0N + 4/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 350 MCM Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Bajante apantallamiento 1/0 AWG Cu - 3/4" IMC	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra apantallamiento (sin soldadura, ni electrodo) incluye grapa de conexión bimetálica y curva IMC 3/4	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de bandeja porta cable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Tubería IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	66,67%	0,00%	-66,67%	sin iniciar

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ:
1.TRÁMITES DE INGRESO DE PERSONAL
2. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 21
3. REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO ENTREGA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES DIARIAS

LUNES 23 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Excavación de Registros. * Fundida de solado * Levantamiento de cajas de registros * Compactación de terreno con apisonador tipo canguro y pisón en canalización de jardín. * Manejo de Aguas en canalización de áreas verde con motobomba de 2" Se instalaron 12 Mts de tubería Hidráulica de 1"
MARTES 24 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Fundida de solado * Excavación de Registros * Levantamiento de cajas de registros. * Instalación de tuberías Hidráulicas 18 metros = 3 tubos de 1"
MIÉRCOLES 25 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DÍA FESTIVO - NO LABORAL
JUEVES 26 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 6:00 PM	* Excavación de Canalización. * Levante de Registro en zona verde. * Desencofrado de vigas de cimentación. * Manejo de aguas en canalización de áreas verde con motobomba de 2". * Instalación de 8 tubos de 4" en canalización, área subestación.
VIERNES 27 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Levantamiento de Registros * Excavación de Registros. * Fundido de Solado. * Trasiego de materiales
SÁBADO 28 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 12:00 PM	* Levantamiento de Registros. * Trasiego de materiales. * Ingreso de materiales 35 bultos de cemento. 2 tubos de 2" 3 tubos de 4" 2 sifón de 2" 1 codo de 2" 1 codo de 4" 20 varillas de 3/8 2 niveles 3 palustres 2 martillos 20 kilos de alambre 2 escuadras
DOMINGO 29 de diciembre de 2024	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Lunes 23/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “prevención de las lesiones osteomusculares”
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de Excavación de Registros
- Se realiza socialización - programación de vuelos
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de seguridad
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Fundida de solado

Martes 24/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Prevención de estrés laboral y riesgo psicosocial”
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Excavación de Registros
- Se realiza apoyo SST durante la actividad de Levantamiento de cajas de registros
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Instalación de tuberías Hidráulicas
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de seguridad

Miércoles 25/12/2024
- Dia no laboral

Jueves 26/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Salud ocupacional"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Excavación de Canalización
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de desencofrado de vigas de cimentación.
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Desencofrado de vigas de cimentación
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Viernes 27/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Impacto ambiental y responsabilidad"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Levantamiento de Registros
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Fundido de Solado
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Sábado 28/12/2024
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Trabajo en equipo"
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Levantamiento de Registros
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Trasiego de materiales

Domingo 29/12/2024
• Día no laborado

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1. Relleno y compactación con apisonador tipo canguro y pisón. **2.** Fundida de solado. **3.** Ingreso de material de construcción. **4.** Trasiego de materiales. **5.** Levantamiento de cajas de registros. **6.** Instalación de tuberías hidráulicas. **7.** Evacuación de agua en canalización con motobomba de 2".	**MANEJO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN - MACA-** **MACA #3 - Manejo de cortes, rellenos y ZODMES(Movimiento de Tierra).** **MACA # 4 - Manejo de materiales de Construcción.** **MACA # 5 - Manejo de aguas lluvias y drenajes naturales durante la construcción.** **MACA # 7 - Señalización en áreas de Construcción.**	**1. **Almacenamiento temporal de materiales**** Los materiales de construcción en el sitio de obra se resguardan mediante un cerramiento provisional cubiertos y demarcados que incluye cinta de advertencia, malla de protección, señalización conforme al programa establecido de seguridad y señalización, garantizando la prevención de riesgos asociados. **2. **Manipulación segura de materiales**** La manipulación de materiales se realiza de manera controlada, asegurando que no representen peligro para los transeúntes, el personal de obra y terceros, al tiempo que se evitan impactos negativos sobre los elementos ambientales circundantes. **3. **Demarcación de áreas de advertencia**** Las áreas de trabajo se señalizan , de acuerdo con las normativas de seguridad, para delimitar zonas críticas y evitar accesos no autorizados. **4. ** Manejo de cortes, rellenos y ZODMES (Movimiento de Tierra)**** El material removido resultante de los cortes y excavaciones en el área de subestación y en las zonas verdes fue utilizado para el cierre de las canalizaciones, luego de la instalación de las tuberías hidráulicas, compactando cada 20cm con pisón y apisonador tipo canguro, con el objeto de afectar lo menos posible el suelo y el subsuelo del área del proyecto. **5. ** Evacuación de aguas en canalizaciones de áreas verdes **** Debido a la ocurrencia de precipitaciones en los meses anteriores, por la temporada de lluvias, sumado a que en la zona de jardín o áreas verdes del aeropuerto existe una característica en los suelos de alto nivel de retención de aguas, al nivel de las excavaciones para canalización de tuberías se presenta una cantidad de agua retenida, la cual es evacuada con el uso de motobomba de 2" hacia el canal de aguas lluvias, durante el proceso se asegura que no se genere arrastre de material terreo.
8. Actividad de limpieza y organización del área de trabajo. **9.** manejo de fauna presente en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha.	**Ficha MACA #1 - Manejo ambiental para campamentos e infraestructura temporal.**	**5. ** Limpieza y organización del área de trabajo**** Con el propósito de mantener un ambiente seguro, saludable, mejorar la productividad y el bienestar de los empleados se programó para el día sábado 28 de diciembre del 2024 la organización del container que contiene los materiales de construcción y la segregación de la madera utilizada para el encofrado zapatas y pedestales, para su recuperación y reutilización, en aras de darle un manejo ambientalmente adecuado. **6. ** Apoyo en el control y manejo adecuado de fauna presente en el Aeropuerto Almirante Padilla**** Debido a la presencia de abejas africanizadas cerca al área donde se encuentra dispuesto el material de construcción, se solicitó apoyo a la unidad de bomberos de la Aerocivil, quienes se acercaron a la zona e identificaron las características de estas abejas, las cuales eran temporales, es decir, que no iban a permanecer en la zona, por lo tanto recomendaron detener las labores de trasiego de materiales en aras de proteger la integridad y salud de los trabajadores, hasta que las mismas abandonar el lugar, suceso que ocurrió en poco tiempo, luego se continúo con el trabajo programado.
10. Evacuación de residuos sólidos no aprovechables generados en obra.	**Ficha PGR - 4 - Subprograma Gestión de Residuos Sólidos.**	**7. ** Disposición final de Residuos sólidos no aprovechables **** Se realizó acompañamiento y direccionamiento en la evacuación de 2.5 kg de residuos sólidos no aprovechables, el día sábado 28 de diciembre, los cuales fueron dispuestos en el punto de almacenamiento temporal del aeropuerto para ser posteriormente recogidos por la empresa prestadora del servicio municipal Interaseo, en aras de prevenir impactos ambientales y al ser humano asociados a la acumulación, manejo inadecuado o retención en obra de los mismos.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


1. CANALIZACIÓN SALIDA DESDE SUBESTACIÓN
2. CONTRUCCIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN (REGISTROS) ELÉCTRICOS
3. INICIO CANALIZACIÓN PARALELA A BOMBEROS


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
NA	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Apisonador tipo canguro:** 1 **Mezcladora de concreto:** 1 **Taladro Percutor: 1**
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	17
Total Personal	23

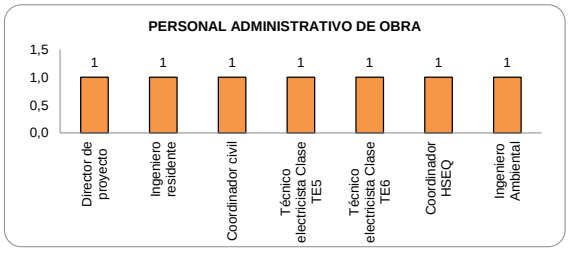



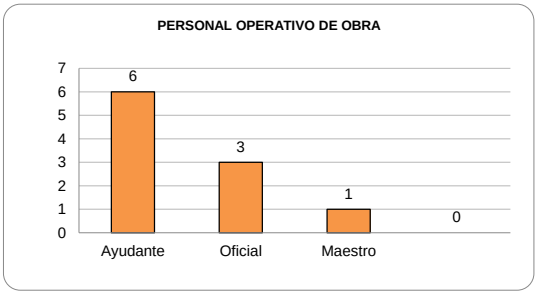

CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. CS. UAAC-INT-518-096-2024 Entrega de Informe semanal No 23 elaborado por la interventoría
2. CS. UAAC-INT-518-097-2024 Solicitud de ingreso Permanente

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72.340.149,00
Total Acumulado	**$ 72.340.149,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 72.340.149,00
% Avance facturado Acumulado
2,93%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27.115.133,00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11.466.118,00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11.466.118,00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11.466.118,00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27.984.159,00
Total Acumulado	**$ 89.497.646,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 89.497.646,00
% Avance facturado Acumulado
10,46%

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Excavación de registros en zonas verdes.





Fundido de solado en cajas de registro.






Levantamiento de cajas de registro.





Levantamiento de cajas de registro.



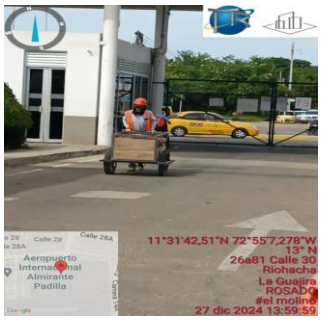

Trasiego de materiales.





Instalación de tuberías eléctricas e hidráulicas.





Reutilización de material excavado para el cierre de canalizaciones y perímetro de registros en zonas verdes y área de subestación.





Reutilización de material excavado para el cierre de canalizaciones en zonas verdes..





Pesaje de residuos sólidos no aprovechables y posterior disposición en punto de almacenamiento temporal cerca a la entrada Alfa 4 para su recolección.





Apoyo y presencia del cuerpo de bomberos Aeronáuticos y bióloga en la contingencia presentada con abejas en área de acopio de material.





Manejo adecuado de materiales en actividades de solado y levantamiento de registros con el propósito de evitar impactos asociados a las personas y ambientales.





Señalización del trazado de tuberías con cinta roja y cierre de registros con plástico al terminar actividades, para evitar impactos asociados a la integridad de las personas y al ambiente.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se presentan bajos rendimientos que aduce le contratista obedecen a la temporada de fin de año, pero que afecta la ejecución de las obras y la nivelación de la obra. La interventoría indica al contratista el procedimiento de informe de presunto incumplimiento del contratista de obra.	ING. OMAR TRIGOS LACERA
