AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	11 de febrero de 2025
Semana No.	**30**	**Del :**	3 de febrero de 2025	**al**	9 de febrero de 2025

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	208	días	**Tiempo restante**	248 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	45,61%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal		Acumulado
(%) Programado	2,21%	46,04%	**(%) Ejecutado**	1,980%		29,13%
Valor programado ($)	$54.537.641,83	$1.137.930.949,37	**Valor ejecutado ($)**	$48.932.726,15		$720.094.951,19
			Evaluación		**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-16,90%
					Valor Adelanto/Atraso	-$ 417.835.998,18

OBSERVACIONES

De acuerdo con la programación, a continuación se detallan las actividades sin iniciar, las ya iniciadas pero que no han culminado

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**99,06%**	**62,24%**	**-36,82%**	**en ejecución**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Localización y replanteo con equipo topográfico	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Campamento 18 M2	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Dia de trasiego - 2 ayudantes	42,86%	16,67%	**-26,19%**	**en ejecución - con retraso**
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100,00%	101,95%	**1,95%**	**en ejecución - mayor cantidad**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100,00%	77,36%	**-22,64%**	**en ejecución - con retraso**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100,00%	87,08%	**-12,92%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	90,14%	**-9,86%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 - según diseño) (no incluye acero de refuerzo) (incorporador de aire al 6%) cubierta	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**terminada**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e max = 4.0 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Piso en adoquin referencia Piazza liso 15 x 15. (incluye cama de arena de 5 cm)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Única, Formato (0,56 M x 0,56 M).	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Guardaescobas en PVC Blanco h = 8.5 cms	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Estuco plastico acrilico	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en acero inoxidable tipo manija, pintadas en bases y acabados catalizados.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza, cerradura tipo manija en acero inoxidable	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su instalación). No incluye fluxómetro	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica entrada posterior para fluxómetro REF. REF 113121001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su instalación). No incluye fluxómetro	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de orinal alongado, conexión superior 0,5 GPD. Importado Toto. 5-AA-UT104E#01. No incluye fluxometro	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación grifería con sensor city - sku: KG25CR048	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable Referencia 706590001	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de ducha antivandalica con regadera Tubular - REF. 754000001 O SIMILAR	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación dispensador de jabón 1.2 LT cuerpo en acero inoxidable REF- 217601 (incluye accesorios de fijación)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel higiénico para rollo institucional en acero inoxidable (incluye accesorios de fijación) Ref. 706670001	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**sin iniciar**

Suministro, transporte e instalación de Dispensadores de toallas para manos en acero inoxidable. REF 706150001. (incluye accesorios de fijación)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Cañuela prefabricada Tipo A-120	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y respaldo de batería de 90 minutos, Dimensiones: 38 cms x 14 sistema de instalación a pared. (Inc	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100,00%	87,50%	-12,50%	en ejecución - con retraso
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).	100,00%	95,77%	-4,23%	en ejecución - con retraso
Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Mobiliario sala de turno	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Mobiliario Taller	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Mobiliario de oficina	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**100,00%**	**4,64%**	**-95,36%**	**sin iniciar**
Tuberia pvc-s 2"	100,00%	21,05%	-78,95%	en ejecución - con retraso
S/codo pvc-s 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Codo pvc-s 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Yee pvc-s 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tee pvc-s 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Unión pvc-s 2"	100,00%	35,29%	-64,71%	en ejecución - con retraso
Punto lavamanos 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto sifón ducha 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto sifón 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Válvula antiretorno 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tragante 4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Excavacion en conglomerado	100,00%	7,78%	-92,22%	en ejecución - con retraso
Relleno con material seleccionado de la excav.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro y conformacion con recebo	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Retiro de sobrantes	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro y conformacion arena de peña	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto sifón 4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Válvula antiretorno 2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Equipo Hidroneumático 1 hp 60 Litros Horizontal Horiz	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Válvula de corte 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Brida 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Cheque 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tuberia pvc-p 1"	100,00%	66,89%	-33,11%	en ejecución - con retraso
Codo pvc-p 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tee pvc-p 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Adaptador macho 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Codo pvc-p 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Tee pvc-p 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Adaptador macho 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Unión pvc-p 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto sanitario 1-1/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto lavamanos 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Punto ducha 1/2"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**92,57%**	**0,46%**	**-92,10%**	**en ejecución - con retraso**
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100,00%	6,25%	-93,75%	en ejecución - con retraso
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Bajante apantallamiento 1/0 AWG Cu - 3/4" IMC	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra apantallamiento (sin soldadura, ni electrodo) incluye grapa de conexión bimetalica y curva IMC	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4".	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa. Incluye certificación.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar

Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales desmontables, Ranuras superiores de ventiladores, 4 Ruedas, 4 Niveladores, 8 Llaves	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorizacion de 12 hilos de fibra.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalacion de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
Suministro e instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 × 1080.	75,00%	0,00%	-75,00%	sin iniciar
Suministro e instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.	100,00%	0,00%	-100,00%	sin iniciar
TERMINACIÓN Y ENTREGA	**25,00%**	**25,00%**	**0,00%**	**En ejecución**
ENTREGA PRIMERA FASE	100,00%	100,00%	0,00%	terminada

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978,00
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	$ 0,00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ:
1.TRÁMITES DE INGRESO DE PERSONAL
2.TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIAL
3.TRAMITES DE INGRESO Y SALIDA DE EQUIPOS
4.REVISIÓN Y OBSERVACIONES SOBRE LOS PAZ Y SALVO DEL PERSONAL RETIRADO
5.ELABORACIÓN INFORME SEMANAL
6.ELABORACIÓN INFORME MENSUAL
7.REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA
8.ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ
9.COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 26

ACTIVIDADES DIARIAS

LUNES 3 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1.Trasiego de material. 2.Forrado e instalación de casetones 3.Armado de acero – vigas de amarre de placa superior. 4.Relleno de tubería sanitaria. 5.Instalación de tubería hidráulica – 6mts. 6. Excavación para canalización en área de bomberos (se realiza re excavación para darle nueva dirección hacía nueva caja proyectada). 7. Pulida de tapas de registros vaciadas. 8. Acabados de marcos para cajas de registros. 9. Ingreso de 16 m3 de grava 3/4".
MARTES 4 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 2:00 PM a 5:00 PM	1.Trasiego de material. 2.Excavación de canalización eléctrica – Último tramo hasta subestación principal en área de bomberos (re ubicación de tubería 4"). 3.Vaciado de concreto de 4000 PSI para 5 tapas de registros. 4.Se continua con la instalación y forrado casetones. 5. Pulida de tapas de registros vaciadas. 6. Acabado de marcos para cajas de registros. 7. Armado de acero para parrilla inferior (placa superior).
MIÉRCOLES 5 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Trasiego de material 2. Armado de parrilla inferior en placa superior. 3. Excavación de canalización eléctrica en zona de parqueaderos al frente de bomberos. 5. Instalación y acabados de marcos para tapas de cajas de paso eléctrica (Cuantas se terminaron ayer o en cuantas se trabajaron?) . 6. Instalación de tubería eléctrica (6 mts). 7. Instalación de tubería sanitaria (6 mts).
JUEVES 6 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Trasiego de material 2. Armado de parrilla inferior en placa superior. 3. Excavación de canalización eléctrica en zona de parqueaderos al frente de bomberos. 5. Instalación y acabados de marcos para tapas de cajas de paso eléctrica (Cuantas se terminaron ayer o en cuantas se trabajaron?) . 6. Instalación de tubería eléctrica (4.65 mts). 7. Instalación de tubería sanitaria (4.65 mts).
VIERNES 7 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Trasiego de material 2. Vaciado de concreto 4000 psi para placa superior. Nota: * Los trabajos de vaciado de concreto en placa superir finalizaron a las 20:30. * Trabajos de desarmado de tarima, desmonte de bomba de concreto 22:00.

SÁBADO 8 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 12:00 AM	*Organización y despeje de area. * Curado de concreto en placa superior.
DOMINGO 9 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Curado de concreto en placa superior.

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Lunes 03/01/2025
Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Riesgo biologico"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de instalacion de casetones.
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de excavacion
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de relleno de tuberia sanitaria
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Martes 04/01/2025
Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Riesgo electrico"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Excavación de canalización eléctricas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Vaciado de concreto de 4000 PSI para 5 tapas de registros.
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Miércoles 05/01/2025
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Actaos inseguros, condiciones inseguras"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Armado de parrilla inferior en placa superio
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de nstalación de tubería eléctrica (6 mts)
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Jueves 06/01/2025
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Socialización incidente de trabajo"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Armado de parrilla inferior en placa superior
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de trabajo en altura"
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Viernes 07/01/2025
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Socializacion fundida de placa"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de instalacion de linea de vida para vaciado de placa superior
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Vaciado de concreto 4000 psi para placa superio
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Sábado 08/01/2025
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Metodologia de las 5s"
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Curado de concreto en placa superior
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de trabajo en altura

Domingo 09/01/2025
- Curado de placa de concreto en placa superior

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1. Trasiego de material. **2.** Forrado e instalación de casetones. **3.** Instalación de tubería hidráulica – 6mts. **4.** Excavación para canalización en área de bomberos (se realiza re excavación para darle nueva dirección hacía nueva caja proyectada). **5.** Ingreso de 16 m3 de grava 3/4". **6.** Excavación de canalización eléctrica – Último tramo hasta subestación principal en área de bomberos (re ubicación de tubería 4"). **7.** Vaciado de concreto de 4000 PSI para 5 tapas de registros. **8.** Armado de parrilla inferior en placa superior. **9.** Vaciado de concreto 4000 psi para placa superior.	**MANEJO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN - MACA-** **MACA #2 - Remoción de cobertura Vegetal, descapote y disposición de suelos.** **MACA #3 - Manejo de cortes, rellenos y ZODMES (Movimiento de Tierra).** **MACA # 4 - Manejo de materiales de Construcción.** **MACA # 6 - Control de la contaminación en Construcción.** **MACA # 7 - Señalización en áreas de Construcción.**	**1. **Almacenamiento temporal de materiales**** Los materiales de construcción en el sitio de obra se resguardan mediante un cerramiento provisional cubiertos y demarcados que incluye cinta de advertencia, malla de protección, señalización conforme al programa establecido de seguridad y señalización, garantizando la prevención de riesgos asociados. **2. **Manipulación segura de materiales**** - La manipulación de materiales se realiza de manera controlada, asegurando que no representen peligro para los transeúntes, el personal de obra y terceros, al tiempo que se evitan impactos negativos sobre los elementos ambientales circundantes. - La mezcla de concreto para las tapas de registro se realizan sobre plastico negro de alta resistencia con el proposito de aislar el suelo y evitar contaminación y daños asociados al mismo. - La mezcla de concreto para el vaciado de la placa se realizó con maquinaria de construcción que minimizó los impactos ambientales como la minimización de material particulado. **3. Control de la contaminación en Construcción.** Durante el proceso de vaciado de concreto 4000 PSI, es inevitable la generación de material particulado,por esto con el propósito de minimizar este impacto ambiental y evitar daños asociados a la integridad de trabajadores, vecinos del aeropuerto, trabajadores y pasajeros se utilizó maquinaria de construcción (bomba estacionaria de concreto), la cual permite minimizar la expansión de polvillo, igualmente se tomaron otras medidas como la adecuación de plastico negro de alta resistencia en la malla perimetral para evitar afectacción a las comunidades vecinas del aeropuerto, también se humedece el área al momento del barrido y limpieza. **4. **Demarcación de áreas de advertencia**** Las áreas de trabajo se señalizan , de acuerdo con las normativas de seguridad, para delimitar zonas críticas y evitar accesos no autorizados. **5. ** Manejo de cortes, rellenos y ZODMES (Movimiento de Tierra)**** El material ZODMES removido en las canalizaciones en la unidad de bomberos es dispuesto al lado de las excavaciones, para posterior reutilización en el cierre de las mismas, luego de la instalación de tuberías electricas, hidráulicas y sanitarias.

7. Evacuación de Residuos sólidos	**PGR 1 - Manejo Integral de Residuos sólidos .**	**6. ** Evacuación de residuos solidos **** Se realiza evacuación de 4 kg de residuos sólidos no recicables y 1 kg de residuos sólidos reciclables el día viernes 07 de febrero del 2025, los cuales son dispuestos en el punto de almacenamiento temporal de residuos del aeropuerto Almirante Padilla, los residuos reciclables son retirados por la asociación de recicladores autorizada por el aeropuerto Corpecram quienes hacen selección los días martes, jueves y domingo y recolección los días lunes, miércoles y viernes.
8. Organización del frente de Obra. **9**. Acompañamiento al profesional ambiental del contratista en la charla sobre prevención de accidentes ofidicos (Mordedura de serpientes).	**EA-1 - Subprograma Educación Ambiental**	**7. ** Limpieza y organización del área de trabajo**** Con el propósito de mantener un ambiente seguro, saludable, mejorar la productividad y el bienestar de los empleados se realizó el día sábado 08 de febrero del 2025 la organización del frente de obra al finalizar la jornada laboral y el container que contiene almacenado los materiales de construcción. **8. ** Acompañamiento en Charla de Prevención de accidentes Ofidicos**** Debido al riesgo al que se encuentran expuestos los trabajadores por transitar en áreas del aeropuerto donde confluyen serpientes en su mayoría tipo cazadoras, el ingeniero ambiental del contratista, desarrolló una capacitación con el próposito que los trabajadores aprendieran a identificar los tipo de serpientes comunes en el área y prevenir accidentes por mordedura de las mismas, se enfatizó en el uso permanente de los Elementos de Protección Personal EPP, que permiten reducir este riesgo y se les indicó la reacción adecuada ante el avistamiento de cualquiera de estas especies, que incluye el no molestarlas ni atentar contra ellas, siempre y cuando no se este en riesgo la integridad de la persona, lo pertinente es hacer el reporte del avistamiento ante la biologa de Aerocivil a cargo del programa de control de fauna.

ACTIVIDADES TÉCNICAS

1.ARMADO DE ACEROS Y ENCOFRADO DE PLACA SUPERIOR:
• ARMADO DE ENTARIMADO, INSTALACION DE GATOS, ARMADO DE FORMALETAS Y CORTE DE ACERO PARA LOSA SUPERIOR.
• ARMADO DE TARIMA PARA INSTALACIÓN DE TROMPO.


2.CONCRETO Y ENSAYOS:
• VACIADO DE CONCRETO (4000 PSI) EN LOSA SUPERIOR
• ENSAYO SLUMP, TOMA Y ENVÍO DE CILINDROS A LABORATORIO PARA RESISTENCIA.


3.GESTIÓN Y SUPERVISIÓN:
• GESTIÓN DE PERMISOS PARA INGRESO DE MATERIAL Y EQUIPOS.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este periodo no se reporta el ingreso del vehículo	Para este periodo se reporta el ingreso de una bomba estacionaria de concreto	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Apisonador tipo canguro:** 1 **Mezcladora de concreto:** 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6 **Vibro de concreto**: 1
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	20
Total Personal	26

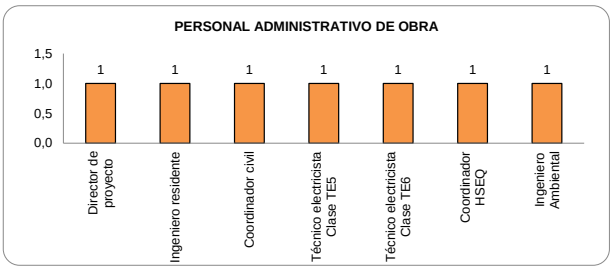

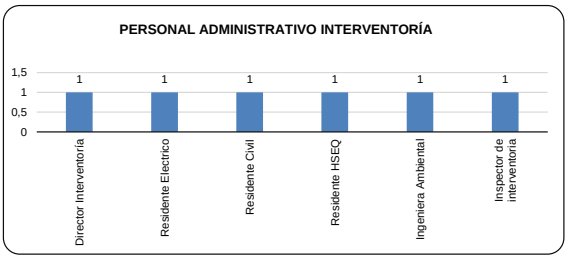

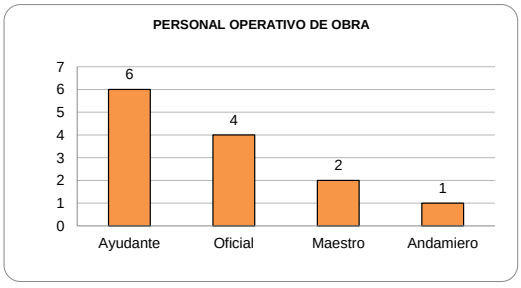

CORRESPONDENCIA ENVIADA

04/02/2025 **CS.UAAC-INT518-013-2025**, mediante el cual se hace entrega del Informe Semanal No. 29

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72.340.149,00
Total Acumulado	**$ 72.340.149,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 72.340.149,00
% Avance facturado Acumulado
2,93%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA


Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27.115.133,00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11.466.118,00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11.466.118,00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11.466.118,00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27.984.159,00
Total Acumulado	**$ 89.497.646,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 89.497.646,00
% Avance facturado Acumulado
10,46%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socializacion prevencion de lesiones en miembros inferior

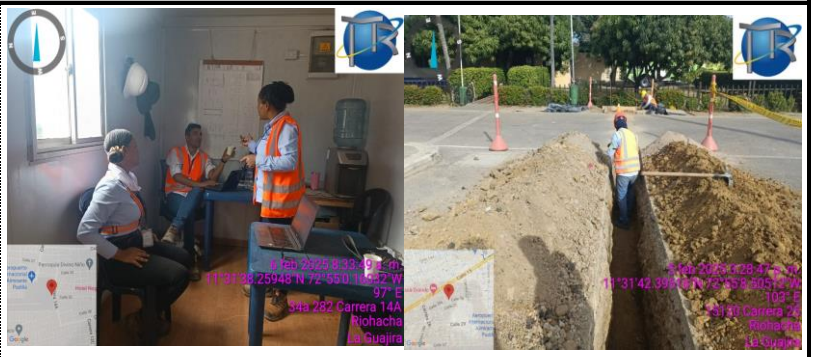

Charlas y acompañamiento SST durante las actividades programadas



Corrección de canalización al frente de bomberos para dirigir a nueva caja de paso proyectada.



Armado de parrilla en acero para placa superior.



Excavación e instalacion de tubería electrica y sanitaria en parqueadero area concesionada al frente de bomberos



Instalación de marcos y acabados en cajas de paso





Vaciado de concreto 4000 psi para placa superior.



Curado de concreto de placa superior.







Traslado de material ZODME removido de las excavaciones paralela a la unidad de bomberos hacia área de obra establecida para su almacenamiento.







Organización, pesaje y disposición adecuada de residuos reciclables y no reciclables en el centro de acopio de residuos sólidos del aeropuerto.








Medidas ambientales aplicadas para minimizar la generación de material particulado: cubrimiento de malla perimetral, humectación del área antes del barrido y cubrimiento de material de construcción (arena y recevo).







Organización del área de trabajo, almacenamiento de residuos según su clasificación (material vegetal, madera, residuos peligrosos y residuos)







Uso de bomba estacionaria de concreto, señalización de áreas intervenidas, cubrimiento de material excavado y de construcción.





Acompañamiento en charla sobre la prevención de accidentes ofidicos y señalización donde se indican las especies de serpientes frecuentes en el área que permite su identificación.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1- Progreso en la estructura: Se avanzó significativamente en el armado de acero, la instalación de tuberías y el vaciado de concreto, especialmente en la placa superior. 2- Trabajos de excavación y canalización: Se completaron excavaciones clave para la canalización eléctrica y sanitaria, incluyendo ajustes en el área de bomberos. 3- Actividades de acabados: Se dedicó tiempo a la pulida y acabados de tapas de registros y marcos, lo que indica una fase de detalles finales en ciertas áreas. 4- Curado del concreto: El curado de la placa superior fue una actividad crítica en los últimos días, asegurando la durabilidad de la estructura. Este periodo refleja un avance constante en la construcción, con énfasis en la preparación de la estructura principal y la instalación de sistemas clave (eléctricos y sanitarios).	**ING. OMAR TRIGOS LACERA**
