AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	25 de febrero de 2025
Semana No.	**32**	**Del :**	17 de febrero de 2025	**al**	23 de febrero de 2025

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	222	días	**Tiempo restante**	234 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	48,68%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA

	Semanal	Acumulado		Semanal		Acumulado
(%) Programado	6,13%	52,76%	**(%) Ejecutado**	0,311%		29,69%
Valor programado ($)	$151.535.720,00	$1.304.092.672,04	**Valor ejecutado ($)**	$7.680.862,00		$733.728.042,19
			Evaluación		**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-23,08%
					Valor Adelanto/Atraso	-$ 570.364.629,85

OBSERVACIONES

De acuerdo con la programación, a continuación se detallan las actividades sin iniciar, las ya iniciadas pero que no han culminado

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**100,00%**	**63,80%**	**-36,20%**	**En ejecución**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Localización y replanteo con equipo topográfico	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Campamento 18 M2	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Dia de trasiego - 2 ayudantes	100,00%	66,67%	**-33,33%**	**En ejecución - con retrasos**
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100,00%	77,36%	**-22,64%**	**En ejecución - con retrasos**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100,00%	87,08%	**-12,92%**	**En ejecución - con retrasos**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	92,58%	**-7,42%**	**En ejecución - con retrasos**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) (incorporador de aire al 6%) cubierta	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e max = 4.0 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Piso en adoquin referencia Piazza liso 15 x 15. (incluye cama de arena de 5 cm)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Única, Formato (0,56 M x 0,56 M).	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Guardaescobas en PVC Blanco h = 8.5 cms	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100,00%	4,24%	**-95,76%**	**En ejecución - con retrasos**
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Estuco plastico acrilico	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en acero inoxidable tipo manija, pintadas en bases y acabados catalizados.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza, cerradura tipo manija en acero inoxidable	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su instalación). No incluye fluxómetro	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica entrada posterior para fluxómetro REF. REF 113121001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su instalación). No incluye fluxómetro	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de orinal alongado, conexión superior 0,5 GPD. Importado Toto. 5-AA-UT104E#01. No incluye fluxometro	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación grifería con sensor city - sku: KG25CR048	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable Referencia 706590001	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de ducha antivandalica con regadera Tubular - REF. 754000001 O SIMILAR	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación dispensador de jabón 1.2 LT cuerpo en acero inoxidable REF- 217601 (incluye accesorios de fijación)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel higiénico para rollo institucional en acero inoxidable (incluye accesorios de fijación) Ref. 706670001	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de Dispensadores de toallas para manos en acero inoxidable. REF 706150001. (incluye accesorios de fijación)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Cañuela prefabricada Tipo A-120	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y respaldo de batería de 90 minutos, Dimensiones: 38 cms x 14 sistema de instalación a pared. (Inc	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100,00%	87,50%	**-12,50%**	**En ejecución - con retrasos**

Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario sala de turno	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario Taller	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario de oficina	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**100,00%**	**12,36%**	**-87,64%**	**En ejecución - con retrasos**
TUBERIA PVC-S 2"	100,00%	83,33%	**-16,67%**	**En ejecución - con retrasos**
S/CODO PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
CODO PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
YEE PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
TEE PVC-S 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
UNIÓN PVC-S 2"	100,00%	88,24%	**-11,76%**	**En ejecución - con retrasos**
PUNTO LAVAMANOS 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
PUNTO SIFÓN 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100,00%	100,00%	**0,00%**	**Terminada**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
TRAGANTE 4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	100,00%	7,78%	**-92,22%**	**En ejecución - con retrasos**
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
RETIRO DE SOBRANTES	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
SUMINISTRO Y CONFORMACION ARENA DE PEÑA	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
PUNTO SIFÓN 4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Equipo Hidroneumático 1 hp 60 Litros Horizontal Horiz	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
VÁLVULA DE CORTE 1"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
BRIDA 1"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
CHEQUE 1"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
TUBERIA PVC-P 1"	100,00%	66,89%	**-33,11%**	**En ejecución - con retrasos**
CODO PVC-P 1-1/4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
TEE PVC-P 1-1/4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
BUJE PVC-P 1-1/4" x 3/4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
ADAPTADOR MACHO 1-1/4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
CODO PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
TEE PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
UNIÓN PVC-P 1/2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
PUNTO DUCHA 1/2"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**100,00%**	**7,06%**	**-92,94%**	**En ejecución - con retrasos**
Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador Breaker regulable 50 A, 25 kA -220 V, 12 interruptores de 20 A, 2 interruptores de	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100,00%	8,10%	**-91,90%**	**En ejecución - con retrasos**
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100,00%	53,75%	**-46,25%**	**En ejecución - con retrasos**
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100,00%	60,00%	**-40,00%**	**En ejecución - con retrasos**
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Bajante apantallamiento 1/0 AWG Cu - 3/4" IMC	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra apantallamiento (sin soldadura, ni electrodo) incluye grapa de conexión bimetalica y curva IMC 3/4	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4".	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa. Incluye certificación.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales desmontables, Ranuras superiores de ventiladores, 4 Ruedas, 4 Niveladores, 8 Llaves	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorizacion de 12 hilos de fibra.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalacion de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 × 1080.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Disco Duro 8TB 3.5IN	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Panel control de acceso 4 puertas	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Terminal Multi-Biométrica	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalacion de electroiman para puerta 300 kg	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de Boton de salida (No Touch)	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**
ENTREGA SEGUNDA FASE	100,00%	0,00%	**-100,00%**	**Sin iniciar**

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes sin AIU - Solo IVA)	**4,45%**	**0,00%**	**-4,45%**	**Sin iniciar**
Tablero General Ayudas Visuales 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazar	77,78%	0,00%	-77,78%	**Sin iniciar**
Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para	100,00%	0,00%	-100,00%	**Sin iniciar**
TERMINACIÓN Y ENTREGA	**25,00%**	**25,00%**	**0,00%**	**En ejecución**
ENTREGA PRIMERA FASE	100,00%	100,00%	0,00%	**Terminada**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2.471.685.007,00	**Valor Inicial:**	$ 855.375.978,00
Valor Anticipo:	$ 535.395.600	**Valor Anticipo:**	$ 0,00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.471.685.007	**Valor total actual del contrato**	$ 855.375.978,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DURANTE LA SEMANA SE REALIZÓ:

1. TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIALES
2. ELABORACIÓN INFORME SEMANAL
3. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA
4. ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ
5. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 28

ACTIVIDADES DIARIAS

LUNES 17 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Trasiego de material: Transporte y manejo de materiales necesarios para la construcción. * Construcción de registro para servicios eléctricos y sanitarios. * Fundido de cárcamo para tuberia sanitaria. * Acabados de registro eléctricos y sanitarios.
MARTES 18 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Trasiego de material: Transporte y manejo de materiales necesarios para la construcción. * Construcción de registro para servicios eléctricos y sanitarios. * Fundido de cárcamo para tuberia sanitaria. * Acabados de registro eléctricos y sanitarios. * Retiro de encofrado de tarima.
MIÉRCOLES 19 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Trasiego de material: Transporte y manejo de materiales necesarios para la construcción. * Construcción de registro para servicios sanitarios. * Fundido de cárcamo para tuberia sanitaria. * Acabados de registro sanitarios. * Preparacion de conductor electrico. * Excavación puesta a tierra. * Instalación de tubería sanitaria interna.
JUEVES 20 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Trasiego de material: Transporte y manejo de materiales necesarios para la construcción. * Acabados de registro sanitarios - actividad finalizadaal 100% - pendiente instalacion de tapas. * Preparación y reparación de conductor electrico 4/0 - Actividad finalizadaal 100%. * Excavación para malla puesta a tierra - Actividad finalizadaal 100%. * Instalacion de conductor desnudo para malla puesta a tierra (86mts) - Avtividad finalizadaal 100%. * Instalacion de tuberia sanitaria (12 mts) - Actividad finalizada al 100%. * Armado de tuberia sanitaria interna. * Instalación de 6 varillas puesta a tierra.
VIERNES 21 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* Anclaje de varillas 3/8 para columnetas en vigas de cimentaicón. * Trasiego de materiales. * Alistamiento de tapas de registros sanitarios. * Pegado de bloques, primera hilera (guia). * Reubicacion de registro de puesta a tierra. * Canalizacion de un conductor 4/0 (163 mts - amarillo). * Armado de tubería sanitaria interna.
SÁBADO 22 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 12:00 AM	* Pegado de bloques, cuatro hileras. * Canalizacion de un conductor 4/0 (22 mts - amarillo). * Solo se laboro con 3 oficiales, 2 auxiliares y un maestro y por parte del contratista electrico 2 ayudante y 1 tecnico
DOMINGO 23 de febrero de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	* DIA NO LABORAL.

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Lunes 17/02/2025

Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Caida tropiezoz y reabalones"

- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Trasiego de material: Transporte y manejo de materiales necesarios para la construcción.
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Construcción de registro para servicios eléctricos y sanitarios
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Fundido de cárcamo para tuberia sanitaria
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Martes 18/02/2025

- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Trasiego de material: Transporte y manejo de materiales necesarios para la construcción.
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Construcción de registro para servicios eléctricos y sanitarios
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de desencofre de tarima de losa superior
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Miércoles 19/02/2025
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Inportancia de clasificacion de las sustancias queimicas"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Fundido de cárcamo para tuberia sanitaria
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Jueves 20/02/2025
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Inspeccion de herramientas, y la seguridad en el trabajo"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Acabados de registro sanitarios
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Armado de tuberia sanitaria interna
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Viernes 21/02/2025
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "No hay atajo para la seguridad"
- Se realiza socialización programación vuelos
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de armado de tuebria sanitari.
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Sábado 22/02/2025
- Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "La seguridad esta en tus manos"
- Revisión documental de AST y herramientas
- Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de levante de manposteria.
- Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de excavacion

Domingo 23/02/2025
- Día no laborado

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1.Trasiego de material: Transporte y manejo de materiales necesarios para la construcción**.** **2.** Construcción de registro para servicios eléctricos y sanitarios. **3.**Fundido de cárcamo para tuberia sanitaria **4.** Acabados de registro sanitarios - actividad finalizadaal 100% - pendiente instalacion de tapas. **5.** Preparacion de conductor electrico. **6.** Acabados en marcos de registros. **7**.Excavación para malla puesta a tierra - Actividad finalizadaal 100%. **8.** Pegado de bloques, primera hilera (guia). **9.** Canalizacion de un conductor 4/0 (163 mts - amarillo). y (22 mts - amarillo). **10.** Tendido y corte de cable alimentador 4/0 en tramos de 314 mts. **11.** Retiro de Encofrado de Tarima	**MANEJO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN - MACA-** **MACA #3 - Manejo de cortes, rellenos y ZODMES (Movimiento de Tierra).** **MACA # 4 - Manejo de materiales de Construcción.** **MACA # 7 - Señalización en áreas de Construcción.**	**1. **Almacenamiento temporal de materiales**** Los materiales de construcción en el sitio de obra se resguardan mediante un cerramiento provisional cubiertos y demarcados que incluye cinta de advertencia, malla de protección, señalización conforme al programa establecido de seguridad y señalización, garantizando la prevención de riesgos asociados. **2. **Manejo de Materiales de Construcción **** **-** La manipulación de materiales se realiza de manera controlada, asegurando que no representen peligro para los transeúntes, el personal de obra y terceros, al tiempo que se evitan impactos negativos sobre los elementos ambientales circundantes. - La mezcla de concreto para los acabados de registros eléctricos y sanitarios, el fundido de los carcamos de tubería sanitaria se realiza sobre plastico negro de alta resistencia con el proposito de aislar el suelo evitado asi generar contaminación y daños asociados al mismo. - El material resultante del retiro de tarima es acopiado en un área del frente de obra dispuesto según las caracteristicas de dicho material, el cual puede ser reutilzado en actividades futuras por ser un estibado en madera. **3. **Demarcación de áreas de advertencia**** Las áreas de trabajo se señalizan , de acuerdo con las normativas de seguridad, para delimitar zonas críticas y evitar accesos no autorizados, minimizando los riesgos asociados. **4. ** Manejo de cortes, rellenos y ZODMES (Movimiento de Tierra)**** El material generado en las excavaciones para malla puesta a tierra es dispuestos al lado de las mismas , para ser posteriormente reutilizados en el cubrimiento y cierre del área con compactador tipo canguro .
12. Capacitación Disposición Adecuada de Residuos Peligrosos Generados en Obra.	**EA-1 - Subprograma Educación Ambiental**	**6. ** Capacitación Ambiental**** Con el próposito de fortalecer el manejo, segregación o separación adecuado de los residuos peligrosos generados en el frente de obra, desde la interventoría ambiental se realiza el día martes 18 de febrero antes de iniciar actividades orientación a los trabajadores acerca de la importancia de separar estos residuos, disponerlos en bolsas rojas y como identificar aquellos que son peligrosos observando la información al respaldo de los recipientes, los cuales tienen pictogramas que brindan tal información.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


Actividades Técnicas:
Trasiego de material: Transporte y manejo de materiales para construcción.
Construcción de registro para servicios eléctricos y sanitarios.
Acabados de registros eléctricos y sanitarios (finalizado al 100%, pendiente instalación de tapas).
Fundido de cárcamo: Para tubería sanitaria.
Preparación y reparación de conductor eléctrico 4/0 (finalizado al 100%).
Canalización de conductor 4/0 (total: 185 metros).
Excavación para malla de puesta a tierra (finalizado al 100%).
Instalación de conductor desnudo para malla de puesta a tierra (86 metros).
Instalación de 6 varillas de puesta a tierra.
Reubicación de registro de puesta a tierra.
Instalación de tubería sanitaria (12 metros, finalizado al 100%).
Armado de tubería sanitaria interna - (100%).
Retiro de encofrado de tarima.
Anclaje de varillas 3/8 para columnetas en vigas de cimentación.
Alistamiento de tapas de registros sanitarios.
Pegado de bloques.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este perdido no se reporta el ingreso del vehículo	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Apisonador tipo canguro:** 1 **Mezcladora de concreto:** 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas


PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	23
Total Personal	29

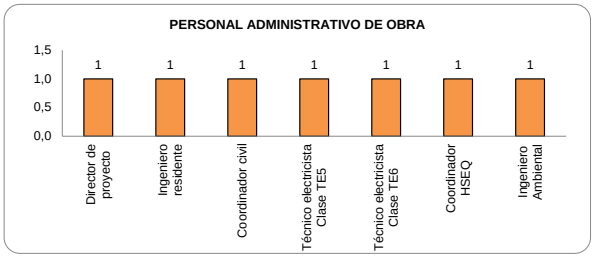



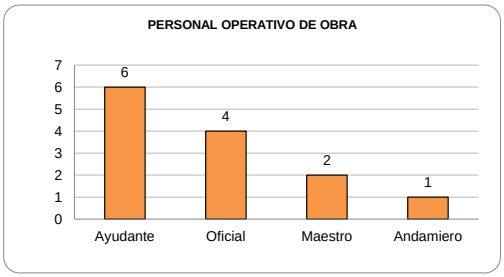

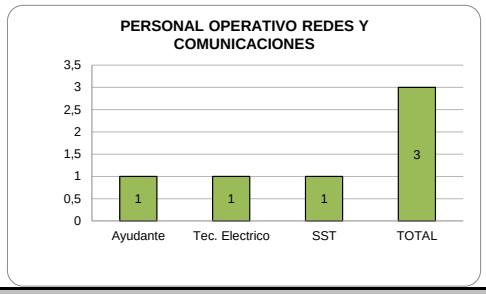

CORRESPONDENCIA ENVIADA

17/02/2025 **CS. UAAC-INT-518-018-2025** Entrega de documentación requerida mediante comunicación oficio CONS- ICAS-2025-0179
17/02/2025 **CS. UAAC-INT-518-019-2025** Llamado de atención por mal manejo en el desenrollado de conductor eléctrico.
18/02/2025 **CS.UAAC-INT518-020-2025** entrega del Informe Semanal No. 31.
20/02/2025 **CS. UAAC-INT-518-021-2025** Exigencia de Cumplimiento del Numeral 6.2.1.2 - Informe Semanal de Actividades.

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72.340.149,00
2	del 01 de diciembre de 2024 al 31 de neeor de 2025	$ 234.646.711,00
Total Acumulado	**$ 306.986.860,00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2.471.685.007,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 306.986.860,00
% Avance facturado Acumulado
12,42%


AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27.115.133,00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11.466.118,00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11.466.118,00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11.466.118,00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27.984.159,00
6	del 17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025	$ 11.466.118,00
7	del 17 de enero al 16 de febrero de 2025	$ 64.966.531,00
Total Acumulado	**$ 165.930.295,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855.375.978,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 165.930.295,00
% Avance facturado Acumulado
19,40%

REGISTRO FOTOGRÁFICO



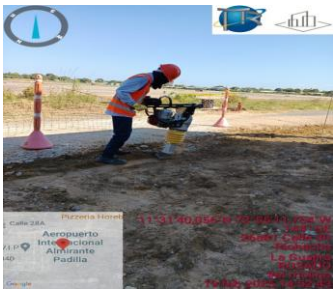

Excavación y reutilización del material extraido para cierre en la misma canalización con apisonador tipo canguro





Manipulación segura de materiales y demarcacion de áreas intervenidas a fin de evitar daños asocidos al personal y ambientales

<table>
<tr><td></td><td> </td></tr>
<tr><td>Acabados de registros sanitarios</td><td>Acabados de cajas de paso eléctricas</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Construcción de cajas electrcias</td><td>Desencofrado y desmonte de entarimado de placa superior.</td></tr>
<tr><td></td><td> </td></tr>
<tr><td>Acondicionamiento de tapas de cajas de paso eléctrica</td><td>Tendido, preparación y reparacion del conductor</td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td>Excavación para la instalación de conductor y varillas de sistema puesta a tierra</td><td>Intalaciones sanitarias interneas en subestación</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Prueba de estanqueidad en tubería sanitaria.</td><td>Vaciado de concreto en cárcamo para tubería sanitaria.</td></tr>
</table>





Instalación de varillas puesta a tierra.







Halado de conductor para labores de instalación dentro de tuberías y registros.





Levante de muros en subestacion nueva ayudas visuales.





Charla de seguridad y acompañamiento en campo

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
durante la presente semana se iniciaron las actividades de instalación de acometida y puesta a tierra de la nueva subestación; así mismo se iniciaron las actividades de mampostería. Pese a lo anterior el procentaje de retraso sigue en aumento y se acumulan al corte 90 días de retraso que el contratista no ha logrado disminuir, por lo que estainterventoría validará y ratificará el incumplimiento al cronograma aprobado.	ING. OMAR TRIGOS LACERA
