Cot 740 - 2024.

OBJETO: EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO USAQUÉN 001 - 2024

INTERVENTORÍA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS.

PARQUE: JARDINES DE ORIENTE.



Norma

Powered by CamScanner

VIERNES 21 DE MARZO/2025

PERSONAL: 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: INICIO INSTALACIÓN CERRAMIENTO.


TST.

MARTES 25 DE MARZO/2025.

PERSONAL: 7 MAESTROS 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: INICIO DESMOLDEANTES DE PLACAS Y DIFERENTE ADHERIR ESTAMPILLADOS PARA ENTREGAS DE CONJUNTO, COMO SE SOLICITÓ EN REUNIÓN CON LA COMUNIDAD.

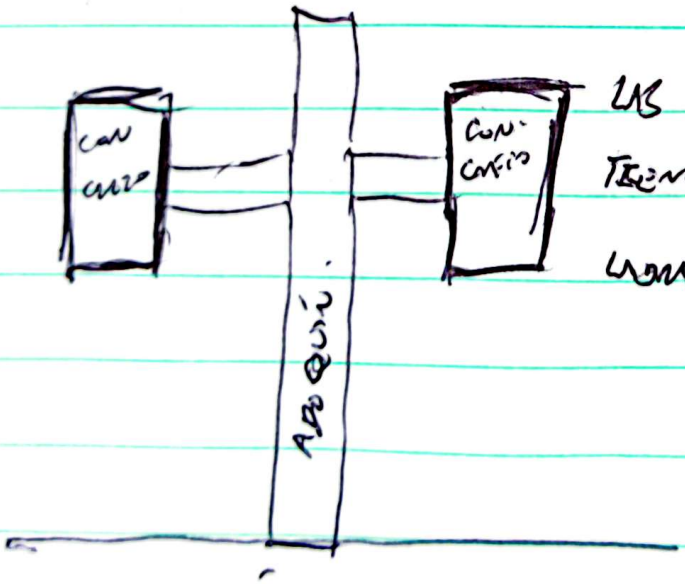

LAS PLACAS EN CONCRETO TIENEN BORDILLO EN CONCRETO.

TST.

MIÉRCOLES 26/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRA + 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: -DESCUENTE JUEGO EN MADERA.

- DESCUENTE PERFORACIÓN EN CÁMARA Y COMPROS.

- SE CONTINÚA CON OBRA CIVIL.

INT.

JUEVES 27/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRA, 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - REPLANTEO EN SITIO.

- SE PLANTEA UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE +20cm EN EL ALA BAJO DE LOS DEDOS NUEVOS Y LA ZONA DE JUEGOS CON RESPECTO AL ANDEN EXISTENTE CONTRA LA AV. 19.

INT.

VIERNES 28/03/2025

PERSONAL: 2 AY,


CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN SECTOR

INT

Powered by CamScanner

DEL DESAGÜE PLUVIAL NUEVO PARA EVACUACIÓN DE LAS ÁREAS DE LAS PATIOS DESCUBIERTOS.

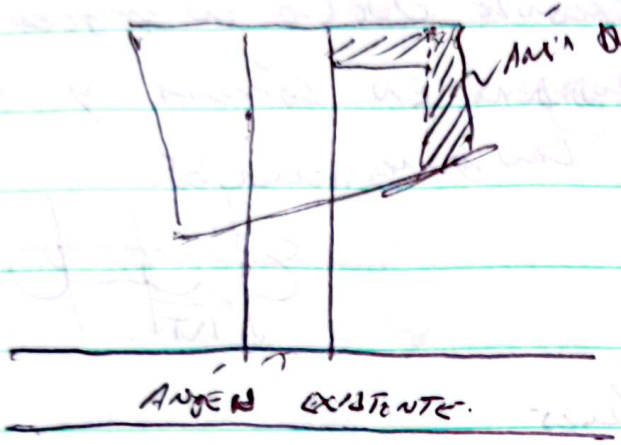


AV. 19.

LUNES 31/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 2 AY.

CLIMA: LLUVIA PERMANENTE.

ACTIVIDADES: AL DESCAPOTAR, SE EVIDENCIA UNA PATIO A UNO 15cm DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO.

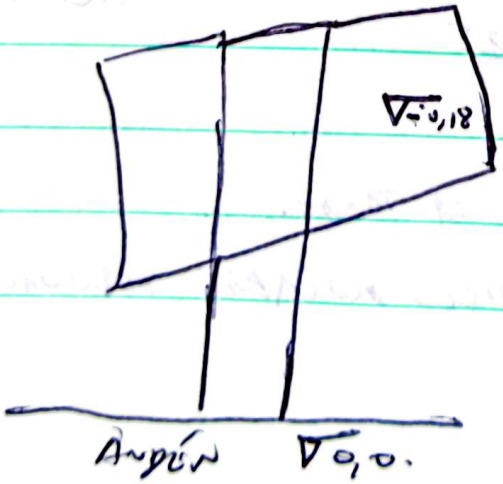

Norma

Powered by CamScanner

AL NIVELAR SE OBTIENE COMO RESULTADO QUE ESTA ESTÁ 18cms MÁS ABAJO DEL NIVEL DEL TERRENO. TENIENDO EN CUENTA ESTO, CON UNA PENDIENTE DE ACABADO DEL 1% APROXIMADAMENTE, EDIFICIANDO LA ESTRUCTURA COMO SE PLANTEÓ EN EL ANTEPROYECTO TENDRÍA LO SIGUIENTE:

