

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.6809602

" CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR"

INFORME TECNICO 1

Apto 503 torre 2 carrera 6 sur #66-40, Santafé de Varsovia Ibagué Tolima
Móvil: 313 832 61 16 **Correo**: CR 6 SUR # 66 - 40 TO 2 AP 503 CON SANTA FE DE VARSOVIA

Tabla de contenido

1. Información General 3
   1. Datos Generales 3
2. Resumen de las actividades del periodo 3
   1. Avance de las actividades programadas 3
   2. Avance de obra ejecutado 4
3. Relación personal empleado 6
4. Registro fotográfico 9
5. Actas parciales aprobadas 14
6. Pólizas aprobadas 14

1. Información General

1. Datos Generales

CONTRATANTE	SUBDIRECCIÓN CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS SENA REGIONAL TOLIMA 1
CONTRATO NRO.	O1.PCCNTR.6809602
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/10/2024
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CUBIERTAS 24-2
CC o NIT	901874139-3
LUGAR DE EJECUCIÓN	ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR TOLIMA
FECHA DE INICIO	21/11/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	80 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 156’564.981, CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR 38
PRÓRROGA NRO. 1	90 DIAS
PRÓRROGA NRO. 1	45 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	(176) días
FECHA DE TERMINACIÓN	15/05/ 2025

Objeto del contrato

" CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR".

2. Resumen de las actividades del periodo

Una vez terminada la etapa de diseño, se ha realizado algunos ajustes al mismo por solicitud de la entidad contratante como de la interventoría y por consiguiente ajuste al balance del presupuesto contractual.

Debido a la temporada de lluvias que ha iniciado desde mediado de febrero, no ha sido posible el avance en la instalación de la estructura metálica sobre los bloque y parqueadero,

puesto que la SISO advierte de los riesgos de trabajar con equipos de soldadora en los días de lluvia y amenazas de tormenta.

Esto ha generado el inicio de las obras de ejecución tiempo después del programado con fecha del 23 de marzo del 2025 en zona de taller con la elaboración de las sobrecubiertas del bloque de salones y bloque administrativo, el fin de adelantar el corte y ensamble y pintura anticorrosivo color negro de la estructura de correas, cerchas y canal el lamina sin el inconveniente de la temporada presente, la estructura metálica se ha realizado en un 95% en taller, para evitar el riesgo de los trabajadores,

La estructura de cerchas, correa y canales metálicas fueron trasladadas a la obra el día 31 de marzo del 2025, en donde se continuo con terminaciones de ensamble e izada de la estructura sobre las placas de bloque de salones y bloque administrativo, en esta tarea se tuvieron en cuenta las mitigaciones de afectación ambiental con el cuidado de la flora y se manejó todos los protocolos en seguridad laboral con los trabajadores en cuanto a la dotación de elementos de seguridad personal y elemento de trabajo en altura, inspeccionadas por la SISO.

A pesar de la temporada de lluvias, se ha trabajado con la inspección de la SISO en diferentes horarios en donde no se presente lluvias que pueda generar peligro de los trabajadores por el hecho de actividades de soldadura, que puede generar descargas eléctricas.

El avance de obra ha llevado a la ejecución del Suministro e instalación de cubierta en teja Termoacústica UPCV. Supertile DE 37" 2,5mm 1.07 mx 11.80m Incluye estructura, elementos de fijación. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación para bloque administrativo y bloque de formación, durante el mes de marzo y abril de 2025.

3. Avance de las actividades programadas

Durante el mes de marzo y abril de 2025 se llevo el avance del 100% de la actividad de Suministro e instalación de cubierta en teja Termoacústica UPCV. Supertile DE 37" 2,5mm 1.07 mx 11.80m Incluye estructura, elementos de fijación. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación para bloque administrativo y bloque de formación.

4. Avance de obra ejecutado

Durante el mes de marzo y abril de 2025 con la ejecución de la actividad del Suministro e instalación de cubierta en teja Termoacústica UPCV. Supertile DE 37" 2,5mm 1.07 mx 11.80m Incluye estructura, elementos de fijación. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación para bloque administrativo y bloque de formación, se produjo un avance del 73% de contrato .

A continuación, se presenta las cantidades total ejecutadas del contrato:

CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL N° 1	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**VR UNITARIO**	**CANT.**	**VR TOTAL**
1. PRELIMINARES					
1,1	Diseño de cubierta parqueaderos y sobre cubierta bloques incluye detalles arquitectónicos y/o estructurales- entrega planos récord digitales y en físico.	und	$2.257.600,00	1,00	$ 2.257.600,00
2.CUBIERTA					
2,1	Suministro e instalación de cubierta en teja Termoacústica UPCV. Supertile DE 37" 2,5mm 1.07 mx 11.80m Incluye estructura, elementos de fijación. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación para bloque administrativo y bloque de formación	m2	$ 189.210,00	704,96	$ 133.385.481,60
2,2	Suministro e instalación de cubierta en teja Termoacústica UPCV. Supertile DE 37" 2,5mm 1.07 mx 11.80m Incluye estructura y todos los elementos de fijación para zona parqueaderos	m2	$ 196.737,00		$ 0,00
3.CAPTACION AGUAS LLUVIAS					
3,1	Canal en lámina galvanizada cal. 20de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, pintura base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación y todo lo requerido para su correcta instalación y recibo a satisfacción	ml	$ 87.987,00	55,00	$ 4.839.285,00
3,2	Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC 6"	ml	$ 68.452,00	18,00	$ 1.232.136,00
3,3	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento para aguas de 1000 lts incluye flotador, llave de paso y demás elementos para su correcto funcionamiento	und	$ 1.146.875,00	-	$ 0,00
3,4	Canal de aguas lluvias PVC tipo amazonas incluye accesorios soportes, uniones, andamios y demás elementos necesarios para su correcta instalación	ml	$ 96.900,00	-	$ 0,00
4. VARIOS					
4,1	Retiro de escombros a lugar autorizado, (entregar certificado)	m3	$ 84.800,00	-	$ 0,00
4,2	Demolición pañetes incluye andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	$ 8.950,00	-	$ 0,00
4,3	Suministro y aplicación pañete impermeabilizado incluye andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	$ 43.000,00	-	$ 0,00
4,4	Suministro y aplicación de impermeabilizante para pañete existente (aditivo liquido mejorado con polímeros sintéticos que actúan como impermeabilizante integral taponando poros y capilares en morteros) incluye todos los	m2	$ 29.400,00	-	$ 0,00

	elementos necesarios para su correcta ejecución				
4,5	Suministro y aplicación de pintura tipo 1 para exteriores incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	m2	$ 20.000,00	-	$ 0,00
4,6	Mantenimiento y reparación canales (cafetería y cocina) existentes, incluye limpieza, ajustes, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	$ 48.400,00	-	$ 0,00
4,7	Reparación manto asfaltico existente incluye sustitución donde sea necesario	m2	$ 57.900,00	-	$ 0,00
4,8	Suministro y aplicación Pintura Reflectiva de Aluminio para Protección de Cubiertas en bloque cocina	m2	$ 27.000,00	-	$ 0,00
4,9	Limpieza y lavado de bajantes existentes, incluye todos los elemento necesarios para su correcta ejecución	ml	$ 15.700,00	-	$ 0,00
4,10	Suministro e instalación gárgola de rebose en lamina acero galvanizado de 1,5 mm de espesor , ancho 35 cms, incluye anticorrosivo, pintura de acabado y todos los elementos para su correcto funcionamiento	und	$ 99.000,00	-	$ 0,00
4,11	Aseo general de obra	und	$ 263.000,00	-	$ 0,00
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				$ 141.714.502,60
	ADMINISTRACION				$ 28.342.900,52
	UTILIDAD				$ 7.085.725,13
	TOTAL A.U.				$ 35.428.625,65
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD				$ 1.346.287,77
	TOTAL, PRESUPUESTO OBRAS				$ 178.489.416,02

5. Relación personal empleado

Para los meses de diciembre, enero y febrero el ingreso personal operativo como oficiales y ayudantes y personal técnico administrativo como profesional SST e ingeniero residente de obra, en el caso del personal operativo se conformó una cuadrilla con 1 oficial, variación de entrada y salida de ayudantes y 1 maestro general.

CONSORCIO CUBIERTAS 24-2

MES	NOVIEMBREE 2024		OBRA	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR


				ASISTENCIA										
				21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NO	CARGO	ACTIVIDAD		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	ING RESIDENTE	CONSTRUCCION	AD											
			OF											
			AY											
2	SISO	CONSTRUCCION	AD											
			OF											
			AY											
3	SOLDADOR GENERAL	CONSTRUCCION	AD											
			OF											
			AY											
4	SOLDADORES	CONSTRUCCION	AD											
			OF											
			AY											
	PERSONAL ADMINISTRATIVO			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	SOLDADOR GENERAL			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	SOLDADORES			0	0	0		0	0	0	0	0	0	
	TOTAL PERSONAL EN OBRA			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

MES	DCIEMBRE 2024		OBRA	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR

				ASISTENCIA																										
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NO	CARGO	ACTIVIDAD		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
1	ING RESIDENTE	CONSTRUCCION	AD																													
			OF																													
			AY																													
2	SISO	CONSTRUCCION	AD																													
			OF																													
			AY																													
3	SOLDADOR GENERAL	CONSTRUCCION	AD																													
			OF																													
			AY																													
4	SOLDADORES	CONSTRUCCION	AD																													
			OF																													
			AY																													
	PERSONAL ADMINISTRATIVO			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	SOLDADOR GENERAL			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	SOLDADORES			0	##	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
	TOTAL PERSONAL EN OBRA			0	##	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0

DISEÑO

Apto 503 torre 2 carrera 6 sur #66-40, Santafé de Varsovia Ibagué Tolima
Móvil: 313 832 61 16 **Correo**: CR 6 SUR # 66 - 40 TO 2 AP 503 CON SANTA FE DE VARSOVIA



CONSORCIO CUBIERTAS 24-2

MES	ENERO 2025		OBRA	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR

				ASISTENCIA																														
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
NO	CARGO	ACTIVIDAD		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L		
1	ING RESIDENTE	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
2	SISO	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
3	SOLDADOR GENERAL	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
4	SOLDADORES	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				##	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
	SOLDADOR GENERAL				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
	SOLDADORES				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					
	TOTAL PERSONAL EN OBRA				##	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					

DISEÑO

MES	FEBRERO 2025		OBRA	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR

				ASISTENCIA																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
NO	CARGO	ACTIVIDAD		S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M		
1	ING RESIDENTE	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
2	SISO	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
3	SOLDADOR GENERAL	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
4	SOLDADORES	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0		
	SOLDADOR GENERAL					0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0		
	SOLDADORES					##	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0		
	TOTAL PERSONAL EN OBRA					##	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0		

AJUSTE DE DISEÑO

MES	MARZO 2025		OBRA	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR

				ASISTENCIA																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NO	CARGO	ACTIVIDAD		S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	J	V
1	ING RESIDENTE	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
2	SISO	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																															
3	SOLDADOR GENERAL	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																															
			AY																						1	1		1	1	1				
4	SOLDADORES	CONSTRUCCION	AD																															
			OF																						3	3		3	3	3				
			AY																															
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0			0	0	0		
	SOLDADOR GENERAL					0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	3	3			3	3	3		
	SOLDADORES					0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	1	1			1	1	1		
	TOTAL PERSONAL EN OBRA					0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	4	4			4	4	4		

AJUSTE DE DISEÑO

Apto 503 torre 2 carrera 6 sur #66-40, Santafé de Varsovia Ibagué Tolima
Móvil: 313 832 61 16 **Correo**: CR 6 SUR # 66 - 40 TO 2 AP 503 CON SANTA FE DE VARSOVIA

MES	ABRIL 2025		OBRA	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DEL PARQUEADERO (150 MTS) Y SOBRE CUBIERTA DE LOS 3 BLOQUES DE ESCUELA GASTRONOMICA DE MELGAR

				ASISTENCIA																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NO	CARGO	ACTIVIDAD		M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	J	V	S	S	D	L	M	M	L	M	M	J	V
1	ING RESIDENTE	CONSTRUCCION	AD	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
			OF																														
			AY																														
2	SISO	CONSTRUCCION	AD																														
			OF	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
			AY																														
3	SOLDADOR GENERAL	CONSTRUCCION	AD																														
			OF																														
			AY	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
4	SOLDADORES	CONSTRUCCION	AD	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3
			OF																														
			AY																														
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					4	4	4	4		4	4		4	4	4		4	4	4		4	4		4	4	4	4		4	4	4	4	4
	SOLDADOR GENERAL					1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1
	SOLDADORES					1	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1		1	1	1	1	1
	TOTAL PERSONAL EN OBRA					6	6	6	6		6	6		6	6	6		6	6	6		6	6		6	6	6	6		6	6	6	6	6

6. Estado del clima

CUADRO ESTADO DEL CLIMA MARZO 2025

# DEL DIA	S 1	L 3	M 4	M 5	J 6	V 7	S 8	L 10	M 11	M 12	J 13	V 14	S 15	L 17	M 18	M 19	J 20	V 21	S 22	L 24	M 25	M 26	J 27	V 28	S 29	L 31
Mañana																										
Tarde																										

Soleado | lluvia

CUADRO ESTADO DEL CLIMA ABRIL 2025

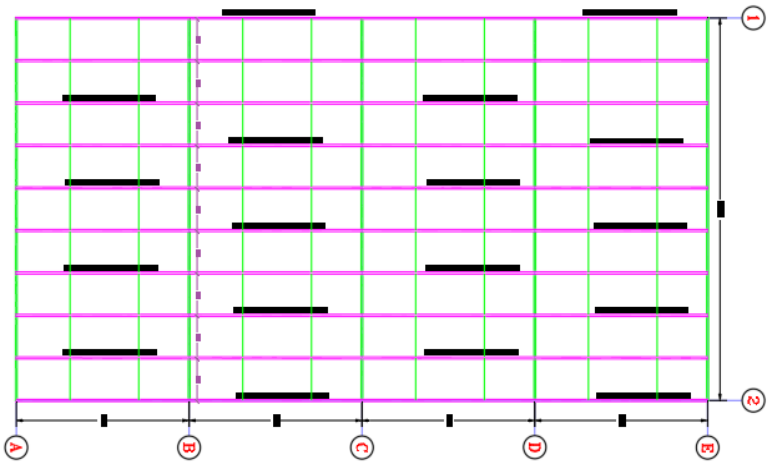
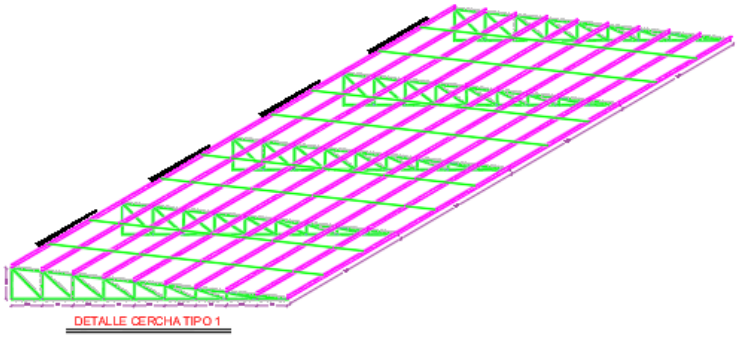
# DEL DIA	M 1	M 2	J 3	V 4	S 5	L 7	M 8	M 9	J 10	V 11	S 12	L 13	M 14	M 15	S 16	L 18	M 19	M 20	J 21	V 22	S 23	L 25	M 26	M 27	J 28	V 29
Mañana																										
Tarde																										

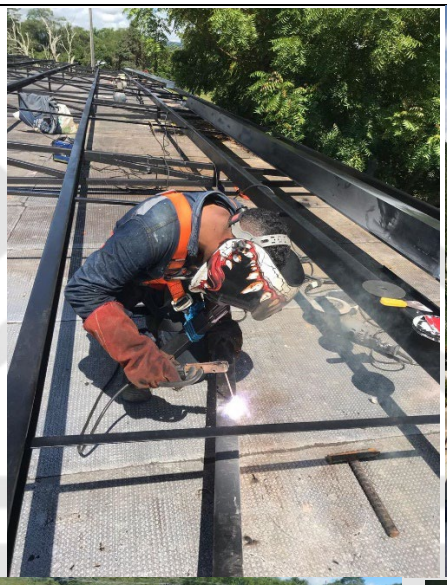
Soleado | lluvia

7. Registro fotográfico

Registro fotográfico de las actividades realizadas durante los meses de marzo a abril.

ACTIVIDADES REALIZADAS
RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS SEGÚN PROGRAMACION

Diseño de cubierta parqueaderos y sobre cubierta bloques incluye detalles arquitectónicos y/o estructurales- entrega planos récord digitales y en físico.	  
Suministro e instalación de cubierta en teja Termoacústica UPCV. Supertile DE 37" 2,5mm 1.07 mx 11.80m Incluye estructura, elementos de fijación. Y todos los elementos necesarios para su correcta instalación para bloque administrativo y bloque de formación	 



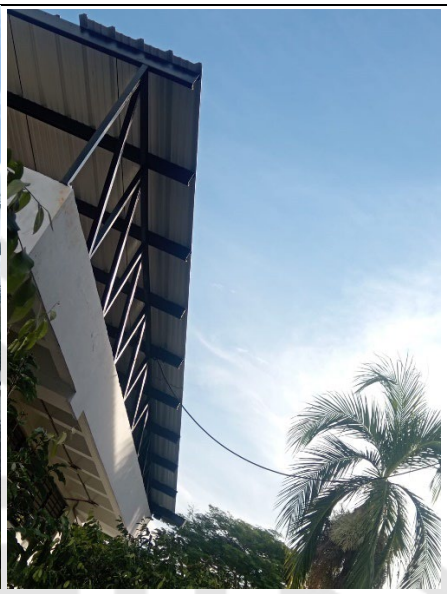
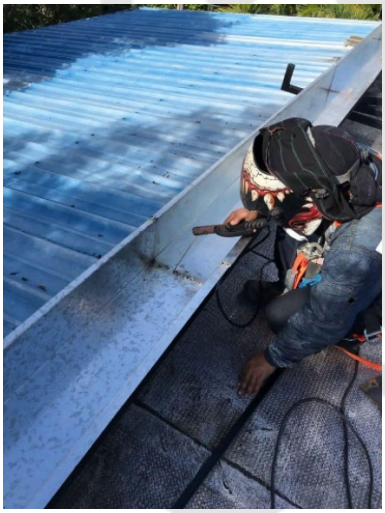
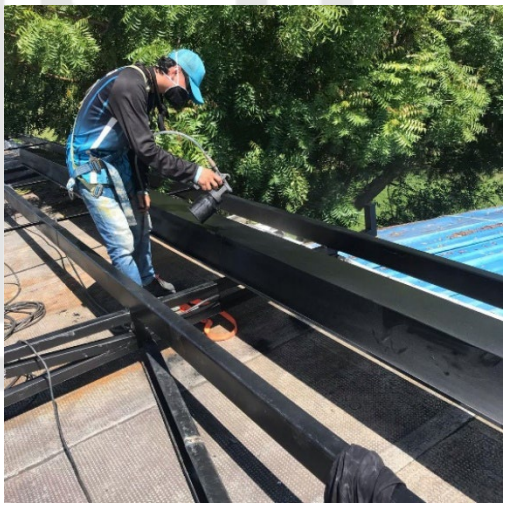








Apto 503 torre 2 carrera 6 sur #66-40, Santafé de Varsovia Ibagué Tolima
Móvil: 313 832 61 16 **Correo**: CR 6 SUR # 66 - 40 TO 2 AP 503 CON SANTA FE DE VARSOVIA

	 
Canal en lámina galvanizada cal. 20de 35x30. (incluye suministro, transporte, instalación, pintura base en wash primer, 3 manos de cromato de zinc, barrera epóxica y acabado en esmalte a base de poliuretano, soportes, elementos de fijación y todo lo requerido para su correcta instalación y recibo a satisfacción	 

	 
Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC 6"	   

Actividades SST	 

8. Actas parciales aprobadas

Hasta la fecha no se ha generado pago de parcial, siendo el acta que acompaña este informe la primera acta por aprobar.

9. Modificaciones del contrato

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1: El 30 de diciembre de 2024, las partes de mutuo acuerdo prorrogaron el plazo del contrato por un término de noventa (90) días, es decir, desde el 01 de enero del 2025 hasta el día 31 de marzo del 2025.

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 2: El 31 de marzo de 2025, las partes de mutuo acuerdo prorrogaron el plazo del contrato por un término de cuarenta y cinco (45) días, es decir, desde el 01 de abril del 2025 hasta el día 15 de mayo del
2025

10. Pólizas aprobadas

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	Compañía mundial de seguros
NRO. DE PÓLIZA	I-100037471
CERTIFICADO O ANEXO	4
FECHA EXPEDICIÓN	07/04/2025
FECHA APROBACIÓN	28/04/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/12/2024	15/09/2025	$ 48.695.684,00
Devolución del pago anticipado	N/A		
Salarios y prestaciones sociales	30/12/2024	15/05/2028	$ 12.173.921,00
Calidad del servicio	15/05/2025	15/05/2030	$ 121.739.210,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	Compañía mundial de seguros		
NRO. DE PÓLIZA	I-100009090		
CERTIFICADO O DE ANEXO	4		
FECHA EXPEDICIÓN	07/04/2025		
FECHA APROBACIÓN	28/04/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	08/10/2024	15/05/2025	$ 284.700.000,0

Contratista
HERNANDO SANABRIA LOZANO
C.C. 93.366.027 de Purificación
Representante legal
CONSORCIO CUBIERTAS 24-2
