CONSORCIO POLIESTACIÓN

Flandes, Tolima
16 de abril de 2025

OFC.INT-CCVA-088
O
F

Ingeniero:
José Arcesio Vargas Benítez.
Secretario de planeación e infraestructura
Ciudad

Referencia: **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192 - 2023 "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA "**

Asunto: Entrega de acta de avance de interventoría N° 7

Respetado Ingeniero Vargas:

Por medio de este documento hacemos entrega del acta de avance de la interventoria N° 7, correspondiente al periodo entre el 19 de diciembre de 2024 y 25 de marzo de 2025.

Agradeciendo de antemano su atención y quedo pendiente de cualquier inquietud.

Cordialmente,

Juan Camilo Díaz Vargas
R.L. Consorcio Poliestación
Contratista de Interventoría

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES
SECCIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 16 ABR 2025 HORA: 11:40
No. RADICACIÓN: 2737
ENVIAR: 2 folios planeación
RECIBIÓ:

Dirección: Cra 5 No. 11-24 Of. 802 Edificio Torre Empresarial Ibagué – Tolima – Cel.: 3153988586 – E-mail
anlagenbauer@hotmail.com

CONSORCIO POLIESTACION

NIT: 901708257-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 5 11 24 OF 802, Ibagué, Tolima, Colombia

Tel. 6082607436

Email. anlagenbauer@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764079497732 válida desde 2024-09-13 hasta 2025-09-13 rango desde FECP5 hasta FECP50.

Razón Social: ALCALDÍA DE FLANDES
NIT : 800100055
Dirección: Carrera 8a con calle 12 Esquina Barrio Centro, Flandes, Tolima, Colombia
Teléfono:
Email: contactenos@flandes-tolima.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FECP9
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:42:23-05:00
FECHA FIRMADO:	05/05/2025 09:42:27

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	05	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
	005	INTERVENTORIA ACTA PARCIAL No. 07 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 192-2023. CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	WSD	1,00	$96.660.667,49	IVA	19%	$18,365,526.82	0,00	$96.660.667,49

Notas:

SON: (ciento quince millones veintiseis mil ciento noventa y cuatro pesos treinta y un centavos)
CUFE: a0df607402b632704706e8dfe58e25af7e5bb2be43bde808851e002976acf656d43ec9bbae2eb8ece5d46341fc5fdcb7

Subtotal:	$96.660.667,49
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$18.365.526,82
Total:	$115.026.194,31

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
IVA	$96.660.667,49	19,00%	$18.365.526,82

Firma Digital: XhFAGp6IOJyUPiBx3eYwVui1mke5CJEwf3U4dYSRC3V1Pc4sVGJDa156QCrQezQy
s1tQlmb4mmeLIXul/EDUKe556tMW1kMdaSd8xGoEy6Mvdij3lc
jxU1asphtLgU+9 2sSlakxXJxWcEe7JDpBV3zsx7qbl4+2eQJ/gTw1C+CFxnqRh2UfZ0Zkg+pu2LVkl uylXE/l+lC1cnryZpgPT7W0bYn7y/mmqELw
M8NQ9nfZ/eFHvSuCPxpPCXJWF5Nul RT9sKlv7/KxPpn44p0SszcStfnLj5Lndq7CpZpoAS09vv8qvZq4Pj0ulZhXcCCY4 g6fkvaa0tWuy3YZsdasP
pw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ALCALDÍA DE
FLANDES

ACTA PARCIAL N° 07

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 192-2023

FECHA	25	DE	MARZO	DE	2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA	**NÚMERO DE CONTRATO No.192 - 2023**	**FECHA: 5 de MAYO de 2023**
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA	CONSORCIO POLIESTACION	
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS / C.C No. 5.829.612 DE IBAGUÉ	
IDENTIFICACION:	901708257-4	
OBJETO	Contratar la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para realizar los estudios, diseños y construcción de la estación de policía en zona urbana del municipio de Flandes, departamento de Tolima.	
VALOR INICIAL:	Cuatrocientos veintiún millones ciento ochenta y dos mil ochocientos veintiún pesos ($421.182.821,00) mcte.	
VALOR ADICIONAL:	Ciento trece millones trecientos treinta y Ocho mil noventa y nueve pesos ($113.338.099,00) mcte	
VALOR TOTAL:	Quinientos treinta y cuatro millones quinientos veinte mil novecientos veinte pesos ($534.520.920,00) mcte	
FECHA DE INICIO:	29 de mayo del 2023	
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	Siete (07) de marzo del 2024	
FECHA ACTA REINICIO NO. 1	Dieciocho (18) de junio de 2024	
FECHA ACTA DE SUSENSION N °2	Treinta y Uno (31) De diciembre De 2024	
FECHA ACTA DE REINICIO N° 2	08 DE ENERO DE 2025	
ACTA DE PRORROGA N° 2	08 DE ENERO DE 2025	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	18 DE ABRIL DE 2025	

En Flanes - Tolima, a los veinticinco (25) día del mes de marzo de 2024, se reunieron en las oficinas de la secretaria de planeación e infraestructura del Municipio de Flandes, el **Ing. JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ** en calidad de **supervisor**, **JUAN CAMILO DIAZ VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía número 5.829.612 de Ibagué, como Representante Legal del CONSORCIO POLIESTACIÓN, con el fin de suscribir el acta parcial del contrato en mención:

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor contrato inicial	$ 421.182.821,00	
Valor contrato adicional	$ 113.338.099,00	
Valor desembolsos realizados		$ 381.152.662,63
Valor desembolso acta parcial N. 07		$ 115.026.194,31
Valor por ejecutar		$ 38.342.063,06
Sumas iguales	$ 534.520.920,00	$ 534.520.920,00

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del anticipo	$ 0	
Amortización anticipo antes de esta acta		$ 0
Amortización anticipo presente acta final		$ 0
Saldo por amortizar		$ 0
Sumas iguales	**$ 0**	**$ 0**

Valor a cancelar presente acta parcial N. 07 **$ 115.026.194,31**

ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Una vez revisados totalmente las actividades ejecutadas según lo estipulado en el contrato de interventoría 192 del 2023, se constató a la fecha, se encuentra ejecutada a entera satisfacción.

*** PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Certifico que el contratista ha efectuado los pagos a la seguridad social, salud, pensión y riesgos profesionales, durante la vigencia del contrato y se encuentra a paz y salvo a la fecha por este concepto.

*** CUMPLIMIENTO**

Previa revisión del informe presentado por JUAN CAMILO DIAZ VARGAS identificado con cedula de ciudadanía número 5.829.612 de Ibagué, como Representante Legal del CONSORCIO POLIESTACIÓN cumplió con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el Acto Contractual y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

NOTA: El recibo por parte del supervisor de los trabajos ejecutados no exime al CONSORCIO POLIESTACIÓN NIT: 901708257-4 de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta N°7, a los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de marzo de 2025.

JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
R.L. / CONSORCIO POLIESTACIÓN

JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ
Supervisor

ALCALDIA DE **FLANDES**

MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
UNIDOS PARA TRANSFORMAR A FLANDES 2024-2027
PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023

PERIODO DEL INFORME: DEL: 19 de diciembre de 2024 hasta 25 de marzo de 2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023

CONTRATO DE OBRA No. 183 DE 27 de abril de 2023

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL FLANDES TOLIMA NIT: 800100055-6
REP. LEGAL: JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACION NIT. 901708527-4
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL,JURIDICA Y TECNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

VALOR INICIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS :	$	251.833.788,00
VALOR INICIAL INTERVENTORIA :	$	421.182.821,00
VALOR ADICIONAL	$	113.338.099,00
VALOR FINAL:	$	534.520.920,00

ANTICIPO ESTUDIOS Y DISEÑOS (50%)		
VALOR ACTA PARCIAL #1	$	50.366.757,44
VALOR ACTA PARCIAL #2	$	25.183.379,22
VALOR ACTA PARCIAL #3	$	75.550.136,34
VALOR ACTA PARCIAL #4	$	76.684.129,87
VALOR ACTA PARCIAL #5	$	76.684.129,87
VALOR ACTA PARCIAL #6	$	76.684.129,87
VALOR ACTA PARCIAL #7	$	115.026.194,31
Σ PARCIALES	$	496.178.656,92

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE OBRA:	25-mar.-25
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	24-mar.-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31-dic.-24
FECHA ACTA DE INICIO	29-may.-23
FECHA DE SUSPENSION No. 1	7-mar.-24
FECHA DE REINICIO No. 1	18-jun.-24
FECHA DE ADICION Y PRORROGA No.1	5-jul.-24
FECHA ACTA DE SUSPENSION N° 2	31-dic.-24
FECHA ACTA DE REINICIO N°2	8-ene.-25
FECHA ACTA DEPRORROGA N° 2	8-ene.-25
NUEVA FECHA DE TERMINACION	18-abr.-25

FORMA DE PAGO: La alcaldia realizara el pago correspondiente a la interventoría de la consultoría para la realización de estudios y diseño a través de pagos mensuales durante el tiempo que dure la consultoría.el pago correspondiente a la interventoría de la obra lo realizará atravéz de pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato y al acta final lo cual sera sobre el 10%del valor correspondiente a la interventoría para la obra el cual se pagara con la respectiva liquidación.para los pagos que el municipio de flandes haga al contratista, se verificara previamente el cumplimienteo de los siguientes requisitos. 1. La obtención de la certificación del cumplimineto de las entregas o ejecucion deservicios o entrega de productos por parte del supervisor. 2. La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud,pensión,riesgos profesionales), y de las obligaciones para fiscales (SENA,ICBF, Caja de compensción familiar). 3. la radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos anteriores. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL municipio de flandes solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuarápagos a terceros.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: EJECUCIÓN

CONDICIONES CONTRACTUALES

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

CONDICIONES ACTA INICIO

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

CONDICIONES REINICIO

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/05/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

CONDICIONES ADICION PRORROGA No.1

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	30/06/2025	$ 53.452.092,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	31/12/2027	$ 53.452.092,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	30/06/2025	$ 106.904.184,00

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

ACTA DE SUSPENSION N°2 Y PRORROGA N°2

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	8/01/2025	8/08/2025	$ 53.452.092,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	8/01/2025	8/01/2028	$ 53.452.092,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	8/01/2025	8/08/2025	$ 106.904.184,00

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023

PERIODO DEL INFORME: DEL: 19 de diciembre de 2024 hasta 25 de marzo de 2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023

CONTRATO DE OBRA No. 183 DE 27 de abril de 2023

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL FLANDES TOLIMA NIT: 800100055-6
REP. LEGAL: JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACION **NIT**. 901708527-4
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL,JURIDICA Y TECNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

VALOR INICIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS :	$ 251.833.788,00	ANTICIPO ESTUDIOS Y DISEÑOS (50%)	
VALOR INICIAL INTERVENTORIA :	$ 421.182.821,00	VALOR ACTA PARCIAL #1	$ 50.366.757,44
VALOR ADICIONAL	$ 113.338.099,00	VALOR ACTA PARCIAL #2	$ 25.183.379,22
VALOR FINAL:	$ 534.520.920,00	VALOR ACTA PARCIAL #3	$ 75.550.136,34
		VALOR ACTA PARCIAL #4	$ 76.684.129,87
		VALOR ACTA PARCIAL #5	$ 76.684.129,87
		VALOR ACTA PARCIAL #6	$ 76.684.129,87
		VALOR ACTA PARCIAL #7	$ 115.026.194,31
		Σ PARCIALES	$ 496.178.856,92

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE OBRA:	24-oct.-24
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	24-mar.-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31-dic.-24
FECHA ACTA DE INICIO	29-may.-23
FECHA DE SUSPENSION No. 1	7-mar.-24
FECHA DE REINICIO No. 1	18-jun.-24
FECHA DE ADICION Y PRORROGA No.1	5-jul.-24
FECHA ACTA DE SUSPENSION N° 2	31-dic.-24
FECHA ACTA DE REINICIO N°2	8-ene.-25
FECHA ACTA DEPRORROGA N° 2	8-ene.-25
NUEVA FECHA DE TERMINACION	18-abr.-25

FORMA DE PAGO:	La alcaldía realizara el pago correspondiente a la interventoría de la consultoría para la realización de estudios y diseño a través de pagos mensuales durante el tiempo que dure la consultoría.el pago correspondiente a la interventoría de la obra lo realizará atravéz de pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato y al acta final lo cual sera sobre el 10%del valor correspondiente a la interventoría para la obra el cual se pagara con la respectiva liquidación.para los pagos que el municipio de flandes haga al contratista, se verificara previamente el cumplimiento de los siguientes requisitos. 1. La obtención de la certificación del cumplimineto de las entregas o ejecucion deservicios o entrega de productos por parte del supervisor. 2. La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud,pensión,riesgos profesionales), y de las obligaciones para fiscales (SENA,ICBF, Caja de compensción familiar). 3. la radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos anteriores. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL municipio de flandes solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuarápagos a terceros.	**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:**	EJECUCIÓN

CONDICIONES CONTRACTUALES

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

CONDICIONES ACTA INICIO

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

CONDICIONES REINICIO

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/05/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

CONDICIONES ADICION PRORROGA No.1

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	30/06/2025	$ 53.452.092,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	31/12/2027	$ 53.452.092,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	30/06/2025	$ 106.904.184,00

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

ACTA DE SUSPENSION N°2 Y PRORROGA N°2

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	8/01/2025	8/08/2025	$ 53.452.092,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	8/01/2025	8/01/2028	$ 53.452.092,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	8/01/2025	8/08/2025	$ 106.904.184,00

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023

PERIODO DEL INFORME: DEL: 19 de diciembre de 2024 hasta 25 de marzo de 2024

3. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

- ☐ RED DE ACUEDUCTO _____ ML
- ☐ RED ALC. SAN / PLUV _____ ML
- ☐ PTAP / PTAR _____ UN
- ☐ POZOS PROFUNDOS _____ ML
- ☐ VIA URB / SEC / TERC _____ KM
- ☐ _____
- ☐ PUENTE / ALC / BOX _____ UN
- ☑ OTRO. CUAL? _____ UN

CONTRATO		INTERVENTORIA	
		PROGRAMA:	N/A
META:		META:	N/A
RUBRO:	CDP:	RUBRO: N/A	CDP 2023000415
		FUENTE: N/A	
REGISTROS PRESUPUESTALES	RP	REGISTROS PRESUPUESTALES	RP
ACTAS COBRADAS $	304.468.532,74	ACTAS COBRADAS $	

4. CRONOLOGIA DEL OBRA:

	ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1	Acta de inicio	29/05/2023	24/03/2024	$ 421.182.821,00	
2	Acta de suspensión No. 1	7/03/2024	24/03/2024	$ 421.182.821,00	
3	acta de reinico No.1	18/09/2024	5/07/2024	$ 421.182.821,00	
4	Acta de Adicion yPrórroga No. 1	5/07/2024	31/12/2024	$ 534.520.920,00	
6	Acta de suspensión No2	31/12/2024	8/01/2025	$ 534.520.920,00	
7	acta de reinico No.2	8/01/2025	18/04/2025	$ 534.520.920,00	
8	Acta de prorroga No 2	8/01/2025	18/04/2025	$ 534.520.920,00	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL OBRA, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

OBRA

% AVANCE EN PLAZO:	71,47%	PLAZO FALTANTE:	281	dias	% PROGRAMACION OBRA	71,47%	% OBRA EJECUTADA	58,54%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Una vez revisados totalmente las actividades ejecutadas según lo estipulado en el contrato de interventoría 192 del 2023, se constató a la fecha, se encuentra ejecutada a entera satisfacción.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	director de la interventoria a la construccion	70%	3,00	$ 4.500.000,00	$ 9.450.000,00
	Ingeniero civil residente de interventoria	100%	3,00	$ 2.500.000,00	$ 7.500.000,00
	Ingeniero civil especialista en geotecnia	30%	3,00	$ 3.500.000,00	$ 3.150.000,00
	Ingeniero civil especialista en estructuras	50%	3,00	$ 3.500.000,00	$ 5.250.000,00
	Ingeniero civil Ambiental	50%	3,00	$ 2.500.000,00	$ 3.750.000,00
	Ingeniero Electrico	40%	3,00	$ 2.500.000,00	$ 3.000.000,00
	Ingeniero topografo	100%	3,00	$ 2.500.000,00	$ 7.500.000,00
	Inspector Siso	50%	3,00	$ 2.000.000,00	$ 3.000.000,00
	SUBTOTAL		2,00	$ 42.600.000,00	
	factor multiplicador				$ 85.200.000,00
	OTROS COSTOS				
	Edicion de informes, documentación, fotocopias y equipos de oficina.	Mes	3,00	$ 570.222,437	$ 1.710.667,31
	Ensayos de laboratorio	Mes	3,00	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00
	Oficina (incluye servicios publicos)	Mes	3,00	$ 2.500.000,00	$ 7.500.000,00
	SUB TOTAL OTROS COSTOS				$ 11.460.667,31
	SUB TOTAL PERSONAL+OTROS COSTOS				$ 96.660.667,31
	IVA 19%				$ 18.365.527,00
	TOTAL INTERVENTORIA ETAPA CONSTRCCION DE OBRA				$ 115.026.194,31

CLIMATOLOGIA: durante la ejecución de las actividades no se presento ninguna eventualidad climatica.

7. ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

Carácter General

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO SI	SEGUIMIENTO NO	OBSERVACIONES
Según lo descrito en la **CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** la interventoria a cumplido con sus obligaciones en lo que se lleva de ejecutado en el contrato a la fecha.	X		

De Carácter Especifico- Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO SI	SEGUIMIENTO NO	OBSERVACIONES
1. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido, entregando los productos y prestando los servicios descritos a continiación ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 1.Interventoria al Levantamiento Topográfico 1 UND 2.Interventoria al Estudio de Suelos 1 UND 3.I nterventoría al Diseño Arquitectónico 1 UND 4.Interventoria al Diseño Estructural 1 UND 5.Interventoria al Diseño Hidrosanitario 1 UND 6.Interventoria al Diseño de Redes de Gas y 1 UND 7.Interventoría al Diseño Eléctrico e Iluminación 1 UND 8.Interventoria al Presupuesto y Programación de obra 1 UND	X		
2. contar con todo el personal y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato	X		

PERIODO DEL INFORME: DEL: 19 de diciembre de 2024 hasta 25 de marzo de 2024

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION).



FOTO 1:



FOTO 2:



FOTO 3:



FOTO 4:



FOTO 5:



FOTO 6:



FOTO 7:



FOTO 8:



FOTO 9:



FOTO 10:



FOTO 11:



FOTO 12:



FOTO 15:



FOTO 16:



FOTO 17:



FOTO 18:



FOTO 19:



FOTO 20:

PERIODO DEL INFORME: DEL: 19 de diciembre de 2024 hasta 25 de marzo de 2024



FOTO 21:



FOTO 22:



FOTO 23:



FOTO 24:



FOTO 25:



FOTO 26:

9. OBSERVACIONES	10. FIRMAS
	ING. JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ SUPERVISOR

INFORME DE ACTA PARCIAL No 7

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 192-2023

PROYECTO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Al CONTRATO DE OBRA 420-2023

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

PERIODO:

DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 25 DE MARZO DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

INFORME DE ACTA PARCIAL No 7

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 192-2023

PROYECTO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Al CONTRATO DE OBRA 420-2023

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

PERIODO:

DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 25 DE MARZO DE 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MUNICIPIO DE FLANDES
TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
CAPITULO 1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
2. ALCANCE DEL PROYECTO 6
CAPITULO 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 192-2023 11
2.1 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
2.1.1 GENERALIDADES 11
2.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA 12
2.1.3 EQUIPOS DE LA INTERVENTORIA 13
2.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 13
2.1.5 INFORMACIÓN - FÍSICO FINANCIERA 14
CAPITULO 3 POLIZAS VIGENTES 16
3.1 DENTRO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 192-2023 16
3.1.1 GARANTÍAS PACTADAS Y TOMADAS 16
CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
CAPITULO 5 REGISTRO FOTOGRAFICO 18
CAPITULO 6 DOCUMENTACIÓN ANEXA 22
6.1 RUT 22
6.2 Certificación Bancaria 22
6.3 Pagos de seguridad Social 22
6.1 RUT 23
6.2 Certificación Bancaria 24
6.3 Pagos de seguridad Social Octubre y Noviembre 25

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado del Acta Parcial de Interventoría No. 7, correspondiente al control, revisión y ejecución del proyecto denominado "**Realización de estudios, diseños y construcción de la Estación de Policía en la zona urbana del municipio de Flandes, departamento de Tolima.**"

En el documento se describen los aspectos más relevantes de la obra, tales como la descripción del proyecto, localización, cantidades de obra, revisiones técnicas y los oficios con medidas preventivas que se implementaron para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y el acatamiento de las especificaciones técnicas. El informe abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría en el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2024 y el 25 de marzo de 2025, con **un avance financiero del 30% con respecto al valor de la fase de construcción de obra** y un **avance acumulado del 90%** respecto al total de a interventoría a la construcción, dejando el 10% para la liquidación del contrato.

Este informe recopila el estado actual de la obra, mostrando el avance económico, físico y real del contrato. Dichos avances han sido supervisados por la interventoría, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato. Adicionalmente, se incluyen los controles y supervisiones de la obra mediante registros escritos en campo, anotaciones diarias en el libro de

obra conforme a los formatos establecidos, y un completo registro fotográfico que complementa la información.

El principal objetivo del Estado es servir a la comunidad, fomentar la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución. En este sentido, el municipio de Flandes, comprometido con la mejora de la seguridad de sus ciudadanos, ha gestionado y desarrollado proyectos enfocados en fortalecer los sistemas de seguridad. Estas acciones buscan garantizar la tranquilidad y seguridad de la población.

En respuesta a las necesidades de seguridad del municipio, la alcaldía de Flandes ha contratado la realización de los estudios, diseños y construcción de la Estación de Policía, después de haber completado los respectivos diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y eléctricos, en conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.

CAPITULO 1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Flandes es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Tolima, se encuentra localizado en el centro del país en la cuenca alta del río Magdalena, en las desembocaduras del río Bogotá, río Sumapaz y el río Coello. El proyecto se encuentra localizado en la transversal 10ª B zona urbana del municipio.

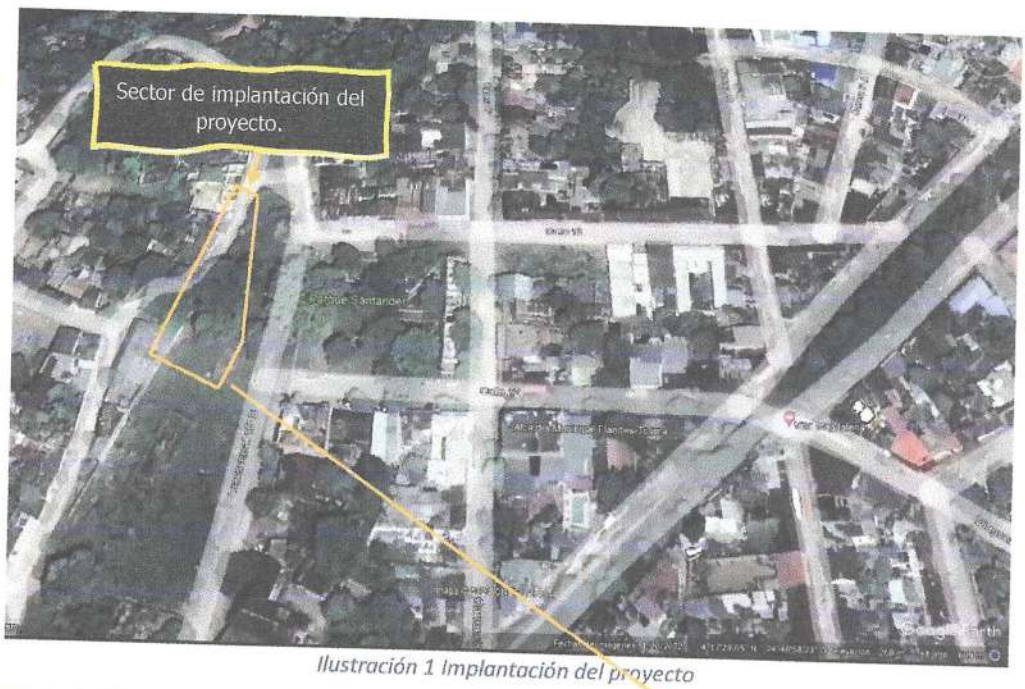


Ilustración 1 Implantación del proyecto



Ilustración 3 Localización de Flandes en Colombia



Ilustración 2 Localización del proyecto en Flandes

2. ALCANCE DEL PROYECTO

Se precisa desarrollar y ejecutar en el marco del convenio Interadministrativo No. 1908-2022 celebrado entre LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON y EL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEL MUNICIPIO DE TOLIMA. Derivando los siguientes contratos:
No 192-2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA".
No 183-2023 cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA."

El alcance del proyecto será descrito a continuación, de acuerdo con lo contratado por el municipio de Flandes - Tolima, describiendo el proyecto, con su respectiva localización, uso y área para entender mejor los beneficios para la comunidad que generará este proyecto.

El proyecto por ejecutar está compuesto de doce (12) capítulos, los cuales son:

1. PRELIMINARES: comprende las actividades iniciales necesarias para planificar y preparar un proyecto de construcción. En este proceso se incluyen tareas de localización, que implican la identificación y delimitación de las áreas donde se llevarán a cabo las obras, así como el replanteo, que consiste en establecer la ubicación exacta de elementos clave como cimientos, estructuras y servicios. Estas actividades son fundamentales para sentar las bases de un proyecto exitoso, asegurando una correcta ejecución y evitando posibles contratiempos durante las etapas posteriores de construcción.

2. ESTRUCTURAS: Contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección, y en general todas las relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución de las obras, se seguirán,

además, las recomendaciones del Código Colombiano Sismo-resistente y de los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha de la licitación. Este ítem abarca diversas actividades fundamentales para la construcción, que van desde la excavación de cimentación, que sienta las bases del proyecto, además se realiza el relleno en recebo común, el cual es compactado mecánicamente para asegurar la estabilidad del terreno, posterior a esto se procede al suministro e instalación de concreto de limpieza (solado) con una resistencia de 2000 PSI, seguido por la ejecución de columnas en concreto con una resistencia de 4000 PSI, que proporcionan el soporte necesario para la estructura.

3. INSTALACIONES ELECTRICAS: Se atenderán las últimas normas, manuales de especificaciones y publicaciones de las dependencias de La Entidad encargadas del diseño, aprobación, regulación y mantenimiento de este tipo de obras y las instrucciones de la Interventoría. Toda instalación eléctrica será debidamente planeada y proyectada y sus respectivos planos aprobados por La Entidad, antes de iniciarse la revisión y conexión definitiva.
4. CABLEADO ESTRUCTURADO: comprende el suministro e instalación de JACKS modulares categoría 6ª blindados para cable estructurado. El módulo de conector blindado se termina en un cable de par trenzado blindado de 4 pares y no requiere el uso de una herramienta de impacto. La tapa de terminación tiene un código de color azul para designar el rendimiento de la Categoría 6A e incluye una etiqueta universal codificada para los esquemas de cablead. el suministro e instalación de Face plate para la colocación de Jack blindado Cat. 6ª. Los face plate deben permitir la instalación de los jacks y debe ser modular, para alojar los jacks a instalar.
   suministro e instalación del Cable UTP Cat. 6 (Exterior Interior), se utilizan para sistema de transmisión de voz, datos y video a través de cableado estructurado en frecuencias normales hasta 250 MHz. También comprende el resto de las actividades necesarias de los ítems de obra para la correcta instalación de un cableado estructurado en la estación de policía.

5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: El ítem de Sistema de Puesta a Tierra es crucial para garantizar la seguridad eléctrica de la estación. Este sistema se encarga de disipar eficientemente la corriente excedente hacia la tierra, protegiendo así a las personas y equipos de posibles descargas eléctricas. Entre las actividades asociadas a este ítem se encuentran la instalación de electrodos, la conexión de equipos y la verificación de la resistencia del sistema, asegurando un funcionamiento óptimo y seguro de la infraestructura eléctrica.

ALCALDÍA DE
FLANDES

EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 192-2023

CERTIFICA:

Que, el contratista **CONSORCIO POLIESTACION NIT. 901.708.257-4** representante legal **JUAN CAMILO DIAZ VARGAS**, cumplió con el setenta y uno punto treinta y uno por ciento (92.83%) del contrato No. 192-2023 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."**.

Que el contratista **CONSORCIO POLIESTACION NIT. 901708257-4** representante legal **JUAN CAMILO DIAZ VARGAS**, ha efectuado los respectivos pagos a la seguridad social, salud, pensión y riesgos profesionales, durante la vigencia del contrato y se encuentra a paz y salvo a la fecha por este concepto, lo anterior dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide para autorizar el pago del ACTA No. 07 del contrato en mención, Por un valor de **CIENTO QUINCE MILLONES VEINTISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 31/100 MONEDA CORRIENTE ($ 115.026.194,31) MCTE.**

Nota: Autorícese los descuentos a los que haya lugar, de acuerdo a la retención de impuestos y gravámenes de tipo municipal, departamental o nacional, así como la respectiva amortización del anticipo de acuerdo al porcentaje del contrato si se hubiese hecho.

Para constancia de lo aquí manifestando se afirma la presente certificación, en el Municipio de Flandes a los veintitrés (15) días del mes de abril de 2025.

ING. JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ
SUPERVISOR

6. SISTEMA APANTALLAMIENTO: En cuanto al sistema de apantallamiento se comprenden las actividades de suministro e instalación de punta captora en aluminio con su debida base metálica, el alambrón de 8 mm y la caja plástica para conexión de bajante con cable de cobre para puesta tierra. El sistema de apantallamiento es la estructura diseñada para proteger o aislar a un sistema, equipo o componente electrónico de interferencias electromagnéticas externas o para evitar que estas interferencias sean emitidas al entorno. Este sistema es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento y la integridad de los dispositivos electrónicos en un entorno donde las interferencias electromagnéticas pueden afectar su rendimiento.

7. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO NORMALIZADO LISTADO: se refiere a la implementación y mantenimiento de un sistema integral diseñado para prevenir y combatir incendios en nuestras instalaciones. Este sistema incluye equipos y procedimientos estandarizados que aseguran la seguridad de todos los ocupantes y la protección del patrimonio. En el informe mensual se detallarán las acciones realizadas, el estado actual del sistema y las mejoras implementadas para garantizar su óptima funcionalidad. El sistema de protección contra incendio comprende las actividades de instalación de tubería ranurada y de PVC, la instalación de los diferentes accesorios, la aplicación de pintura para tubería, suministro e instalación de válvulas, más otras actividades adicionales que pondrán en funcionamiento el sistema.

8. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN METALICA: abarca la infraestructura física que sustenta la conectividad de redes de datos y telecomunicaciones en un entorno empresarial. Incluye la instalación de equipos necesarios para garantizar una comunicación eficiente, la implementación de tuberías de refrigeración para mantener una temperatura adecuada en los sistemas, el uso de refrigerante para controlar el calor generado por los equipos, y la presencia de tableros eléctricos de fuerza que distribuyen la energía eléctrica de manera segura y eficaz. Estos elementos son fundamentales para asegurar un funcionamiento óptimo de las redes y sistemas tecnológicos, contribuyendo al rendimiento y fiabilidad de las operaciones diarias.


9. RED DE GAS EN PEALPE: El ítem Red de Gas en Pealpe abarca las actividades relacionadas con la instalación y mantenimiento de la infraestructura de gas, que incluye la colocación de tuberías, válvulas cheque y puntos de gas. Además, se contempla el suministro e instalación de estufa empotrada, garantizando así un sistema seguro y funcional para el uso diario de la estación. El suministro e instalación de tubería PE AL PE 2"mm, para la red de gas. "PE al PE" se refiere a la unión que se da entre dos tuberías de


polietileno sin la necesidad de accesorios o conexiones adicionales. Esta técnica de conexión se utiliza comúnmente en sistemas de tuberías de gas para garantizar una conexión segura, también comprende la tubería que va desde salida del regulador de primera etapa hasta cada uno de los puntos de conexión de los gasodomésticos ubicados en las cocinas, el suministro e instalación de válvula para tubería en PE AL PE 16 mm para la red de gas y el punto de gas estufa.

10. REDES HIDROSANITARIAS: este ítem abarca un conjunto de actividades esenciales para el manejo y distribución del agua en nuestras instalaciones. Esto incluye la ejecución de instalaciones sanitarias que aseguran el correcto desagüe, la red de aguas lluvias que permite una adecuada evacuación de precipitaciones, las instalaciones hidráulicas que garantizan el suministro eficiente y seguro, así como la implementación de equipos y bombas que optimizan el funcionamiento del sistema.

11. ARQUITECTURA: El ítem de Arquitectura comprende una serie de actividades fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de nuestras instalaciones. La mampostería se encarga de la construcción de muros y estructuras sólidas, mientras que los pañetes y afinados aseguran un acabado liso y estético en las superficies. Las impermeabilizaciones son cruciales para proteger los espacios de la humedad, y las pinturas ofrecen no solo protección, sino también una imagen visual atractiva. En cuanto a los pisos, se trabaja en la instalación de materiales duraderos que faciliten el uso diario. El cielo raso proporciona un acabado estético y funcional al techo, mientras que la cubierta garantiza la protección del edificio contra las inclemencias del tiempo. La carpintería, tanto metálica como de madera y aluminio, se utiliza para crear elementos estructurales y decorativos, mientras que el mobiliario se refiere a la disposición de los espacios interiores. Las obras exteriores y el urbanismo abarcan el diseño de áreas al aire libre, mejorando la funcionalidad y estética del entorno. Además, se incluyen accesorios hidrosanitarios que son esenciales para el funcionamiento adecuado de las instalaciones. Por último, elementos especiales como el logo de la Policía Nacional destacan la identidad institucional de la estación.
12. ITEMS NO PREVISTO: este ítems comprende actividades no previstas durante el periodo de ejecución del contrato y la exclusión de actividades que no eran necesarias para la obra, con el fin de garantizar el alcance del proyecto, cabe aclarar que al balancear el contrato no fue necesario adicionar recursos y se mantuvo el mismo valor del contrato.

Ilustración 1 FACHADA DEL PROYECTO

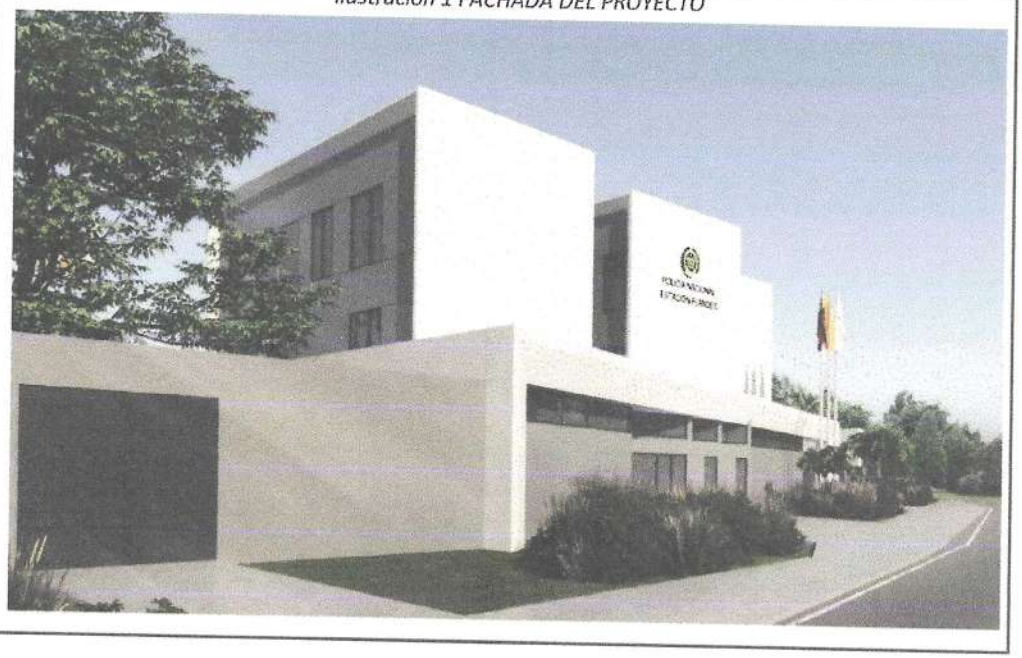

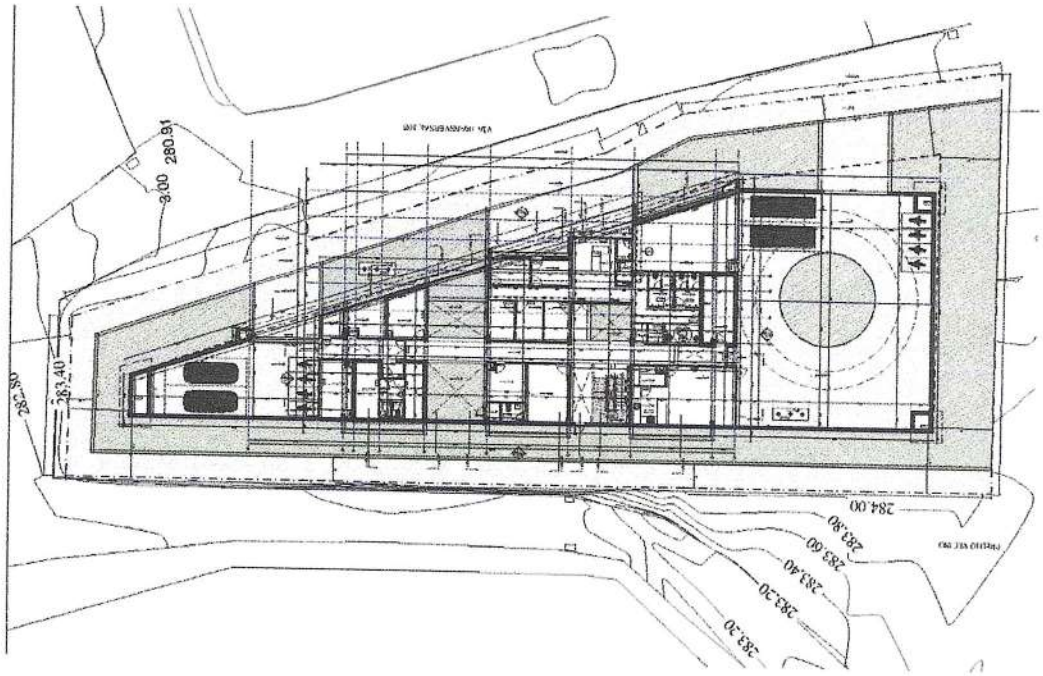

CAPITULO 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 192-2023

2.1 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.1 GENERALIDADES

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO POLIESTACIÓN – NIT 901708257-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS 5.829.612 de Ibagué
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($421.182.821) MCTE
VALOR ADICIONAL N° 1	CIENTO TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($113.338.099,00) MCTE
VALOR TOTAL	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($534.520.920,00) MCTE

PLAZO	HASTA EL 24 DE MARZO DEL 2024 CONTADOS APARTIR DEL ACTA DE INICIO
CDP:	2023000415 DEL 16 DE MARZO DE 2023
RP:	2023000689 DEL 05 DE MAYO DE 2023

CDP ADICION	2024000537 DEL 04 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DEL 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	07 DE MARZO DEL 2024
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	18 DE JUNIO DEL 2024
ACTA DE ADICION Y PRORROGA NO.1	05 DE JULIO DEL 2024
ACTA DE SUSUPENSION No.2	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA ACTA DE REINCIO No. 2	08 DE ENERO DE 2025
ACTA DE PRORROGA No. 2	08 DE ENERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE ABRIL DE 2025

2.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARGO/OFICIO	NOMBRE	(%) PORCENTAJE DE DEDICACION
DIRECTORA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION	Paola Andrea Rodríguez Alcalá	**70%**
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Huber Danilo Villarreal Rubio	**100%**
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Dairo Dueñas Morales	**30%**
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Sharon Dayana Guzmán González	**50%**
INGENIERO AMBIENTAL	Juan Felipe Flórez Barragán	**50%**
INGENIERO ELECTRICO	Adriana Patricia Pineda Peláez	**40%**
INGENIERO TOPOGRAFICO	Jorge Fernando Morales	**100%**
INSPECTOR SISO	Mara Victoria Lozano	**50%**

2.1.3 EQUIPOS DE LA INTERVENTORIA

- ✓ Cámara fotográfica
- ✓ Cinta métrica - flexo metro
- ✓ Computador-portátil
- ✓ Equipo de comunicaciones.

2.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- ✓ Registro fotográfico de las actividades desarrolladas dentro de la **"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA."**

- ✓ Coordinación conjunta en procesos constructivos de diferentes actividades, con seguimiento detallado.

- ✓ Toma de medidas de cantidades de obra de las actividades desarrolladas.

- ✓ Verificar que el contratista este ejecutando la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

- ✓ Observaciones en el libro Bitácora de las actividades realizadas por el contratista, personal de la obra, maquinaria y estado del tiempo.

- ✓ La Interventoría ha estado atenta para que el contratista cumpla con sus obligaciones técnicas y administrativas, dejado por escrito las inquietudes y observaciones necesarias para que cumplan con su cronograma y metas asignadas.

- ✓ Revisión de las afiliaciones de la seguridad social del personal en obra.


- ✓ Seguimiento del uso de equipo de seguridad como: guantes, cascos, tapa bocas, botas. Participación en las charlas dadas por la profesional en salud ocupacional del contratista.

- ✓ Toma de muestras de concreto en molde cilíndrico 4"x8" cuando se requiere, durante este periodo no se fue necesario la toma de muestras.

2.1.5 INFORMACIÓN - FÍSICO FINANCIERA


2.1.5.1 BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA No.192-2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	%
Valor inicial del contrato	$ 421.182.821,00		
Valor adicional contrato	$ 113.338.099,00		
Valor Acta Parcial No. 01		$ 50.366.757,44	9,42%
Valor Acta Parcial No. 02		$ 25.183.379,22	4,71%
Valor Acta Parcial No. 03		$ 75.550.136,34	14,13%
Valor Acta Parcial No. 04		$ 76.684.129,87	14,35%
Valor Acta Parcial No. 05		$ 76.684.129,87	14,35%
Valor Acta Parcial No. 06		$ 76.684.129,87	14,35%
Valor desembolsos realizados		$ 381.152.662,63	71,31%
Valor presente Acta No. 07		$115.026.194,31	21.52%
Saldo por ejecutar		$ 38.342.063,06	7,17%
SUMAS IGUALES	**$ 534.520.920,00**	**$ 534.520.920,00**	100,00%

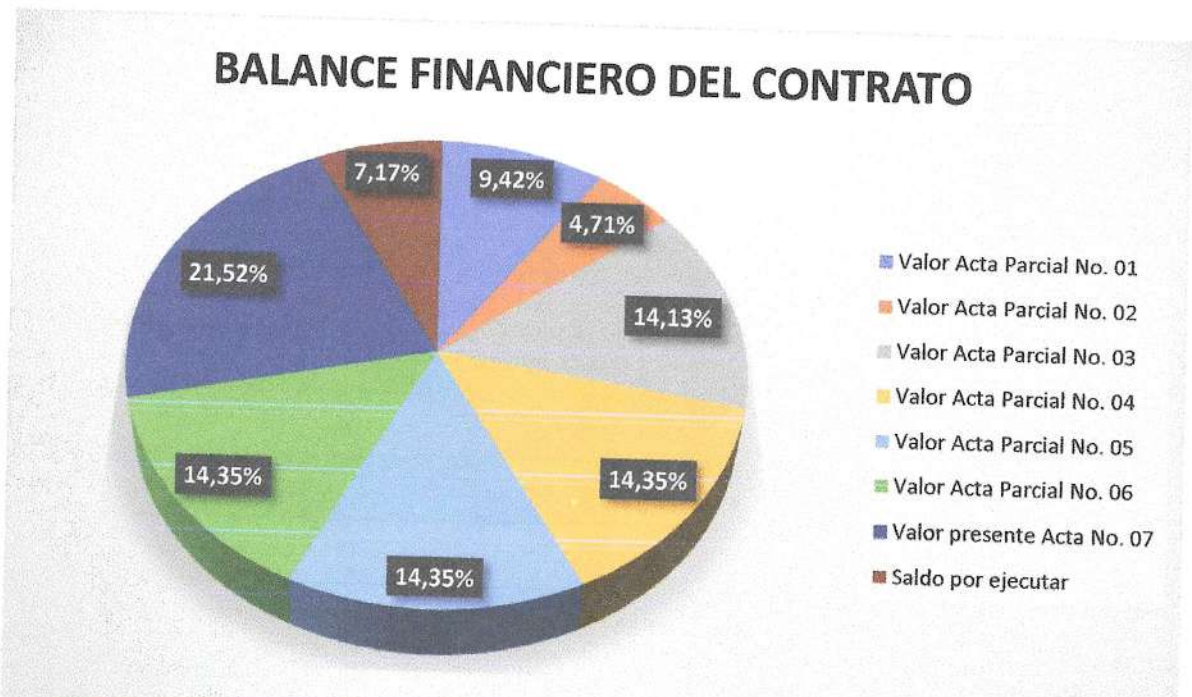

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO POR ETAPAS		
ETAPA 1 INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		
Valor Acta Parcial No. 01	$ 50.366.757,44	33,33%
Valor Acta Parcial No. 02	$ 25.183.379,22	16,67%
Valor Acta Parcial No. 03	$ 75.550.136,34	50,00%
Saldo por ejecutar	$ -	
TOTAL ETAPA 1	**$ 151.100.273,00**	100%
ETAPA 2 INTERVENTORÍA FASE (CONSTRUCCIÓN DE OBRA)		
Valor Acta Parcial No. 04	$ 76.684.129,87	20,00%
Valor Acta Parcial No. 05	$ 76.684.129,87	20,00%
Valor Acta Parcial No. 06	$ 76.684.129,87	20,00%
Valor Presente acta No. 07	**$ 115.026.194,31**	**30,00%**
Acumulado Etapa 2	**$ 345.078.583,92**	**90,00%**
Saldo por ejecutar Etapa 2 para liquidación	$ 38.342.063,08	10,00%
TOTAL ETAPA 2	**$ 383.420.647,00**	100,%
TOTAL	$ 534.520.920,00	



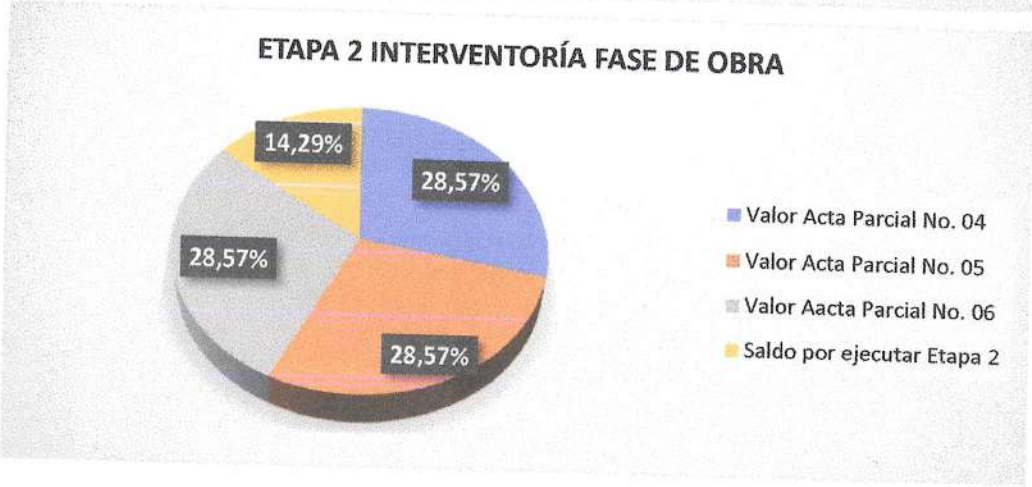

CAPITULO 3 POLIZAS VIGENTES

3.1 DENTRO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 192-2023

3.1.1 GARANTÍAS PACTADAS Y TOMADAS

ADICCION Y PRORROGA 1

Fecha de expedición: 08/05/2024

AMPARO	No. PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA	ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	I-100021892	$53.452.092.00	Desde 05-07-2024 Hasta 30-06-2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Pago salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones	I-100021892	$53.452.092.00	Desde 05-07-2024 Hasta 31-12-2027	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A
Estabilidad y calidad de la obra	I-100021892	$106.904.184.00	Desde 05-07-2024 Hasta 30-06-2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A

SUSPENSION N°2 Y PRORROGA N° 2

AMPARO	No. PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA	ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	I-100021892	$53.452.092.00	Desde 08-01-2025 Hasta 08-08-2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Pago salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones	I-100021892	$53.452.092.00	Desde 08-01-2025 Hasta 08-08-2028	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A
Estabilidad y calidad de la obra	I-100021892	$106.904.184.00	Desde 08-01-2025 Hasta 08-08-2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A

CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La interventoría lleva el noveno (9) mes de ejecución desde el 18 de junio de 2024 hasta el 25 de marzo de 2024 correspondiente al 90% de la interventoría de la obra. El contrato se divide en dos etapas, la Etapa 1 que consiste en la interventoría a la consultoría de estudios y diseños que esta ejecutado en un 100% y la etapa dos que consiste en la interventoría a la construcción de obra que está ejecutada en un 90%; de acuerdo a la forma de pago en la cláusula novena se cita:


  FORMA DE PAGO. *La Alcaldía realizara el pago correspondiente a la interventoría de la consultoría para la realización de estudios y diseño a través de pagos mensuales durante el tiempo que dure la consultoría. El pago correspondiente a la interventoría de la obra lo realizará a través de pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato y al acta final la cual será sobre el 10% del valor correspondiente a la interventoría para la obra el cual se pagará con la respectiva liquidación.*

  Como se menciona en la clausula novena, se pagará hasta el 90% a la interventoría de obra, que corresponde a la etapa 2, como se muestra en el informe y se esta dejando el 10% para liquidación

- ✓ Los materiales utilizados en obra tienen cuentan con sus certificados de calidad.
- ✓ Por último, la interventoría destaca que ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Sin embargo, está sujeta a la atención de los requerimientos por parte del contratista de obra, por lo que se ha realizado un seguimiento constante y se han reiterado las solicitudes, esperando que sean atendidas a la mayor brevedad posible.

CAPITULO 5 REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 01

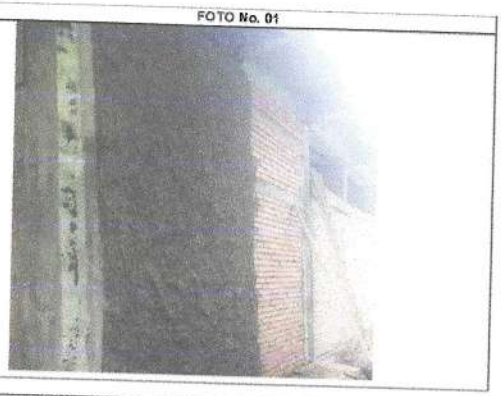

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Pañete fachada principal

FOTO No. 02



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Pañeter fachada lateral izquierda

FOTO No. 03



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Alclade columnetas

FOTO No. 04



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Pañeter interior al lado de escalera

FOTO No. 05




UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
	Construccion de dinteles

FOTO No. 06



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Muro tolete fachada posterior

FOTO No. 07

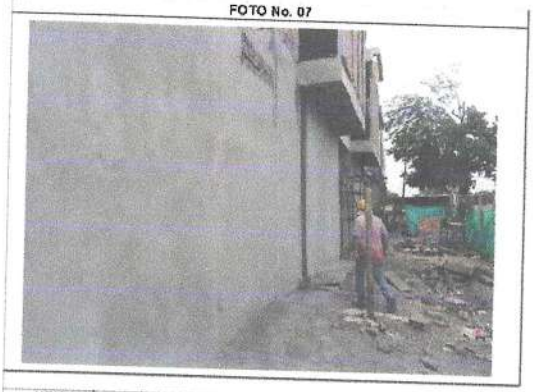

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	fachada posterios

FOTO No. 08



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	fachada posterior y lateral izquierda

FOTO No. 09



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Instalación de ductería eléctrica segundo piso

FOTO No. 10



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Instalación de ductería eléctrica segundo piso

FOTO No. 11



FOTO No. 12



FOTO No. 13



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Instalación de estructura metálica para cubierta

FOTO No. 14



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Ménsula metálica para estructura de cubierta

FOTO No. 15



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Construcción de garita


FOTO No. 16



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Construcción de pollos de cubierta



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Instalación de Cubierta

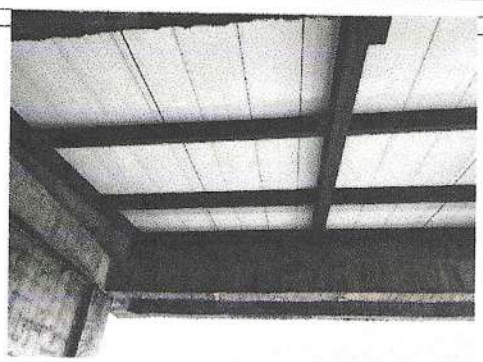


UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Instalación de Cubierta

FOTO No. 19




UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Instalacion de tableta en granito sala multiple

FOTO No. 20

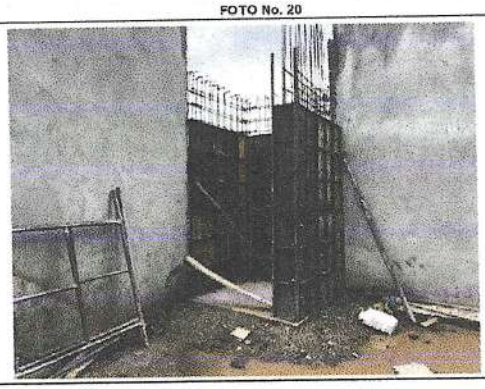


UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Instalacion de formaleta metalica para armerillo

FOTO No. 21

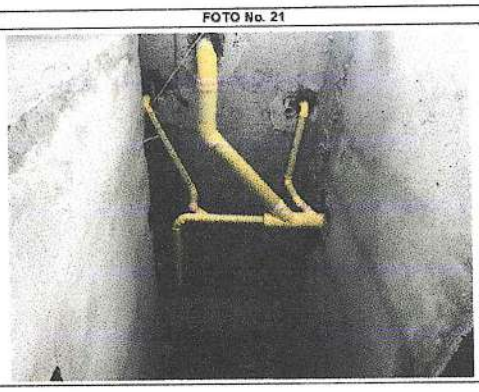


UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Pañete de alojamiento tercer piso

FOTO No. 22

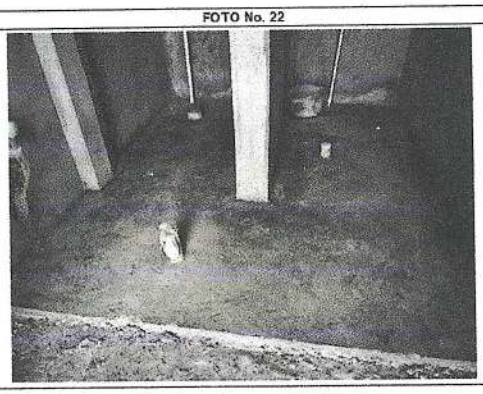


UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Apartamento fiscal, pañetes y estructura de cubierta

FOTO No. 23

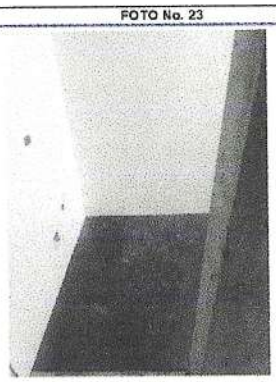

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Enchape piso para baños

FOTO No. 24

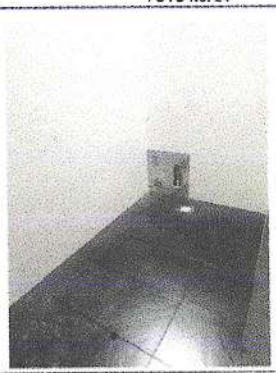

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Enchape piso para baños

CAPITULO 6 DOCUMENTACIÓN ANEXA

6.1 RUT

6.2 Certificación Bancaria

6.3 Pagos de seguridad Social

6.4 Contratos

6.5 Certificado parafiscales

JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
CONSORCIO POLIESTACIÓN

6.1 RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14911296086

(415)7707212489984(8020) 000001491129608 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 8 2 5 7	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO POLIESTACION

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 5 11 24 OF 802 ED TORRE EMPRESARIAL

42. Correo electrónico anlagenbauer@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 2 6 0 7 4 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 4 1 7					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 9 61. Fecha 2023 - 04 - 28 / 11 : 38: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CLAVIJO CAICEDO GERMAN DARIO
985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

6.2 Certificación Bancaria

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO POLIESTACION identificado(a) con NITPJ 9017082574 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 370572901 desde el 16 de agosto de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 29 de agosto de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

6.3 Pagos de seguridad Social Octubre y Noviembre

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 11 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1385586667	9482170764	I	2025/03/11	2025/04/03	SCOTIABANK COLPATRIA	23	$662,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$4,300	$0	$298,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$4,300	$0	$298,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$1,900	$0	$130,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$128,100	$1,900	$0	$130,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$3,400	$0	$233,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$3,400	$0	$233,400
TOTAL				1	$652,500	$9,600	$0	$662,100

2025/04/03 04:11 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 11 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1245096415	9480765823	I	2025/02/11	2025/02/05	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$652,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$0	$0	$128,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$128,100	$0	$0	$128,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$652,500	$0	$0	$652,500

2025/02/05 09:52 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 11 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1093272486	9478340420	I	2025/01/13	2024/12/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$652,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$0	$0	$128,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$128,100	$0	$0	$128,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$652,500	$0	$0	$652,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS	CARRERA 10 3 11	2607436	anlagenbauer@hormail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-01	E	14/03/2025	84177689	$1.268.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	SIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	5829612	DIAZ VARGAS JUAN CAMILO	1	0			SI																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	93410511	VILLARREAL RUBIO HUBER DANILO	1	0			SI																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS	CARRERA 10 3 11	2607436	anlagenbauer@hormail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	05/02/2025	83622282	$1.261.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	DIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	5829612	DIAZ VARGAS JUAN CAMILO	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	93410511	VILLARREAL RUBIO HUBER DANILO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS		CARRERA 10 3 11	2607436	anlagenbauer@hormail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	05/02/2025	82609517	$1.289.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Empresa	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9525812	DIAZ VARGAS JUAN CAMILO	1	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	93410511	VILLARREAL RUBIO HUBER DANILO	1	0			N																	250201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1156976100	9479609546	I	2025/01/07	2024/12/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/12/27 03:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1295581476	9479907174	I	2025/02/05	2025/02/27	BANCOLOMBIA	22	$419,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$3,400	$0	$231,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$3,400	$0	$231,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$200	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,600	$0	$180,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$2,600	$0	$180,600
TOTAL				1	$413,300	$6,200	$0	$419,500

2025/02/27 09:29 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1381772531	9481939767	I	2025/03/05	2025/04/02	BANCOLOMBIA	28	$420,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$4,100	$0	$231,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$4,100	$0	$231,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$200	$0	$7,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$200	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$3,200	$0	$181,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$3,200	$0	$181,200
TOTAL				1	$413,300	$7,500	$0	$420,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65782223		GUZMAN GONZALEZ SHARON DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 5- 54 APT 302 BARRIO EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2644840	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1347960653	9482050573	I	2025/03/07	2025/03/19	BANCO DAVIVIENDA	12	$518,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$1,800	$0	$233,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,000	$1,800	$0	$233,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$101,000	$800	$0	$101,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$101,000	$800	$0	$101,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,300	$1,400	$0	$182,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$181,300	$1,400	$0	$182,700
TOTAL				1	$514,300	$4,000	$0	$518,300

2025/03/19 11:54 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65782223		GUZMAN GONZALEZ SHARON DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 5- 54 APT 302 BARRIO EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2644840	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1246193698	9480665687	I	2025/02/07	2025/02/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$514,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$0	$0	$232,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,000	$0	$0	$232,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$101,000	$0	$0	$101,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$101,000	$0	$0	$101,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,300	$0	$0	$181,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$181,300	$0	$0	$181,300
TOTAL				1	$514,300	$0	$0	$514,300

2025/02/05 03:45 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65782223		GUZMAN GONZALEZ SHARON DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 5- 54 APT 302 BARRIO EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2644840	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133786394	9479027109	I	2025/01/09	2024/12/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$780,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$153,200	$0	$0	$153,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$153,200	$0	$0	$153,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$780,200	$0	$0	$780,200

2024/12/17 12:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110576522		FLOREZ BARRAGAN JUAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 7 CS 11 B SANTA ISABEL	IBAGUE-TOLIMA	3115438758	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1345296437	9483236453	I	2025/03/07	2025/03/18	BANCOLOMBIA	11	$408,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,600	$0	$229,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,300	$0	$179,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,300	$0	$179,300
TOTAL				1	$405,800	$2,900	$0	$408,700

2025/03/18 10:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110576522		FLOREZ BARRAGAN JUAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 7 CS 11 B SANTA ISABEL	IBAGUE-TOLIMA	3115438758	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1321239262	94B1390932	I	2025/02/07	2025/03/10	BANCOLOMBIA	31	$414,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$4,700	$0	$232,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$4,700	$0	$232,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$3,600	$0	$181,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$3,600	$0	$181,600
TOTAL				1	$405,800	$8,300	$0	$414,100

2025/03/07 08:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110576522		FLOREZ BARRAGAN JUAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 7 CS 11 B SANTA ISABEL	IBAGUE-TOLIMA	3115438758	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1321229650	9481390835	I	2025/01/09	2025/03/10	BANCOLOMBIA	60	$384,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$8,100	$0	$216,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$8,100	$0	$216,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$6,300	$0	$168,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$6,300	$0	$168,800
TOTAL				1	$370,500	$14,400	$0	$384,900

2025/03/07 08:17 PM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA PATRICIA PINEDA PELAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-65761555
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-13
FECHA DE PAGO:	2025-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32526646
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32526646
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.500	$ 262.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 336.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000	$ 22.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 620.500	$ 620.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA PATRICIA PINEDA PELAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-65761555
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-02-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-13
FECHA DE PAGO:	2025-02-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32524440
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32524440
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 72.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.200	$ 92.200
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.200	$ 92.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 6.000
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.200	$ 170.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA PATRICIA PINEDA PELAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-65761555
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-01-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-15
FECHA DE PAGO:	2025-01-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	32226125
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32226125
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600	$ 13.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 384.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2025

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONSTRUYE GYM BTA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901723938
SUCURSAL	084
FECHA PAGO	2025-0-27
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-79855590
NOMBRE EMPLEADO	JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32649436
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-01
PERÍODO SALUD	2025-02
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	696

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONSTRUYE GYM BTA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901723938
SUCURSAL	65
FECHA PAGO	2025-01-17
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-79855590
NOMBRE EMPLEADO	JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32878905
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-12
PERÍODO SALUD	2025-01
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	696

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONSTRUYE GYM BTA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901723938
SUCURSAL	63
FECHA PAGO	2024-12-26
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-79855590
NOMBRE EMPLEADO	JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32878905
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-11
PERÍODO SALUD	2024-12
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0696000	$ 90.500	696

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 402.500

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-03-01, 09:50:27 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	MARA VICTORIA LOZANO VARGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 65750824
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1070763955
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1302313930
Banco	(1811) - RAPPIPAY
Valor	$ 2.131.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 1.207.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 887.500	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 37.100	$ 0
		SubTotales:		$ 2.131.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.131.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-31, 10:48:00 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2025
Empresa	MARA VICTORIA LOZANO VARGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 65750824
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1069221038
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1164933044
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 1.948.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 1.103.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 811.300	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 33.900	$ 0
		SubTotales:		$ 1.948.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.948.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-10, 07:27:07 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	MARA VICTORIA LOZANO VARGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 65750824
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068732238
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1114524028
Banco	(1811) - RAPPIPAY
Valor	$ 742.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 300.000	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 58.500	$ 0
		SubTotales:		$ 742.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 742.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

6.4 Contratos

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.001-24

Entre los suscritos a saber **CONSORCIO POLIESTACION**, identificado con Nit. Número 901.708.257-4, quien se denominará EL CONTRATANTE y por la otra CONSTRUYE GYM BTA SAS, identificada con el NIT número 901723938 y quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato para prestar bajo la nómina de CONSTRUYE GYM BTA SAS, los servicios del señor JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS, **identificado** con cédula de ciudadanía número 79.855.590 de Bogotá, identificada como quien *cumple* con los requisitos de su requerimiento de personal, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA en su calidad de prestador del servicio, suministrara a la profesional JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS, para que ejerza las actividades de **INGENIERO TOPOGRAFICO,** quien se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: INGENIERO TOPOGRAFICO **DE INTERVENTORÍA EN EL PROYECTO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA."**, con una disponibilidad del 100%, sin que exista horario determinado, ni dependencia. **PARAGRAFO**: El profesional que prestará el servicio no tiene ninguna función asignada ajena a la ejecución del objeto contractual en mención con CONSTRUYE GYM BTA SAS **SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de SIETE (6) meses, contados a partir del DIECIOCHO (18) del mes de Junio de 2024, y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **TERCERA. - PRECIO**: El valor mensual del contrato será por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE. **CUARTA. - FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será cancelado así: PAGOS MENSUALES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE, previa presentación de informe mensual de sus actividades. **QUINTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATANTE *deberá cumplir en forma eficiente y oportuna* los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.002-24

Entre los suscritos a saber **CONSORCIO POLIESTACION**, identificado con Nit. Número 901.708.257-4, quien se denominará EL CONTRATANTE y por la otra **ANLAGENBAUER S.A.S**, identificada con el NIT número 901.497.811-4 y quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato para prestar bajo la nómina de Anlagenbauer S.A.S los servicios del señor HUBER DANILO VILLARREAL RUBIO, **identificado** con cédula de ciudadanía número 93410511 de Ibagué (Tol.), identificada como quien *cumple* con los requisitos de su requerimiento de personal, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA en su calidad de prestador del servicio, suministrara a la profesional **HUBER DANILO VILLARREAL RUBIO,** para que ejerza las actividades de **INGENIERO,** quien se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN EL PROYECTO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA."**, con una disponibilidad del 100%, sin que exista horario determinado, ni dependencia. **PARAGRAFO**: El profesional que prestará el servicio no tiene ninguna función asignada ajena a la ejecución del objeto contractual en mención con ANLAGENBAUER S.A.S. **SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de SIETE (6) meses, contados a partir del PRIMERO (1) del mes de septiembre de 2024, y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **TERCERA. - PRECIO**: El valor mensual del contrato será por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE. **CUARTA. - FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será cancelado así: PAGOS MENSUALES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE, previa presentación de informe mensual de sus actividades. **QUINTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATANTE deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual

6.5 certificado parafiscales

Niyireth Dueñas Morales
Contadora Pública

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA
NIYIRETH DUEÑAS MORALES
CERTIFICA

Que CONSORCIO POLIESTACION, identificada con NIT 901708257-4, se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 , en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide para el ACTA DE AVANCE N° 7, periodo comprendido desde el 19 de diciembre de 2024 al 25 de marzo de 2025, del contrato de interventoría No 192 DE 2023, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

Dada en Ibagué a los ocho (08)días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
CONTADORA PÚBLICA
T.P 100.287-T

Dirección: Bosques de Alameda Mz a Cs 24 Ibagué – Tolima - Teléfono 2618186
Celular: 3158007707 - E-mail: niyidm.e7@hotmail

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B0982F4F9980A51C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIYIRETH DUEÑAS MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65738338 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 100287-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 65.738.338
DUEÑAS MORALES

APELLIDOS
NIYIRETH

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1967
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-OCT-1986 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00127429-F-0065738338-20081113 0005898021A 1 6350023112



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100287-T

NIYIRETH
DUEÑAS MORALES
C.C. 65738338
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
MIGUEL T[illegible]E PEÑA

107713

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

+-
