INFORME DE SUPERVISIÓN

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION ACTA No:		3			FECHA:	7	de	abril	de	2025		
TIPO DE INFORME:	PARCIAL		FINAL	X	PERIODICIDAD:			FINAL				
PERIODO:	DEL	31	de	AGOSTO	de 2023	AL	29	de	OCTUBRE	de	2023	
PERIODO:	DEL	2	de	NOVIEMBRE	de 2023	AL	15	de	FEBRERO	de	2024	
PERIODO:	DEL	16	de	MAYO	de 2024	AL	5	de	SEPTIEMBRE	de	2024	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	030	DE	2021	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2021-15-516-0091

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 1.851.006.282,00	$ 2.614.406.135,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT		REPRESENTANTE LEGAL	
RED VITAL S.A. E.S.P		YEISON ROKNEY TORRES SUAREZ	
NIT	900.259.348-5	C.C.	1.053.611.160

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	14	12	2021

PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL MISMO
PLAZO ADICIONAL 1	SEIS (6) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 3	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 4	QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL 5	DOCE (12) DIAS
PLAZO ADICIONAL 6	UN (01) MES Y TRECE (13) DIAS
PLAZO ADICIONAL 7	CATORCE (14) DIAS
PLAZO ADICIONAL 8	VEINTE (20) DIAS
PLAZO ADICIONAL 9	TREINTE (30) DIAS
PLAZO ADICIONAL 10	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL 11	VEINTE (20) DIAS
PLAZO CON ADICIONES	VEINTISEIS (26) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	13	10	2022
FECHA DE TERMINACION REAL SEGÚN PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	5	9	2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	25	02	2022
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1	21	04	2022
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	30	06	2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 2	31	07	2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	30	10	2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. 3	2	11	2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4	16	02	2024
FECHA DE REINICIACIÓN No. 4	16	05	204
ACTA DE TERMINACIÓN	5	09	2024
ACTA DE RECIBO FINAL	7	04	2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	14	12	2021
ACTA PARCIAL 1	13	4	2023
ACTA PARCIAL 2	27	10	2023
ACTA DE TERMINACION	6	9	2024
ACTA DE RECIBO FINAL	7	4	2025

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	NIT: 891.801.240-1
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
26/05/2022	Adicional en valor N°1	$ 203.614.440,00	
7/12/2022	Adicional en plazo N°1	$ -	SEIS 6 MESES Y VEINTICUATRO 24 DIAS
3/08/2023	Adicional en plazo N°2	$ -	UN 1 MES
16/08/2023	Adicional en valor N°2 y adicional en plazo N°3	$ 232.792.598,00	UN 1 MES
29/09/2023	Adicional en plazo N°4	$ -	QUINCE 15 DIAS
18/10/2023	Adicional en plazo N°5	$ -	DOCE 12 DIAS
3/11/2023	Adicional en valor N°3 y adicional en plazo N°6	$ 326.992.815,00	UN 1 MES Y TRECE 13 DIAS
15/12/2023	Adicional en plazo N°7	$ -	CATORCE 14 DIAS
29/12/2023	Adicional en plazo N°8	$ -	VEINTE 20 DIAS
18/01/2024	Adicional en plazo N°9	$ -	TREINTA 30 DIAS
17/05/2024	Adicional en plazo N°10	$ -	TRES 3 MESES
14/08/2024	Adicional en plazo N°11	$ -	VEINTE 20 DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		763.399.853,00	VEINTISEIS (26) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS

VALOR INICIAL	$ 1.851.006.282,00	VALOR ADICIONALES	$ 763.399.853,00	VALOR TOTAL	$ 2.614.406.135,00

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1	26/05/2022	Clausula segunda	cambio adición en valor
2	7/12/2022	Clausula segunda	cambio adición en valor y adición en tiempo
3	19/08/2023	Clausula segunda	cambio adición en valor y adición en tiempo
4	2/11/2023	Clausula segunda	cambio adición en valor y adición en tiempo

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
4005327	0	12/11/2021	HDI SEGUROS S.A	6/12/2021
4005327	2	14/12/2021	HDI SEGUROS S.A	15/12/2021
4005327	4	25/05/2022	HDI SEGUROS S.A	26/05/2022
4005327	5	9/09/2022	HDI SEGUROS S.A	12/09/2022
4005327	6	26/12/2022	HDI SEGUROS S.A	26/12/2022
4005327 - 40010001	7 - 8	2/08/2023	HDI SEGUROS S.A	16/08/2023
4005327 - 40010001	8 - 9	2/08/2023	HDI SEGUROS S.A	7/09/2023
4005327 - 40010001	10	27/10/2023	HDI SEGUROS S.A	27/10/2023
4005327 - 40010002	11	9/11/2023	HDI SEGUROS S.A	4/01/2024
4005327 - 40010003	14 -15 - 16	6/06/2024	HDI SEGUROS S.A	
4005327	17	29/08/2024	HDI SEGUROS S.A	5/09/2024

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	JULIO	9454858739	11	8	2023
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	AGOSTO	9456086232	12	9	2023
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	SEPTIEMBRE	9457544096	11	10	2023
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	OCTUBRE	9458915809	15	11	2023
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	NOVIEMBRE	9460325073	13	12	2023
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	DICIEMBRE	9461629634	17	1	2024
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	ENERO	9462817331	9	2	2024
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	FEBRERO	9464238945	12	3	2024
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	ABRIL	9467061702	14	5	2024
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	MAYO	9468491062	12	6	2024
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	JUNIO	9469825470	10	7	2024
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	JULIO	9471225898	12	8	2024
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	AGOSTO	9473079183	11	9	2024
RED VITAL PAIPA SA E.S.P	900.259.348	X	X	X	SEPTIEMBRE	9475067542	8	10	2024

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	810	TIEMPO TRANSCURRIDO	810	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	0
% PROGRAMADO CTO	100,00%	% DE AVANCE CTO	100,00%	%RETRASO	0,00%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

SE PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO DEL 82,6% EN LA PARTE FINANCIERA Y EL 100% EN LA OBRA FISICA DE LA INSTALACION DE LA RED , PASO NIVELES, CAJAS , ACCESORIOS , DEL TOTAL DEL CONVENIO GARANTIZANDO LA FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR EL CONTRATISTA Y VIABILIZADAS POR LA INTERVENTORIA , LA EMPRESA RED VITAL REALZARA LA CONSTRUCCION DE LA CAJA DE MICROMEDICION , FILTRO LA CUAL DEBE SER DISEÑADA Y CONSTRUIDA EN CONCRETO SALIENDO DEL ALCANCE DEL CONVENIO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO								
ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)				VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	PRELIMINARES							
1,1	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM)	M2	0	X				
1,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	2339,42	X			47%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
2	EXCAVACIONES							
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	-249,13	X			-21%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
2.2	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	-10,22	X			-1%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 1	3.03.11. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	385,43	X			39%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 2	1.02.18. EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO)	M3	169,15	X			19%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
3	RELLENOS							
3.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	1245,14	X			35%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
3.2	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	107,57	X			26%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
3.3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M3	0	X				
4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm (12 PULGADAS)							
4,1	INSTALACIÓN TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm (12 PULGADAS)	ML	3908,42	X			78%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
4.2	SUMINISTRO TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm (12 PULGADAS)	ML	212,42	X			4%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS							
5.1	SUMINISTRO ACCESORIOS HIDRÁULICOS							
5,1.1	SUMINISTRO MACROMEDIDOR 12" EXTREMO BRIDA INCLUYE ACCESORIOS	UND	0	X				
5.1.2	SUMINISTRO VALVULA COMPUERTA ELASTICA 12" EXTREMO BRIDA. INCLUYE ACCESORIOS	UND	1	X			50%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
5.1.3	SUMINISTRO VALVULA VENTOSA DE 3" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0	X				
5.1.4	SUMINISTRO VALVULA PURGA 6 PULGADAS NCLUYE ACCESORIOS	UND	0	X				
5.1.5	SUMINISTRO VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6" EXTREMO BRIDA INCLUYE ACCESORIOS	UND	2	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
5.2	INSTALACIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS							
5.2.1	INSTALACION MACROMEDIDOR 12" EXTREMO BRIDA INCLUYE ACCESORIOS	UND	0	X				
5.2.2	INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA 12" EXTREMO BRIDA INCLUYE ACCESORIOS	UND	1	X			25%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
5.2.3	INSTALACION VALVULA DE VENTOSA 3 PULGADAS INCLUYE ACCESORIOS	UND	0	X				
5.2.4	INSTALACION VALVULA DE PURGA 6 PULGADAS INCLUYE ACCESORIOS	UND	0	X				
5.2.5	INSTALACION VALVULA COMPUERTA ELASTICA 6" EXTREMO BRIDAS. INCLUYE ACCESORIOS	UND	2	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE INSPECION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO							
6,1	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADRILLO	UND	10	X			32%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
7	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA DE QUIEBRE							
7,1	CAMARA DE QUIEBRE EN CONCRETO 4000 P.S.I IMPERMEABILIZADO INCLUYE REFUERZO, PASAMUROS DE 1.4 X 1 X 1.2M	UND	0	X				
8	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL							
8,1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	0	X				
	ITEMS NO PREVISTOS							
INP 1	3.03.11. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	0	X				
INP 2	1.02.18. EXCAVACION MECANICA EN ROCA DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS, (INCLUYE RETIRO)	M3	0	X				
4,1	INSTALACIÓN TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm (12 PULGADAS)	ML	0	X				
4.2	SUMINISTRO TUBERÍA PE 100 PN 8 RDE 21 DIAMETRO 315 mm (12 PULGADAS)	ML	-82	X				La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción

	ITEMS NO PREVISTOS							
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS							
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA COMBINADA 2" TRIPLE EFECTO INCLUYE ACCESORIOS	UND	15	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE 2" PARA ROSCAR	UND	15	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA COMBINADA 1" TRIPLE EFECTO INCLUYE ACCESORIOS	UND	6	X			40%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA DE 1" PARA ROSCAR	UND	6	X			40%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE ACERO INOX D1 12" X 2"	UND	21	X			70%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REGULADORA DE PRESION 150 br 206 pr 12"	UND	1	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARTIDA 3490 EN ACERO INOX DE 315 MM X 6 PARA PE	UND	0	X				
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA ELASTICA BR 4" INCLUYE ACCESORIOS	UND	0	X				
INP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARTIDA 3490 EN ACERO INOX DE 315 MM X 4" PARA PE	UND	0	X				
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA AQT COMPUERTA ELASTICA BR 8"	UND	1	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PARTIDA 3490 EN ACERO INOX DE 12" 315 MM X 8 PARA PE	UND	1	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 14	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLAR DE ACERO INOX D1 12" X 4"	UND	0	X				
INP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO EN YEE AQT BR 12"	UND	1	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
	CONSTRUCCION MUERTOS							
INP 16	CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) PARA MUERTOS (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M3	24,1	X			99%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
	CONSTRUCCION PASOS ELEVADOS							
	PRELIMINARES							
INP 17	2.01.04. LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	M2	34,94	X			87%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
	CIMENTACION							
INP 18	3.03.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	M3	0,78	X			31%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 19	3.03.22. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,11	X			52%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 20	2.07.05. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	M3	2,94	X			100%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 21	2.07.04. CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	M3	0,81	X			99%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 22	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	262,47	X			78%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
	ESTRUCTURAS							
INP 23	SUMINISTRO, INSTALACION CONEXIONES	KG	229,8	X			63%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 24	SUMINISTRO, INSTALACION PLACAS BASE	KG	54,38	X			27%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	1565,6	X			73%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
INP 26	3.13.34. PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	220,87	X			48%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción
	TRANSPORTE							
INP 27	2.07.10. TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	VIAJE	769	X			77%	La interventoria verifico y acompaño la ejecución de la actividad a satisfacción

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

LA SUPERVISION A LA EJECUCION DEL CONVENIO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31-08-2023 AL 29-10-2023 Y DEL 02-11-2023 AL31-12-2023 FUE EJERCIDA POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PERIODO 2020-2023, LO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2024 AL 15-02-2024 Y DEL 16-05-2024 AL 05-09-2024 FUE EJERCIDA POR FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PERIODO 2024-2027 HACIENDO REVISION DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y OBRAS POR TERMINAR

LA EMPRESA RED VITAL REALIZO TERMINADO DE ACABADOS CAJAS Y PASO NIVEL DEL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2024 ADICIONALMENTE SIN CARGO AL CONVENIO DESARROLLO OBRAS DE MEJORAMIENTO FIJACION TUBERIA MUERTOS EN CONCRETO Y PROTECCION VALVULAS CON CAJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS ESTAS ACTIVIDADES NO AFECTARON LOS RECUROS DEL CONVENIO , RED VITAL CON SUS RECURSOS SE COMPORMETE A REALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA CAJA DONDE SE UBICA LA REGULADORA Y FILTROS LA CUAL ESTA EN LA VIA Y REQUIERE CONDICIONES ESPECIALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION FUERA DEL ALCANCE DEL CONVENIO

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PAGOS

DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ANTICIPO	33%	14	12	2021	$ 648.747.250,00
ACTA PARCIAL No 1	22%	13	4	2023	$ 423.763.169,00
ACTA PARCIAL No 2	17%	27	10	2023	$ 329.621.093,59
ACTA RECIBO A SATISFACCION	18%	7	4	2025	$ 353.077.599,41
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS					**$ 1.755.209.112,00**

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

EL VALOR ETOTAL EJECUTADO DEL CONVENIO CORRESPONDE A $ 2.160.563.562,87 INCLUIDOS LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y APORTES DE RED VITAL QUE CORRESPONDE A 82,6 % EN ALCANCE FINANCIERO

SE PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DE $ 1.755.209.112 DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA ENTIDAD Y UN SALDO NO EJECUTADO DE 190,258,421 POR PARTE DE LA EMPRESA RED VITAL COMO CONTRAPARTIDAD SE EJECUTO UN TOTAL DE $ 405.354.450,87 Y NO EJECUTADO DE $ 263.584.151,13

S4E PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100% DONDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	RIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe del contratista No 00 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA				13	12	2021	
Informe del contratista No 01 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	14	12	2021	13	1	2022	
Informe del contratista No 02 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	14	1	2022	13	2	2022	
Informe del contratista No 03 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	14	2	2022	24	2	2022	
Informe del contratista No 04 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	4	2022	20	5	2022	
Informe del contratista No 05 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	5	2022	20	6	2022	
Informe del contratista No 06 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	6	2022	20	7	2022	
Informe del contratista No 07 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	7	2022	20	8	2022	
Informe del contratista No 08 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	8	2022	20	9	2022	
Informe del contratista No 09 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	9	2022	20	10	2022	
Informe del contratista No 10 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	10	2022	20	11	2022	
Informe del contratista No 11 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	11	2022	20	12	2022	
Informe del contratista No 12 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	12	2022	20	1	2023	
Informe del contratista No 13 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	1	2023	20	2	2023	
Informe del contratista No 14 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	2	2003	20	3	2023	
Informe del contratista No 15 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	3	2023	20	4	2023	
Informe del contratista No 16 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	4	2023	20	5	2023	

Informe del contratista No 17 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	5	2023	20	6	2023	
Informe del contratista No 18 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	6	2023	29	6	2023	
Informe del contratista No 19 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	21	7	2023	30	8	2023	
Informe del contratista No 20 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	31	8	2023	30	9	2023	
Informe del contratista No 21 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	1	10	2023	31	10	2023	
Informe del contratista No 22 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	2	11	2023	1	12	2023	
Informe del contratista No 23 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	2	12	2023	1	1	2024	
Informe del contratista No 24 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	2	1	2024	15	2	2024	
Informe del contratista No 25 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	16	5	2024	15	6	2024	
Informe del contratista No 26 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	16	6	2024	15	7	2024	
Informe del contratista No 27 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CHORRO BLANCO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAIPA DEPARTAMENTO DE BOYACA	16	7	2024	5	9	2024	

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:


la supervision ejercida desde el acta de inicio hasta el 31-12-2023 no fue ejercida por funcionarios de la administratcion municpal 2024-2023
la empresa red vital se compromete a realizar la construccion de la caja de valulas , reguladoras que se encuentra sobre la via con los recursos de la empresa ya que se deben revisar el sistema constructivo y diseños para garantizar su resistencia por la ubicacion , razon por lo cual no se ejecuto en el convenio
en el presente periodo no hubo ejecucion ambiental por lo cual no se presentaron soportes por parte del contratista e intervenjtoria a la supervision
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor

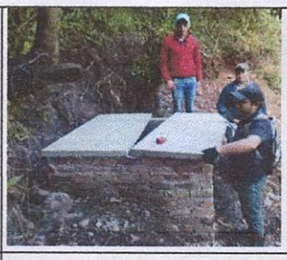
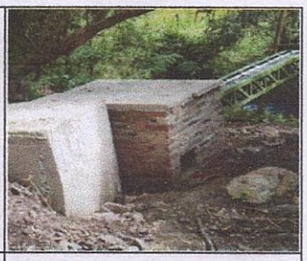
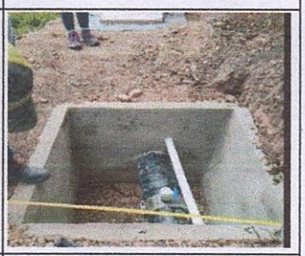
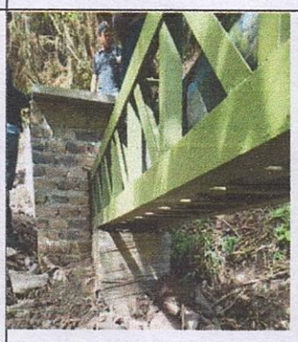
LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:


Supervisor

NOMBRE	JORGE EDWIN LÓPEZ

REGISTRO FOTOGRAFICO

			
VERIFICACION PORFUNDIDAD TUBERIA	VERIFICACION PORFUNDIDAD TUBERIA	VERIFICACION PORFUNDIDAD TUBERIA	VERIFICACION PORFUNDIDAD TUBERIA
			
VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO	VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO	VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO	VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO
			
VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO	VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO	VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO	VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO
			
VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO	VERIFICACION ANCLAJES TUBERIA Y MUERTOS EN CONCRETO	VALVULAS	CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS

			
CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS	CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS	CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS	CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS
			
CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS	CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS	CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS	CAJAS DE INSPECCION Y VALVULAS
			
FILTRO, VALVULAS REGULADORAS	PASO NIVEL 1	PASO NIVEL 1	CERCHA Y ESTRUCTURA PASO NIVEL 1
			
CERCHA Y ESTRUCTURA PASO NIVEL 1	CERCHA Y ESTRUCTURA PASO NIVEL 1	CERCHA Y ESTRUCTURA PASO NIVEL 1	CERCHA Y ESTRUCTURA PASO NIVEL 2

			
CERCHA Y ESTRUCTURA PASO NIVEL 2	CERCHA Y ESTRUCTURA PASO NIVEL 2	CERCHA Y ESTRUCTURA PASO NIVEL 2	
OBSERVACIONES:			
1.SE RECOMENDÓ EL FRAGUADO DE LAS VIGA NUMERO 12			

FIRMA: _____
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: **JORGE EDWIN LÓPEZ TORREZ**

FIRMA: _____
CARGO: APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO DE OBRA
NOMBRE: **CAMILO ERNESTO ROJAS FIGUEREDO**
