CONSORCIO POLIESTACION

NIT: 901708257-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 5 11 24 OF 802, Ibagué, Tolima, Colombia

Tel. 6082607436

Email. anlagenbauer@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764079497732 válida desde 2024-09-13 hasta 2025-09-13 rango desde FECP5 hasta FECP50.

Cliente: ALCALDÍA DE FLANDES
NIT : 800100055
Dirección: Carrera 8a con calle 12 Esquina Barrio Centro, Flandes, Tolima, Colombia
Teléfono:
Email: contactenos@flandes-tolima.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECP7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:01:03-05:00**
FECHA FIRMADO:	**24/10/2024 14:01:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
	005	INTERVENTORIA ACTA PARCIAL No. 05 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 192-2023. CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	WSD	1,00	$64.440.445,27	IVA	19%	$12,243,684.60	0,00	$64.440.445,27

Notas:

SON: (setenta y seis millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento veintinueve pesos ochenta y siete centavos)
CUFE: b393cb7a44785decfb701e4fa3885b9ba030abb2d917ddaae5a67ed33d679df6755c3a48e8cdab4d0b5f1d4b2212ee75

Subtotal:	$64.440.445,27
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.243.684,60
Total:	$76.684.129,87

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$64.440.445,27	19,00%	$12.243.684,60

Firma Digital: AHTXAbi30kp6leYci6B5KrK4C5SxOooq4IA1xt8ug81aK6Q1qNCUAEwA65L1yvcZ
JZsqoQyrzQh6cWMaUoOpi5O5/W/TYGnktUo1Inv74IEdB7yO/J
4m3oedw0wpJzsD KuEeby3rA9ubeETkfG7OZwOoMfgL0mLMwtfj7UzGWrqiolhvQUWmz/dyffMguGOS t4cjL1IF8gP6tGVTGIPM4gM9XUPVxhswMiF
snPtBa20iwWotDdUpZexREHh9Dqjo 94o6H5ZrqCSD3wFqwy1Cp3UV+HJeVqxVhrqdhT6UH2IdJ+ZmgKhSKqUiJyIFi9DV TbFxdDKXEdVi2N1CZqpi
uw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

ACTA PARCIAL N° 05

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 192-2023

FECHA	23	DE	OCTUBRE	DE	2024

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA	**NÚMERO DE CONTRATO No.192 - 2023**	**FECHA: 5 de MAYO de 2023**
INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA	CONSORCIO POLIESTACION	
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS / c.c No. 5.829.612 DE IBAGUE	
IDENTIFICACION:	901708257-4	
OBJETO	Contratar la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para realizar los estudios, diseños y construcción de la estación de policía en zona urbana del municipio de Flandes, departamento de Tolima.	
VALOR INICIAL:	Cuatrocientos veintiún millones ciento ochenta y dos mil ochocientos veintiún pesos ($421.182.821,00) mcte.	
VALOR ADICIONAL:	Ciento trece millones trecientos treinta y Ocho mil noventa y nueve pesos ($113.338.099,00) mcte	
VALOR TOTAL:	Quinientos treinta y cuatro millones quinientos veinte mil novecientos veinte pesos ($534.520.920,00) mcte	
FECHA DE INICIO:	29 de mayo del 2023	
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	Siete (07) de marzo del 2024	
FECHA ACTA REINICIO NO. 1	Dieciocho (18) de junio de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO NO.1	Treinta Y Uno (31) De Diciembre De 2024	

En Flanes - Tolima, a los Veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024, se reunieron en las oficinas de la secretaria de planeación e infraestructura del Municipio de Flandes, el **Ing. JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ** en calidad de **supervisor**, **JUAN CAMILO DIAZ VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía número 5.829.612 de Ibagué, como Representante Legal del CONSORCIO POLIESTACIÓN, con el fin de suscribir el acta parcial del contrato en mención:

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor contrato inicial	$ 421.182.821,00	
Valor contrato adicional	$ 113.338.099,00	
Valor desembolsos realizados		$ 227.784.402,87
Valor desembolso acta parcial N. 05		$ 76.684.129,87
Valor por ejecutar		$ 230.052.387,26
Sumas iguales	$ 534.520.920,00	$ 534.520.920,00

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del anticipo	$ 0	
Amortización anticipo antes de esta acta		$ 0
Amortización anticipo presente acta final		$ 0
Saldo por amortizar		$ 0
Sumas iguales	**$ 0**	**$ 0**

Valor a cancelar presente acta parcial N. 05 **$ 76.684.129,87**

ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Una vez revisados totalmente las actividades ejecutadas según lo estipulado en el contrato de interventoría 192 del 2023, se constató a la fecha, se encuentra ejecutada a entera satisfacción.

*** PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Certifico que el contratista ha efectuado los pagos a la seguridad social, salud, pensión y riesgos profesionales, durante la vigencia del contrato y se encuentra a paz y salvo a la fecha por este concepto.

*** CUMPLIMIENTO**

Previa revisión del informe presentado por JUAN CAMILO DIAZ VARGAS identificado con cedula de ciudadanía número 5.829.612 de Ibagué, como Representante Legal del CONSORCIO POLIESTACIÓN cumplió con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en el Acto Contractual y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

NOTA: El recibo por parte del supervisor de los trabajos ejecutados no exime al CONSORCIO POLIESTACIÓN NIT: 901708257-4 de sus responsabilidades y obligaciones contractuales.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta N°5, a los que en ella intervinieron a los Veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024.

JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
R.L. / CONSORCIO POLIESTACIÓN

JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ
Supervisor

ALCALDIA DE
FLANDES

EL SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 192-2023

CERTIFICA:

Que, el contratista CONSORCIO POLIESTACIÓN NIT: 901708257-4 Representante Legal JUAN CAMILO DIAZ VARGAS identificado con cedula de ciudadanía número 5.829.612 de Ibagué, cumplió con el cincuenta y seis punto noventa y seis por ciento (56.96 %) del CONTRATO No. 192-2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.".

Que el contratista CONSORCIO POLIESTACIÓN NIT: 901708257-4 Representante Legal JUAN CAMILO DIAZ VARGAS identificado con cedula de ciudadanía número 5.829.612 de Ibagué, ha efectuado los respectivos pagos a la seguridad social, salud, pensión y riesgos profesionales, durante la vigencia del contrato y se encuentra a paz y salvo a la fecha por este concepto, lo anterior dando cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide para autorizar el pago del acta No.05 del contrato en mención por un valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($76.684.129,87) MCTE.**

Nota: Autorícese los descuentos a los que haya lugar, de acuerdo a la retención de impuestos y gravámenes de tipo municipal, departamental o nacional, así como la respectiva amortización del anticipo de acuerdo al porcentaje del contrato si se hubiese hecho.

Para constancia de lo aquí manifestando se afirma la presente certificación, en el Municipio de Flandes a los veintitrés (23) días del Octubre de 2024.

ING. JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE FLANDES

MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
UNIDOS PARA TRANSFORMAR A FLANDES 2024-2027
PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023

Pagina de

PERIODO DEL INFORME DEL: 19 de agosto de 2024 hasta 18 de octubre de 2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°192-2023

CONTRATO DE OBRA No.. 183 DE 27 de abril de 2023

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL FLANDES TOLIMA NIT: 800100055-6
REP. LEGAL: JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACION NIT. 901708527-4
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL,JURIDICA Y TECNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

VALOR INICIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS :	$ 251.833.788,00	ANTICIPO ESTUDIOS Y DISEÑOS (50%)	
VALOR INICIAL INTERVENTORIA :	$ 421.182.821,00	VALOR ACTA PARCIAL #1	$ 50.366.757,44
VALOR ADICIONAL	$ 113.338.099,00	VALOR ACTA PARCIAL #2	$ 25.183.379,22
VALOR FINAL:	$ 534.520.920,00	VALOR ACTA PARCIAL #3	$ 75.550.136,34
		VALOR ACTA PARCIAL #4 INTEREVENTORIA	$ 76.684.129,87
		VALOR ACTA PARCIAL #5 INTEREVENTORIA	$ 76.684.129,87
		Σ PARCIALES	$ 304.468.532,74

FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE OBRA:	24-oct.-24
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	24-mar.-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31-dic.-24
FECHA ACTA DE INICIO	29-may.-23
FECHA DE SUSPENSION No. 1	7-mar.-24
FECHA DE REINICIO No. 1	18-jun.-24
FECHA DE ADICION Y PRORROGA No.1	5-jul.-24
FECHA DE TERMINACION :	31-dic.-24

FORMA DE PAGO: La alcaldía realizara el pago correspondiente a la interventoria de la consultoría para la realización de estudios y diseño a través de pagos mensuales durante el tiempo que dure la consultoría.el pago correspondiente a la interventoria de la obra lo realizará atravéz de pagos mensuales hasta el 90% del valor del contrato y al acta final lo cual sera sobre el 10%del valor correspondiente a la interventoria para la obra el cual se pagara con la respectiva liquidación.para los pagos que el municipio de flandes haga al contratista, se verificara previamente el cumplimientoo de los siguientes requisitos. **1.** La obtención de la certificación del cumplimineto de las entregas o ejecucion deservicios o entrega de productos por parte del supervisor. **2.** La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud,pensión,riesgos profesionales), y de las obligaciones para fiscales (SENA,ICBF, Caja de compensción familiar). **3.** la radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos anteriores. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista por ello el derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. EL municipio de flandes solo adquiere obligaciones con el proponente favorecido en el presente proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia efectuarápagos a terceros.

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: EJECUCIÓN

CONDICIONES CONTRACTUALES

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

CONDICIONES ACTA INICIO

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, **PRESTACIONES** SOCIALES E **INDEMNIZACIONES LABORALES**	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y **CALIDAD DE LA OBRA**					

CONDICIONES REINICIO

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/05/2024	$ 42.118.282,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/03/2027	$ 42.118.283,10
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	I-100021892	5/05/2023	24/09/2024	$ 84.236.564,20

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

CONDICIONES ADICION PRORROGA No.1

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	30/06/2025	$ 53.452.092,00
PAGO DE **SALARIOS, PRESTACIONES** SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	31/12/2027	$ 53.452.092,00
CALIDAD DEL **SERVICIO**	SEGUROS MUNDIAL	I-100021892	5/07/2024	30/06/2025	$ 106.904.184,00

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					

FLANDES

MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
UNIDOS PARA TRANSFORMAR A FLANDES 2024-2027
PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION

Pagina de

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023

PERIODO DEL INFORME: DEL: 19 de agosto de 2024 hasta 18 de octubre de 2024

3. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

- ☐ RED DE ACUEDUCTO _____ ML
- ☐ RED ALC. SAN / PLUV _____ ML
- ☐ PTAP / PTAR _____ UN
- ☐ POZOS PROFUNDOS _____ ML
- ☐ VIA URB / SEC / TERC _____ KM
- ☐ _____
- ☐ PUENTE / ALC / BOX _____ UN
- ☑ OTRO. CUAL? _____ UN

CONTRATO		INTERVENTORIA	
		PROGRAMA:	N/A
META:		META:	N/A
RUBRO:	CDP:	RUBRO: N/A	CDP 2023000415
		FUENTE: N/A	
REGISTROS PRESUPUESTALES	RP	REGISTROS PRESUPUESTALES	RP
ACTAS COBRADAS $	227.784.402,87	ACTAS COBRADAS $	

4. CRONOLOGIA DEL OBRA:

	ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1	Acta de inicio	29/05/2023	24/03/2024	$ 421.182.821,00	
2	Acta de suspensión No. 1	7/03/2024	24/03/2024	$ 421.182.821,00	
2	acta de reinico No.1	18/06/2024	5/07/2024	$ 421.182.821,00	
2	Acta de Adicion yPrórroga No. 1	5/07/2024	31/12/2024	$ 534.520.920,00	
				$ -	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL OBRA, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

OBRA

% AVANCE EN PLAZO: 30,23% PLAZO FALTANTE: 74 dias % PROGRAMACION OBRA 30,23% % OBRA EJECUTADA 29,11%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: Una vez revisados totalmente las actividades ejecutadas según lo estipulado en el contrato de interventoria 192 del 2023, se constató a la fecha, se encuentra ejecutada a entera satisfacción.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
	director de la interventoria a la construccion	70%	2,00	$ 4.500.000,00	$ 6.300.000,00
	Ingeniero civil residente de interventoria	100%	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
	Ingeniero civil especialista en geotecnia	30%	2,00	$ 3.500.000,00	$ 2.100.000,00
	Ingeniero civil especialista en estructuras	50%	2,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
	Ingeniero civil Ambiental	50%	2,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
	Ingeniero Electrico	40%	2,00	$ 2.500.000,00	$ 2.000.000,00
	Ingeniero topografo	100%	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
	Inspector Siso	50%	2,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00
	SUBTOTAL		2,00		$ 28.400.000,00
	factor multiplicador				$ 56.800.000,00
	OTROS COSTOS				
	Edicion de informes, documentación, fotocopias y equipos de oficna.	Mes	2,00	$ 570.222,437	$ 1.140.444,87
	Ensayos de laboratorio	Mes	2,00	$ 750.000,00	$ 1.500.000,00
	Oficina (incluye servicios publicos)	Mes	2,00	$ 2.500.000,00	$ 5.000.000,00
	SUB TOTAL OTROS COSTOS				$ 7.640.444,87
	SUB TOTAL PERSONAL+OTROS COSTOS				$ 64.440.444,87
	IVA 19%				$ 12.243.685,00
	TOTAL INTERVENTORIA ETAPA CONSTRCCION DE OBRA				$ 76.684.129,87

CLIMATOLOGIA: durante la ejecución de las actividades no se presento ninguna eventualidad climatica.

7. ADMINISTRATIVO

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES

Carácter General

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO SI	SEGUIMIENTO NO	OBSERVACIONES
Según lo descrito en la **CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** la interventoria a cumplido con sus obligaciones en lo que se lleva de ejecutado en el contrato a la fecha.	X		

De Carácter Especifico- Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO SI	SEGUIMIENTO NO	OBSERVACIONES
1. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido, entregando los productos y prestando los servicios descritos a continiación ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 1.Interventoria al Levantamiento Topográfico 1 UND 2.Interventoria al Estudio de Suelos 1 UND 3.I nterventoria al Diseño Arquitectónico 1 UND 4.Interventoria al Diseño Estructural 1 UND 5.Interventoria al Diseño Hidrosanitario 1 UND 6.Interventoria al Diseño de Redes de Gas y 1 UND 7.Interventoria al Diseño Eléctrico e Iluminación 1 UND 8.Interventoria al Presupuesto y Programación de obra 1 UND	X		
2. contar con todo el personal y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato	X		

FLANDES	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA UNIDOS PARA TRANSFORMAR A FLANDES 2024-2027 PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023**	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 19 de agosto de 2024 hasta 18 de octubre de 2024

8. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION).



FOTO 1:



FOTO 2:



FOTO 3:



FOTO 4:




FOTO 5:



FOTO 6:



FOTO 7:




FOTO 8:




FOTO 9:



FOTO 10:




FOTO 11:



FOTO 12:



FOTO 13:




FOTO 18:



FOTO 17:







FLANDES	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA UNIDOS PARA TRANSFORMAR A FLANDES 2024-2027 PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA N°192-2023**	Pagina de

PERIODO DEL INFORME | DEL: 19 de agosto de 2024 | hasta 18 de octubre de 2024

FOTO 18:




FOTO 19:



FOTO 20:



FOTO 21:



FOTO 22:



FOTO 23:



FOTO 24:

FOTO 25:

FOTO 26:

9. OBSERVACIONES	10. FIRMAS
	ING. JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ **SUPERVISOR**

Niyireth Dueñas Morales
Contadora Pública

CERTIFICA QUE

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ ALCALÁ con cédula de ciudadanía No. 28.548.736 de Ibagué, se encuentra al día en el pago de los aportes parafiscales de los meses de julio, agosto y octubre del 2024, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ibagué a los dos (02) días del mes de septiembre de 2024

Cordialmente,

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
CONTADORA PÚBLICA
T.P 100.287-T

Dirección: Bosques de Alameda Mz a Cs 24 Ibagué – Tolima - Teléfono 2618186
Celular: 3158007707 - E-mail:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 2 4 0 7 4 9 4 6 F D 8 A 0 F 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIYIRETH DUEÑAS MORALES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65738338 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 100287-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 65.738.338
DUEÑAS MORALES

APELLIDOS
NIYIRETH

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1967
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-OCT-1986 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2900100-00127429-F-0065738338-20081113 0005898021A 1 6350023112



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100287-T

NIYIRETH
DUEÑAS MORALES
C.C. 65738338
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
MIGUEL TH IE PEÑA
107713

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

+-

INFORME DE ACTA PARCIAL No 5

CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. 192-2023

PROYECTO:

INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

Al CONTRATO DE OBRA 420-2023

OBJETO:

REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.

PERIODO:

DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE OCTUBRE DEL 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE FLANDES
TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
CAPITULO 1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 5
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 6
CAPITULO 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 192-2023 11
2.1 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 11
2.1.1 GENERALIDADES 11
2.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA 12
2.1.3 EQUIPOS DE LA INTERVENTORIA 12
2.1.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 12
2.1.5 INFORMACIÓN - FÍSICO FINANCIERA 14
CAPITULO 3 POLIZAS VIGENTES 16
3.1 DENTRO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 192-2023 16
CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
CAPITULO 5 REGISTRO FOTOGRAFICO 18
CAPITULO 6 DOCUMENTACIÓN ANEXA 24
6.1 Contrato 24
6.2 Acta de inicio 24
6.3 Acta de suspensión No 1 24
6.4 Acta de Reinicio No 1 24
6.5 Acta de Adición y Prorroga 24
6.6 Pólizas 24
6.7 RUT 24
6.8 Certificación Bancaria 24
6.9 Control de calidad. Ensayo de resistencia a la compresión y asentamientos 24

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado del Acta Parcial de Interventoría No. 5, correspondiente al control, revisión y ejecución del proyecto denominado "**Realización de estudios, diseños y construcción de la Estación de Policía en la zona urbana del municipio de Flandes, departamento de Tolima.**"

En el documento se describen los aspectos más relevantes de la obra, tales como la descripción del proyecto, localización, cantidades de obra, revisiones técnicas y los oficios con medidas preventivas que se implementaron para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y el acatamiento de las especificaciones técnicas. El informe abarca las actividades desarrolladas por la Interventoría en el período comprendido entre el 19 de agosto y el 18 de octubre de 2024, con un avance financiero del 14.35% y un avance acumulado del 56.96% respecto al total del contrato.

Este informe recopila el estado actual de la obra, mostrando el avance económico, físico y real del contrato. Dichos avances han sido supervisados por la interventoría, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y demás condiciones establecidas en el contrato. Adicionalmente, se incluyen los controles y supervisiones de la obra mediante registros escritos en campo, anotaciones diarias en el libro de obra conforme a los formatos establecidos, y un completo registro fotográfico que complementa la información.

El principal objetivo del Estado es servir a la comunidad, fomentar la prosperidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución. En este sentido, el municipio de Flandes, comprometido con la mejora de la seguridad de sus ciudadanos, ha gestionado y desarrollado proyectos enfocados en fortalecer los sistemas de seguridad. Estas acciones buscan garantizar la tranquilidad y seguridad de la población.

En respuesta a las necesidades de seguridad del municipio, la alcaldía de Flandes ha contratado la realización de los estudios, diseños y construcción de la Estación de Policía, después de haber completado los respectivos diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos y eléctricos, en conformidad con las especificaciones técnicas requeridas.

CAPITULO 1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Flandes es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Tolima, se encuentra localizado en el centro del país en la cuenca alta del río Magdalena, en las desembocaduras del río Bogotá, río Sumapaz y el río Coello. El proyecto se encuentra localizado en la transversal 10ª B zona urbana del municipio.



Ilustración 1 Implantación del proyecto



Ilustración 3 Localización de Flandes en Colombia



Ilustración 2 Localización del proyecto en Flandes

Localización Obra a ejecutar – Estación de policia – Flandes,Tolima.

1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

Se precisa desarrollar y ejecutar en el marco del convenio Interadministrativo No. 1908-2022 celebrado entre LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON y EL MUNICIPIO DE FLANDES, TOLIMA con objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEL MUNICIPIO DE TOLIMA. Derivando los siguientes contratos:
No 192-2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA".
No 183-2023 cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA."

El alcance del proyecto será descrito a continuación, de acuerdo con lo contratado por el municipio de Flandes - Tolima, describiendo el proyecto, con su respectiva localización, uso y área para entender mejor los beneficios para la comunidad que generará este proyecto.

El proyecto por ejecutar está compuesto de trece (11) capítulos, los cuales son:

1. PRELIMINARES: comprende las actividades iniciales necesarias para planificar y preparar un proyecto de construcción. En este proceso se incluyen tareas de localización, que implican la identificación y delimitación de las áreas donde se llevarán a cabo las obras, así como el replanteo, que consiste en establecer la ubicación exacta de elementos clave como cimientos, estructuras y servicios. Estas actividades son fundamentales para sentar las bases de un proyecto exitoso, asegurando una correcta ejecución y evitando posibles contratiempos durante las etapas posteriores de construcción.

2. ESTRUCTURAS: Contiene las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección, y en general todas las relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la ejecución de las obras, se seguirán, además, las recomendaciones del Código Colombiano Sismo-resistente y de los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha de la licitación. Este ítem abarca diversas actividades fundamentales para la construcción, que van desde la excavación de cimentación, que sienta las bases del proyecto, además se realiza el relleno en recebo

común, el cual es compactado mecánicamente para asegurar la estabilidad del terreno, posterior a esto se procede al suministro e instalación de concreto de limpieza (solado) con una resistencia de 2000 PSI, seguido por la ejecución de columnas en concreto con una resistencia de 4000 PSI, que proporcionan el soporte necesario para la estructura.

3. INSTALACIONES ELECTRICAS: Se atenderán las últimas normas, manuales de especificaciones y publicaciones de las dependencias de La Entidad encargadas del diseño, aprobación, regulación y mantenimiento de este tipo de obras y las instrucciones de la Interventoría. Toda instalación eléctrica será debidamente planeada y proyectada y sus respectivos planos aprobados por La Entidad, antes de iniciarse la revisión y conexión definitiva.
4. CABLEADO ESTRUCTURADO: comprende el suministro e instalación de JACKS modulares categoría 6ª blindados para cable estructurado. El módulo de conector blindado se termina en un cable de par trenzado blindado de 4 pares y no requiere el uso de una herramienta de impacto. La tapa de terminación tiene un código de color azul para designar el rendimiento de la Categoría 6A e incluye una etiqueta universal codificada para los esquemas de cablead. el suministro e instalación de Face plate para la colocación de Jack blindado Cat. 6ª. Los face plate deben permitir la instalación de los jacks y debe ser modular, para alojar los jacks a instalar.
   suministro e instalación del Cable UTP Cat. 6 (Exterior Interior), se utilizan para sistema de transmisión de voz, datos y video a través de cableado estructurado en frecuencias normales hasta 250 MHz. También comprende el resto de las actividades necesarias de los ítems de obra para la correcta instalación de un cableado estructurado en la estación de policía.

5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: El ítem de Sistema de Puesta a Tierra es crucial para garantizar la seguridad eléctrica de la estación. Este sistema se encarga de disipar eficientemente la corriente excedente hacia la tierra, protegiendo así a las personas y equipos de posibles descargas eléctricas. Entre las actividades asociadas a este ítem se encuentran la instalación de electrodos, la conexión de equipos y la verificación de la resistencia del sistema, asegurando un funcionamiento óptimo y seguro de la infraestructura eléctrica.

6. SISTEMA APANTALLAMIENTO: En cuanto al sistema de apantallamiento se comprenden las actividades de suministro e instalación de punta captora en aluminio con su debida base metálica, el alambrón de 8 mm y la caja plástica para conexión de bajante con cable de cobre para puesta tierra. El sistema de apantallamiento es la estructura diseñada para

proteger o aislar a un sistema, equipo o componente electrónico de interferencias electromagnéticas externas o para evitar que estas interferencias sean emitidas al entorno. Este sistema es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento y la integridad de los dispositivos electrónicos en un entorno donde las interferencias electromagnéticas pueden afectar su rendimiento.

7. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO NORMALIZADO LISTADO: se refiere a la implementación y mantenimiento de un sistema integral diseñado para prevenir y combatir incendios en nuestras instalaciones. Este sistema incluye equipos y procedimientos estandarizados que aseguran la seguridad de todos los ocupantes y la protección del patrimonio. En el informe mensual se detallarán las acciones realizadas, el estado actual del sistema y las mejoras implementadas para garantizar su óptima funcionalidad. El sistema de protección contra incendio comprende las actividades de instalación de tubería ranurada y de PVC, la instalación de los diferentes accesorios, la aplicación de pintura para tubería, suministro e instalación de válvulas, más otras actividades adicionales que pondrán en funcionamiento el sistema.

8. AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN METALICA: abarca la infraestructura física que sustenta la conectividad de redes de datos y telecomunicaciones en un entorno empresarial. Incluye la instalación de equipos necesarios para garantizar una comunicación eficiente, la implementación de tuberías de refrigeración para mantener una temperatura adecuada en los sistemas, el uso de refrigerante para controlar el calor generado por los equipos, y la presencia de tableros eléctricos de fuerza que distribuyen la energía eléctrica de manera segura y eficaz. Estos elementos son fundamentales para asegurar un funcionamiento óptimo de las redes y sistemas tecnológicos, contribuyendo al rendimiento y fiabilidad de las operaciones diarias.

9. RED DE GAS EN PEALPE: El ítem Red de Gas en Pealpe abarca las actividades relacionadas con la instalación y mantenimiento de la infraestructura de gas, que incluye la colocación de tuberías, válvulas cheque y puntos de gas. Además, se contempla el suministro e instalación de estufa empotrada, garantizando así un sistema seguro y funcional para el uso diario de la estación. El suministro e instalación de tubería PE AL PE 2"mm, para la red de gas. "PE al PE" se refiere a la unión que se da entre dos tuberías de polietileno sin la necesidad de accesorios o conexiones adicionales. Esta técnica de conexión se utiliza comúnmente en sistemas de tuberías de gas para garantizar una conexión segura, también comprende la tubería que va desde salida del regulador de primera etapa hasta cada uno de los puntos de conexión de los gasodomésticos ubicados


en las cocinas, el suministro e instalación de válvula para tubería en PE AL PE 16 mm para la red de gas y el punto de gas estufa.

10. REDES HIDROSANITARIAS: este ítem abarca un conjunto de actividades esenciales para el manejo y distribución del agua en nuestras instalaciones. Esto incluye la ejecución de instalaciones sanitarias que aseguran el correcto desagüe, la red de aguas lluvias que permite una adecuada evacuación de precipitaciones, las instalaciones hidráulicas que garantizan el suministro eficiente y seguro, así como la implementación de equipos y bombas que optimizan el funcionamiento del sistema.

11. ARQUITECTURA: El ítem de Arquitectura comprende una serie de actividades fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de nuestras instalaciones. La mampostería se encarga de la construcción de muros y estructuras sólidas, mientras que los pañetes y afinados aseguran un acabado liso y estético en las superficies. Las impermeabilizaciones son cruciales para proteger los espacios de la humedad, y las pinturas ofrecen no solo protección, sino también una imagen visual atractiva. En cuanto a los pisos, se trabaja en la instalación de materiales duraderos que faciliten el uso diario. El cielo raso proporciona un acabado estético y funcional al techo, mientras que la cubierta garantiza la protección del edificio contra las inclemencias del tiempo. La carpintería, tanto metálica como de madera y aluminio, se utiliza para crear elementos estructurales y decorativos, mientras que el mobiliario se refiere a la disposición de los espacios interiores. Las obras exteriores y el urbanismo abarcan el diseño de áreas al aire libre, mejorando la funcionalidad y estética del entorno. Además, se incluyen accesorios hidrosanitarios que son esenciales para el funcionamiento adecuado de las instalaciones. Por último, elementos especiales como el logo de la Policía Nacional destacan la identidad institucional de la estación.

Ilustración 1 FACHADA DEL PROYECTO



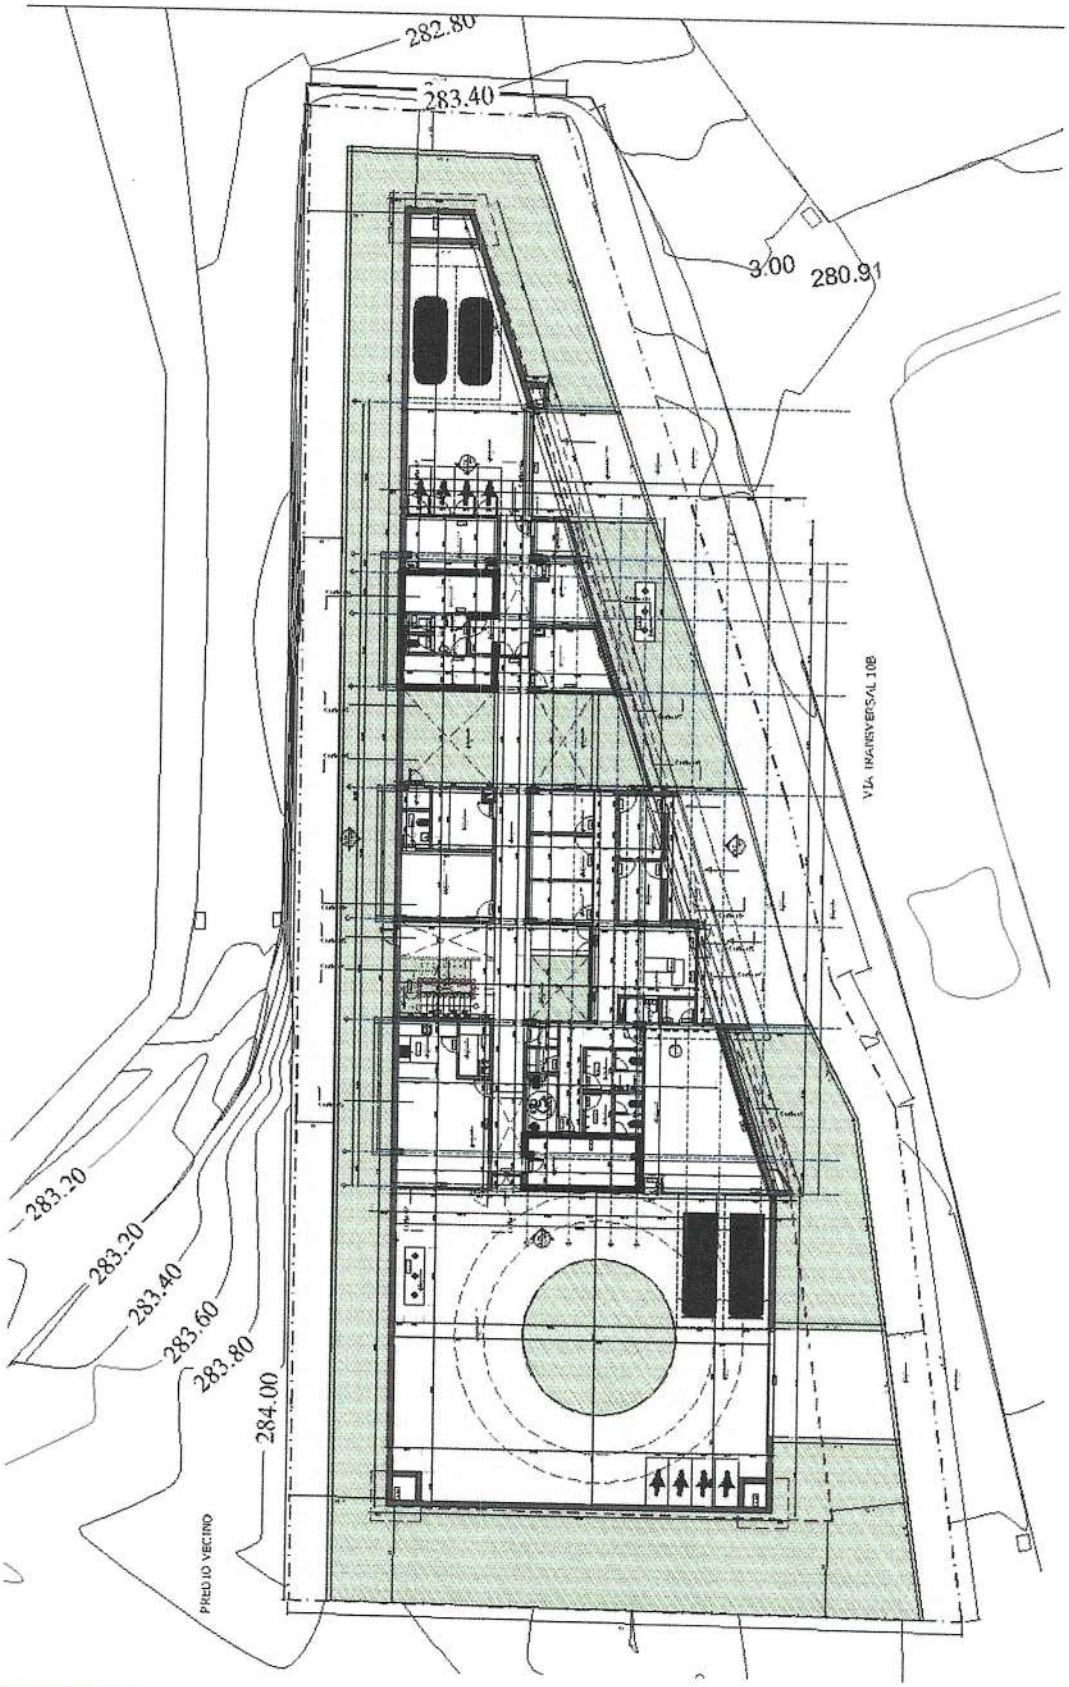

Dirección: Carrera 5 No. 11-24 Oficina. 802 edificio Torre Empresarial Ibagué – Tolima – Cel.: 3153988586 –
E-mail consorciopoliestacion@gmail.com

CAPITULO 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 192-2023

2.1 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1.1 GENERALIDADES

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO POLIESTACIÓN – NIT 901708257-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS 5.829.612 de Ibagué
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($421.182.821) MCTE
VALOR ADICIONAL N° 1	CIENTO TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($113.338.099,00) MCTE
VALOR TOTAL	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($534.520.920,00) MCTE

2.1.2 PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARGO/OFICIO	NOMBRE	(%) PORCENTAJE DE DEDICACION
DIRECTORA DE INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION	Paola Andrea Rodríguez Alcalá	**70%**
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Juan Camilo Diaz Vargas Residente hasta el 31 de Agosto del 2024	**100%**
INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Huber Danilo Villarreal Rubio Residente a partir del 1 de Septiembre de 2024	**100%**
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	Dairo Dueñas Morales	**30%**
INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Sharon Dayana Guzmán González	**50%**
INGENIERO AMBIENTAL	Juan Felipe Flórez Barragán	**50%**
INGENIERO ELECTRICO	Adriana Patricia Pineda Peláez	**40%**
INGENIERO TOPOGRAFICO	Jorge Fernando Morales	**100%**
INSPECTOR SISO	Mara Victoria Lozano	**50%**

2.1.3 EQUIPOS DE LA INTERVENTORIA

- ✓ Cámara fotográfica
- ✓ Cinta métrica - flexo metro
- ✓ Computador-portátil
- ✓ Equipo de comunicaciones.

- ✓ Registro fotográfico de las actividades desarrolladas dentro de la **"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA."**

- ✓ Coordinación conjunta en procesos constructivos de diferentes actividades, con seguimiento detallado.

- ✓ Toma de medidas de cantidades de obra de las actividades desarrolladas.

- ✓ Verificar que el contratista este ejecutando la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

- ✓ Observaciones en el libro Bitácora de las actividades realizadas por el contratista, personal de la obra, maquinaria y estado del tiempo.

- ✓ La Interventoría ha estado atenta para que el contratista cumpla con sus obligaciones técnicas y administrativas, dejado por escrito las inquietudes y observaciones necesarias para que cumplan con su cronograma y metas asignadas.

- ✓ Revisión de las afiliaciones de la seguridad social del personal en obra.


- ✓ Seguimiento del uso de equipo de seguridad como: guantes, cascos, tapa bocas, botas. Participación en las charlas dadas por la profesional en salud ocupacional del contratista.

- ✓ Toma de muestras de concreto en molde cilíndrico 4"x8" de las diferentes fundidas se anexa pruebas.

2.1.5 INFORMACIÓN - FÍSICO FINANCIERA


2.1.5.1 BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA No.192-2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	%
Valor inicial del contrato	$ 421.182.821,00		
Valor adicional contrato	$ 113.338.099,00		
Valor Acta Parcial No. 01		$ 50.366.757,44	9,42%
Valor Acta Parcial No. 02		$ 25.183.379,22	4,71%
Valor Acta Parcial No. 03		$ 75.550.136,34	14,13%
Valor Acta Parcial No. 04		$ 76.684.129,87	14,35%
Valor desembolsos realizados		$ 227.784.402,87	42.61%
Valor presente Acta No. 05		$ 76.684.129,87	14,35%
Saldo por ejecutar		$ 230.052.387,26	43,04%
SUMAS IGUALES	**$ 534.520.920,00**	**$ 534.520.920,00**	100,00%

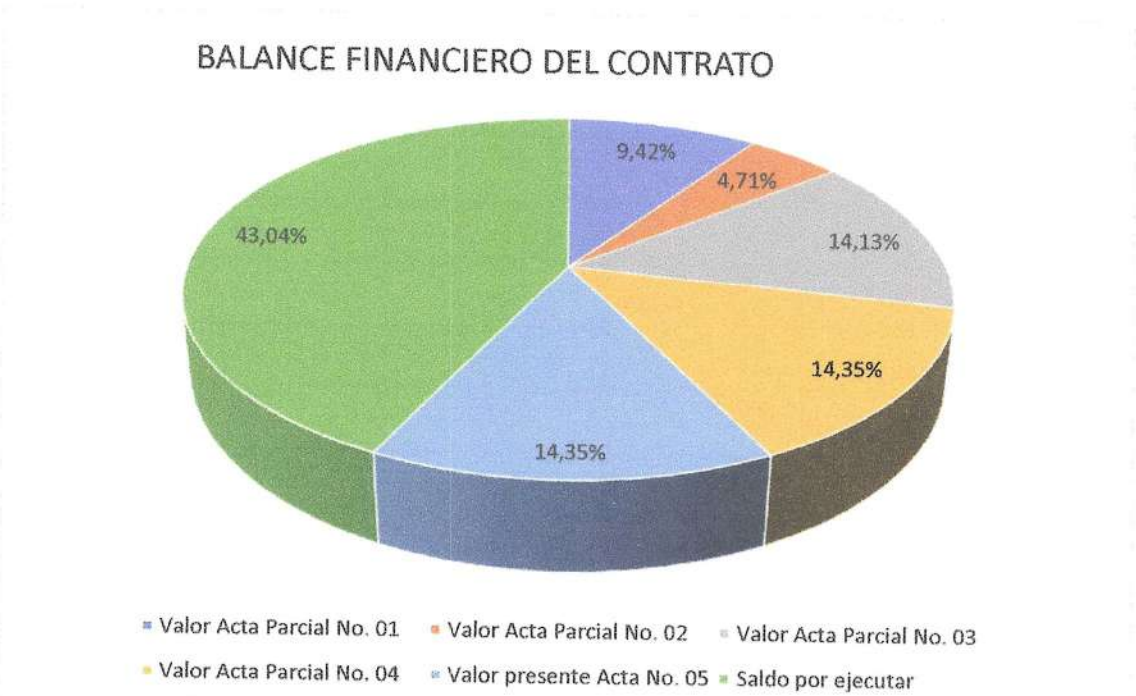

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO POR ETAPAS			
ETAPA 1 INTERVENTORIA A LA CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
Valor Acta Parcial No. 01	$	50.366.757,44	33,33%
Valor Acta Parcial No. 02	$	25.183.379,22	16,67%
Valor Acta Parcial No. 03	$	75.550.136,34	50,00%
Saldo por ejecutar	$	-	
TOTAL ETAPA 1	$	151.100.273,00	100,00%
ETAPA 2 INTERVENTORÍA FASE (CONSTRUCCIÓN DE OBRA)			
Valor Acta Parcial No. 04	$	76.684.129,87	20,00%
Valor presente Acta No. 05	$	76.684.129,87	20,00%
Saldo por ejecutar Etapa 2	$	230.052.387.26	60,00%
TOTAL ETAPA 2	$	383.420.647,00	100,00%
TOTAL	$	534.520.920,00	



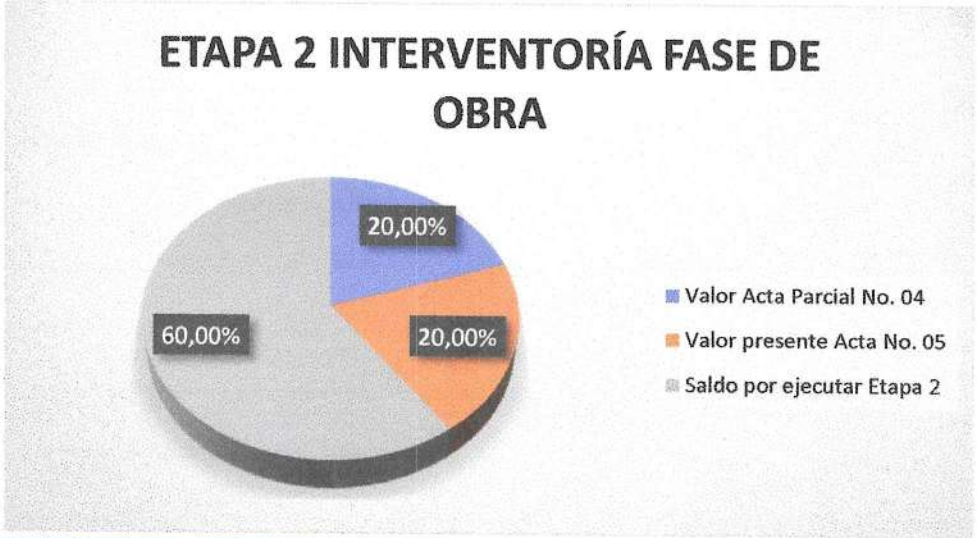

CAPITULO 3 POLIZAS VIGENTES

3.1 DENTRO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 192-2023

GARANTÍAS PACTADAS Y TOMADAS:

Fecha de expedición: 08/05/2024

AMPARO	No. PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA	ASEGURADORA
Cumplimiento del contrato	I-100021892	$53.452.092.00	Desde 05-07-2024 Hasta 30-06-2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Pago salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones	I-100021892	$53.452.092.00	Desde 05-07-2024 Hasta 31-12-2027	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A
Estabilidad y calidad de la obra	I-100021892	$106.904.184.00	Desde 05-07-2024 Hasta 30-06-2025	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A

CAPITULO 4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ La interventoría lleva el cuarto mes de ejecución desde el 19 de agosto de 2024 hasta el 18 de octubre de 2024 correspondiente al 56.96% de ejecución del contrato. El contrato se divide en dos etapas, la Etapa 1 que consiste en la interventoría a la consultoría de estudios y diseños que esta ejecutado en un 100% y la etapa dos que consiste en la interventoría a la construcción de obra que está ejecutada en un 40%.
- ✓ Se han tomado muestras de concreto con el fin de llevar un control de la resistencia del concreto utilizado por el contratista ya sea premezclado o elaborado en obra, estos resultados están dando por encima del 100% a los 28 días.
- ✓ Los materiales utilizados en obra tienen cuentan con sus certificados de calidad.
- ✓ Por último, la interventoría destaca que ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Sin embargo, está sujeta a la atención de los requerimientos por parte del contratista de obra, por lo que se ha realizado un seguimiento constante y se han reiterado las solicitudes, esperando que sean atendidas a la mayor brevedad posible.

CAPITULO 5 REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO No. 01



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE ACERO EN CELDAS.

FOTO No. 02



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	EXCAVACIÓN PARA CAJAS Y TUBERÍA PLUVIAL.

FOTO No. 03



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE POLIETILENO DE 8 MICRAS.

FOTO No. 04




UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA PLACA DE CONTRAPISO.

FOTO No. 05



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA.

FOTO No. 06

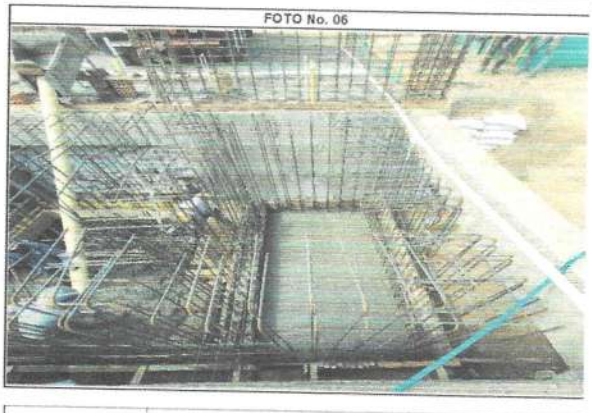

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNDIDA EN TANQUE CON CONCRETO DE 4000 PSI.

FOTO No. 07



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO.

FOTO No. 08



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	DILATACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO.

FOTO No. 09



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Fundida de placa de contrapiso y vida de 20x20 ferentre a armerillo

FOTO No. 10



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Fundida de columnas

FOTO No. 11



FOTO No. 12



FOTO No. 13



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Armado de acero para columnas

FOTO No. 14



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	Instalacion d e malla electrosoldada y acero de refuerzo para armerio

FOTO No. 15



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE COLUMNAS

FOTO No. 16



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE COLUMNAS

FOTO No. 17



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FINDIDA DE COLUMNAS

FOTO No. 18



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FINDIDA DE COLUMNAS

FOTO No. 019



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE ARMERILLO

FOTO No. 020



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	DESENCOFRADO DE ARMERILLO

FOTO No. 021



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA SEGUNDO PISO

FOTO No. 022



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FORMALETA PARA CELDAS

FOTO No. 023



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE CICLOPEO PARA MURO DE CERRAMIENTO

FOTO No. 024



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACION DE TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCIÓN

FOTO No. 025	
	
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNIDADA DE PANTALLAS ESCALERA

FOTO No. 026	
	
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	PANTALLAS ESCALERA

FOTO No. 027	
	
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNIDAD DE CELDAS

FOTO No. 028	
	
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	CELDAS

FOTO No. 029	
	
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL

FOTO No. 030	
	
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL

FOTO No. 031	
	
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA PLACA DE SEGUNDO PISO

FOTO No. 032	
	
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE FORMALETA PARA PLACA DE SEGUNDO PISO

FOTO No. 033




UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	ARMADO DE ACERO VIGAS PLACA SEGUNDO PISO

FOTO No. 034



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACION DE CASETON DE ICOPOR

FOTO No. 035

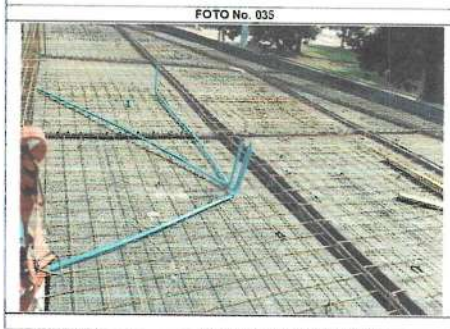


UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALCION DE TUBERIA REDES ELECTRICAS SEGUNDO PISO

FOTO No. 036



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO

FOTO No. 037

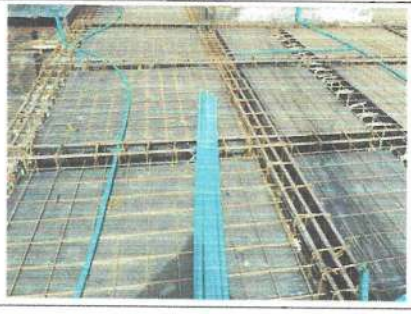

UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACION DE MALLA Y TUBERIA PARA REDES ELECTRICAS

FOTO No. 038



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	INSTALACION DE MALLA INFERIOR

FOTO No. 039



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE PLACA SEGUNDO PISO

FOTO No. 040



UBICACIÓN	MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA
COMENTARIOS:	FUNDIDA DE PLACA SEGUNDO PISO

CAPITULO 6 DOCUMENTACIÓN ANEXA

6.1 Contrato

6.2 Acta de inicio

6.3 Acta de suspensión No 1

6.4 Acta de Reinicio No 1

6.5 Acta de Adición y Prorroga

6.6 Pólizas

6.7 RUT

6.8 Certificación Bancaria

6.9 Control de calidad. Ensayo de resistencia a la compresión y asentamientos

6.10 Pagos de seguridad Social

JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
CONSORCIO POLIESTACIÓN

6.1 Acta de inicio

6. Acta de suspensión No 1

6.4 Acta de Reinicio No 1

6.5 Acta de Adición y Prorroga

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA ACTA DE INICIO	Codigo: CR08 Version: 0 Año: 2013 Copia controlada

FECHA	29	DE	MAYO	DE	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NÚMERO:	192-2023	DE	5 de MAYO de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIESTACIÓN
NIT:	901.708.257-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
C.C.:	5.829.612 DE IBAGUÉ
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($421.182.821) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORÍA, SERA HASTA EL 24 DE MARZO DE 2024, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN. LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL CONVENIO N° 1908 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA, YA QUE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO SON AUTORIZADOS POR UN CONFIS EN EL HORIZONTE DE TIEMPO 2023 - 2027
CDP:	2023000415 DEL 16 DE MARZO DE 2023
RP:	2023000689 DEL 05 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DEL 2023
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	24 DE MARZO DEL 2024

CONSIDERANDO:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA ACTA DE INICIO	Codigo: CR08 Version: 0 Año: 2013 Copia controlada

Que entre la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES** y **CONSORCIO POLIESTACIÓN**, se celebró el Contrato de INTERVENTORÍA No. **192 - 2023**, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"** por un valor de **CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($421.182.821) MCTE** y un plazo de ejecución hasta el veinticuatro (24) de marzo del 2024

- Que el Registro Presupuestal **2023000689** fue expedido el **05 de mayo del 2023**, el contrato fue suscrito por las partes el **(05 de mayo del 2023)**, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
- Que, de acuerdo con la cláusula **QUINTA** termino de ejecución y vigencia: El plazo de ejecución de las actividades propias del objeto que se pretende adelantar será **HASTA EL 24 DE MAZO DEL 2024**, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la cláusula **DECIMA** del contrato, se ha designado mediante oficio como supervisor a la Secretaria de Planeación e Infraestructura y/o quien haga sus veces, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del Contrato No **192** del **05** de **MAYO** del **2023**, Cuyo objeto es **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, el día **(29 de MAYO del 2023)**.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO:

IVONE MARCELA BARRAGÁN RAMÍREZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura

POR EL CONTRATISTA:

CONSORCIO POLIESTACIÓN
NIT: 901.708.257-4
R.L. JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
C.C.: 5.829.612

Elaboro: Daniel Afanador
Apoyo SPI
Revisó: Alpin Hernando Tovar Mejía
Abogado SPI

ACTA DE SUSPENSION No 1

FECHA	07	DE	MARZO	DE	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO:	192-2023	DE	05 de mayo de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIESTACION R.L. JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
NIT/C.C.:	NIT. 901.708.257-4 C.C. 5.829.612 DE IBAGUÉ
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($421.182.821) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2024, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.
CDP:	2023000415 DEL 16 DE MARZO DE 2023
RP:	2023000689 DEL 05 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DEL 2023
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	24 DE MARZO DEL 2024
FECHA PRESENTE ACTA DE SUSPENSION No1:	07 DE MARZO DEL 2024

CONSIDERANDO:

En el municipio de Flandes – Tolima, a los SIETE (07) días del mes de marzo de 2024, se reunieron el **ING. CARLOS ALBEIRO VEGA HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 5.864.724 de Coello Tolima**, como supervisor y en calidad de secretario de planeación e infraestructura del Municipio de Flandes y el CONSORCIO POLIESTACION, identificado con Nit. No 901.708.257-4 representado legalmente por el señor JUAN CAMILO DÍAZ VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía No 5.829.612 de Ibagué, en calidad de interventor con el fin de celebrar el Acta de Suspensión No1 al contrato de interventoría No 192 de 2023.

JUSTIFICACION:

La suspensión del contrato "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" se sustenta en la siguiente situación:

1. El 05 de agosto de 2022 el municipio de Flandes (Tolima y el Ministerio del Interior suscribe el convenio No 1908 con el ministerio del interior - Fonsecon, cuya fecha de finalización contractual esta hasta el 24 de marzo de 2024.

ACTA DE SUSPENSION No 1

2. El 15 de diciembre de 2022 se realiza el acta de inicio del convenio convenio No 1908 de 2022 con el ministerio del interior - FONSECON.
3. El 27 de abril de 2023, se suscribe el contrato llave en mano No 183 de 2023, cuyo objeto es "Realizar los estudios, diseños y construcción de la estación de policía en zona urbana del Municipio de Flandes, departamento del Tolima.
4. El 05 de mayo de 2023, se suscribe el contrato de interventoría No 192 de 2023 cuyo objeto es "contratar la interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para realizar los estudios, diseños y construcción de la estación de policía en zona urbana del Municipio de Flandes, departamento del Tolima.
5. Una vez se surtieron todos los trámites de entrega y recibo de los estudios y diseños por parte de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional (DILOF) y el Ministerio del Interior, se suscribe el Anexo 22 (Acta de recibo de entregables de estudios y diseños) en conjunto con la supervisión del Ministerio del Interior, contratistas de estudios, diseños, obra y su interventoría y la supervisión del municipio de Flandes – Tolima, con fecha de 27 de febrero de 2024.
6. Dentro del producto de los estudios y diseños, se evidenció la necesidad de adicionar al contrato de obra e interventoría la suma de **MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MTE ($1.570.557.343)** para lograr garantizar el cierre financiero del convenio, la cual es la construcción de una Estación de Policía en el municipio de Flandes – Tolima.
7. Que una vez sustentado lo anterior y en cumplimiento al numeral 23 de la cláusula segunda del convenio 1908 de 2022 (...) 23) *Incluir como riesgo previsible en su contratación los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, deberá aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, para lo cual deberá presentar el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo al inicio de la ejecución de la obra, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados en primer lugar por el MUNICIPIO a los contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio* (...) esta administración se encuentra gestionando los recursos faltantes que garanticen la adecuada ejecución de la obra y lograr dar feliz término al convenio.
8. Dado a lo anterior no se están realizando actividades de obra, debido que dentro del anexo de recibo de los estudios y diseños (Anexo 22), la supervisión del Ministerio no ha dado aval para dar inicio de actividades en obra, toda vez que a la fecha no se cuentan con los recursos necesarios para garantizar la ejecución total del alcance contractual del objeto en referencia.
9. Teniendo en cuenta lo anterior, y en cumplimiento al numeral 34 de la cláusula segunda del convenio 1908 de 2022 (...) "34) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho y de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, así como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del MINISTERIO.." (...) esta supervisión solicita al Ministerio del Interior se evalúe y viabilice la primera suspensión del convenio por cuatro (04) meses, mientras se logra hacer las gestiones necesarias para la consecución de los recursos faltantes, los cuales ascienden a **MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MTE ($1.570.557.343)**; esta administración se compromete a que una vez se logre incorporar estos recursos faltantes, notificara y adelantaran los trámites correspondientes para poder darle tramite al inicio y ejecución de la obra.

ALCALDÍA DE FLANDES

ACTA DE SUSPENSION No 1

10. Así las cosas y teniendo en cuenta lo autorizado por el Ministerio del interior se hace necesario suspender el contrato llave en mano No 183 de 2023 y el contrato de interventoria No192 de 2023, por un tiempo de cuatro (04) meses, según lo estipulado en la solicitud de suspensión del convenio y hasta tanto se supere la situación que produjo la misma.

ACUERDAN:

PRIMERO: suspender las actividades y plazo del contrato de interventoria No192 de 2023 cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, por un tiempo de cuatro (04) meses a partir del día Siete (07) de marzo de 2024 y hasta el día seis (06) de Julio de 2024.

SEGUNDO: Para efectos de cumplimiento o plazo extintivo el tiempo de la suspensión no se contabilizará en el plazo contractual.

TERCERO: La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y ajustes.

CUARTO: Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, las partes declaran que esta suspensión no genera reajustes, indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista; además, la entidad no aplicara el incumplimiento del contrato, ni hará efectiva la cláusula referente a la caducidad durante el tiempo que dure la misma.

QUINTO: Superados los inconvenientes que justificaron la suspensión o el plazo pactado para la misma, previa elaboración y suscripción de la respectiva acta de reiniciación de los trabajos en donde se hará constar la fecha y ampliación de las pólizas.

Para constancia, se suscribe por los que en ella intervienen, a los siete (07) días del mes de marzo de 2024.

POR EL MUNICIPIO;

CARLOS ALBEIRO VEGA HERRERA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFARESTRUCTURA
SUPERVISOR

POR LA INTERVENTORIA;

CONSORCIO POLIESTACION
NIT: 901.708.257-4
R.L. JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
C.C.: 5.829.612

Elaboro: Carlos Albeiro Vega Herrera
Secretario de planeación e Infraestructura

Revisor: Leo Nathaly Bravo Ramirez
Abogada Contratista

ALCALDÍA DE FLANDES

ACTA DE REINICIO No. 1
CONTRATO INTERVENTORIA No. 192 DEL 05 DE MAYO DE 2023

FECHA	18	DE	JUNIO	DE	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO DE INTERVENTORIA			
NÚMERO:	**192-2023**	**DE**	**05 de mayo de 2023**
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."			
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIESTACION R.L. JUAN CAMILO DIAZ VARGAS		
NIT/C.C.:	NIT. 901.708.257-4 C.C. 5.829.612 DE IBAGUÉ		
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($421.182.821) MCTE		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2024, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.		
CDP:	2023000415 DEL 16 DE MARZO DE 2023		
RP:	2023000689 DEL 05 DE MAYO DE 2023		
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DEL 2023		
FECHA INICIAL DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	24 DE MARZO DEL 2024		
FECHA PRESENTE ACTA DE SUSPENSION No. 1:	07 DE MARZO DEL 2024		
FECHA PRESENTE ACTA DE REINICIO No. 1:	18 DE JUNIO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	CINCO (05) DE JULIO DE 2024		

ALCALDÍA DE FLANDES

ACTA DE REINICIO No. 1
CONTRATO INTERVENTORIA No. 192 DEL 05 DE MAYO DE 2023

CONSIDERANDO:

En el municipio de Flandes – Tolima, a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2024, se reunieron el **ING. CARLOS ALBEIRO VEGA HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 5.864.724 de Coello Tolima**, como supervisor y en calidad de secretario de planeación e infraestructura del Municipio de Flandes y el **CONSORCIO POLIESTACION**, identificado con **NIT. No. 901.708.257-4** representado legalmente por el señor **JUAN CAMILO DÍAZ VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 5.829.612 de Ibagué Tolima**, en calidad de **INTERVENTOR,** hemos convenido de manera voluntaria realizar la presente **Acta de Reinicio No. 001**, al **contrato Interventoria No. 192 de 2023**, previas las siguientes consideraciones.

a. Que el **contrato Interventoria No. 192 de 2023**, tiene por objeto **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, con acta de suspensión No. 001 del 07 de marzo de 2024, en la actualidad se encuentra suspendido.

b. Que el **SUPERVISOR** del contrato, Secretario de Planeación e Infraestructura, y por la otra, el **CONSORCIO POLIESTACION**, identificado con **NIT. No 901.708.257-4** representado legalmente por el señor **JUAN CAMILO DÍAZ VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía **No 5.829.612 de Ibagué Tolima**, en calidad de **INTERVENTOR**, acordaron reiniciara el contrato de interventoría, a partir del dieciocho (18) de junio de 2024, puesto que ya se superaron las razones que ocasionaron su suspensión.

c. Que atendiendo a lo señalado por el supervisor del contrato se hace necesario realizar la presente **acta de reinicio**, por lo que las partes;

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar las actividades de la ejecución del **contrato Interventoría No. 192 de 2023**; a partir del día dieciocho (18) de junio de 2024; Del contrato se encuentra pendiente por ejecutar dieciocho (18) días calendario, es decir, el contrato terminaría su plazo de ejecución hasta el cinco (05) de julio de 2024.

SEGUNDO: La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como precios y ajustes.

ALCALDÍA DE FLANDES

ACTA DE REINICIO No. 1
CONTRATO INTERVENTORIA No. 192 DEL 05 DE MAYO DE 2023

TERCERO: El contratista realizara la ampliación de pólizas.

CUARTO: Continúan vigentes y sin cambio alguno las demás estipulaciones del **contrato Interventoría No. 192 de 2023.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2024

POR EL MUNICIPIO;

CARLOS ALBEIRO VEGA HERRERA
SECRETARIO DE PLANEACION E INFARESTRUCTURA
SUPERVISOR

POR LA INTERVENTORIA;

CONSORCIO POLIESTACIÓN
NIT: 901.708.257-4
R.L. JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
C.C.: 5.829.612

Elaboro: Carlos A. Vega Herrera.
Secretario de Planeación e Infraestructura

Revisor: Leo Nathaly Bravo Ramirez.
Abogada Contratista

ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO INTERVENTORIA No. 192 DEL 05 DE MAYO DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLANDES– TOLIMA Y CONSORCIO POLIESTACION.

FECHA	05	DE	JULIO	DE	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO LLAVE EN MANO			
NÚMERO:	192-2023	DE	05 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."			
CONTRATISTA:	CONSORCIO POLIESTACION R.L. JUAN CAMILO DIAZ VARGAS		
NIT/C.C.:	NIT. 901.708.257-4 C.C. 5.829.612 DE IBAGUE		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($421.182.821) MCTE		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	CIENTO TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($113.338.099,00) MCTE		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($534.520.920,00) MCTE		
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 24 DE MARZO DE 2024, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.		
CDP:	2023000415 DEL 16 DE MARZO DE 2023		
RP:	2023000689 DEL 05 DE MAYO DE 2023		
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DEL 2023		
CDP ADICION:	2024000536 DEL 04 DE JULIO DE 2023		
FECHA INICIAL DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	24 DE MARZO DEL 2024		
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1:	07 DE MARZO DEL 2024		

FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	18 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA DE ADICIÓN No. 1:	CINCO (05) DE JULIO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

Entre los suscritos a saber: **ANA JUDITH GAMBOA MANTILLA**, mayor de edad, vecina y domiciliada en el Municipio de Flandes, Tolima, identificada con la cédula de ciudadanía No. 3.576.267 expedida en Girardot Cundinamarca, en su calidad de ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, cargo para el cual tomo posesión el día treinta (30) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), según consta en acta de la Notaria Única del circuito de Flandes, Tolima, en uso de las facultades y funciones contenidas en el articulo 315 de la Constitución Política, y actuando en nombre y representación del municipio con NIT 800.100.055-6, que para los efectos del presente contrato se denominarán **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO POLIESTACION**, identificado con **NIT. No. 901.708.257-4** representado legalmente por el señor **JUAN CAMILO DÍAZ VARGAS**, identificado con cedula de ciudadanía **No. 5.829.612 de Ibagué Tolima**, firmante del **contrato Interventoría No. 192 de 2023**, que tiene por Objeto: **"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, convenimos realizar la presente Adición y Prorroga, previa las siguientes consideraciones:

a. Que el contrato Interventoría No. 192 de 2023 en la actualidad se encuentra vigente.

b. Que de acuerdo a las justificaciones presentadas por el CONTRATISTA y la solicitud del supervisor del contrato Secretario de Planeación e Infraestructura en la cual se manifiesta:

- Que conforme a la aprobación de Estudios y Diseños Finales por parte del Ministerio del Interior en los cuales se puede evidenciar la necesidad de generar adición presupuestal y prórroga para la ejecución de la obra aprobada y en consecuencia al contrato de interventoría.
- Que el valor total final del Convenio N°1908 del 2022, es de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUARO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($5.844.674.584), conforme a la adición el cual se encuentra respaldado por el CDP No. 34524 del 26 de abril de 2024.
- Que conforme a lo establecido en la modificación de adición y prorroga, los recursos adicionados se distribuyen en:

Detalle	Convenio	Valores contratados	Resultado Consultoría
Valor estudios y diseño	$ 251.533.788	$ 251.533.788	$ 251.533.788
Valor interventoría estudios y diseño	$ 151.300.273	$ 151.300.273	$ 151.300.273
Valor construcción de obra	$ 3.695.100.610	$ 3.592.961.205	$ 3.993.810.896
Valor Fiscalización interventoría de obra	$ 176.182.548	$ 176.182.548	$ 363.420.647
TOTAL	$ 4.274.117.241	$ 4.235.577.864	$ 5.844.674.584

Por ende, es necesario realizar una adición presupuestal al valor del contrato de interventoría N°192-2024, en la suma **CIENTO TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($113.338.099,00) MCTE**, al contrato N°192-2022, el cual se determina conforme al incremento del valor de la obra tomándose como porcentaje el 7,57% respecto a la adición presupuestal de la obra.

Que el valor a adicionar se encuentra respaldado por el CDP N°2024000536 en la medida que es menester garantizar la continuidad y correcta ejecución de la obra e interventoria a cargo del contratista.

Que el día 11 de junio del 2024, se realiza el comité técnico de seguimiento y control al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1908 de 2022, donde autorizan el inicio de actividades de obra y se establecen los siguientes compromisos,

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LIMITE CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO	Certificado y/o acta de recibo y entrega del lote debidamente nivelado, descapotado y demolido	INMEDIATO
MUNICIPIO	Actualización de planos	INMEDIATO
MUNICIPIO – CONTRATISTAS	Listado de mano de obra calificada y no calificada para revisión en conjunto con la Policía Nacional	INMEDIATO
MUNICIPIO	Certificado de factibilidad provisionales de los servicios públicos (Acueducto, alcantarillado y energía)	14/06/2024
MUNICIPIO – CONTRATISTAS	Plan de trabajo y plan de compras	14/06/2024
MUNICIPIO – CONTRATISTAS	Entrega de acta de vecindad	14/06/2024
MINISTERIO	Reunión virtual	14/06/2024

Que dentro de los compromisos se encuentra la entrega del plan de trabajo y plan de compras por parte del contratista y Municipio, allegando el contratista el cronograma de actividades aprobadas en la elaboración de estudios y diseños, donde se aprobó un plazo de nueve (09) meses para su ejecución,

Que teniendo en cuenta la fecha de aprobación de iniciación de actividades de obra, y el plazo de ejecución acordado dentro del convenio interadministrativo, el cual culmina el 31

de diciembre del 2024, evidenciando una diferencia de tiempo a partir del acta de iniciación con el plazo aprobado de estudios y diseños para lo cual se tendrá en cuenta para las gestiones propias del contrato y sus trámites administrativos.

Teniendo en cuenta lo anterior se considera necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024, plazo dado para la ejecución de convenio interadministrativo N°1908 del 2022.

c. Que atendiendo a lo indicado por el **SUPERVISOR** del Contrato Interventoría No. 192 de 2023 y teniendo en cuenta el principio de responsabilidad que trata el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del contrato en la suma **CIENTO TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($113.338.099,00) MCTE**, Quedando el valor del contrato en la suma de **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($534.520.920,00) MCTE**

CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar los siguientes valores a la CLAUSULA DECIMA SEXTA. VALOR: El presente contrato:

VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 192 DE 2023	$ 421.182.821,00
VALOR INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 151.300.273,00
VALOR INICIAL DE INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	$ 270.082.548,00
VALOR DE LA INTERVENTORIA SEGÚN DISEÑOS PARA EJECUCION DE OBRA	$ 363.420.647,00
VALOR ADICION DE INTERVENTORIA	$ 113.338.099,00
TOTAL CONTRATO	$534.520.920

CLAUSULA TERCERA: La adición de que trata el presente acuerdo de voluntades, se cancelará con cargo:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005	**SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION:** **UNIDAD EJECUTORA:** 1-Administracion central **SECTOR:** 12-JUSTICIA Y EL DERECHO **PROGRAMA:** 1202-Promocion y el Acceso a la Justicia. **CPC:** 53129-Otros edificios no residenciales. **META:** 199-Construir la nueva estación de policía. **PROYECTO:** 2020732750027-Desarrollo de un programa de atención prioritario para salvaguardar los derechos de los ciudadanos en situación de violencia familiar en el Municipio de Flandes. **FUENTE:** 8110801-CONV INTER 1908-22	$ 113.338.099,00
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Número:**	2024000536
	Fecha:	04 DE JULIO DE 2.024
	Valor:	$ 113.338.099,00 MONEDA LEGAL

PARÁGRAFO: El certificado de disponibilidad presupuestal relacionado se afectará para la presente Adición en la suma de **CIENTO TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS ($113.338.099,00) MCTE**, Este monto equivale al valor de la Adición. El Registro Presupuestal se hará por dicho valor, atendiendo el cumplimiento del principio de anualidad según el cual la afectación presupuestal está comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de la vigencia 2024.

CLAUSULA CUARTA: Sobre el valor de la adición de que trata el presente acuerdo de voluntades, el contratista cancelará el valor de las estampillas que, conforme a los acuerdos expedidos por el Honorable Concejo Municipal, deben asumir todas las personas naturales y jurídicas que celebren contratos con el Municipio de Flandes Tolima.

CLAUSULA QUINTA: Prorrogar el plazo inicial del Contrato llave en mano No. 192 de 2023, hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a lo contemplado en la Prorroga No.1.

Que, conforme a la justificación del cronograma de actividades, el presente podrá ser prorrogado.

CLAUSULA QUINTA: El contratista garantizara la ampliación de pólizas de ser necesario.

CLAUSULA SEXTA: El Contrato Interventoria No. 192 de 2023, se mantendrá en lo demás inalterable.

La presente acta se suscribe por los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024) en el municipio del Flandes, Departamento del Tolima.

POR EL MUNICIPIO

ANA JUDITH GAMBOA MANTILLA
Alcaldesa Municipal

POR EL CONTRATISTA

CONSORCIO POLIESTACION
NIT: 901.708.257-4
R.L. JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
C.C.: 5.829.612
CONTRATISTA

ALCALDÍA DE FLANDES

SUPERVISOR

ING. CARLOS ALBEIRO VEGA HERRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

Elaboro: Carlos A. Vega Herrera.
Secretario de Planeación e Infraestructura

Revisa: Leo Nathaly Bravo Ramirez
Abogada Contratista

Control de calidad. Ensayo de resistencia a la compresión y asentamiento

Dirección: Carrera 5 No. 11-24 Oficina. 802 edificio Torre Empresarial Ibagué – Tolima – Cel.: 3153988586 – E-mail consorciopoliestacion@gmail.com

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S


EMISIÓN: 27/11/2021	
VERSIÓN: 1	
CONSECUTIVO: IC&L-CON-111	


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		ZAPATA TIPO 2 EJE E4, ZAPATA TIPO 1 EJE F1 "CARRO 2"			ZAPATA TIPO 4 EJE E8 "CARRO 6"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		4-jul-24	4-jul-24	4-jul-24	4-jul-24	4-jul-24	4-jul-24
FECHA DE ROTURA		11-jul-24	18-jul-24	1-ago-24	11-jul-24	18-jul-24	1-ago-24
DIAMETRO (Cm)		10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
AREA (Cm2)		81,073	81,073	81,073	81,073	81,073	81,073
FUERZA (KNw)		221,5	264,9	333,7	223,2	266,5	336,0
FUERZA (Kgf)		22586,58	27012,12	34027,72	22759,93	27175,27	34262,26
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)		278,59	333,18	419,72	280,73	335,19	422,61
RESISTENCIA (PSI)		3979,9	4759,7	5995,9	4010,5	4788,5	6037,3
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN		99,5%	119,0%	149,9%	100,3%	119,7%	150,9%
TIPO DE FRACTURA		4	2	6	5	3	5
ESQUEMA DE FRACTURA							

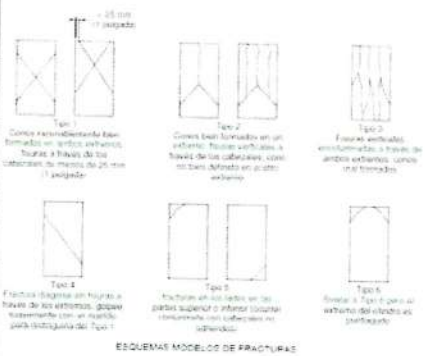

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

Ruben Ortega Mayorquin

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

Karina A Cuenca

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S	**EMISIÓN: 27/11/2021** **VERSIÓN: 1** **CONSECUTIVO: IC&L-CON-111**


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		VIGAS DE CIMENTACIÓN "CARRO 3"			ZAPATA ARMERILLO "CARRO 1"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		5-ago-24	5-ago-24	5-ago-24	14-ago-24	14-ago-24	14-ago-24
FECHA DE ROTURA		12-ago-24	19-ago-24	2-sep-24	21-ago-24	28-ago-24	11-sep-24
DIAMETRO (Cm)		10,16	10,16		10,16	10,16	
AREA (Cm2)		81,073	81,073		81,073	81,073	
FUERZA (KNw)		251,8	297,2		217,5	265,1	
FUERZA (Kgf)		25676,30	30305,78		22178,69	27032,51	
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)		316,70	373,81		273,56	333,43	
RESISTENCIA (PSI)		4524,3	5340,1		3908,0	4763,3	
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN		113,1%	133,5%		97,7%	119,1%	
TIPO DE FRACTURA		3	5		5	5	
ESQUEMA DE FRACTURA							

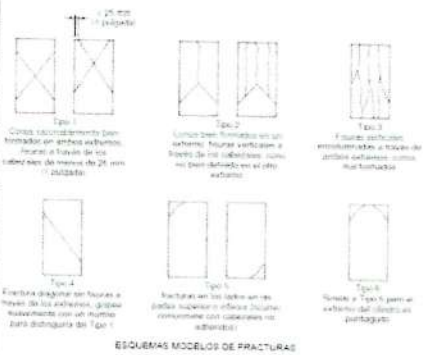

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

Rubén Ortega Mayorquín

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

Karina A Cuenca

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S


EMISIÓN: 27/11/2021	
VERSIÓN: 1	
CONSECUTIVO: IC&L-CON-111	


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		ZAPATA TIPO 6 EJE I7 "CARRO 1"			ZAPATA TIPO 1 EJE B1; PEDESTAL EJE E4; PEDESTAL EJE F7; PEDESTAL EJE E7; PEDESTAL EJE I8; PEDESTAL EJE E8; PEDESTAL EJE F8 "CARRO 2"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		5-jul-24	5-jul-24	5-jul-24	5-jul-24	5-jul-24	5-jul-24
FECHA DE ROTURA		12-jul-24	19-jul-24	2-ago-24	12-jul-24	19-jul-24	2-ago-24
DIAMETRO (Cm)		10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
AREA (Cm2)		81,073	81,073	81,073	81,073	81,073	81,073
FUERZA (KNw)		217,5	263,0	344,9	224,0	269,6	349,1
FUERZA (Kgf)		22178,69	26818,37	35169,80	22841,50	27491,38	35598,08
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)		273,56	330,79	433,80	281,74	339,09	439,08
RESISTENCIA (PSI)		3908,0	4725,6	6197,2	4024,8	4844,2	6272,6
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN		97,7%	118,1%	154,9%	100,6%	121,1%	156,8%
TIPO DE FRACTURA		3	2	2	2	2	3
ESQUEMA DE FRACTURA							

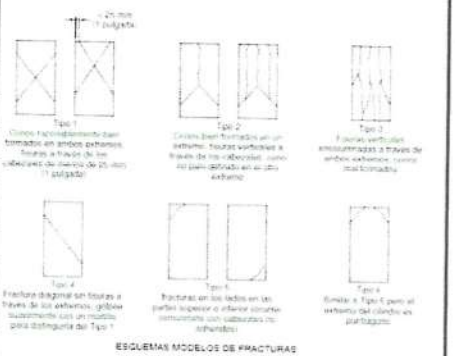

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

Karina A Cuenca
ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S


EMISIÓN: 27/11/2021	
VERSIÓN: 1	
CONSECUTIVO: IC&L-CON-111	


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		ZAPATA TIPO 2 EJE B4; PEDESTAL EJE F1; PEDESTAL EJE I7 "CARRO 1"			ZAPATA TIPO 3 EJE B7; PEDESTAL EJE B8 "CARRO 2"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		8-jul-24	8-jul-24	8-jul-24	8-jul-24	8-jul-24	8-jul-24
FECHA DE ROTURA		15-jul-24	22-jul-24	5-ago-24	15-jul-24	22-jul-24	5-ago-24
DIAMETRO (Cm)		10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
AREA (Cm2)		81,073	81,073	81,073	81,073	81,073	81,073
FUERZA (KNw)		234,6	279,0	312,9	233,9	277,5	304,2
FUERZA (Kgf)		23922,40	28449,91	31906,73	23851,02	28296,95	31019,58
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)		295,07	350,92	393,55	294,19	349,03	382,61
RESISTENCIA (PSI)		4215,3	5013,1	5622,2	4202,7	4986,1	5465,9
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN		105,4%	125,3%	140,6%	105,1%	124,7%	136,6%
TIPO DE FRACTURA		5	5	3	5	5	5
ESQUEMA DE FRACTURA							

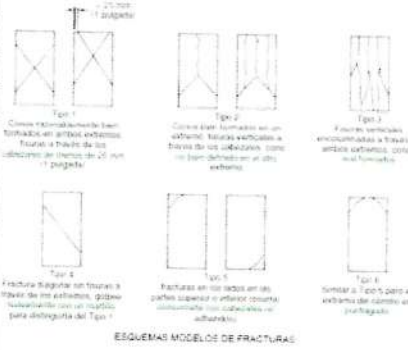

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S


EMISIÓN: 27/11/2021	
VERSIÓN: 1	
CONSECUTIVO: IC&L-CON-111	


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		ZAPATA TIPO 7 EJE C8 Y EJE C7 "CARRO 1"			ZAPATA TIPO 8 EJE D8 Y EJE D7 "CARRO 3"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		12-jul-24	12-jul-24	12-jul-24	12-jul-24	12-jul-24	12-jul-24
FECHA DE ROTURA		19-jul-24	26-jul-24	9-ago-24	19-jul-24	26-jul-24	9-ago-24
DIAMETRO (Cm)		10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
AREA (Cm2)		81,073	81,073	81,073	81,073	81,073	81,073
FUERZA (KNw)		236,8	291,5	308,7	235,2	288,5	306,0
FUERZA (Kgf)		24146,73	29724,55	31478,45	23983,58	29418,63	31203,13
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)		297,84	366,64	388,27	295,83	362,86	384,88
RESISTENCIA (PSI)		4254,8	5237,7	5546,7	4226,1	5183,8	5498,2
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN		106,4%	130,9%	138,7%	105,7%	129,6%	137,5%
TIPO DE FRACTURA		3	2	5	3	3	5
ESQUEMA DE FRACTURA							

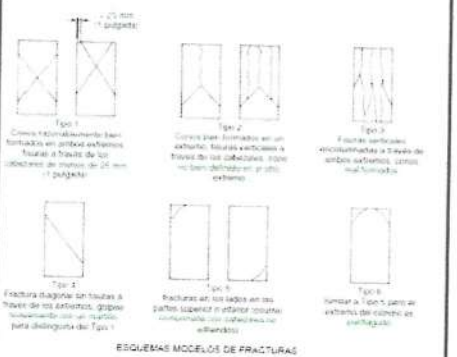

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S


EMISIÓN: 27/11/2021	
VERSIÓN: 1	
CONSECUTIVO: IC&L-CON-111	


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		PEDESTAL EJE C7, PEDESTAL EJE D7, MURO PANTALLA EJE D Y MURO PANTALLA EJE C "CARRO 1"			VIGAS DE CIMENTACIÓN "CARRO 1"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		18-jul-24	18-jul-24	18-jul-24	22-jul-24	22-jul-24	22-jul-24
FECHA DE ROTURA		25-jul-24	1-ago-24	15-ago-24	29-jul-24	5-ago-24	19-ago-24
DIAMETRO (Cm)		10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
AREA (Cm2)		81,073	81,073	81,073	81,073	81,073	81,073
FUERZA (KNw)		248,6	277,3	285,9	233,2	243,6	262,1
FUERZA (Kgf)		25349,99	28276,56	29153,51	23779,64	24840,14	26726,60
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)		312,68	348,78	359,59	293,31	306,39	329,66
RESISTENCIA (PSI)		4466,9	4982,5	5137,1	4190,1	4377,0	4709,4
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN		111,7%	124,6%	128,4%	104,8%	109,4%	117,7%
TIPO DE FRACTURA		5	5	5	5	5	5
ESQUEMA DE FRACTURA							

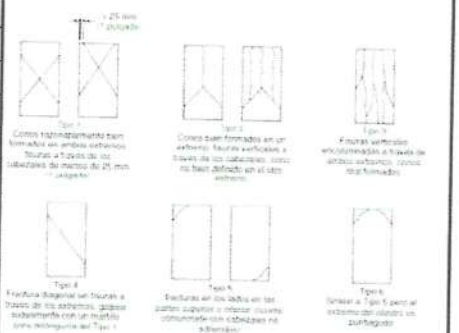

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

Rubén Ortega Mayorquín

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

Karina A Cuenca

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S


EMISIÓN: 27/11/2021	
VERSIÓN: 1	
CONSECUTIVO: IC&L-CON-111	


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		ZAPATA TIPO 4 EJE C4, ZAPATA TIPO 1 EJE C1, ZAPATA TIPO 1 EJE D1 "CARRO 1"			VIGAS DE CIMENTACIÓN "CARRO 1"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		23-jul-24	23-jul-24	23-jul-24	5-ago-24	5-ago-24	5-ago-24
FECHA DE ROTURA		30-jul-24	6-ago-24	20-ago-24	12-ago-24	19-ago-24	2-sep-24
DIAMETRO (Cm)		10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	
AREA (Cm2)		81,073	81,073	81,073	81,073	81,073	
FUERZA (KNw)		244,4	272,0	300,9	249,5	291,6	
FUERZA (Kgf)		24921,71	27736,11	30683,07	25441,76	29734,74	
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)		307,40	342,11	378,46	313,81	366,76	
RESISTENCIA (PSI)		4391,4	4887,3	5406,6	4483,0	5239,5	
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN		109,8%	122,2%	135,2%	112,1%	131,0%	
TIPO DE FRACTURA		2	5	5	3	5	
ESQUEMA DE FRACTURA							

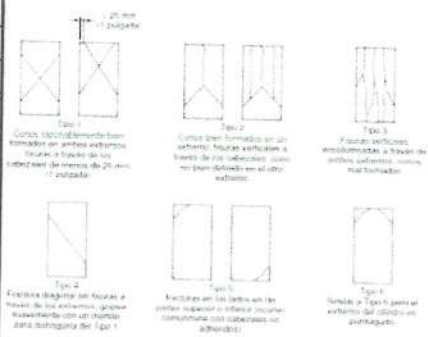

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

Ruben Ortega Mayorquin

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

Karina A Cuenca

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S

EMISIÓN: 27/11/2021	
VERSIÓN: 1	
CONSECUTIVO: IC&L-CON-111	


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		ZAPATA CELDAS "CARRO 2"			ZAPATA CELDAS "CARRO 3"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		14-ago-24	14-ago-24	14-ago-24	14-ago-24	14-ago-24	14-ago-24
FECHA DE ROTURA		21-ago-24	28-ago-24	11-sep-24	21-ago-24	28-ago-24	11-sep-24
DIAMETRO (Cm)		10,16	10,16		10,16	10,16	
AREA (Cm2)		81,073	81,073		81,073	81,073	
FUERZA (KNw)		218,9	265,9		216,2	263,7	
FUERZA (Kgf)		22321,45	27114,09		22046,13	26889,75	
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)		275,32	334,44		271,93	331,67	
RESISTENCIA (PSI)		3933,2	4777,7		3884,7	4738,2	
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN		98,3%	119,4%		97,1%	118,5%	
TIPO DE FRACTURA		2	5		5	5	
ESQUEMA DE FRACTURA							

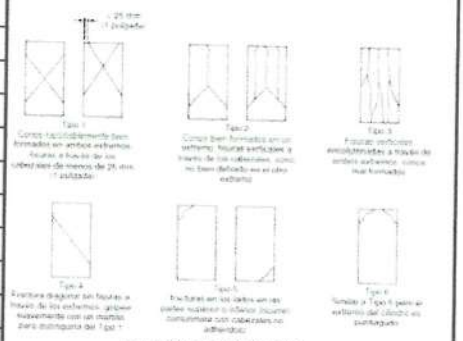

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

	INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S	**EMISIÓN: 27/11/2021**
		VERSIÓN: 1
		CONSECUTIVO: IC&L-CON-111


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN CELDAS "CARRO 1"			PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN ARMERILLO "CARRO 1"		
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280	280	280	280
	PSI	4000	4000	4000	4000	4000	4000
EDAD DE ROTURA		7	14	28	7	14	28
FECHA DE TOMA		22-ago-24	22-ago-24	22-ago-24	23-ago-24	23-ago-24	23-ago-24
FECHA DE ROTURA		29-ago-24	5-sep-24	19-sep-24	30-ago-24	6-sep-24	20-sep-24
DIAMETRO (Cm)							
AREA (Cm2)							
FUERZA (KNw)							
FUERZA (Kgf)							
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)							
RESISTENCIA (PSI)							
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN							
TIPO DE FRACTURA							
ESQUEMA DE FRACTURA							

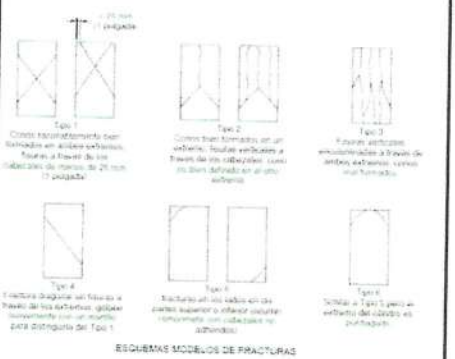

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

Ruben Ortega Mayorquin

ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

Karina A Cuenca

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

INGENIERÍA CONSTRUCCIONES & LABORATORIOS S.A.S

EMISIÓN: 27/11/2021	
VERSIÓN: 1	
CONSECUTIVO: IC&L-CON-111	


ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO NTC 673

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL **MUNICIPIO:** FLANDES - TOLIMA

FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 28 de agosto de 2024

ELEMENTO		PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN ARMERILLO					
RESISTENCIA TEORICA	Kg/Cm2	280	280	280			
	PSI	4000	4000	4000			
EDAD DE ROTURA		7	14	28			
FECHA DE TOMA		23-ago-24	23-ago-24	23-ago-24			
FECHA DE ROTURA		30-ago-24	6-sep-24	20-sep-24			
DIAMETRO (Cm)							
AREA (Cm2)							
FUERZA (KNw)							
FUERZA (Kgf)							
RESISTENCIA (Kgf/Cm2)							
RESISTENCIA (PSI)							
PORCENTAJE RESISTENCIA A COMPRESIÓN							
TIPO DE FRACTURA							
ESQUEMA DE FRACTURA							

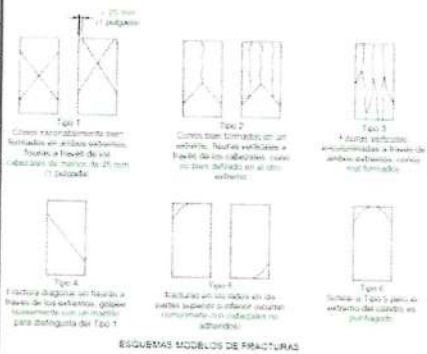

ESQUEMAS MODELOS DE FRACTURAS

PORCENTAJE DE RESISTENCIA ESPERADA POR CADA EDAD	
3 DIAS	39% A 47%
7 DIAS	62% A 68%
14 DIAS	81% A 85%
28 DIAS	100% MINIMO

NOTA: ESPECIMENES DE CONCRETO DE 4"

Ruben Ortega Mayorquin


ING. RUBEN DARIO ORTEGA MAYORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

Karina A Cuenca

ING. KARINA ALEJANDRA CUENCA LEAL
LABORATORISTA

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

FOTO 1. Toma de Asentamiento del concreto de cemento hidráulico (Slump) Ensayo No.1 Pedestales Y Vigas De Cimentación Armerillo "Carro 1".

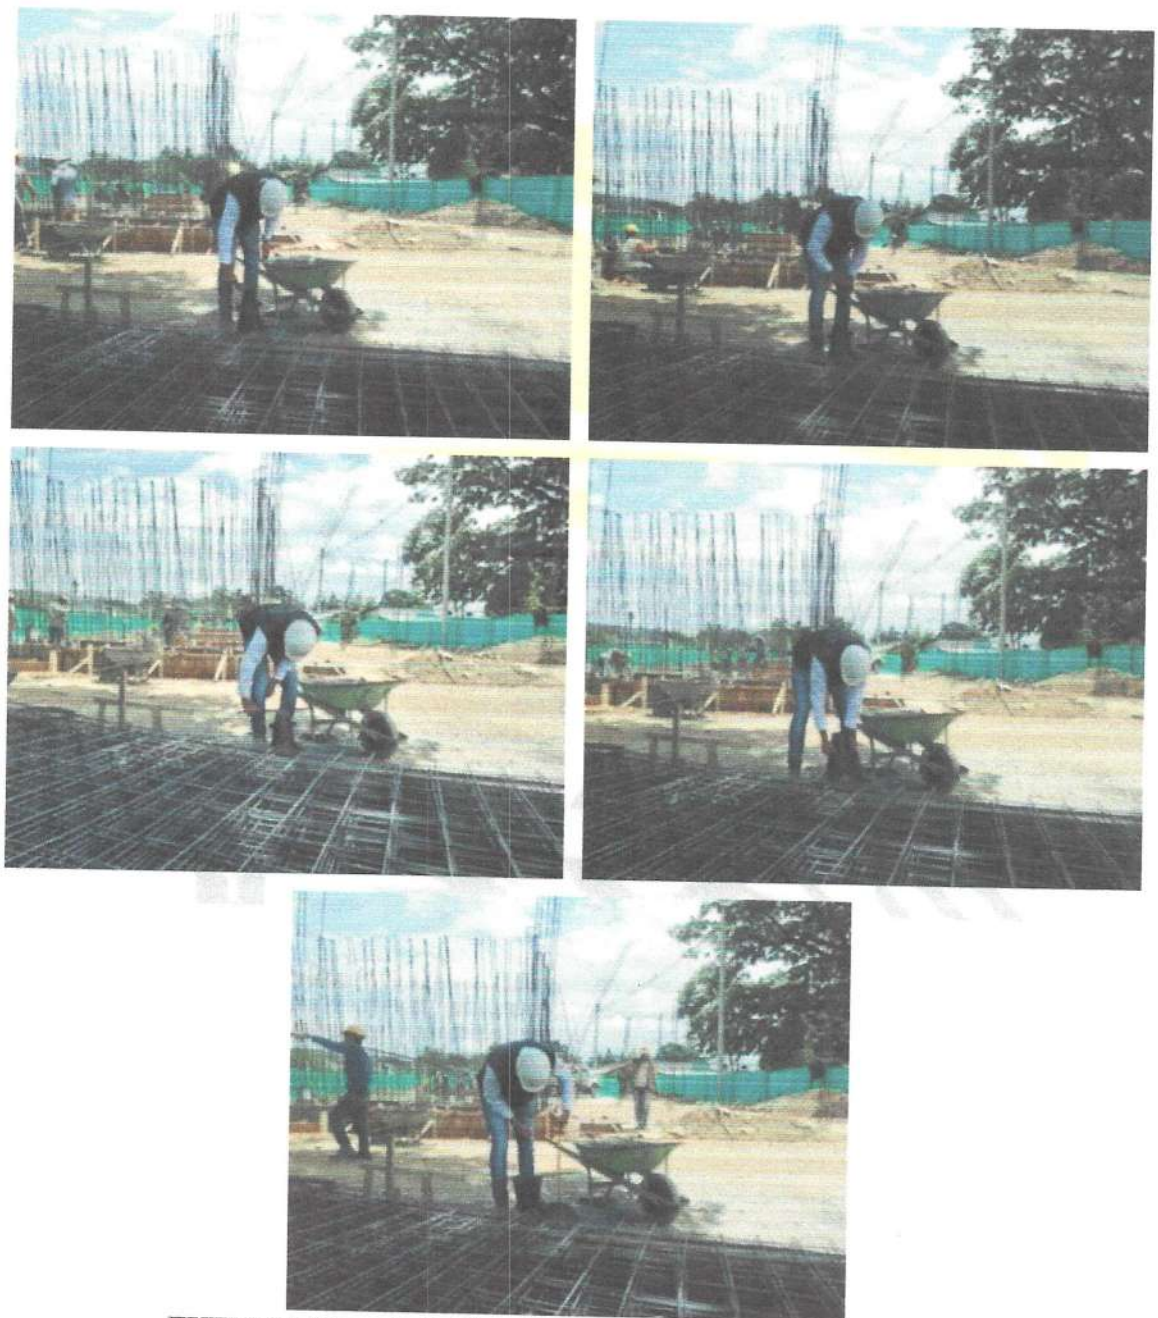

FUENTE: Ingeniería Construcciones & Laboratorios S.A.S.

ANEXO 2. RESULTADOS OBTENIDOS.

TABLA 1. Toma de Asentamiento del concreto de cemento hidráulico (Slump) Ensayo No.1 Pedestales Y Vigas De Cimentación Armerillo "Carro 1".

No. DE ENSAYO	FECHA DE ENSAYO	HORA	LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA DEL CONCRETO	ASENTAMIENTO ESPERADO	ASENTAMIENTO OBTENIDO	APROBADO	NO APROBADO
1	23 de agosto de 2024	11:10:00 a. m.	Pedestales Y Vigas De Cimentación Armerillo "Carro 1"	Planta Argos	6" ± 1"	7"	X	

FUENTE: Ingeniería Construcciones & Laboratorios S.A.S

Girardot, 9 de Octubre de 2024

Señores:
CONSORCIO POLIESTACIÓN
Flandes – Tolima

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos dar a conocer los resultados de los Ensayos de Resistencia a Compresión de los cilindros normales de concreto de las muestras enviadas al laboratorio, que tiene como objeto Interventoría integral (Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, Jurídica y Técnica) para realizar los Estudios, Diseños y Construcción de la Estación de policía en zona Urbana del Municipio de Flandes; Departamento del Tolima.

Los ensayos fueron realizados de acuerdo con la norma I.N.V E - 410 -13.

Quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración o información complementaria que pudiere requerirse y esperamos poder servirles.

Cordialmente,

OSCAR HUGO NIETO LAGUNA
Ingeniero Civil
Gerente Corporativo
Representante Legal

CONSECUTIVO: INGEO N°20200 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES	INGEOBRAS

RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

REGISTRO DEL PROYECTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO POLIESTACIÓN — NIT: 901708257-4

DIRECCION: CR 5 11 24 OF 802 ED TORRE EMPRESARIAL — FECHA T: 4-07-2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA — FECHA E: 9-10-2024

REGISTRO DE LA MUESTRA

SITIO DE LA EJECUCUION DE LAS ACTIVIDADES: FLANDES - TOLIMA

TIPO DE ESTUDIO: RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13

MUESTRA TOMADA POR: CLIENTE: X — INGEOBRAS: ____

MATERIAL: CONCRETO ESTRUCTURAL — **PROCEDENCIA:** ARGOS

FECHA DE LA ULTIMA TOMA: 1-10-2024 — **FECHA ENTREGA RESULTADOS:** 9-10-2024

NOTAS

Los resultados presentados en este informe, corresponden unicamente a la muestra sometida a ensayo. El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproduccion parcial o total de este documento sin la debida autorizacion escrita de Ingeobras OHN S.A.S.

Cuando el cliente suministra la (s) muestra (s) es el directo responsable de su rotulación, procedencia, transporte y entrega al laboratorio. Ingeobras realiza los ensayos solicitados por el cliente a la muestra cómo se recibió y no se hace responsable de cualquier alteración en la validez de los resultados de los ensayos.

Los parámetros de cumplimiento o no de los resultados de los ensayos de laboratorio están relacionados directamente con las especificaciones y rangos establecidos en la norma aplicable al ensayo específico y la conformidad de los resultados queda estipulado en el informe entregado.

Cuando Ingeobras no realice directamente algún ensayo de laboratorio sino a través de un proveedor externo, la aceptación o no de dicho procedimiento queda estipulado en el formato de Revisión de los informes de los resultados, quedaran consignados en los formatos propios de Ingeobras sas.

OBSERVACIONES

ENSAYOS SUBCONTRATADOS (*):

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20200 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	ZAPATAS TIPO 2	EJE E4	280	4000	4/07/2024	11/07/2024	7	204,5	20853,1	257,2	3674	91,9%
2			280	4000	4/07/2024	18/07/2024	14	230,3	23483,9	289,7	4138	103,5%
3			280	4000	4/07/2024	1/08/2024	28	285,0	29061,7	358,5	5121	128,0%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20201 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	ZAPATAS TIPO 2	EJE B4	280	4000	8/07/2024	15/07/2024	7	207,7	21179,4	261,2	3732	93,3%
2			280	4000	8/07/2024	22/07/2024	14	231,2	23575,7	290,8	4154	103,9%
3			280	4000	8/07/2024	5/08/2024	28	287,6	29326,9	361,7	5168	129,2%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días	81% a 85%	
7 Días	62% a 68%		28 Días	100% como mínimo	

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20202 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	ZAPATAS TIPO 7	EJE C ENTRE EJES 7-8	280	4000	12/07/2024	19/07/2024	7	205,2	20924,4	258,1	3687	92,2%
2			280	4000	12/07/2024	26/07/2024	14	233,3	23789,8	293,4	4192	104,8%
3			280	4000	12/07/2024	9/08/2024	28	289,6	29530,8	364,2	5204	130,1%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días	81% a 85%	
7 Días	62% a 68%		28 Días	100% como mínimo	

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20203 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	ZAPATAS TIPO 9	EJE 1-2	280	4000	14/07/2024	21/07/2024	7	197,1	20098,5	247,9	3542	88,5%
2			280	4000	14/07/2024	28/07/2024	14	205,9	20995,8	259,0	3700	92,5%
3			280	4000	14/07/2024	11/08/2024	28	277,0	28246,0	348,4	4977	124,4%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20204 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	ZAPATAS DE CELDAS	EJE 7-8	280	4000	14/07/2024	21/07/2024	7	199,0	20292,2	250,3	3576	89,4%
2			280	4000	14/07/2024	28/07/2024	14	218,8	22311,3	275,2	3931	98,3%
3			280	4000	14/07/2024	11/08/2024	28	278,1	28358,1	349,8	4997	124,9%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20205 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	ZAPATAS DE CELDAS	EJE 7-8	280	4000	14/08/2024	21/08/2024	7	200,2	20414,6	251,8	3597	89,9%
2			280	4000	14/08/2024	28/08/2024	14	220,3	22464,2	277,1	3958	99,0%
3			280	4000	14/08/2024	11/09/2024	28	280,3	28582,5	352,6	5036	125,9%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20206 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	CELDAS ARMERILLO	PROYECTO	280	4000	23/08/2024	30/08/2024	7	174,2	17763,3	219,1	3130	78,3%
2			280	4000	23/08/2024	6/09/2024	14	202,2	20618,5	254,3	3633	90,8%
3			280	4000	23/08/2024	20/09/2024	28	260,2	26532,9	327,3	4675	116,9%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20207 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	TANQUE	PROYECTO	280	4000	29/08/2024	5/09/2024	7	202,0	20598,1	254,1	3630	90,7%
2			280	4000	29/08/2024	12/09/2024	14	238,1	24279,3	299,5	4278	107,0%
3			280	4000	29/08/2024	26/09/2024	28	281,1	28664,0	353,6	5051	126,3%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20208 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	PLACA CONTRAPISO	PROYECTO	175	2500	29/08/2024	5/09/2024	7	128,4	13093,1	161,5	2307	92,3%
2			175	2500	29/08/2024	12/09/2024	14	142,4	14520,7	179,1	2559	102,3%
3			175	2500	29/08/2024	26/09/2024	28	202,4	20638,9	254,6	3637	145,5%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20209 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	PLACA CONTRAPISO	PROYECTO	175	2500	29/08/2024	5/09/2024	7	126,7	12919,7	159,4	2277	91,1%
2			175	2500	29/08/2024	12/09/2024	14	140,5	14326,9	176,7	2525	101,0%
3			175	2500	29/08/2024	26/09/2024	28	229,7	23422,7	288,9	4127	165,1%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO Nº20210 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	PLACA CONTRAPISO	PROYECTO	175	2500	29/08/2024	5/09/2024	7	127,3	12980,9	160,1	2287	91,5%
2			175	2500	29/08/2024	12/09/2024	14	145,7	14857,2	183,3	2618	104,7%
3			175	2500	29/08/2024	26/09/2024	28	231,5	23606,3	291,2	4160	166,4%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20211 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	PLACA CONTRAPISO	ARMERILLO Y CELDAS	175	2500	30/08/2024	6/09/2024	7	125,3	12777,0	157,6	2251	90,1%
2			175	2500	30/08/2024	13/09/2024	14	144,9	14775,6	182,3	2604	104,1%
3			175	2500	30/08/2024	27/09/2024	28	216,0	22025,7	271,7	3881	155,2%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Dias	39% a 47%		14 Dias		81% a 85%
7 Dias	62% a 68%		28 Dias		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20212 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	PLACA CONTRAPISO	CELDAS	175	2500	30/08/2024	6/09/2024	7	126,9	12940,1	159,6	2280	91,2%
2			175	2500	30/08/2024	13/09/2024	14	145,2	14806,2	182,6	2609	104,4%
3			175	2500	30/08/2024	27/09/2024	28	217,6	22188,9	273,7	3910	156,4%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20213 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	TANQUE	PROYECTO	280	4000	18/09/2024	25/09/2024	7	174,2	17763,3	219,1	3130	78,3%
2			280	4000	18/09/2024	2/10/2024	14	202,2	20618,5	254,3	3633	90,8%
3			280	4000	18/09/2024	16/10/2024	28		0,0	0,0	0	0,0%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%		28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20214 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	ARMERILLO	PROYECTO	280	4000	18/09/2024	25/09/2024	7	225,4	22984,3	283,5	4050	101,3%
2			280	4000	18/09/2024	2/10/2024	14	252,2	25717,1	317,2	4532	113,3%
3			280	4000	18/09/2024	16/10/2024	28		0,0	0,0	0	0,0%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días	81% a 85%	
7 Días	62% a 68%		28 Días	100% como mínimo	

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20215 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	TAPA TANQUE	PROYECTO	280	4000	28/09/2024	5/10/2024	7	139,4	14214,8	175,3	2505	62,6%
2			280	4000	28/09/2024	12/10/2024	14		0,0	0,0	0	0,0%
3			280	4000	28/09/2024	26/10/2024	28		0,0	0,0	0	0,0%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días		81% a 85%
7 Días	62% a 68%	.	28 Días		100% como mínimo

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

INGEOBRAS

Ingenieria & Construcciones S.A.S

CONSECUTIVO: INGEO N°20216 VERSIÓN: 1 EMISIÓN: 06/10/2020	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV E – 410 – 13	INGEOBRAS

INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO POLIESTACIÓN

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA

LOCALIZACION: FLANDES - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

No.	ELEMENTO	UBICACIÓN	RESISTENCIA TEORICA		FECHA		EDAD	FUERZA LEIDA	FUERZA	ESFUERZO		PORCENTAJE RESISTENCIA COMPRESION
			Kg/cm2	PSI	TOMA	ROTURA	DIAS	KNw	Kg	Kg/cm2	PSI	
1	PANTALLA CELDAS	PROYECTO	280	4000	1/10/2024	8/10/2024	7	208,8	21291,5	262,6	3752	93,8%
2			280	4000	1/10/2024	15/10/2024	14		0,0	0,0	0	0,0%
3			280	4000	1/10/2024	29/10/2024	28		0,0	0,0	0	0,0%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad					
3 Días	39% a 47%		14 Días	81% a 85%	
7 Días	62% a 68%		28 Días	100% como mínimo	

OBSERVACIONES: CILINDROS DE CONCRETO DE 4"

ING. OSCAR HUGO NIETO L.
GERENTE CORPORATIVO

KIRLEY DAVID PINO BEJARANO
ASISTENTE LABORATORIO

Carrera 9 No. 32-111 Barrio/Rosablanca Girardot-Cundinamarca
Cel.: 3218852425 - 3208095823
ingeobrasohnsas@gmail.com gerencia@outlook.com

6.7 Certificados de calidad

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: Ternium Colombia S.A.S.
NIT: 890932389-8
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales
Página Web: www.ternium.com.co

INFORMACION GENERAL

Cliente: G Y J FERRETERIAS SA GIRON
Dirección: KM5 MAS 500 MT VIA GIRON FLORIDABLA
Teléfono: 6712000

Fecha Impresión 24/02/07
No. Remisión: 82714585
Página: 1 de 7

Informe N°: 28396
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr *	% Ni *	% Cu
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067201	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.11	0.23	0.021	0.015	0.002	0.49	0.206	0.061	0.165
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.12	0.21	0.020	0.014	0.001	0.49	0.166	0.064	0.177
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.12	0.21	0.020	0.014	0.001	0.49	0.166	0.064	0.177
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067411	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.12	0.21	0.020	0.014	0.001	0.49	0.166	0.064	0.177
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067412	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.12	0.21	0.020	0.014	0.001	0.49	0.166	0.064	0.177
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067414	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.12	0.21	0.020	0.014	0.001	0.49	0.166	0.064	0.177
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067415	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.12	0.21	0.020	0.014	0.001	0.49	0.166	0.064	0.177
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067418	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.12	0.21	0.020	0.014	0.001	0.49	0.166	0.064	0.177
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067419	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	1.12	0.21	0.020	0.014	0.001	0.49	0.166	0.064	0.177

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067201	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.041
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067409	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.036
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067410	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.036
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067411	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.036
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067412	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.036

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Autoriza
Elvy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **G Y J FERRETERIAS SA GIRON**
Dirección: **KM5 MAS 500 MT VIA GIRON FLORIDABLA**
Teléfono: **6712000**

Fecha Impresión **24/02/07**
No. Remisión: **82714585**
Página: **7 de 7**

Informe N°: **28396**
Informe Ant N°:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% Cu	± 0.0101 %
% V	± 0.0009 %
% Nb	± 0.0006 %
% Mo	± 0.0036 %
Resistencia a la Fluencia	± 989 psi / ± 6.82 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 989 psi / ± 6.82 Mpa
Alargamiento	± 0.54 %
Altura Resalte	± 0.022 mm
Separación entre extremos	± 0.041 mm
Espaciamiento	± 0.022 mm
Angulo de Resalte	± 0.84 °
Peso metro (masa)	± 0.0086 kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**G Y J FERRETERIAS SA GIRON**	Fecha Impresión	**24/02/07**	Informe N°:	**28396**
Dirección:	**KM5 MAS 500 MT VIA GIRON FLORIDABLA**	No. Remisión:	**82714585**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**6712000**	Página:	**6 de 7**		

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Composición Química: NTC 5192: 2021 Num. 9.1.2 (Método E415) NTC 5231: 2020

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caida de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2021 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2022

* Doblado: NTC 1:2019 (método guiado) NTC 2289:2020 Num. 10

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% C	± 0.0105 %
% Mn	± 0.0230 %
% Si	± 0.0199%
% S	± 0.0025 %
% P	± 0.0014 %
% Cr	± 0.0134 %
% Ni	± 0.0073 %

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **G Y J FERRETERIAS SA GIRON**
Dirección: **KM5 MAS 500 MT VIA GIRON FLORIDABLA**
Teléfono: **6712000**

Fecha Impresión **24/02/07**
No. Remisión: **82714585**
Página: **5 de 7**

Informe N°: **28396**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES / PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Angulo de Resalte
					mm	mm	Kg/m	°
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067414	NTC 2289 GR60	Ternium	7.4	17.1	3.890	58
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067415	NTC 2289 GR60	Ternium	7.4	17.1	3.890	58
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067418	NTC 2289 GR60	Ternium	7.4	17.1	3.890	58
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067419	NTC 2289 GR60	Ternium	7.4	17.1	3.890	58

DATOS GENERALES / PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Altura Resalte
					mm
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067201	NTC 2289 GR60	Ternium	1.70
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067409	NTC 2289 GR60	Ternium	1.77
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067410	NTC 2289 GR60	Ternium	1.77
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067411	NTC 2289 GR60	Ternium	1.77
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067412	NTC 2289 GR60	Ternium	1.77
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067414	NTC 2289 GR60	Ternium	1.77
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067415	NTC 2289 GR60	Ternium	1.77
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067418	NTC 2289 GR60	Ternium	1.77
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067419	NTC 2289 GR60	Ternium	1.77

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **G Y J FERRETERIAS SA GIRON**
Dirección: **KM5 MAS 500 MT VIA GIRON FLORIDABLA**
Teléfono: **6712000**

Fecha Impresión **24/02/07**
No. Remisión: **82714585**
Página: **4 de 7**

Informe N°: **28396**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067415	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067418	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067419	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206
					20240206

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Angulo de Resalte
					mm	mm	Kg/m	°
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067201	NTC 2289 GR60	Ternium	7.3	17.1	3.917	57
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067409	NTC 2289 GR60	Ternium	7.4	17.1	3.890	58
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067410	NTC 2289 GR60	Ternium	7.4	17.1	3.890	58
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067411	NTC 2289 GR60	Ternium	7.4	17.1	3.890	58
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067412	NTC 2289 GR60	Ternium	7.4	17.1	3.890	58

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **G Y J FERRETERIAS SA GIRON**
Dirección: **KM5 MAS 500 MT VIA GIRON FLORIDABLA**
Teléfono: **6712000**

Fecha Impresión **24/02/07**
No. Remisión: **82714585**
Página: **3 de 7**

Informe N°: **28396**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS							
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2	Carga Fluencia N	Carga Tracción N
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067419	NTC 2289 GR60	Ternium	67515	93766	15	Sin Grieta	1.39	510	237404	329711

DATOS GENERALES					PROPIEDADES FISICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Fecha Ensayo
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067201	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067409	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067410	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067411	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067412	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067414	NTC 2289 GR60	Ternium	20240206

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Ternium

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**
Página Web: **www.ternium.com.co**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **G Y J FERRETERIAS SA GIRON**
Dirección: **KM5 MAS 500 MT VIA GIRON FLORIDABLA**
Teléfono: **6712000**

Fecha Impresión **24/02/07**
No. Remisión: **82714585**
Página: **2 de 7**

Informe N°: **28396**
Informe Ant N°:

DATOS GENERALES / PROPIEDADES QUIMICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% V	% Mo
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067414	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.036
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067415	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.036
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067418	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.036
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067419	NTC 2289 GR60	Ternium	0.022	0.036

DATOS GENERALES / PROPIEDADES FISICAS

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Resistencia Fluencia psi	Resistencia Tracción psi	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Área Nominal mm2	Carga Fluencia N	Carga Tracción N
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067201	NTC 2289 GR60	Ternium	68273	96940	13	Sin Grieta	1.42	510	240070	340871
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067409	NTC 2289 GR60	Ternium	67515	93766	15	Sin Grieta	1.39	510	237404	329711
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067410	NTC 2289 GR60	Ternium	67515	93766	15	Sin Grieta	1.39	510	237404	329711
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067411	NTC 2289 GR60	Ternium	67515	93766	15	Sin Grieta	1.39	510	237404	329711
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067412	NTC 2289 GR60	Ternium	67515	93766	15	Sin Grieta	1.39	510	237404	329711
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067414	NTC 2289 GR60	Ternium	67515	93766	15	Sin Grieta	1.39	510	237404	329711
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067415	NTC 2289 GR60	Ternium	67515	93766	15	Sin Grieta	1.39	510	237404	329711
9001229	BARRA COR 1"(No.8) 14m NTC2289/G60	A011067418	NTC 2289 GR60	Ternium	67515	93766	15	Sin Grieta	1.39	510	237404	329711

Eivy Jerez.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Laboratory Manager

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los valores/variables señalados con asterisco (*) no se encuentran dentro del alcance de la acreditación.

RUT

Dirección: Carrera 5 No. 11-24 Oficina. 802 edificio Torre Empresarial Ibagué – Tolima – Cel.: 3153988586 – E-mail
consorciopoliestacion@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14911296086

(415)7707212489984(8020) 000001491129608 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 8 2 5 7	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO POLIESTACION

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 5 11 24 OF 802 ED TORRE EMPRESARIAL

42. Correo electrónico anlagenbauer@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 2 6 0 7 4 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 4 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 2 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI X NO

60. No. de Folios: 9

61. Fecha 2023 - 04 - 28 / 11 : 38: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CLAVIJO CAICEDO GERMAN DARIO
985. Cargo Analista II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14911296086

(415)7707212489984(8020) 000001491129608 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 8 2 5 7	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 3 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 3 2 8	
81. Hasta	2 0 2 5 0 3 2 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 4 2 8		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14911296086

(415)7707212489984(8020) 000001491129608 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 8 2 5 7	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 8 2 9 6 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	VARGAS	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14911296086

(415)7707212489984(8020) 000001491129608 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 0 8 2 5 7	4	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 9 7 8 1 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ANLAGENBAUER SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
379,064,539	9 0	2 0 2 3 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 8 5 4 8 7 3 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RODRIGUEZ	ALCALA	PAOLA	ANDREA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
42,118,282	1 0	2 0 2 3 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Dirección: Carrera 5 No. 11-24 Oficina. 802 edificio Torre Empresarial Ibagué – Tolima – Cel.: 3153988586 – E-mail
consorciopoliestacion@gmail.com

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO POLIESTACION identificado(a) con NITPJ 9017082574 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 370572901 desde el 16 de agosto de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 29 de agosto de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

6.10 Pagos de seguridad Social

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110576522		FLOREZ BARRAGAN JUAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 7 CS 11 B SANTA ISABEL	IBAGUE-TOLIMA	3115438758	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	940407407	9473975603	I	2024/10/07	2024/09/27	BANCOLOMBIA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

2024/09/27 12:07 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65782223		GUZMAN GONZALEZ SHARON DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 5- 54 APT 302 BARRIO EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2644840	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	859366501	9471590150	I	2024/09/06	2024/08/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$780,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$153,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$153,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$153,200		$0	$0
1	CC	65782223	GUZMAN SHARON	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$153,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$153,200		$0	$0

2024/08/21 04:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65782223		GUZMAN GONZALEZ SHARON DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 5- 54 APT 302 BARRIO EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2644840	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	859366501	9471590150	I	2024/09/06	2024/08/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$780,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$0	$0	$352,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$153,200	$0	$0	$153,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$153,200	$0	$0	$153,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$0	$0	$275,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$275,000	$0	$0	$275,000
TOTAL				1	$780,200	$0	$0	$780,200

2024/08/21 04:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65782223		GUZMAN GONZALEZ SHARON DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 5- 54 APT 302 BARRIO EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2644840	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	969976462	9474021761	I	2024/10/07	2024/10/09	BANCO DAVIVIENDA	2	$781,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$153,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$153,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$153,200		$0	$0
1	CC	65782223	GUZMAN SHARON	25-14		30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$275,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,200,000	$153,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$2,200,000	$352,000			$2,200,000	$275,000			$0	$0			$2,200,000	$153,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65782223		GUZMAN GONZALEZ SHARON DAYANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 22 5- 54 APT 302 BARRIO EL CARMEN	IBAGUE-TOLIMA	2644840	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	969976462	9474021761	I	2024/10/07	2024/10/09	BANCO DAVIVIENDA	2	$781,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,000	$600	$0	$352,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$352,000	$600	$0	$352,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$153,200	$300	$0	$153,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$153,200	$300	$0	$153,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,000	$400	$0	$275,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$275,000	$400	$0	$275,400
TOTAL				1	$780,200	$1,300	$0	$781,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 11 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	953176189	9474194577	I	2024/10/09	2024/10/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$652,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0
1	CC	28548736	RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	230201		30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,840,000	$128,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0

2024/10/02 09:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 11 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	953176189	9474194577	I	2024/10/09	2024/10/02	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$652,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$0	$0	$128,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$128,100	$0	$0	$128,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$652,500	$0	$0	$652,500

2024/10/02 09:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 11 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	953158183	9471797931	I	2024/09/10	2024/10/02	SCOTIABANK COLPATRIA	22	$663,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0
1	CC	28548736	RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	230201	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,840,000	$128,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$128,100		$0	$0

2024/10/02 09:17 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28548736		RODRIGUEZ ALCALA PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 NO 3 11 APT 301 BRR BELEN	IBAGUE-TOLIMA	2732538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	953158183	9471797931	I	2024/09/10	2024/10/02	SCOTIABANK COLPATRIA	22	$663,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$4,800	$0	$299,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$294,400	$4,800	$0	$299,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,100	$2,100	$0	$130,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$128,100	$2,100	$0	$130,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$3,800	$0	$233,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$3,800	$0	$233,800
TOTAL				1	$652,500	$10,700	$0	$663,200

2024/10/02 09:17 AM

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-08-04, 07:39:22 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	MARA VICTORIA LOZANO VARGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 65750824
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065606603
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	823272202
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 377.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 162.500	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 6.800	$ 0
		SubTotales:		$ 377.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-01, 02:44:29 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	MARA VICTORIA LOZANO VARGAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 65750824
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1066220481
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	882875180
Banco	(1811) - RAPPIPAY
Valor	$ 711.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 368.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 287.500	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	1	$ 56.100	$ 0
		SubTotales:		$ 711.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 711.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	949810566	9473828603	I	2024/10/03	2024/10/01	BANCOLOMBIA	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC 93385314	DUEÑAS DAIRO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

2024/10/01 10:15 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	949810566	9473828603	I	2024/10/03	2024/10/01	BANCOLOMBIA	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

2024/10/01 10:15 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93385314		DUEÑAS MORALES DAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 53-53 APTO 201 TOSCANA	IBAGUE-TOLIMA	2657037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1000000286	9472994395	I	2024/09/04	2024/09/23	BANCO DE BOGOTA	19	$575,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$3,600	$0	$259,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$256,000	$3,600	$0	$259,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,400	$1,600	$0	$113,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$111,400	$1,600	$0	$113,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$2,800	$0	$202,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$200,000	$2,800	$0	$202,800
TOTAL				1	$567,400	$8,000	$0	$575,400

2024/09/23 11:12 AM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA PATRICIA PINEDA PELAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-65761555
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-03
FECHA DE PAGO:	2024-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30884522
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30884522
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 162.500	$ 165.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 208.000	$ 211.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 300	$ 13.600	$ 13.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 384.100	$ 390.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/09/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA PATRICIA PINEDA PELAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-65761555
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-27
FECHA DE PAGO:	2024-09-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	30888436
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30888436
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 162.500	$ 164.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 208.000	$ 210.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 13.600	$ 13.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 384.100	$ 388.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/10/2024

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110576522		FLOREZ BARRAGAN JUAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ 7 CS 11 B SANTA ISABEL	IBAGUE-TOLIMA	3115438758	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	1014949469	947653975	I	2024/09/06	2024/10/30	NEQUI	54	$385,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$8,200	$0	$216,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$8,200	$0	$216,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$6,400	$0	$168,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$6,400	$0	$168,900
TOTAL				1	$370,500	$14,600	$0	$385,100

2024/10/30 03:32 PM

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.002-24

Entre los suscritos a saber **CONSORCIO POLIESTACION**, identificado con Nit. Número 901.708.257-4, quien se denominará EL CONTRATANTE y por la otra **ANLAGENBAUER S.A.S**, identificada con el NIT número 901.497.811-4 y quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato para prestar bajo la nómina de Anlagenbauer S.A.S los servicios del señor HUBER DANILO VILLARREAL RUBIO, **identificado** con cédula de ciudadanía número 93410511 de Ibagué (Tol.), identificada como quien *cumple* con los requisitos de su requerimiento de personal, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA en su calidad de prestador del servicio, suministrara a la profesional **HUBER DANILO VILLARREAL RUBIO,** para que ejerza las actividades de **INGENIERO,** quien se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA EN EL PROYECTO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA."**, con una disponibilidad del 100%, sin que exista horario determinado, ni dependencia. **PARAGRAFO**: El profesional que prestará el servicio no tiene ninguna función asignada ajena a la ejecución del objeto contractual en mención con ANLAGENBAUER S.A.S. **SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de SIETE (6) meses, contados a partir del PRIMERO (1) del mes de septiembre de 2024, y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **TERCERA. - PRECIO**: El valor mensual del contrato será por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE. **CUARTA. - FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será cancelado así: PAGOS MENSUALES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE, previa presentación de informe mensual de sus actividades. **QUINTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATANTE deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual

se dará un término de 5 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado ley 1122 de enero de 2007. **SEXTA.- SUPERVISIÓN:** El CONTRATANTE o su Representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. **SEPTIMA. -TERMINACIÓN**. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. **OCTAVA. - INDEPENDENCIA**: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **NOVENA. - CESIÓN**: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **DÉCIMA. - DOMICILIO**: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Ibagué.

Las partes suscriben el presente documento, el PRIMERO (1) del mes de septiembre del año 2024, en la ciudad de Flandes (Tol).

JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
C.C. 5.829.612 de Ibagué
Contratante
R.L. ANLAGENBAUER S.A.S

HUBER DANILO VILLARREAL RUBIO
C.C. 93.410.511 de Ibagué
Contratista

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS	CARRERA 10 3 11	2607436	anlagenbauer@hormail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	E	30/10/2024	81032093	$644.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	LMA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	5A29812	DIAZ VARGAS JUAN CAMILO	1	0				N																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-1	2.000.000	II	139.200	CCF50	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497811-4	ANLAGENBAUER SAS		CARRERA 10 3 11	2607436	anlagenbauer@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	30/10/2024	81299687	$1.262.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Residente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9829612	DIAZ VARGAS JUAN CAMILO	1	0			S																	23-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF50	2.080.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	9947611	VILLARREAL RUBIO HUBER DANILO	1	0			S	X																23-01	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF40	2.080.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.001-24

Entre los suscritos a saber **CONSORCIO POLIESTACION**, identificado con Nit. Número 901.708.257-4, quien se denominará EL CONTRATANTE y por la otra CONSTRUYE GYM BTA SAS, identificada con el NIT número 901723938 y quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato para prestar bajo la nómina de CONSTRUYE GYM BTA SAS, los servicios del señor JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS, **identificado** con cédula de ciudadanía número 79.855.590 de Bogotá, identificada como quien *cumple* con los requisitos de su requerimiento de personal, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- OBJETO**: El CONTRATISTA en su calidad de prestador del servicio, suministrara a la profesional JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS, para que ejerza las actividades de **INGENIERO TOPOGRAFICO,** quien se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: INGENIERO TOPOGRAFICO **DE INTERVENTORÍA EN EL PROYECTO "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA."**, con una disponibilidad del 100%, sin que exista horario determinado, ni dependencia. **PARAGRAFO**: El profesional que prestará el servicio no tiene ninguna función asignada ajena a la ejecución del objeto contractual en mención con CONSTRUYE GYM BTA SAS **SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO**: El plazo para la ejecución del presente contrato será de SIETE (6) meses, contados a partir del DIECIOCHO (18) del mes de Junio de 2024, y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito. **TERCERA. - PRECIO**: El valor mensual del contrato será por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE. **CUARTA. - FORMA DE PAGO:** El valor del contrato será cancelado así: PAGOS MENSUALES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE, previa presentación de informe mensual de sus actividades. **QUINTA. - OBLIGACIONES:** El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATANTE deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la

naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de le ley 100 de 1993, para lo cual se dará un término de 5 días contados a partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado el contrato se dará por terminado ley 1122 de enero de 2007. **SEXTA. - SUPERVISIÓN:** El CONTRATANTE o su Representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA. **SEPTIMA. -TERMINACIÓN**. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. **OCTAVA. - INDEPENDENCIA**: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento. **NOVENA. - CESIÓN**: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. **DÉCIMA. -DOMICILIO**: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad de Ibagué.

Las partes suscriben el presente documento, el dieciocho (18) del mes de junio del año 2024, en la ciudad de Flandes (Tol).

JUAN CAMILO DIAZ VARGAS
C.C. 5.829.612 de Ibagué
Contratante
R.L. CONSORCIO POLIESTACION

JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
C.C. 79.855.590 de Bogotá
Contratista

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONSTRUYE GYM BTA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901723938
SUCURSAL	55
FECHA PAGO	2024-08-30
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-79855590
NOMBRE EMPLEADO	JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A
APP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	30728827
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-07
PERÍODO SALUD	2024-08
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0.0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0.0696000	$ 90.500	696

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0.0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 402.500

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONSTRUYE GYM BTA SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901723938
SUCURSAL	60
FECHA PAGO	2024-09-30
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-79855590
NOMBRE EMPLEADO	JORGE FERNANDO MORALES OLIVEROS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	31131687
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2024-08
PERÍODO SALUD	2024-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.300.000	0,1600000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.300.000	0,0052200	$ 6.800	522

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.300.000	0,0400000	$ 52.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 208.000	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 318.800
