DVL S.A.S

Gobernación de Sucre

UAEGRADCC
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA	martes, 31 de diciembre de 2024	PERIODO No.	15	DEL	23/12/2024	AL	30/12/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	CONTRATO CDCP-003-2024	CONTRATO No.:	CONTRATO CDCP-002-2024
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMIINSTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES POR TEMPORADA DE SEQUÍA CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO	OBJETO:	CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES POR TEMPORADA DE SEQUIA CON INCIDENCIA DEL FENOMENO DEL NIÑO
PLAZO INICIAL:	2 MESES	PLAZO INICIAL:	2 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MAYO 17 DE 2024	FECHA DE INICIACIÓN:	MAYO 17 DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	JULIO 17 DE 2024	FECHA DE SUSPENSIÓN:	JULIO 17 DE 2024
FECHA DE REINICIO:	NOVIEMBRE 13 DE 2024	FECHA DE REINCIO:	NOVIEMBRE 13 DE 2024
PRORROGA	DICIEMBRE 31 DE 2024	PRORROGA	DICIEMBRE 31 DE 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	109	PLAZO ACTUALIZADO:	109
PLAZO TRANSCURRIDO:	110 EQUIVALE AL 100,00%	PLAZO TRANSCURRIDO:	110 EQUIVALE AL 100,00%
ANTICIPO 30%:	$ 18.242.700,00	ANTICIPO 30%:	235.664.282,49
VALOR INICIAL :	$ 60.809.000,00	VALOR INICIAL :	785.547.608,30
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 60.809.000,00	VALOR ACTUALIZADO:	785.547.608,30
VALOR PAGADO:	$ 36.485.400,00	VALOR PAGADO:	463.814.872,30
VALOR POR PAGAR:	$ 24.323.600,00	VALOR POR PAGAR:	321.732.736,00
SUPERVISOR:	PAOLA ANDREA TOUS BERTEL - DIRECTORA UAEGRADCC	INTERVENTOR:	DVL CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Actividades Pozo profundo Corregimiento El Retiro, municipio de Sampués

Se realizó movilización y Retirada de Equipos. Trasporte de Maquinaria de Perforación, Camioneta Doble Cabina y demás Accesorios y Herramientas al Sitio de Obra (Incluye Montaje y Desmontaje de Equipo)

Se realiazó adecuación de area de trabajo y construcción de Piscinas para la preparación del Lodo de perforación y las Muestras del Lodo de Excavación

Actividades Pozo profundo Corregimiento Santiago Apostol, municipio de San Benito Abad

Se realizó suministro e instalación de tanques de reserva de 2.000Litros. Incluye suministro e instalación de accesorios y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Se construyó losa Maciza Cimiento H=20 CM

Se realizó Suministro e instalación de tubería de PVC 2" RDE21 de alimentación de tanques y distribución de agua. Incluye accesorios y demas elementos necesarios para su correcta operación

Actividades Pozo profundo Corregimiento Flor del Monte, municipio de Ovejas

Se realizó lavado Y Desarrollo Del Pozo Con Compresor De Aire, Piston y yetting

Se realizó Prueba de Aforo con compresor para determinar el Caudal del Pozo y el punto de Instalación de La bomba sumergible

Se realizó Sello sanitario y base

Se realizó Suministro e instalación equipo de bombeo incluye bomba solar y motor con cabeza dinámica total (HDT)=75mca, caudal (Q)=30m3/día y Potencia(P)= 5 HP y todos los componentes para su puesta en marcha

Se realizó Suministro e instalación de tanques de reserva de 2.000Litros. Incluye suministro e instalación de accesorios y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento

Se construyó Losa Maciza Cimiento H=20 CM

Se realizó Suministro e instalación de tubería de PVC 2" RDE21 de alimentación de tanques y distribución de agua. Incluye accesorios y demas elementos necesarios para su correcta operación

DVL S.A.S

Gobernación de Sucre

UAEGRADCC
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA	martes, 31 de diciembre de 2024	PERIODO No.	15	DEL	23/12/2024	AL	30/12/2024

Se realizó Suministro e instalación de tubería de PVC 2" RDE21 de alimentación de tanques y distribución de agua. Incluye accesorios y demás elementos necesarios para su correcta operación

Actividades Pozo profundo Corregimiento El Coley, municipio de Los Palmitos

Se realizó movilización y Retirada de Equipos. Trasporte de Maquinaria de Perforación, Camioneta Doble Cabina y demás Accesorios y Herramientas al Sitio de Obra (Incluye Montaje y Desmontaje de Equipo)
Se realizó Adecuación de area de trabajo y construcción de Piscinas para la preparación del Lodo de perforación y las Muestras del Lodo de Excavación
Se realizó Perforación exploratoria en 6 1/2", registro litológico, registro de perforación, rata de penetración, muestreo cada metro y análisis granulométrico in situ de las muestras extraídas durante la perforación
Se realizó Registro Eléctrico (Resistividad aparente, SP Y Gamma Ray) para determinar columna estratigráfica del Pozo y hacer el Diseño de Pozo Ubicando La Instalación de Los tubos y filtros.
Se realizó ampliación en 12 1/2"
Se realizó Suministro e instalación Tubería Ranurada PVC RDE 21 6" x 6 mts
Se realizó suministro e instalación de Tubería PVC RDE 21 6" x 6 mts
Se realizó suministro E instalación de gravilla seleccionada No. 2 + transporte
Se realizó Lavado Y Desarrollo Del Pozo Con Compresor De Aire, Piston y yetting
Se realizó Prueba de Aforo con compresor para determinar el Caudal del Pozo y el punto de Instalación de La bomba sumergible
Se realizó Sello sanitario y base

DVL S.A.S

Gobernación de Sucre

UAEGRADCC
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA	martes, 31 de diciembre de 2024	PERIODO No.	15	DEL	23/12/2024	AL	30/12/2024

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 785.547.608,30	100,00%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 785.547.608,30	100,00%	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

NO APLICA PARA ESTE INFORME

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

La obra se terminó de manera satisfactoria

DVL S.A.S

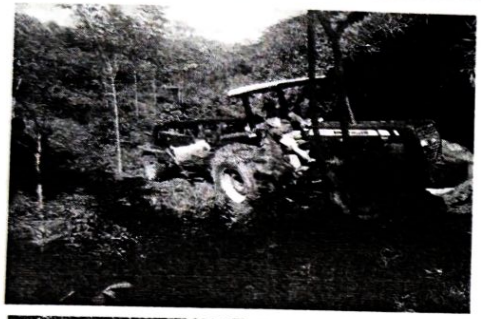
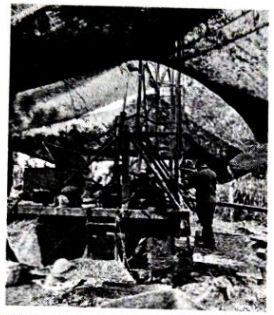
Gobernación de Sucre

UAEGRADCC
Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo, Atención de Desastres y Cambio Climático

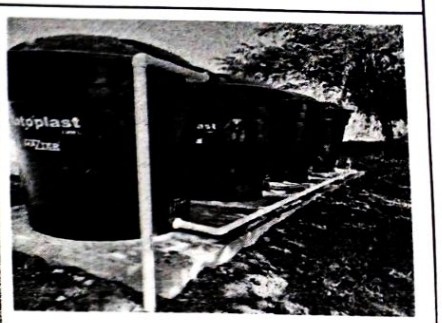
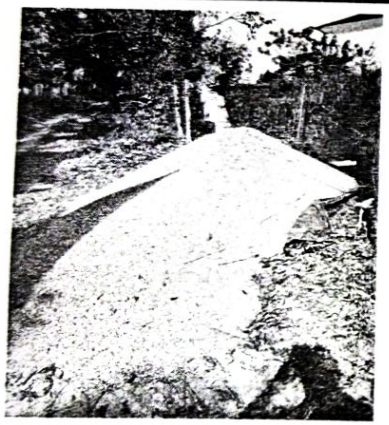
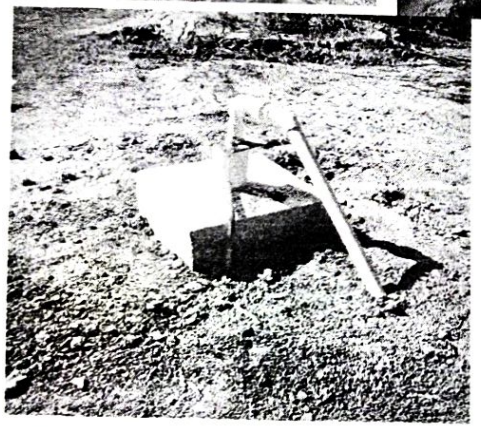
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

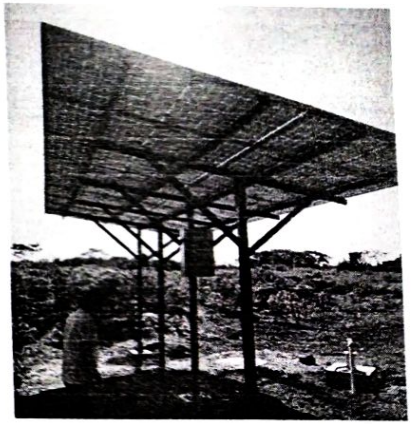
FECHA	martes, 31 de diciembre de 2024	PERIODO No.	15	DEL	23/12/2024	AL	30/12/2024

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





FIRMA INTERVENTOR
DVL CONSTRUCCION, INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S
