Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE DICIEMBRE DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

Objeto del Convenio:	**ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"**										
Valor del Convenio:	$ 13.958.651.555,00		Aporte de Coldeportes:		$ 13.958.651.555,00		Aporte del Municipio:		$ 0,00		
Valor Adición:	$ 0,00										
Valor Total:	$ 13.958.651.555,00										
Plazo de Ejecución:	5 MESES Y 24 DIAS		Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga Nº 1		31/03/2025		
Fecha de Inicio:	6/11/2024		Suspensión 2		Reinicio:		Prórroga Nº 2				
Vencimiento:	31/12/2024						Plazo Actualizado				
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha		Modificación Valor		
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	Desde	16/10/2024	Hasta	30/09/2025	$ 2.791.730.311,00		Hasta				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº		Período comprendido entre el	1 DE DICIEMBRE DEL 2024	y el	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO CESAR				
Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	Objeto:
Contrato Nº:	004-2024	Contrato Nº:
Contratista:	CONSORCIO INTERPARK SAN DIEGO	Contratista:
Plazo Inicial:	6 meses	Plazo Inicial:
Fecha de Inicio:		Fecha de Inicio:
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:
Fecha de Terminación:	10 de septiembre del 2025	Fecha de Terminación:
Prórrogas:		Prórrogas:
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado:
Valor Inicial:	$ 518,496,955	Valor Inicial:
Valor Adiciones:		Valor Adiciones: -
Valor Actualizado:	$ 518,496,955	Valor Actualizado:
Valor pagado:	0	Valor pagado:
Valor por pagar:	$ 518,496,955	Valor por pagar:
Nombre Supervisor:	UBEIMAN SOCARRAS RUEDA	Nombre Interventor:

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004-2024				**CONTRATO DE OBRA Nº**			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2024	27/12/2025	51.849.695,50				
ARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONE	27/12/2024	27/06/2028	51.849.696,50				

CALIDAD DEL SERVICIO	27/12/2024	27/06/2030	51.849.697,50				
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza N°		21-44-101460909	Nombre de la Aseguradora	Póliza N°		

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº			CONTRATO DE OBRA Nº		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
en este periodo aun no se han realizado pagos a los contratos derivados puesto que solo se ha llevado a cabo la celebracion del contrato de interventoria					

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
en este periodo aun no hay reportes de seguimiento de avances tanto fisicos, como financieros								
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	


DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

CELEBRACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONCURSO DE MERITO ABIERTO CMA 001-2024

SOLICITUD DE PRORROGA N° 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID -846-2024

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

en este periodo no hay aun balance que se puedan reportan de la ejecucion

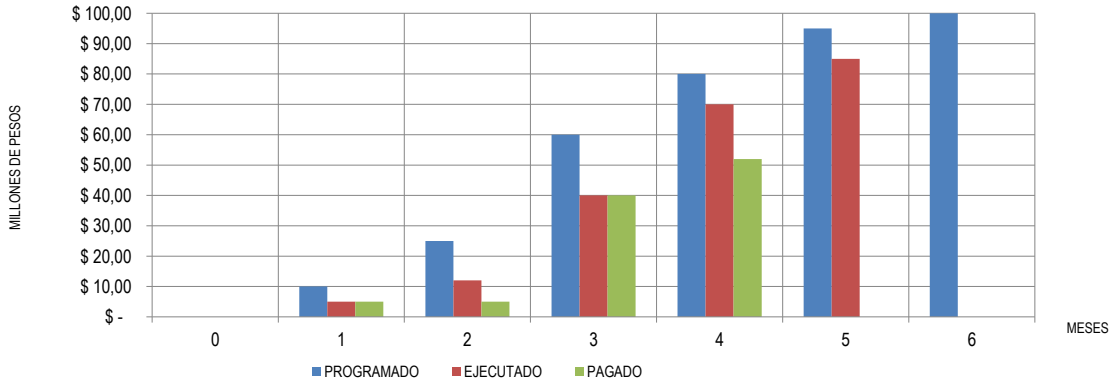

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	ATC-FR-003 Página _ de _

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

aun no hay reportes de recomendaciones y/o comentarios de la internetoria.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N.A	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N.A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N.A	0	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N.A	0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N.A	0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio	N.A	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Luis Eduardo Arzuaga O.			
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	UBEIMAN SOCARRAS RUEDA	UBEIMAN SOCARRAS RUEDA	Elaborado: 31/12/2024
Apoyo a la supervision de la secretaria de planeacion	Secretario de planeacion e infraestructura	Secretario de planeación e infraestructura	Total de Páginas: 3

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página 1 de 1

A N E X O Nº 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"			
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEG, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contratista:	N.A	Director de obra:	N.A
Interventor:	CONSORCIO INTERPARK SAN DIEGO	Director Interventoría:	N.A
Fecha del registro fotográfico:	31/12/2024		

se adjunta el mismos reporte fotografico del mes de noviembre puesto que aun no se han realizado intervenciones al predio.

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
fotografia tomanda al costado ESTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.	fotografia tomanda al costado ESTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.	fotografia tomanda al costado SUR del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
fotografia tomanda al costado NORTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.	fotografia tomanda al costado ESTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.	fotografia tomanda al costado OESTE del predio donde se llevara a cambo la ejecucion o construccion del escenario deportivo.
