Barranquilla, 21 abril 2025

Doctor
Nelson Oquendo Consuegra
Subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del Departamento del Atlántico

ASUNTO: Informe de gestión de actividades correspondientes al periodo del 14 de marzo del 2025 al 13 de abril del 2025.

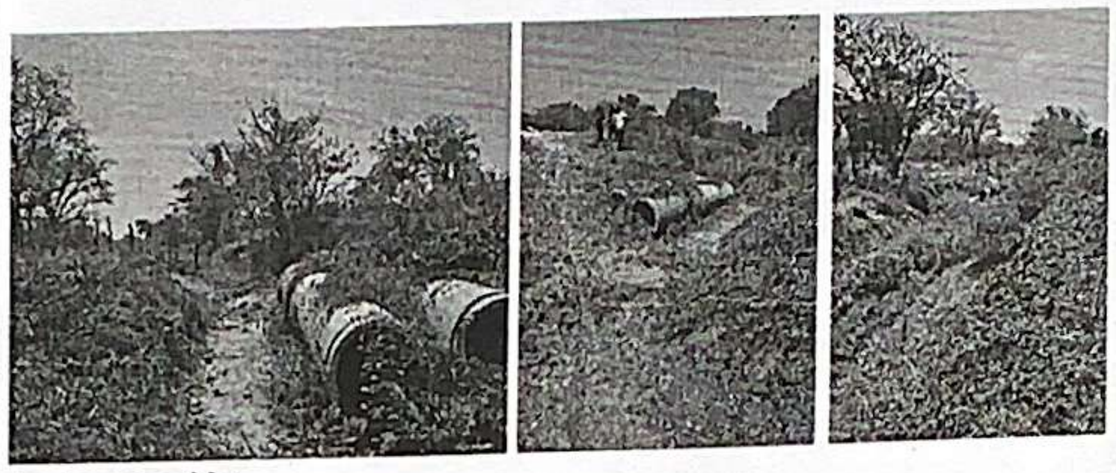
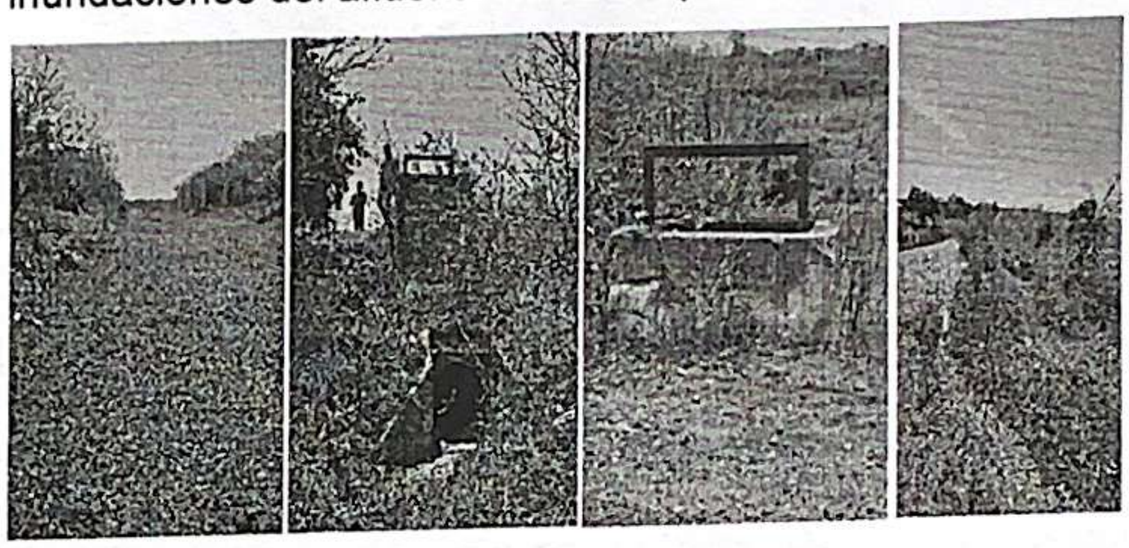
Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión correspondientes al periodo del **14 de marzo del 2025 al 13 de abril de 2025**, de acuerdo al contrato No. 202500701.

Objeto: Prestación de servicios profesionales para acompañar el desarrollo de los distintos procesos, programas, actividades administrativas, operativas y misionales de la subsecretaría de prevención y atención de desastres del Departamento del Atlántico.

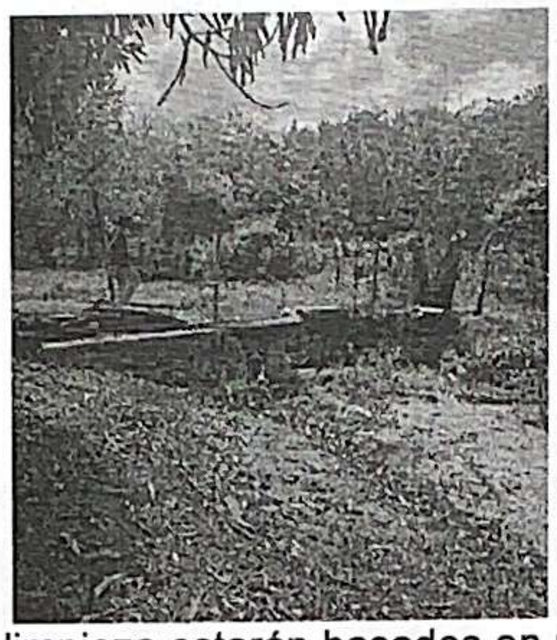
Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas	
Obligación	**Producto**
Visita municipio de Candelaria	
Diseñar proyectos de infraestructura destinados a la prevención y mitigación de riesgos derivados de desastres naturales y antrópicos, incluyendo obras de control de inundaciones, drenajes y reservorios.	Visita de Inspección Técnica, sobre el arroyo Bejuco, municipio de Candelaria, Atlántico. La inspección realizada en el entorno afectado permitió identificar los siguientes componentes: Ubicación Zona 1: Obra hidráulica (box coulvert), construido para el manejo de aguas y el paso vehicular sobre su superficie, en la cual se encuentra una gran acumulación de sedimento y otros problemas de tipo antrópico como son, la existencia de varias áreas con depósitos de basuras lo cual imposibilita su drenaje natural, contribuyendo a la pérdida de capacidad hidráulica del cauce en dicho punto de referencia, provocado una posible inundación de los predios adyacentes a la zona de inspección técnica.   Ubicación Zona 2: sector el Barro, se evidencia riesgo por

	posible inundación debido a la conformación de erosión laminar, surcos y en menor proporción, cárcavas, cuya formación es favorecida por la baja resistencia del suelo formados a partir de los torrenciales aguaceros, escorrentía superficial, que ocasionan el desgaste del horizonte superficial del suelo, favoreciendo el incremento  de la erosión. Ubicación Zona 3: obra hidráulica tipo compuerta, se evidencia riesgo por inundación debido a que mencionada obra genera el flujo del fluido por sistema de rebose hacia el canal de riego No 3 de esta municipalidad, mencionado canal se encuentra sin intervención y/o mantenimiento, lo cual representa riesgo por posible desbordamiento e inundaciones del afluente hacia los predios aledaños. 
Elaborar presupuestos detallados para las obras civiles, considerando los costos asociados a la gestión del riesgo y los recursos disponibles.	Se realiza informe, dejando evidencia de lo observado, emitiendo el respectivo concepto técnico y la posible solución, adjuntando presupuesto y cronograma.
Visita municipio de Manatí	
Evaluar las condiciones estructurales de infraestructuras afectadas por desastres o con potencial riesgo, emitiendo diagnósticos técnicos y recomendaciones para su reparación o reforzamiento.	Visita de Inspección Técnica, municipio de Manatí. La inspección realizada en el entorno afectado permitió identificar que diversos canales naturales han sufrido un grave deterioro debido a la acumulación excesiva de maleza y residuos sólidos, lo que compromete su capacidad de drenaje y afecta negativamente el ecosistema circundante. La obstrucción de estos canales puede generar riesgos de inundaciones y alteraciones en la calidad del agua. Con el fin de mitigar estos problemas, se llevará a cabo una intervención técnica que consistirá en la limpieza y remoción de la vegetación invasiva y los

2/A

	desechos presentes en dichos canales. Los trabajos de   limpieza estarán basados en un plano detallado, en el cual se encuentran claramente marcados los canales que requieren intervención. Este proceso tiene como objetivo restaurar la funcionalidad de los canales, mejorar la gestión del agua y contribuir a la conservación de los ecosistemas acuáticos locales.
Elaborar presupuestos detallados para las obras civiles, considerando los costos asociados a la gestión del riesgo y los recursos disponibles.	Se realiza informe, dejando evidencia de lo observado, emitiendo el respectivo concepto técnico y la posible solución, adjuntando presupuesto y cronograma.
Diseñar y supervisar planes de rehabilitación de infraestructuras deterioradas por eventos climáticos o desastres, asegurando su funcionalidad y seguridad.	Visita de Inspección Técnica, municipio de Manatí. La inspección realizada en el entorno afectado permitió identificar una vía terciaria en evidente mal estado. El camino es de tierra y no cuenta con ningún tipo de pavimentación, lo que lo hace vulnerable a las condiciones climáticas. En la superficie se observan múltiples baches y charcos, señales claras de un deficiente sistema de drenaje. La erosión del terreno es notoria, especialmente en las zonas más transitadas, donde el paso de vehículos ha deteriorado la vía. Hay acumulación de lodo y zonas con residuos, lo que sugiere un mantenimiento poco frecuente o inexistente. El terreno es irregular, lo que dificulta la movilidad segura tanto para vehículos como para peatones. La vía carece de señalización o elementos que mejoren su transitabilidad. Las condiciones actuales representan un riesgo, especialmente durante temporadas de lluvia. El deterioro progresivo de esta carretera refleja el abandono estatal y la falta de inversión en infraestructura rural. Esta vía, en su estado actual, limita el desarrollo y el acceso de las comunidades que dependen de ella.  

Elaborar presupuestos detallados para las obras civiles, considerando los costos asociados a la gestión del riesgo y los recursos disponibles.	Se realiza informe, dejando evidencia de lo observado, emitiendo el respectivo concepto técnico y la posible solución, adjuntando presupuesto y cronograma.
Todas las demás que designe el supervisor y que estén encaminadas al correcto cumplimiento del objeto del contrato.	Se participó en la reunión inicial de coordinación con relación a la misión y visión y los procesos de la Gestión del Riesgo, resultados contenidos en distribución de equipos de trabajo para el **conocimiento del riesgo**, **reducción del riesgo** y **manejo de desastres,** la reunión fue precedida por el Dr. Nelson Oquendo Consuegra, en coordinación con funcionarios y contratistas de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico.  
Evaluar las condiciones estructurales de infraestructuras afectadas por desastres o con potencial riesgo, emitiendo diagnósticos técnicos y recomendaciones para su reparación o reforzamiento.	1) Se realizo visita de inspección técnica ocular al arroyo el pueblo, a la altura del barrio Chacanita, Municipio de Usiacurí. Esta sección del arroyo presenta sedimentación y desplome de un muro de protección. Por lo tanto, se recomienda realizar acciones pertinentes para el mejoramiento de la capacidad de ronda la hídrica

Álvaro Agudelo Sanjuan
C.C. 8.530.305 de Barranquilla

4/4
