AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	5 de mayo de 2025
Semana No.	**42**	**Del :**	26 de abril de 2025	**al**	2 de mayo de 2025

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	290	días	**Tiempo restante**	166 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	63.60%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

A partir del informe 36, se reporta la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta el plan de contigencia No. 2, aprobado al contratista, para la nivelación de la ejecución, cuyo plazo de monitoreo se determina hasta el 16 de mayo de 2025. De acuerdo con esto, se ajustaron los porcentajes y valores acumulados, que para el informe semanal 42, reporta lo siguiente:

	Semanal	Acumulado		Semanal		
(%) Programado	2.43%	44.44%	**(%) Ejecutado**	0.46%		43.47%
Valor programado ($)	$59,977,771.16	$1,098,299,263.92	**Valor ejecutado ($)**	$11,398,163.00		$1,074,489,554.19
			Evaluación		**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-0.96%
					Valor Adelanto/Atraso	-$ 23,809,709.73

OBSERVACIONES

Teniendo en cuentael plan de continegia No. 2, aprobadoal contratista, se las actividades que ya se encutrna programadas para ejecución, se reporta el sigueitne estado y porcentaje:

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**95.11%**	**74.21%**	**-20.90%**	**Ejecutado con retrasos**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Localización y replanteo con equipo topográfico	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Campamento 18 M2	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Dia de trasiego - 2 ayudantes	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100.00%	65.15%	**-34.85%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.47%	**0.47%**	**En ejecución**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	27.35%	**-72.65%**	**Ejecutado con retrasos**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	23.25%	**-76.75%**	**Ejecutado con retrasos**
Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e max = 4.0 cm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100.00%	44.14%	**-55.86%**	**Ejecutado con retrasos**
Piso en adoquin referencia Piazza liso 15 x 15. (incluye cama de arena de 5 cm)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Única, Formato (0,56 M x 0,56 M).	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Guardaescobas en PVC Blanco h = 8.5 cms	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	60.72%	**-39.28%**	**Ejecutado con retrasos**
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100.00%	98.22%	**-1.78%**	**Ejecutado con retrasos**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100.00%	133.38%	**33.38%**	**En ejecución**
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Estuco plastico acrilico	100.00%	9.86%	**-90.14%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza,	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Cañuela prefabricada Tipo A-120	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100.00%	87.50%	**-12.50%**	**Ejecutado con retrasos**
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco,	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Mobiliario sala de turno	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Mobiliario Taller	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Mobiliario de oficina	75.00%	0.00%	**-75.00%**	**Ejecutado con retrasos**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**100.00%**	**59.58%**	**-40.42%**	**Ejecutado con retrasos**
TUBERIA PVC-S 2"	100.00%	93.54%	**-6.46%**	**Ejecutado con retrasos**
S/CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
YEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
TEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
UNIÓN PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO LAVAMANOS 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
TRAGANTE 4"	100.00%	25.00%	**-75.00%**	**Ejecutado con retrasos**
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	100.00%	7.78%	**-92.22%**	**Ejecutado con retrasos**
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100.00%	53.44%	**-46.56%**	**Ejecutado con retrasos**
SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
RETIRO DE SOBRANTES	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
SUMINISTRO Y CONFORMACION ARENA DE PEÑA	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
PUNTO SIFÓN 4"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
Equipo Hidroneumático 1 hp 60 Litros Horizontal Horiz	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
VÁLVULA DE CORTE 1"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**
BRIDA 1"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Ejecutado con retrasos**

CHEQUE 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
TUBERIA PVC-P 1"	100.00%	66.89%	-33.11%	Ejecutado con retrasos
CODO PVC-P 1-1/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
TEE PVC-P 1-1/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
BUJE PVC-P 1-1/4" x 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
BUJE PVC-P 1-1/4" x 1/2"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
ADAPTADOR MACHO 1-1/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CODO PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TEE PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
UNIÓN PVC-P 1/2"	100.00%	50.00%	-50.00%	Ejecutado con retrasos
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100.00%	50.00%	-50.00%	Ejecutado con retrasos
PUNTO DUCHA 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**91.96%**	**49.36%**	**-42.60%**	**Ejecutado con retrasos**
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100.00%	64.12%	-35.88%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100.00%	57.50%	-42.50%	Ejecutado con retrasos
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100.00%	112.00%	12.00%	En ejecución
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Bajante apantallamiento 1/0 AWG Cu - 3/4" IMC	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra apantallamiento (sin soldadura, ni electrodo) incluye grapa de conexión bimetalica y curva IMC 3/4	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100.00%	62.50%	-37.50%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4".	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa.	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	37.83%	-62.17%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	100.00%	15.67%	-84.33%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100.00%	62.00%	-38.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100.00%	62.00%	-38.00%	Ejecutado con retrasos
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	100.00%	0.00%	-100.00%	Ejecutado con retrasos
TERMINACIÓN Y ENTREGA	**25.00%**	**25.00%**	**0.00%**	**Terminado**
ENTREGA PRIMERA FASE	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2,471,685,007.00	**Valor Inicial:**	$ 855,375,978.00
Valor Anticipo:	$ 535,395,600	**Valor Anticipo:**	$ 0.00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2,471,685,007	**Valor total actual del contrato**	$ 855,375,978.00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIALES
2. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME SEMANAL 41
3. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA
4. ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ
5. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 38

ACTIVIDADES DIARIAS

SABADO 26 de abril de 2025	TURNO DIURNO 07:00 AM a 12:00 M	1. Pañete de mamposteria exterior. 2. Instalación de 3 varrillas puesta a tierrra 2,4 mts 3. Instalacion de conductor 2/0 desnudo para sistema puesta a tierra (2mts). 4. Conexión con soldadura exotermica de conductor y varillas de cobre. 5. Excavación de terreno para tubería electrica 6. Instalación de tubería electrcia de 4" (6,4 mts) 7. Alistado de detalles en filos de puertas y ventanas
DOMINGO 27 de abril de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	*DIA NO LABORAL
LUNES 28 de abril de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Pañete de mampostería exterior 2. Excavacion y mejoramiento de terreno para continuar con armado de acero en rampa 3. Alistado de detalles en filos de puertas y ventanas.
MARTES 29 de abril de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Organización de cables 2/0. 2. Excavación de canalización sujeta ión principal. 3. Instalación de tubería de 4" 6.60 mts en torre de control. 4. Pañete de mampostería exterior. 5. Solado para la continuación muro de contención. 6. Alistado de detalles en filos de puertas y ventanas

MIERCOLES 30 de abril de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Pañete de muro de contención y rampa 2. Excavación de canalización en subestación principal 3. Reparacion de tapas y marcos de cajas de paso electrica 4. Nivelacion de terreno al rededor de la subestación 5. Reparacion - compactacion de excavaciones de canalización en los bomberos 6. Instalación de 4 curvas y 6.60 mts de tubos de 4" en subestación principal
JUEVES 1 de mayo de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 12:00 AM	*DIA NO LABORAL
VIERNES 2 de mayo de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Reparacion de tapas y marcos de cajas de paso electrica 2. Nivelacion de terreno al rededor de la subestación 3. Aplicación de base en area interna 4. Levante de mamposteria para antepecho en loza superior

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Sabado 26/04/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la cahrla d segrudiad tema tratado"Proteccion del cuerpo con el cemento"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de instalacion del sistema puesta a tierra.
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de pañete sobre mampostería parte exterior.
• Se realiza socializacion de programacion de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Domingo 27/04/2025
•Dia No laboral

Lunes 28/04/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la cahrla d segrudiad tema tratado"Dia mundial de la seguridad y salus en el trabajo"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Pañete de mampostería exterior
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Excavacion y mejoramiento de terreno para continuar con armado de acero en rampa.
• Se realiza socializacion de programacion de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Martes 29/04/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Excavación de canalización subestación principal.
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividades de Solado para la continuación muro de contención
• Se realiza socializacion de programacion de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Miercoles 30/04/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado "La importancia del sentido de pertenencia en el ámbito laboral"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Pañete de muro de contención y rampa
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Excavación de canalización en subestación principal
• Se realiza socialización de programación de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

Jueves 01/05/2025
• Dia no laboral

Viernes 02/05/2025
• Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Día del trabajador"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Reparación de tapas y marcos de cajas de paso eléctrica
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de Nivelación de terreno alrededor de la subestación
• Se realiza socialización de programación de vuelo
• Revisión documental de AST y herramientas
• Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1. Educación Ambiental	**EA - 1 Educación Ambiental**	Durante la semana, la profesional ambiental del contratista ejecutó una jornada de capacitación dirigida al personal operativo, enfocada en la correcta segregación y disposición de los residuos sólidos en el punto ecológico. En el desarrollo de la actividad se socializó el contenido normativo de la Resolución 2184 de 2019, particularmente lo relacionado con la adecuada clasificación de los residuos en cada contenedor. Al finalizar, a traves de un ejercicio practico, el personal aplicó los conocimientos adquiridos durante la capacitación.
2. Disposición Adecuada de Residuos Solidos Generados en Obra.	**PGR - 1 Gestión Integral de Residuos Solidos Convencionales y Residuos Liquidos**	El 30 de abril de 2025 se realizó la segregación, el pesaje y la disposición de los residuos sólidos convencionales generados en la obra. Se dispuso un total de 6,5 kg de residuos, de los cuales 4,54 kg corresponden a residuos aprovechables, 0,82 kg a residuos orgánicos aprovechables y 1,14 kg a residuos no aprovechables. En cuanto a los residuos líquidos, durante la semana se realizaron las gestiones para la renovación del permiso de ingreso del vehículo y su conductor. Se espera que la proxima semana, se realice la disposición de estos residuos.
3. Manejo de actividades de construcción y adecuación - MACA- 1. Pañete de mampostería exterior 2. Excavacion y mejoramiento de terreno para continuar con armado de acero en rampa 3. Alistado de detalles en filos de puertas y ventanas. 4. Organización de cables 2/0. 5. Instalación de tubería de 4" 6.60 mts en torre de control. 6. Solado para la continuación muro de contención. 7. Pañete de muro de contención y rampa 8. Excavación de canalización en subestación principal 9. Reparacion de tapas y marcos de cajas de paso electrica 10. Nivelacion de terreno al rededor de la subestación 11. Reparacion - compactacion de excavaciones de canalización en los bomberos 12. Instalación de 4 curvas y 6.60 mts de tubos de 4" en subestación principal 13. Aplicación de base en area interna 14. Levante de mamposteria para antepecho en loza superior	**MACA #3 - Manejo de Cortes, rellenos y Zodmes (Movimentos de tierra).**	Durante la semana se llevaron a cabo las siguientes actividades de excavación: - Excavación para finalizar la construcción de la rampa. - Excavación para canalización en la subestación principal. - Excavación para reparación de tapas y marcos de cajas de paso electrica. - Excavación para nivelación de terreno al rededor de la nueva subestación. El material excavado para la reparación de las cajas de paso y para la canalización en la subestación principal, fue dispuesto a un costado y reutilizado para relleno de las mismas, mientras que el resultante de la finalización de la rampa y la nivelación del terreno alrededor de la subestación fue dispuesto en un area paralela a la subestación para adecuación del terreno.
	MACA #4 - Manejo de Materiales de construcción.	- Los materiales que permanecen en el frente de obra se encuentran cubiertos y demarcados. - No se presentaron derrames de concreto. - No se realizó lavado de maquinaria en el frente de obra, ni de la mezcladora, esta fue ubicada sobre un plástico resistente para garantizar el aislamiento del suelo. - La mezcla y las estructuras se realizan en aislamiento del suelo.
	MACA #5 - Manejo de aguas lluvias y drenajes naturales durante la construcción	Respecto al manejo de las aguas lluvias, no se presentan represamientos en los alrededores de la nueva subestación. Se destaca que para no afectar los canales de drenaje, se realizó una gestón adecuada del material resultante de las excavasiones. Ademas los materiales que permancen en el frente de obra, como la arena, grava y material de recebo, se encuentran debidamente cubiertos, evitando el arrastre de material térreo hacia los canales de aguas lluvias de plataforma.
	MACA #6 - Control de la contaminación en la construcción.	-Durante la semana se llevó a cabo una jornada de aseo en el frente de obra, en la cual se realizaron labores de limpieza general, adecuación del centro de acopio y nivelación del terreno. Estas actividades contribuyen a mantener el orden y la seguridad en la zona de trabajo. - El frente de obra cuenta con contenedores para la clasificación de residuos, de acuerdo con la nueva codificación de colores establecida al interior de la resolución 2184 de 2019. - Se cuenta con una unidad sanitaria, la cual se encuentra a la espera del respectivo mantenimiento.

	MACA #7 - Señalización de las areas de construcción	Los sitios con alto potencial de riesgo y que pueden provocar algun tipo de accidente permanecen debidamente señalizados, estos incluyen puntas expuestas, excavaciones, entre otros. Las areas se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas con cinta de peligro.
4. Acciones desarrolladas por la interventoria Ambiental	**Inspección y seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental**	En el marco de las funciones de interventoría ambiental, se realizaron inspecciones técnicas diarias en el frente de obra, con el propósito de verificar la implementación de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto y hacer seguimiento a las actividades de gestión ambiental. El sábado 26 de abril se realizó una charla dirigida al personal de obra sobre el Plan de Manejo Ambiental del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, destacando las fichas de manejo establecidas y las medidas obligatorias que deben aplicarse durante las actividades constructivas. Se realizó acompañamiento durante el ingreso de nuevo personal al frente de trabajo, brindando una inducción sobre las medidas de manejo ambiental aplicables durante el desarrollo de las labores. Se realizó especial énfasis en la correcta gestión de los residuos, tanto convencionales como peligrosos. Destacando estos últimos, ya que, por su actividad, se generarán este tipo de desechos, los cuales requieren un manejo especial.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


Durante la semana del 26 de abril al 2 de mayo de 2025, se realizaron trabajos de pañete en mampostería exterior, muros de contención y rampas, junto con el alistado de detalles en puertas y ventanas. En instalaciones eléctricas, se colocaron varillas y conductores de puesta a tierra con soldadura exotérmica, se excavaron zanjas y se instaló tubería de 4" en la torre de control y subestación principal, además de repararse tapas y marcos de cajas eléctricas. En preparación de terreno, se ejecutaron excavaciones, nivelaciones y compactaciones para la rampa, subestación y zona de bomberos, así como el solado para el muro de contención. También se avanzó en la base para estucado interno y el levantamiento de mampostería para el antepecho de la losa superior. El domingo 27 y el jueves 1 de mayo fueron días de descanso por ser fin de semana y festivo, respectivamente.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este perdido no se reporta el ingreso del vehículo	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Apisonador tipo canguro:** 1 **Mezcladora de concreto:** 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6 Rotomartillo: 1
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas


PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	20
Total Personal	26

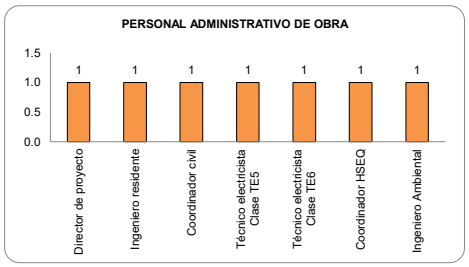



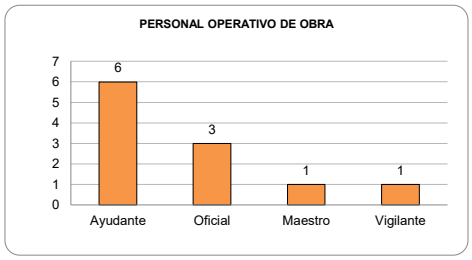

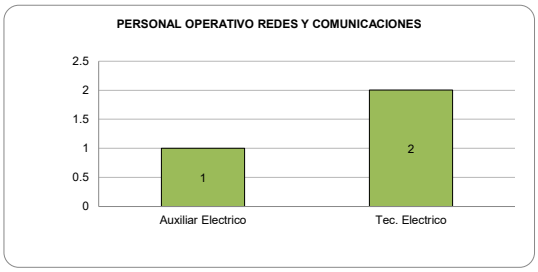

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CS. UAAC-INT-518-054-2025 Informe semanal 41 interventoria

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72,340,149.00
2	del 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025	$ 234,646,711.00
3	del 1 febrero+A232 al 25 marzo de 2025	$ 280,038,868.00
Total Acumulado	**$ 587,025,728.00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 587,025,728.00
% Avance facturado Acumulado
23.75%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27,115,133.00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11,466,118.00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11,466,118.00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11,466,118.00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27,984,159.00
6	del 17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025	$ 11,466,118.00
7	del 17 de enero al 16 de febrero de 2025	$ 64,966,531.00
8	del 17 de febrero al 16 de marzo de 2025	$ 11,466,118.00
9	del 17 de marzo al 16 de abril de 2025	$ 75,339,635.00
Total Acumulado	**$ 252,736,048.00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855,375,978.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 252,736,048.00
% Avance facturado Acumulado
29.55%

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Seguiminto SST durante las actividades en altura



Acompañamiento durante la charla de seguridad y Ambiental.





Actividad sobre la disposición adecuada de los residuos solidos. / Disposición adecuada de residuos en el centro de acopio.





Reutilización de material de excavación para relleno. / Disposición de material en area pararela al frente de obra para nivelación del terreno.





Material cubierto para control de la contaminación y evitar arrastre de material terreo.





Jornada de aseo al frente de obra.



Acompañamiento ambiental durante ingreeso de personal.







Areas intervenidas debidamente señalizadas.




Instalación de tuberia eléctrica hacia torre de control






Instalación refuerzo de sistema puesta a tierra en subestaicon principal




Excavación y solado para la continuacion de muro de contención




Detalles de filos en puertas y ventanas





Instalación de canalización eléctrica en torre de control y obras civiles para canalización eléctrica en s/e principal





Inicio de labores de reparacion de hundimientos y grietas en cajas de paso electrica



Inicio de actividades para obra blanca - aplicación de base

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Durante la semana, se avanzó en actividades como pañete de mampostería, instalaciones eléctricas (puesta a tierra, tuberías), excavaciones y nivelaciones, así como reparaciones en cajas de paso y preparación de áreas para estucado. Sin embargo, entre el martes 29 de abril y el viernes 2 de mayo, se presentaron retrasos significativos debido a restricciones en el ingreso de materiales impuestas por la concesión tras un incidente de seguridad, lo que obligó a que todo el material ingresara en un vehículo autorizado. Adicionalmente, la ausencia de la gerente María Prada (Aeronáutica) dificultó la gestión de permisos, retrasando la entrada de insumos clave como varillas, cemento, bloques y estuco por cuatro días. Finalmente, el viernes 2 de mayo, la entidad autorizó el ingreso de materiales, permitiendo retomar los trabajos. Aunque se cumplieron labores en distintas áreas, los retrasos logísticos afectaron la continuidad de la obra, generando un impacto de aproximadamente 4 días sin avances críticos por falta de materiales.	ING. OMAR TRIGOS LACERA
