EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		Código: GP-F101 Versión: 4 Fecha: 31/07/2018

INFORMACION CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

INFORMACION CONTRATO DERIVADO

CONTRATO Nº: EPC-PDA-O-500-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29/09/2023
OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR, LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CLASE DEL CONTRATO: OBRA **DEPENDENCIA:** DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS ESPECIALES
MUNICIPIO: N/A **PROVINCIA:** N/A
CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.
CONTRATISTA: PARQUE DE MAQUINARIA S.A.S NIT:830.065.444-7
REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PATRICIA MARIN MUÑOZ
DATOS DE CONTACTO: 6013688777
SUPERVISOR: MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ
DATOS DE CONTACTO: mayra.solano@epc.com.co **FECHA DE DESIGNACIÓN:** 21/5/2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EPC-PDA-I-501-2023
INTERVENTOR: CONSORCIO JUNIN NIT : 901.766.139-0
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON
DATOS DE CONTACTO: 3214517250
PLAZO DEL CONTRATO: NUEVE (9) **MESES** **DÍAS**
FECHA DE INICIO: 27/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 26/8/2024
OR INICIAL: $ 3.045.916.515,00
RCENTAJE DEL ANTICIPO: N/A
VALOR DEL ANTICIPO: N/A

MODIFICACIONES AL CONTRATO

OTROSI /MODIFICATORIO	MOTIVO	FECHA
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO

PRORROGA SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	FECHA DE REINICIO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO

ADICION Nº	FECHA	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

AZO FINAL DEL CONTRATO: NUEVE (9) **MESES** **DIAS**
HA FINAL DEL CONTRATO: 26 DE AGOSTO DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 3.045.916.515,00

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO

MODIFICACION SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION
				DESDE	HASTA		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	2/11/2023	2/8/2024	$ 348.000.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	AMPARO BASICO PREDIOS LABORES	27/11/2023	27/8/2024	$ 348.000.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/11/2023	2/12/2024	$ 609.183.303,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	2/11/2023	2/8/2027	$ 152.295.826,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	$ 913.774.955,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	27/12/2024	$ 609.183.303,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	27/11/2023	27/8/2027	$ 152.295.826,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	$ 913.774.955,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	SERIEDAD DE LA OFERTA	18/9/2023	18/1/2024	$ 304.591.651,50	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101194394	SERIEDAD DE LA OFERTA	29/9/2023	10/2/2024	$ 29.558.422,00	5/12/2023

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

CONCEPTO	PERIODO DE	PERIODO A	VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	27/11/2023	4/12/2023	$ 80.116.687,24	$ -	$ 80.116.687,24	$ 2.965.799.827,76	29/2/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.2	5/2/2024	12/2/2024	$ 135.966.215,36	$ -	$ 135.966.215,36	$ 2.829.833.612,40	1/3/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	13/2/2024	2/5/2024	$ 183.623.721,87	$ -	$ 183.623.721,87	$ 2.646.209.890,54	31/5/2024

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO/CONVENIO Nº: EPC-PDA-501-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 3/11/2023
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CLASE DEL CONTRATO: INTERVENTORIA **DEPENDENCIA:** DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS ESPECIALES
MUNICIPIO: N/A **PROVINCIA:** N/A
CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.
CONTRATISTA: CONSORCIO JUNIN NIT 901.766.139-0
REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHÓN
DATOS DE CONTACTO: 3214517250
SUPERVISOR: MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ
DATOS DE CONTACTO: mayra.solano@epc.com.co **FECHA DE DESIGNACIÓN:** 21/5/2024
PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) **MESES** **DÍAS**
FECHA DE INICIO: 27/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 26/9/2024
VALOR INICIAL: $ 295.584.219,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO: N/A
VALOR DEL ANTICIPO: N/A

MODIFICACIONES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OTROSI /MODIFICATORIO	MOTIVO	FECHA
N/A	N/A	

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PRORROGA SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	FECHA DE REINICIO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ADICION Nº	FECHA	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
			$ 0,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: DIEZ (10) **MESES** **DIAS**
FECHA FINAL DEL CONTRATO: 26/9/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 295.584.219,00

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MODIFICACION SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACION
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/11/2023	2/1/2025	$ 29.558.421,90	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	2/11/2023	2/9/2027	$ 29.558.421,90	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	CALIDAD DEL SERVICIO	2/9/2024	2/9/2029	$ 88.675.265,70	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	27/1/2025	$ 29.558.421,90	11/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	27/11/2023	27/9/2027	$ 29.558.421,90	11/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	CALIDAD DEL SERVICIO	27/9/2024	27/9/2029	$ 88.675.265,70	11/12/2023

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DE	A					
ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	27/11/2023	12/2/2024	$ 20.956.921,13	$ -	$ 20.956.921,13	$ 274.627.297,67	6/3/2024

PROGRAMACION

MES Nº: 6 **FECHA DE CORTE:** 31/5/2024

ESTADO DEL CONTRATO (POR INICIAR/EN EJECUCION/SUSPENDIDO/TERMINADO/LIQUIDADO): EJECUCIÓN

PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	% PROGRAMACIÓN APROBADA	PLAZO DE OBRA (MESES)	TIEMPO TRANSCURRIDO (MESES)	ATRASO
$ 3.045.916.515,00	$ 493.609.835,55	16,21%	16,21%	9	6	0,00%

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FRENTE	OBRAS EJECUTADAS
Tabio	Atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Tabio
El Colegio	Visita tecnica al municipio de El Colegio
Puli	Obra Puli-tanque de almacenamiento sellantes de fisuras (paredes internas y piso del tanque, instalacion de membrana en pvc, pintura epóxica (paredes externas y techo del tanque)
Cachipay	Obra de rehabilitación red de alcantarillado municipio de Cachipay-casa de la cultura
Zipacon	Atención con equipos de succión presión en el municipio de Zipacon
Manta	Atención con equipos de succión presión en el municipio de Manta
Subachoque	Atención con equipos de succión presión en el municipio de Subachoque
Guacheta	Atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Guacheta
Tausa	Atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Tausa
Susa	Atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Susa
San Juan De Rio Seco	Visita tecnica contratista e interventoria al municipio de San Juan de Rio Seco
Tabio	Visita tecnica por parte de ingeniero al municipio de Tabio
Cachipay	Obra de rehabilitación red de alcantarillado municipio de Cachipay-camino real
Subachoque	Atención con equipos de succión presión en el municipio de Subachoque
Pulí	Visita tecnica por parte de ingeniero al municipio de Puli
Viotá	Visita tecnica por parte de ingeniero al municipio de Viotá

OBSERVACIONES IMPORTANTES


FRENTE	OBSERVACIONES
Interventoria de Obra	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se realizo visita tecnica en el municipio de El Colegio para atender y verificar emergencia presentada en la bocatoma Santa Martha 1, asi como la terminación de la obra en el municipio de pulí con la impermeabilización del tanque de almacenamiento en la PATP.
Interventoria de Obra	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación.
Interventoria de Obra	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación de equipos. Se recomienda al contratista para la atención de las emergencias una mayor rapidez en la entregade las propuestas y subsanaciones con el fin de poder dar aprobación por parte de la interventoria.
Interventoria de Obra	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas. Asi como la pronta entrega a las propuestas de atención de las emergencias presentadas en los municipios
Interventoria de Obra	Se requiere el mantenimiento oportuno del equipo Vactor y/o carrotanque, evitando así retrasos en la ejecución de la programación, importante la comunicación constante con el personal por parte del contratista. Basado en los temas revisados en las actas de comité, es importante la entrega oportuna de los compromisos en las obras de emergencia de los municipios de La Vega, Cachipay, El Colegio y Pulí con el fin de lograr avanzar y ejecutar estas obras de emergencia.

RELACION DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA SUPERVISION DURANTE EL PERIODO


FECHA	CONSECUTIVO No.	ASUNTO	DESTINATARIO
2/05/2024		Cuenta de cobro N° 3	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
6/05/2024		Emergencia sanitaria Solicitud de apoyo institucional para servicio de camión con sistema de succión presión Municipio de Manta	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
8/05/2024	2024-04-0040	Sollicitud de apoyo a emergencias presentadas en el municipio de Sasaima en temas de acueducto y alcaltarillado Municipio Sasiama	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
21/05/2024		Aprobación propuesta La vega	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
24/05/2024		Programación obra La Vega	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín

24/05/2024		Solicitud visita Viotá	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
27/05/2024		Solicitud visita emerfencia pulí	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
27/05/2024		Solicitud cambio director de interventoría	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
27/05/2024		Informe de interventoria N° 6	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
27/05/2024		Acta de cómite de obra	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
28/05/2024		Cambio de director de interventoría	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
29/05/2024	Oficio	Respuesta a comunicación JUNÍN 24-05-24-033 de fecha 27 de mayo de 2024 - Solicitud cambio Director de Interventoría	Fabian Andres Vallejo epc.emergencias@gmail.com
29/05/2024		Sollicitud prestamo vehiculo vactor Municipio de Tena	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
30/05/2024		Respuesta a comunicación JUNÍN 24-05-24-033 de fecha 27 de mayo de 2024 - Solicitud cambio Director de Interventoría	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
31/05/2024		Programación visita Sasaima	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
31/05/2024		APU Motobomba JENAGUAS	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín

REGISTRO FOTOGRAFICO

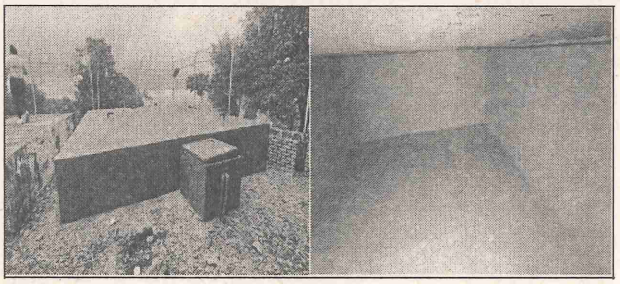

Fotografía Nº 1 PULÍ

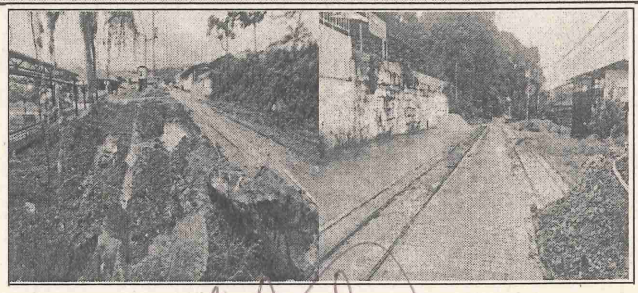

Fotografía Nº 2 CACHIPAY

Elaboró:

NELSON LEONARDO SANTIAGO URREGO

NOHORA VIVIANA MARTINEZ RODRIGUEZ

Revisó:

MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ
