	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN A CONVENIOS E INTERVENTORIAS	Código: GP-F101 Versión: 5 Fecha: 04/06/2024

INFORMACIÓN CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: N/A
OBJETO: N/A
MUNICIPIO: N/A **PROVINCIA:** N/A
CONTRATANTE: N/A
PROFESIONAL DE APOYO DE SUPERVISIÓN DELEGADO: N/A
DATOS DE CONTACTO: N/A **FECHA DE DESIGNACIÓN:** N/A

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

RAZÓN SOCIAL: N/A
REPRESENTANTE LEGAL: N/A
DATOS DE CONTACTO:
PLAZO DEL CONVENIO: N/A **MESES** **DÍAS**
FECHA DE INICIO: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: N/A
VALOR INICIAL: N/A

MODIFICACIONES AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

OTROSÍ /MODIFICATORIO	MOTIVO	FECHA
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

PRORROGA Y/O SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRORROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRORROGA	FECHA DE REINICIO (CUANDO APLIQUE)	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

ADICIÓN Nº	FECHA	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: N/A **MESES** **DÍAS**
FECHA FINAL DEL CONTRATO: N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO: N/A

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

MODIFICACIÓN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
				DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

COMPONENTE	FUENTES DE FINANCIACIÓN					SOPORTES				
	1. PA FIA - REGALIAS DEPARTAMENTO	2. PA FIA- SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO	3.	4.	5.	CDP	RP	CDR	CERTIFICADO DE AFECTACIÓN PARCIAL DE CDR	OTROS: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PDEICOMISO EPC PARA PROYECTOS PAR-PDA
SUMINISTRO DE AGUA A TRAVÉS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS (COMO LOS CARROTANQUES), CUANDO LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO AFECTADA O EL CAUDAL DE LA FUENTE LIMITAN O INTERRUMPEN EL ABASTECIMIENTO; Y PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PREVENIR O MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANT	$ 800.954.197,00							15455		
INVERSIONES QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO	$ 2.244.962.318,00							15067		
TOTALES	$ 3.045.916.515,00									

1592

INFORMACIÓN CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

CONTRATO Nº:	EPC-PDA-O-500-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/09/2023
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR, LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CLASE DEL CONTRATO:	**Obra Publica**
MUNICIPIO:	N/A **PROVINCIA:** N/A
CONTRATANTE:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P
SUPERVISOR:	MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ
DEPENDENCIA:	Direccion Operativa y de proyectos especiales
DATOS DE CONTACTO:	mayra.solano@epc.com.co **FECHA DE DESIGNACIÓN:** 21/5/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

CONTRATISTA:	PARQUE DE MAQUINARIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA PATRICIA MARIN MUÑOZ
DATOS DE CONTACTO:	6013688777
PLAZO DEL CONTRATO:	NUEVE (9) **MESES** 0 **DÍAS**
FECHA DE INICIO:	27/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26/08/2024
VALOR INICIAL:	$ 3.045.916.515,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO (Cuando aplique):	N/A
VALOR DEL ANTICIPO (Cuando aplique):	N/A

MODIFICACIONES AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

OTROSÍ /MODIFICATORIO	MOTIVO	FECHA
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

PRORROGA Y/O SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	FECHA DE REINICIO (CUANDO APLIQUE)	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

ADICIÓN Nº	FECHA	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	NUEVE (9) **MESES** 0 **DÍAS**
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	26/08/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 3.045.916.515,00

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

MODIFICACIÓN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
				DESDE	HASTA		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	2/11/2023	2/8/2024	$ 348.000.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	AMPARO BASICO PREDIOS LABORES	27/11/2023	27/8/2024	$ 348.000.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023

DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/11/2023	2/12/2024	$ 609.183.303,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	2/11/2023	2/8/2027	$ 152.295.826,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	$ 913.774.955,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	27/12/2024	$ 609.183.303,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	27/11/2023	27/8/2027	$ 152.295.826,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	$ 913.774.955,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834	SERIEDAD DE LA OFERTA	18/9/2023	18/1/2024	$ 304.591.651,50	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101194394	SERIEDAD DE LA OFERTA	29/9/2023	10/2/2024	$ 29.558.422,00	5/12/2023

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (cuando aplica)	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DESDE	HASTA					
ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	27/11/2023	4/12/2023	$ 80.116.687,24	$ -	$ 80.116.687,24	$ 2.965.799.827,76	29/2/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.2	5/2/2024	12/2/2024	$ 135.966.215,36	$ -	$ 135.966.215,36	$ 2.829.833.612,40	1/3/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	13/2/2024	2/5/2024	$ 183.623.721,87	$ -	$ 183.623.721,87	$ 2.646.209.890,54	31/5/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.4	30/4/2024	10/5/2024	$ 43.121.097,47	$ -	$ 43.121.097,47	$ 2.603.088.793,07	27/6/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.5	3/5/2024	4/6/2024	$ 55.110.710,89	$ -	$ 55.110.710,89	$ 2.548.078.092,18	27/6/2024

CURVA "S" AVANCE DE OBRA (Obra % Programado Acumulado VS Obra % Ejecutado Acumulado)



ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

FRENTE	OBRAS EJECUTADAS
Soacha	Atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Soacha
Sasaima	Visita tecnica por parte del contratista e interventoria al municipio de Sasaima objeto de la visita, alcantarillado y PTAP
San Antonio del Tequendama	Visita tecnica por parte del contratista e interventoria al municipio de san antonio del Tequendama Objeto de la visita PTAP del municipio
Cachipay	Obra de rehabilitación red de alcantarillado municipio de Cachipay-casa de la cultura
Cachipay	Obra de rehabilitación red de alcantarillado municipio de Cachipay-camino real
Tena	Atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Tena
Nariño	Suministro e instalación motobomba Nariño
Bojaca	Atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Bojacá
Facatativa	Prestación de servicio de vehículo carro tanque de 10 m3 en el municipio de Facatativa
Fomeque	Prestación de servicio de vehículo carro tanque de 10 m3 en el municipio de Fomeque

La Vega	Obra la Vega - Bocatoma
Tocaima	Visita tecnica por parte del contratista e interventoria al municipio de Tocaima vereda el portillo
Pulí	Visita tecnica de parte del contratista e interventoria respecto a colapso en red de alcantarillado municipal
Viotá	Visita tecnica de parte del contratista e interventoria respecto a colapso en red de acueducto del piñal junto a la hacienda el capote
Agua de Dios	Visita tecnica por parte del contratista e interventoria en el municipio de Agua de Dios

OBSERVACIONES IMPORTANTES DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

FRENTE	OBSERVACIONES
Interventoría de Obra Puli y Viota	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas .Asi como la pronta entrega a las propuestas de atención de las emergencias presentadas en los municipios. Se realiza visita técnica al municipio de Pulí y Viotá
Interventoría de Obra Sasaima y san Antonio del tequendama	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas. Asi como la pronta entrega a las propuestas de atención de las emergencias presentadas en los municipios. Se realizo visita a emergencia presentada en los municipios de Sasaima-alcantarillado y San Antonio del Tequendama-Refuerzo a la estructura de la PTAP
Interventoría de Obra Cachipay	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas. Asi como la pronta entrega a las propuestas de atención de las emergencias presentadas en los municipios. Se da por terminada la obra de cachipay sector camino real y casa de la cultura e instalación de la bomba sumergible en el municipio de Nariño Cundinamarca
Interventoría de Obra, La Vega	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas. Asi como la pronta entrega a las propuestas de atención de las emergencias presentadas en los municipios. Se da inicio a la obra en el municipio de La Vega luego de comité adelantado con el gerente de servicios públicos del municipio.
Interventoría de Obra Agua de Dios	Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas. Asi como la pronta entrega a las propuestas de atención de las emergencias presentadas en los municipios. Se evidencia un mejor avance en la bocatoma de la vega, y se realiza visita técnica en el municipio de Agua de Dios Cundinamarca para verificación de alcantarillado.
Interventoría de Obra	Se requiere el mantenimiento oportuno del equipo Vactor y/o carrotanque, evitando así retrasos en la ejecución de la programación, importante la comunicación constante con el personal por parte del contratista. Basado en los temas revisados en las actas de comité, es importante la entrega oportuna de los compromisos en las obras de emergencia y el inicio de obras en las fechas programadas.

INFORMACIÓN DE CONVENIO DE INTERVENTORÍA DE LA OBRA (CUANDO APLICA)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: N/A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: N/A

OBJETO: N/A

MUNICIPIO: N/A **PROVINCIA:** N/A

CONTRATANTE: N/A

PROFESIONAL DE APOYO DE SUPERVISIÓN DELEGADO DE EPC: N/A

DATOS DE CONTACTO: N/A **FECHA DE DESIGNACION:**

FECHA DE INICIO: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: N/A

VALOR INICIAL: N/A

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA DE OBRA

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO JUNIN NIT 901.766.139-0

REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHÓN

DATOS DE CONTACTO: 3214517250

PLAZO DEL CONVENIO: DIEZ (10) **MESES** 0 **DIAS**

CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.

PROFESIONAL DE APOYO DE SUPERVISIÓN DELEGADO DE EPC: MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ

DATOS DE CONTACTO: mayra.solano@epc.com.co **FECHA DE DESIGNACIÓN:** 21/05/2024

FECHA DE INICIO: 27/11/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 26/09/2024

VALOR INICIAL: $ 295.584.219,00

MODIFICACIONES AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

OTROSI /MODIFICATORIO	MOTIVO	FECHA

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

PRORROGA SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	FECHA DE REINICIO (CUANDO APLIQUE)	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

ADICIÓN Nº	FECHA	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	N/A	$ 0,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: Diez (10) **MESES** 0 **DIAS**
FECHA FINAL DEL CONTRATO: 26/09/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 295.584.219,00


ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

MODIFICACIÓN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
				DESDE	HASTA		
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/11/2023	2/1/2025	$ 29.558.421,90	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	2/11/2023	2/9/2027	$ 29.558.421,90	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	CALIDAD DEL SERVICIO	2/9/2024	2/9/2029	$ 88.675.265,70	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	27/1/2025	$ 29.558.421,90	11/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	27/11/2023	27/9/2027	$ 29.558.421,90	11/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182	CALIDAD DEL SERVICIO	27/9/2024	27/9/2029	$ 88.675.265,70	11/12/2023

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DESDE	HASTA					
ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	27/11/2023	12/2/2024	$ 20.956.921,13	$ -	$ 20.956.921,13	$ 274.627.297,87	6/3/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.2	13/2/2024	6/6/2024	$ 23.173.802,77	$ -	$ 23.173.802,77	$ 251.453.495,10	24/6/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	30/4/2024	10/5/2024	$ 4.197.295,91	$ -	$ 4.197.295,91	$ 247.256.199,19	24/6/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.4	5/6/2024	30/7/2024	$ 10.847.940,84	$ -	$ 10.847.940,84	$ 236.408.258,35	30/8/2024

AVANCE FINANCIERO AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

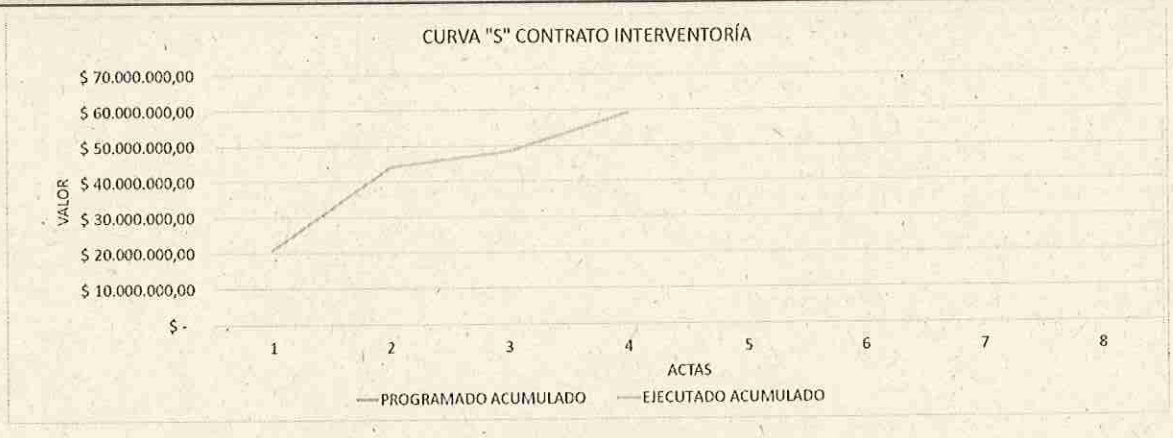

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

MES Nº: 7 **FECHA DE CORTE:** **DESDE:** 1/06/2024 **HASTA:** 30/06/2024

ESTADO DEL CONTRATO (POR INICIAR/EN EJECUCIÓN/SUSPENDIDO/TERMINADO/LIQUIDADO): EJECUCIÓN

PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	% PROGRAMACIÓN APROBADA	PLAZO DE OBRA (MESES)	TIEMPO TRANSCURRIDO (MESES)	ATRASO
$ 3.045.916.515	$ 662.733.579,16	21,76%	21,76%	9	7	0,00%

OBSERVACIONES IMPORTANTES

1596

OBSERVACIONES IMPORTANTES

FRENTE	OBSERVACIONES
Cachipay	se adelantan obras de rehabilitacion en el municipio de cachipay, proximas a entregas en casa de la cultura y camino real
Interventoria	se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos en la programacion. Se hace la solicitud por parte de la interventoria a dar inicio a las obras aprobadas. Asi como la pronta entrega a las propuestas de atencion de las emergencias presentadas en los municipios.
Interventoria	se realizo visita a emergencia presentada en los municpios de de Sasalma- alcantarillado y San Antonio del tequendama- refuerzo a la estrcutura de PTAP
La vega	se da inicio a la obra en el municiplo de la Vega posterior a comité con el gerente de servicios publicos de municipio
Agua de Dios	se realiza visita tecnica en el municiplo de agua de Dios por afectacion en red de alcantarillado

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PERIODO


FECHA	CONSECUTIVO No.	ASUNTO	DESTINATARIO
4/06/2024		APU motobomba Nariño	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
5/06/2024		Solicitud visita SAT	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
6/06/2024		Solicitud de carro de succión presión y la cámara de verificación Municipio de Quipile	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
11/06/2024		Cuenta de cobro N° 4	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
11/06/2024		Cuenta de cobro N° 5	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
11/06/2024		Solicitud prestamo vehiculo succión presión para limpieza redes sanitarias	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
12/06/2024		Solicitud información La Vega	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
12/06/2024		Comité Plan choque	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
13/06/2024		seguimiento comité de obras	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
14/06/2024	100-227-2024	Solicitud vactor Municipio de Tibacuy	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
14/06/2024		Acta cómite de obra	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
14/06/2024		Cuenta No 2 de interventoria EPC-PDA-I-501-2023	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
16/06/2024		cuenta No 4 de obra	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
17/06/2024		Solicitud apoyo emergencias Municipio de Fomeque	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
18/06/2024		Informe de interventoria No 6 y semanales correspondientes 22,23,24 y 25	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
19/06/2024		Acta cómite de obra	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
19/06/2024		conceptos de aprobacion de obras	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
19/06/2024		Solicitud de Apoyo Municipio de Facatativa	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
20/06/2024	2-1314	Solicitud de Vactor Municipio de Suesca	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
21/06/2024		Acta cómite de obra	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
21/06/2024		solicitud visita Tocalma	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
24/06/2024		Acta cómite de obra	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
24/06/2024		Conceptos de interventoria	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
25/06/2024	151-2024	Solicitud apoyo urgente para solución de recolección de residuos solidos Municipio de Útica	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
25/06/2024		Informe de interventoria No 6 y semanales correspondientes	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
25/06/2024	151-2024	Solicitud apoyo urgente para solución de recolección de residuos solidos Municipio de Útica	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
25/06/2024		Conceptos de interventoria	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
27/06/2024		Acta cómite de obra	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
27/06/2024		Solicitud visita Agua de Dios	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
27/06/2024		Informe mensual de intervetoría N° 7	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
28/06/2024		propuesta Sasalma - contencion del terreno	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
30/06/2024		Solicitud de apoyo con vactor por emergencia en alcantarillado Municipio de Tabio	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín

1599


INFORME SOCIAL MENSUAL

Informe Mensual Social formato SAC-F421	PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA	PROFESIONAL SOCIAL QUE APRUEBA POR PARTE DE EPC
	DESDE	HASTA:				
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


REGISTRO FOTOGRÁFICO

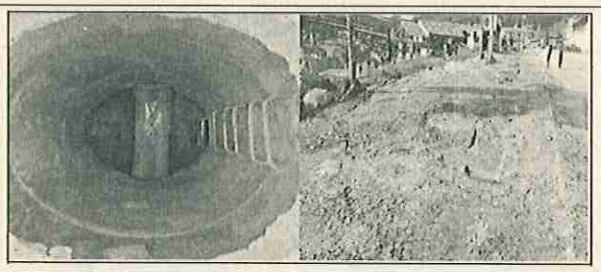


Fotografía No 1. Cachipay Casa de la Cultura

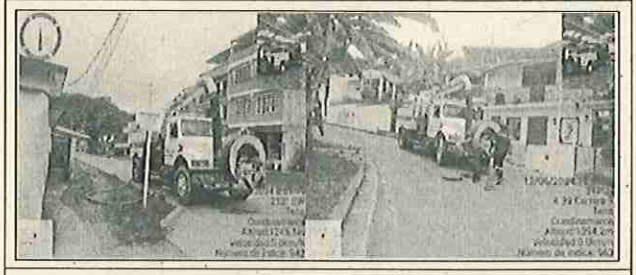

Fotografía No 2 atencion con vehiculos en Tena



Fotografía No 3 Visita municipio - Agua de dios



Fotografía No 4- Obra rehabilitacion municipio de la vega

FIRMA

NOMBRE NELSON LEONARDO SANTIAGO URREGO

Elaboró: Profesional de apoyo a la supervisión de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P

FIRMA

NOMBRE KAROL XIOMARA TORRES AGUDELO

Elaboró: Profesional de apoyo a la supervisión de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P.

FIRMA

NOMBRE DIEGO GABRIEL PULIDO ORTIZ

Elaboró: Profesional de apoyo a la supervisión de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P.

FIRMA

NOMBRE NOHORA VIVIANA MARTINEZ RODRIGUEZ

Revisó: COORDINADORA
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

FIRMA

NOMBRE : MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ

Aprobo: DIRECTORA OPERATIVA Y DE PROYECTOS ESPECIALES
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P
