

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1			**CONTRATO DE OBRA GGC-078-2024**	**67 días**	**lun 21/10/24**	**sáb 28/12/24**			**$ 311.753.900,22**
2			INICIO	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24		s;22FC+40 días;30FC+	$ 0,00
3		**1.0**	**COMPONENTE 1: BLOQUE ADMINISTRATIVO GENERAL**	**32 días**	**lun 25/11/24**	**vie 27/12/24**			**$ 7.681.128,20**
4		1.01	SE DEBE VERIFICAR LAS CONEXIONES DE LOS CIRCUITOS NORMALES Y LA CORRECTA IDENTIFICACION DE LOS CIRCUITOS. MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE CABLEADO Y CANALETAS	10 días	lun 25/11/24	jue 5/12/24	2FC+34 días	5	$ 448.019,70
5		1.02	INSTALACION DE PUNTOS NUEVOS REGULADOS TOMACORRIENTE DOBLE POLO EN TUBO EMT 1/2"	10 días	jue 5/12/24	sáb 14/12/24	4	8;7	$ 333.600,00
6		1.03	AIRE ACONDICIONADO LG 18.000 BTU TIPO SPLIT INVERTER DUALCOOL 220V BLANCO	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	8;7	42	$ 3.669.062,00
7		1.04	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	11 días	lun 16/12/24	jue 26/12/24	5	6;9	$ 1.355.659,10
8		1.05	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS . INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	7 días	lun 16/12/24	lun 23/12/24	5	6;10;9	$ 498.681,40
9		1.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE MILANO - 200 X 120 EN PVC SE CARACTERIZA POR SEPERADOR DE AMBIENTES O PARA DIVIDIR AREA INTERNA Y AREA DE ATENCION AL USUARIO	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	7;8	42	$ 296.722,00
10		1.07	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 CM LED DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO.	5 días	lun 23/12/24	vie 27/12/24	8	42	$ 1.079.384,00
11		2.0	AREA ADMINISTRATIVA	33 días	lun 25/11/24	sáb 28/12/24			$ 143.869.954,17
12		2.01	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS. INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	23 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	16	18FC-10 días	$ 23.327.102,35
13		2.02	APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA TECHOS . INCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	23 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	16	18FC-10 días	$ 7.654.247,90
14		2.03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR TIPO KORAZA.NCLUYE LIMPIEZA , RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS	23 días	jue 5/12/24	sáb 28/12/24	16	18FC-10 días	$ 89.484.654,00
15		2.04	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS .NCLUYE LIMPIEZA , LIJADO RASPADO, RESANES	5 días	mar 24/12/24	sáb 28/12/24	18		$ 542.674,50
16		2.05	DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES INCLUYE RECOGIDA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A SITIO ESCOBRERA CERTIFICADO	10 días	lun 25/11/24	jue 5/12/24	40	14;13;12;17	$ 895.849,42
17		2.06	INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑOS TIIPO REFERENCIA PARED CERÁMICA VERSILIA GRIS CARA DIFERENCIADA 25X35 CM A UNA ALTURA DE 2.12 METROS	10 días	jue 5/12/24	sáb 14/12/24	16		$ 6.022.380,67
18		2.07	DESBASTADA, RETAPADO,PULIDA, DESENMACHADA , DESENGRASADA Y BRILLADA DE PISO DE PISO EN GRANITO INVLUYE GUARDAESCOBAS	5 días	mié 18/12/24	mar 24/12/24	12FC-10 días;13FC-10 días;14FC-10 días	15	$ 13.873.356,90

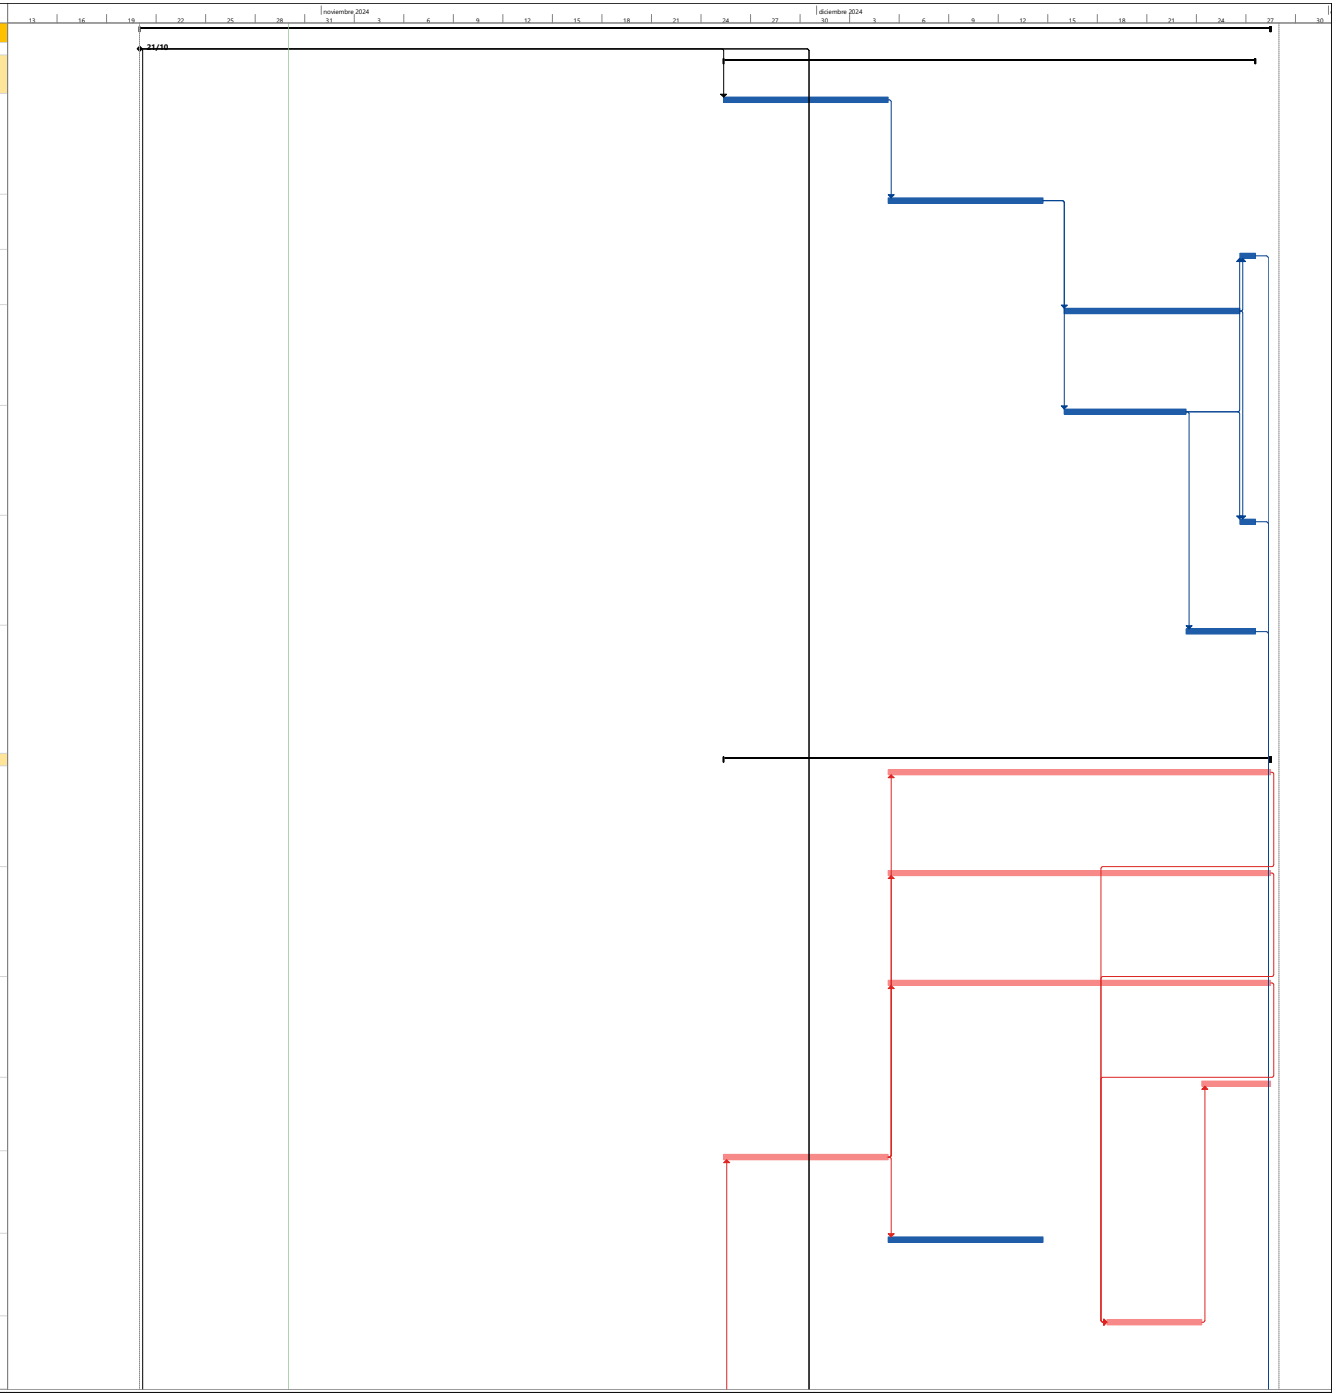

Proyecto: PROGRAMACION_IC
Fecha: mié 30/10/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
19		2.08	INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.05 DE ALTO X 1.20 DE ANCHO X 10mm DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONS DEL EXISTENTE EN ACCESO PRINCIPAL. CONSISTEMA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE AGARRE EN ACERO INOXIDABLE	2 días	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	41FF		$ 1.392.492,84
20		2.09	MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, DESCAPADO MECANICO REALIZADO CON PULIDORA O LIJA MANUAL Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PASIVADO POR FROTE INMERSION O ASPERSION	2 días	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	41FF		$ 677.195,59
21		**3.0**	**PSG**	**27 días**	**sáb 30/11/24**	**sáb 28/12/24**			**$ 6.193.112,00**
22		3.01	SE REQUIRE DESMONTAR MODULO DIVISORIO EN PSG Y RODARLO HACIA EL FRENTE PARA TENER MAS ESPACIO EN AREA DE TRABAJO. Y MONTAJE DE MISMO MODULO DIVISORIO EXISTENTE Y SE REQUIRE HACER ADECUACION E INSTALACION NUEVA PUERTA DE ACCESO	20 días	sáb 30/11/24	sáb 21/12/24	2FC+40 días	24	$ 887.296,00
23		3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA EN MARCHA AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	1 día	vie 27/12/24	sáb 28/12/24	26	42	$ 4.793.970,00
24		3.03	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SALIDA DE AGUAS NEGRAS Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE EN PSG PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS	4 días	sáb 21/12/24	mié 25/12/24	22	25	$ 102.648,00
25		3.04	CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DE DESCARGA Y SUMINISTRO DE MANGERA ACOPLE DE AGUA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA CON ACOPLES Y VALVULA REGULADORA Y MANGUERAS PARA LAVAMANOS.	1 día	mié 25/12/24	jue 26/12/24	24	26	$ 356.928,00
26		3.05	AJUSTE DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS PARA BAÑO EN PSG	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	25	23	$ 52.270,00
27		**4.0**	**NUEVO BAÑO DE GERENCIA SECCIONAL**	**27 días**	**sáb 30/11/24**	**sáb 28/12/24**			**$ 7.048.838,85**
28		4.01	INSTALACION DE MURO EN DRY WALL DOBLE CARA INCLUYE ESTRCTURAS OMEGAS Y TODOS SUS ACCESORIOS.	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24	34	29	$ 635.542,88
29		4.02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 SOBRE MURO Y TECHO EN DRY WALL	2 días	mié 25/12/24	jue 26/12/24	28	35;37;38	$ 298.580,25
30		4.03	DEMOLICIONES - CORTES PARA REDES SANITARIAS E HIDRAULICAS INCLUYE LIMPEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR CERTIFICADO.	12 días	sáb 30/11/24	vie 13/12/24	2FC+40 días	31;32;36;33	$ 258.209,60
31		4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERÍA DE 4" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 4" Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE	5 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	30	34	$ 1.865.997,36
32		4.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERÍA DE 2" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 2" Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE	5 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	30	34	$ 984.050,86
33		4.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HIDRAULICA EN TUBERÍA DE1 / 2" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 1/2"	5 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	30	34	$ 125.162,29
34		4.07	SUMINISTRO E INTALACION DE ENCHAPE PARA PARED CERÁMICO AVELLANO TABACO 30X60CM CAJA 1.62 M2	4 días	mié 18/12/24	lun 23/12/24	31;32;33;36	28	$ 1.663.092,61
35		4.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 CM LED DE 40 W 6500 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN. CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO.	2 días	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	29	42	$ 134.923,00

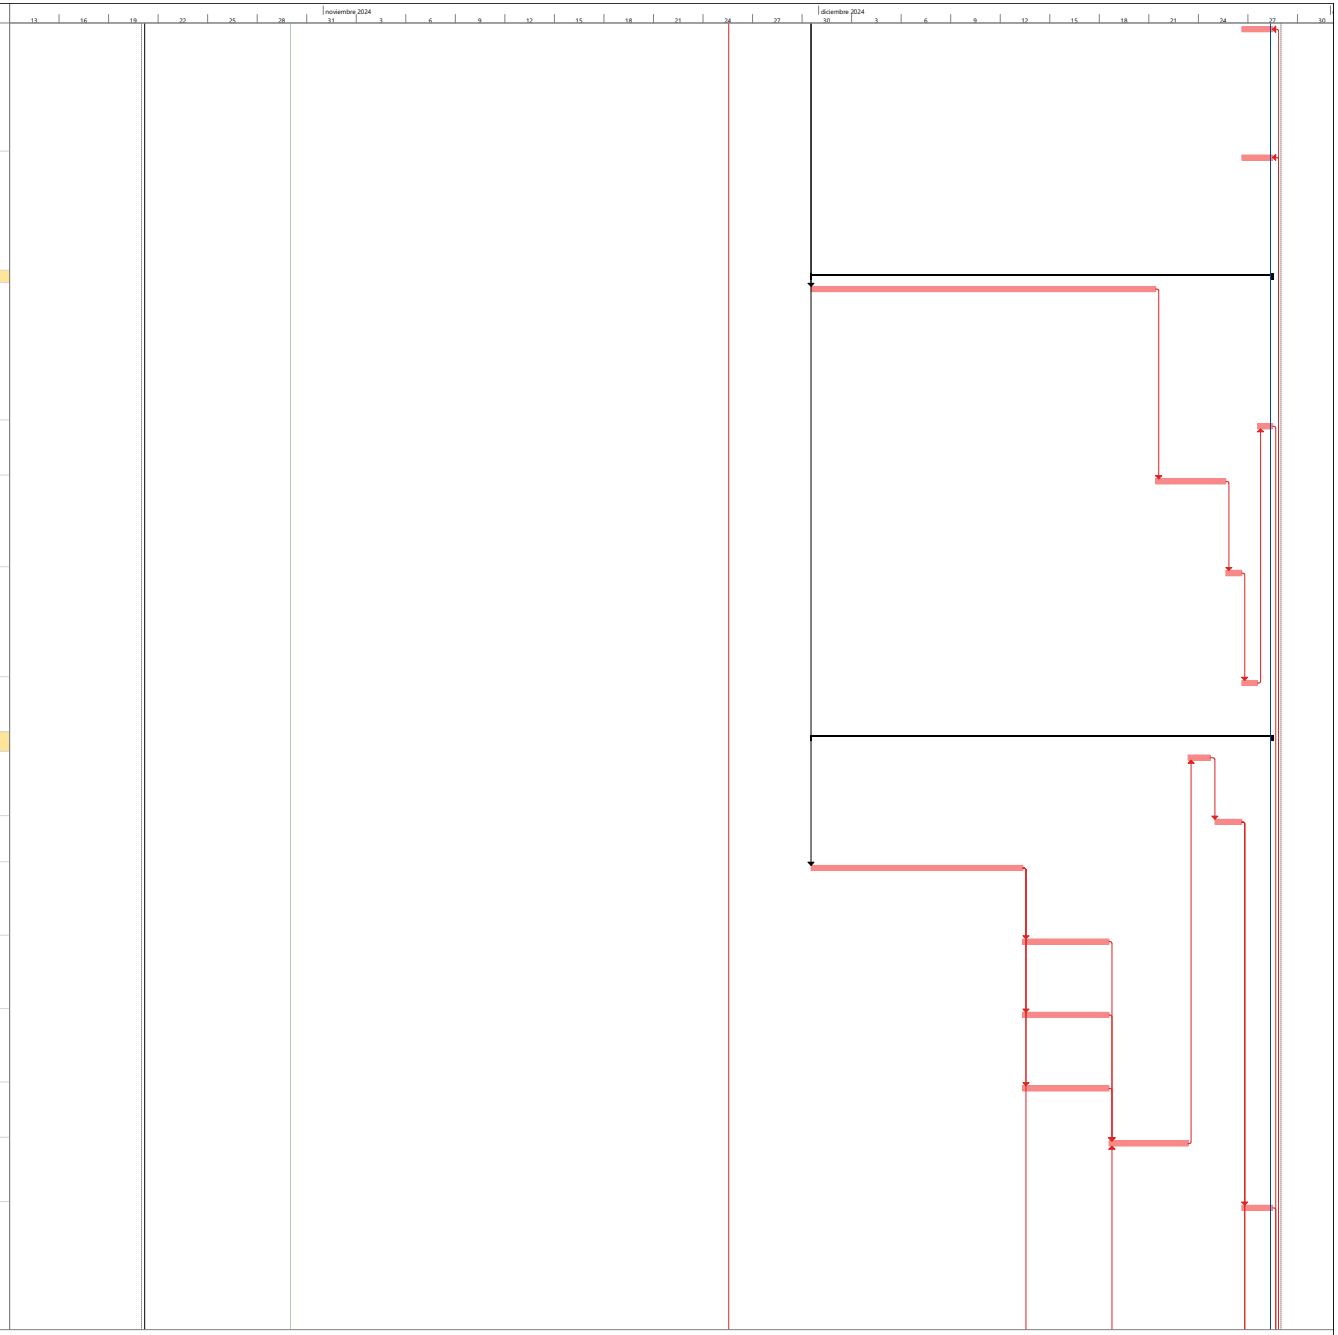

Proyecto: PROGRAMACION_IC
Fecha: mié 30/10/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	Modo de tarea	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
36		4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"", INCLUYE CIRCUITO MONOFÁSICO F:1X12+N:1X12+T:1X12 AWG THHN-THWN, EMPOTRADA EN MURO, INCLUYE UNIONES, TEMINALES, CODOS, BANDA NARANJA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	5 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24	30	34	$ 892.500,00
37		4.10	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO. INCLUYE CAJA RAWELL 5800, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD.	1 día	jue 26/12/24	vie 27/12/24	29	42	$ 94.953,00
38		4.11	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE SENCILLA CON POLO A TIERRA (TOMACORRIENTE, TIERRA AISLADA, TIPO LEGRAND O SIMILAR); CABLE COBRE 7 HILOS NO.12 AWG THHN/THWN 90°C 600V MARCADO LSZH. INCLUYE TOMACORRIENTE, CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN,DUCTOS	2 días	jue 26/12/24	sáb 28/12/24	29	42	$ 95.827,00
39			**5.0 INSTALACIONES ELECTRICAS**	**67 días**	**lun 21/10/24**	**sáb 28/12/24**			**$ 146.960.867,00**
40		5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 150KW TRIFÁSICA CABINADA, INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, TUBO DE DESFOGUE 5 MTS, CAPACITACIÓN Y TANQUE DE COMBUSTIBLE LLENO. INCLUYE CABLEADO DESDE LA PLANTA A LA TRANSFERENCIA Y DE LA RED A LA	34 días	lun 21/10/24	lun 25/11/24	2	42;16	$ 141.582.737,00
41		5.02	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES , SUMINISTRO E INSTALACION CAMBIO A LAMPARAS LED DE SOBREPONER 30 X 120 48 W CON MARCO PARA LAS OFCIINAS ADMINISTRATIVAS	10 días	mié 18/12/24	sáb 28/12/24	42FF	19FF;20FF	$ 5.378.130,00
42			FIN DEL CONTRATO	0 días	sáb 28/12/24	sáb 28/12/24	10;6;23;35;37;38;4	41FF	$ 0,00

