INFORME QUINCENAL No. 1

Contrato de obra No. GGC-078-2024

Objeto: "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD"

GGC-078-2024

INFORME QUINCENAL No. 1

PERIODO DE EJECUCIÓN

21 DE OCTUBRE DE 2024 – 04 DE NOVIEMBRE DE 2024

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-

ORIGINAL

1. INFORME QUINCENAL:

- **Fecha:** 04 de NOVIEMBRE 2024
- **No. de Informe:** 0001
- **Periodo:** 21 DE OCTUBRE DE 2024 – 04 DE NOVIEMBRE DE 2024

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:


- **Objeto del Proyecto:** “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD”

- **Supervisor:** Paula Alejandra Vargas Niño

- **Plazo Contrato:** tres (3) meses

- **Plazo Restante del Contrato:** 57 dias

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

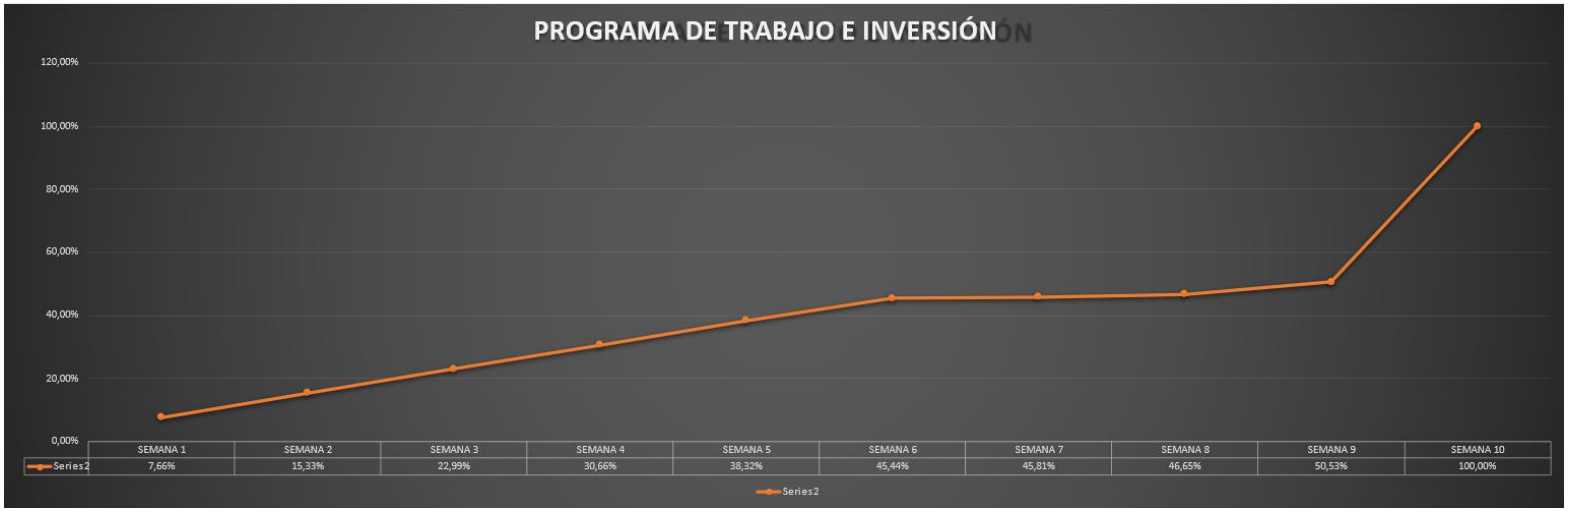

- **% Programado en la quincena:** 15,47%

- **Valor programado en la Quincena:** $ 48.226.619,79 (COSTO DIRECTO)

- **% Ejecutado en la quincena:** 36,42%

- **Valor Ejecutado en la Quincena:** $ 113.545.694,00 (COSTO DIRECTO)

- **% Ejecutado Acumulado:** 36,42%

- **Valor Ejecutado Acumulado:** $ 113.545.694,00 (COSTO DIRECTO)
- **% de Atraso o Adelanto:** + 20,95%
- **Valor del Atraso o Adelanto:** $ 65.319.074,21 (COSTO DIRECTO)

4. DATOS CONTRACTUALES:

- **Contratista:** WRUSSY INGENIEROS SAS
- **No. Contrato:** GGC-078-2024
- **Valor Inicial:** $395.771.577,00
- **Valor Actualizado:** $395.771.577,00
- **Fecha de Inicio:** 21 de octubre 2024
- **Fecha de Vencimiento:** 27 diciembre 2024
- **Prórrogas :**
    - Durante el periodo del informe no se tramitaron prórrogas del contrato.
- **Suspensiones:**
    - Durante el periodo del informe no se tramitaron suspensiones del contrato.

5. Actividades Realizadas en la quincena:

- Durante el periodo del informe se realizo el tramirte de la adquisicion y posterior transporte de la planta electrica

6. Resumen Ejecutivo del Contrato:

- Durante el periodo del informe, se llevó a cabo un diagnóstico detallado de los frentes a intervenir con el objetivo de establecer de manera precisa el alcance de las actividades a realizar en cada uno, con base a lo anterior se actualizaron los balances correspondientes, y se encuentran definiendo el resto de actividades con el fin de poder asegurar el control efectivo del proyecto y y cumplir con el objeto del mismo.

7. Personal y Equipo en Obra:

- **Personal a cargo:**
    - Residente de obra: Ing. Abner David Pérez Turizo
    - Ayudante de Obra: Alfredo de Jesús García
    - Ayudante de Obra: Eduardo Luis Cárdenas
    - Ayudante de Obra: Fredy Molinares
    - Ayudante de Obra: Iván Jesús Coronado
    - Ayudante de Obra: Jose Luis Jaraba
    - Ayudante de Obra: Juan Jose Perozo
    - Ayudante de Obra: Roque Arturo Cárdenas
    - Maestro de Obra: Alexander Enrique Vargas

- **Equipo utilizado:**
    - Durante el periodo del informe se uso equipo de computo para las actividades administrativas

8. Registro Fotográfico del Antes y el Después:

Ilustración 1. COMPRA PLANTA ELÉCTRICA



Ilustración 2. COMPRA PLANTA ELÉCTRICA



Ilustración 3. COMPRA PLANTA ELÉCTRICA



Ilustración 4. COMPRA PLANTA ELÉCTRICA



9. Gestión de los Trámites Contractuales:

- Durante el periodo del informe se adelanta parte administrativa para el corte de obra No.1.
- Se remitirron los documentos tecnicos iniciales para revision y aprobacion

Firma del Responsable:
Nombre: Ing. Abner David Pérez Turizo
Cargo:Residente de obra
Fecha: 04/11/2024
