# INFORME QUINCENAL No. 2

## Contrato de obra No. GGC-078-2024

**Objeto: "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD"**

**GGC-078-2024**

**INFORME QUINCENAL No. 2**

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

**05 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 19 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**VERSIÓN 1**

**VOLUMEN 1-**

**ORIGINAL**

## 1. INFORME QUINCENAL:

- **Fecha:** 19 de NOVIEMBRE 2024
- **No. de Informe:** 0002
- **Periodo:** 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 19 DE NOVIEMBRE DE 2024

## 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:


- **Objeto del Proyecto:** “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD”

- **Supervisor:** Paula Alejandra Vargas Niño

- **Plazo Contrato:** tres (3) meses

- **Plazo Restante del Contrato:** 57 dias

## 3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

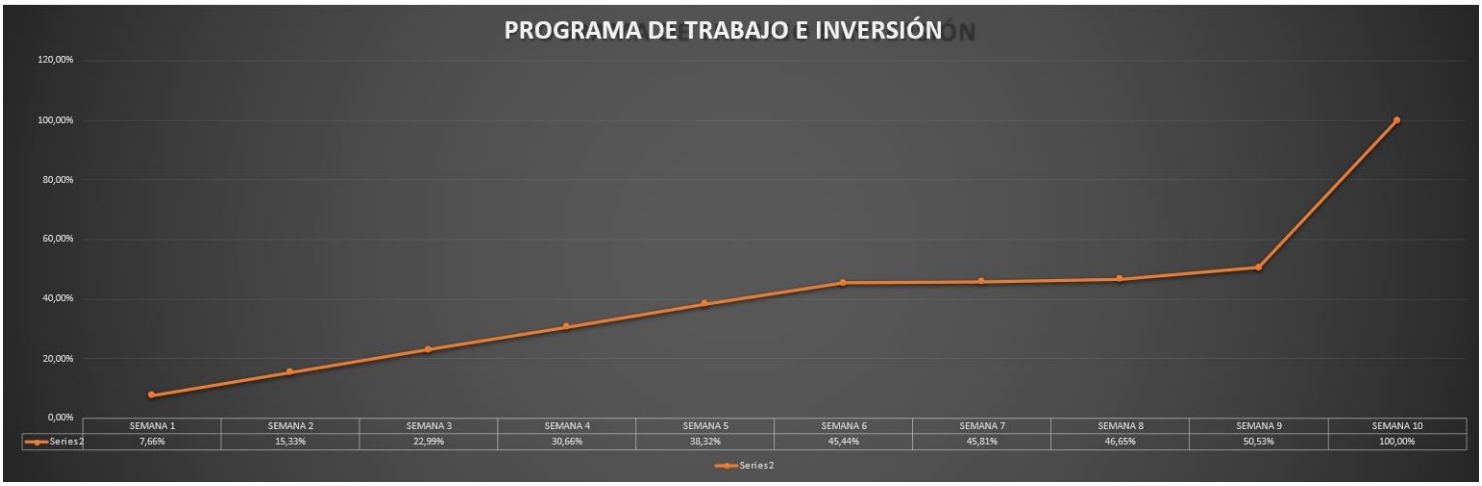


- **% Programado en la quincena:** 16,60%

- **Valor programado en la Quincena:** $ 51.766.188,22 (COSTO DIRECTO)

- **% Ejecutado en la quincena:** 0,22 %

- **Valor Ejecutado en la Quincena:** $ 687.620,00 (COSTO DIRECTO)

- **% programado Acumulado:** 33,21%

- **Valor programado Acumulado:** $ 103.532.376,43 (COSTO DIRECTO)
- **% Ejecutado Acumulado:** 36,64%
- **Valor Ejecutado Acumulado:** $ 114.233.314,00 (COSTO DIRECTO)
- **% de Atraso o Adelanto:** + 3,43%
- **Valor del Atraso o Adelanto:** $ 65.314.150,67 (COSTO DIRECTO)

## 4. DATOS CONTRACTUALES:

- **Contratista:** WRUSSY INGENIEROS SAS
- **No. Contrato:** GGC-078-2024
- **Valor Inicial:** $395.771.577,00
- **Valor Actualizado:** $395.771.577,00
- **Fecha de Inicio:** 21 de octubre 2024
- **Fecha de Vencimiento:** 27 diciembre 2024
- **Prórrogas :**
    - Durante el periodo del informe no se tramitaron prórrogas del contrato.
- **Suspensiones:**
    - Durante el periodo del informe no se tramitaron suspensiones del contrato.

## 5. Actividades Realizadas en la quincena:

- Durante el periodo del informe se realizo el tramirte llego a obra la planta electrica

## 6. Resumen Ejecutivo del Contrato:

- Durante el periodo del informe, se llevó a el transporte a obra de la planta electrica, inicio de actividades de pintura interior y escarificado e inicio de pintura exterior para fachada.

## 7. Personal y Equipo en Obra:

- **Personal a cargo:**
    - Residente de obra: Ing. Abner David Pérez Turizo
    - Ayudante de Obra: Alfredo de Jesús García
    - Ayudante de Obra: Eduardo Luis Cárdenas
    - Ayudante de Obra: Fredy Molinares
    - Ayudante de Obra: Iván Jesús Coronado
    - Ayudante de Obra: Jose Luis Jaraba
    - Ayudante de Obra: Juan Jose Perozo
    - Ayudante de Obra: Roque Arturo Cárdenas
    - Maestro de Obra: Alexander Enrique Vargas
- **Equipo utilizado:**
    - Durante el periodo del informe se uso equipo de computo para las actividades administrativas

## 8. Registro Fotográfico del Antes y el Después:

*Ilustración 1. LLEGADA PLANTA ELECTRICA*



*Ilustración 2. LLEGADA PLANTA ELECTRICA*



*ILUSTRACIÓN 3. INICIO ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR*



*ILUSTRACIÓN 4. INICIO ACTIVIADES DE PINTURA INTERIOR*

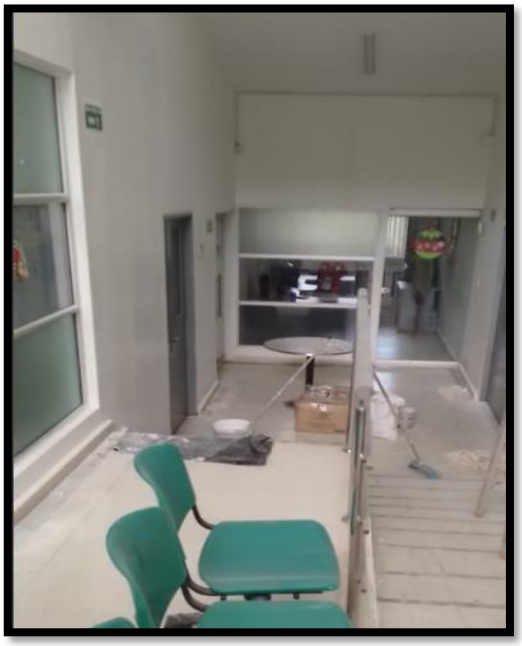


*ILUSTRACIÓN 5. INICIO PINTURA EXTERIOR*



*ILUSTRACIÓN 6. INICIO PINTURA EXTERIOR*



*Ilustración 7. escarificado de pintura exterior*

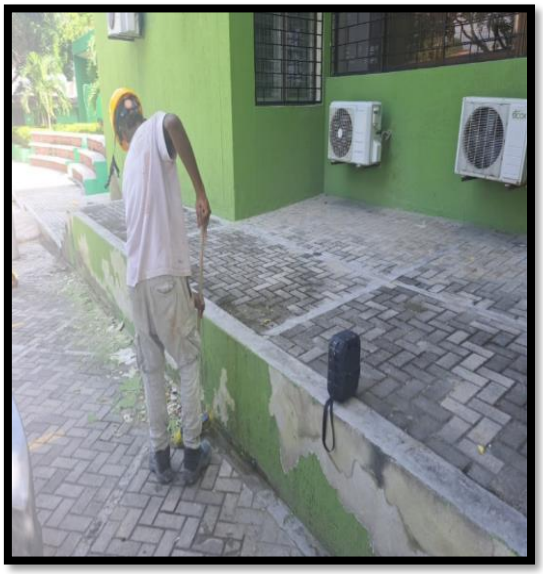


*Ilustración 8. ADECUACION CUARTO PARA PLANTA ELECTRICA*



## 9. Gestión de los Trámites Contractuales:

- Durante el periodo del informe se adelanta parte administrativa para el corte de obra No.1.
- Se remitieron los documentos tecnicos iniciales para revision y aprobacion
- Se encuentra en revision el informe quincenal No. 1

**Firma del Responsable:**
Nombre: Ing. Abner David Pérez Turizo
Cargo:Residente de obra
Fecha: 04/11/2024
