INFORME QUINCENAL No. 3

Contrato de obra No. GGC-078-2024

Objeto: "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD"

GGC-078-2024

INFORME QUINCENAL No. 3

PERIODO DE EJECUCIÓN

20 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 04 DE DICIEMBRE DE 2024

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-

ORIGINAL

1. INFORME QUINCENAL:

- **Fecha:** 04 de DICIEMBRE 2024
- **No. de Informe:** 0003
- **Periodo:** 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 – 04 DE DICIEMBRE DE 2024

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:


- **Objeto del Proyecto:** "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD"

- **Supervisor:** Paula Alejandra Vargas Niño

- **Plazo Contrato:** tres (3) meses

- **Plazo Restante del Contrato:** 25 dias

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

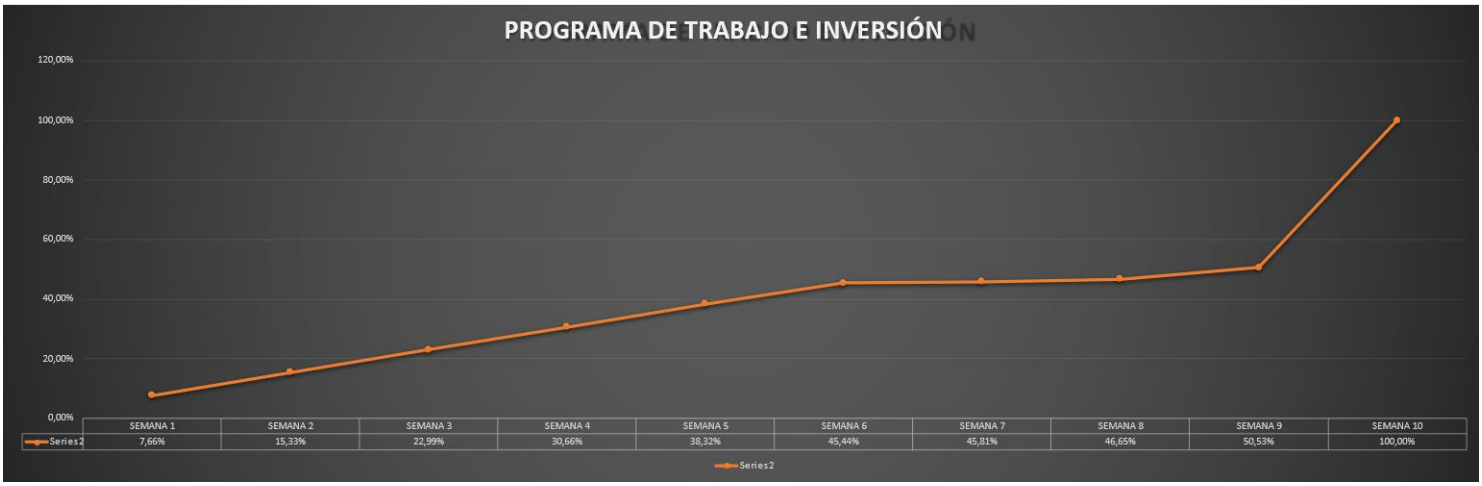

- **% Programado en la quincena:** 12,36%

- **Valor programado en la Quincena:** $ 38.539.188,39 (COSTO DIRECTO)

- **% Ejecutado en la quincena:** 28,36%

- **Valor Ejecutado en la Quincena:** $ 107.205.481,34 (COSTO DIRECTO)

- **% programado Acumulado:** 45,57%
- **Valor programado Acumulado:** $ 142.072.658,65 (COSTO DIRECTO)
-
- **% Ejecutado Acumulado:** 71,03%
- **Valor Ejecutado Acumulado:** $ 221.438.795,34 (COSTO DIRECTO)
- **% de Atraso o Adelanto:** + 25,46%
- **Valor del Atraso o Adelanto:** $ 79.372.543,00 (COSTO DIRECTO)

4. DATOS CONTRACTUALES:

- **Contratista:** WRUSSY INGENIEROS SAS
- **No. Contrato:** GGC-078-2024
- **Valor Inicial:** $395.771.577,00
- **Valor Actualizado:** $395.771.577,00
- **Fecha de Inicio:** 21 de octubre 2024
- **Fecha de Vencimiento:** 29 diciembre 2024
- **Prórrogas :**
    - Durante el periodo del informe no se tramitaron prórrogas del contrato.
- **Suspensiones:**
    - Durante el periodo del informe no se tramitaron suspensiones del contrato.

5. Actividades Realizadas en la quincena:

- Durante el periodo del informe se realizo la instalacion de la planta electrica del proiyecto, asi como actividades de pintura interior de pared y techo, pintura de fachada

6. Resumen Ejecutivo del Contrato:

- Durante el periodo del informe, se llevó a cabo la instalacion de la planta electrica del proyecto, asi como la continuacion de pintura interna de pared, techo y fachada

7. Personal y Equipo en Obra:

- **Personal a cargo:**
    - Residente de obra: Ing. Abner David Pérez Turizo
    - Ayudante de Obra: Alfredo de Jesús García
    - Ayudante de Obra: Eduardo Luis Cárdenas
    - Ayudante de Obra: Fredy Molinares
    - Ayudante de Obra: Iván Jesús Coronado
    - Ayudante de Obra: Jose Luis Jaraba
    - Ayudante de Obra: Juan Jose Perozo
    - Ayudante de Obra: Roque Arturo Cárdenas
    - Maestro de Obra: Alexander Enrique Vargas

- **Equipo utilizado:**
    - Durante el periodo del informe se urtilizaron herramientas de pintura (rodillos, espatura, boriochas, etc.)
    - Herramientas electricas para la instalacion de la planta electrica.

8. Registro Fotográfico del Antes y el Después:

Ilustración 1. PINTURA FACHADA EXTERIOR

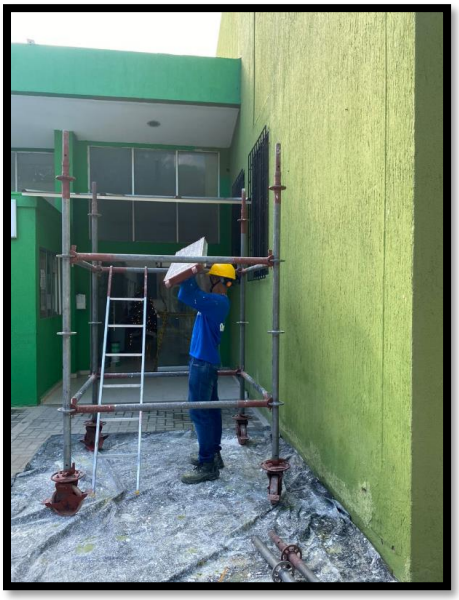


Ilustración 2. LLEGADA PLANTA ELECTRICA



ILUSTRACIÓN 3. ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR



ILUSTRACIÓN 4. ACTIVIDADES DE PINTURA EXTERIOR



ILUSTRACIÓN 5. ACTIVIDADES DE PINTURA EXTERIOR

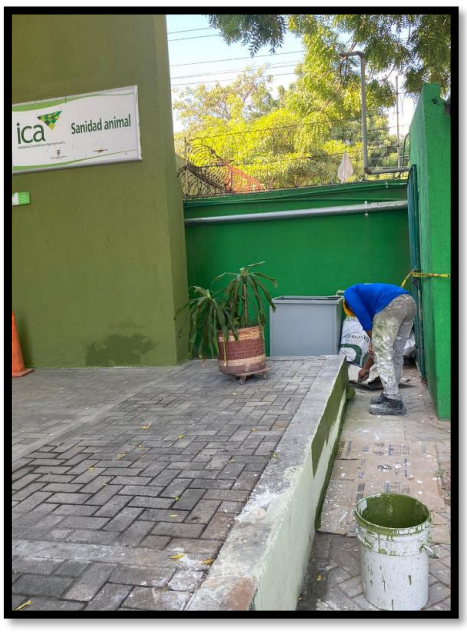


ILUSTRACIÓN 6. ACTIVIDADES DE PINTURA EXTERIOR



ILUSTRACIÓN 7. ACTIVIDADES DE PINTURA EXTERIOR

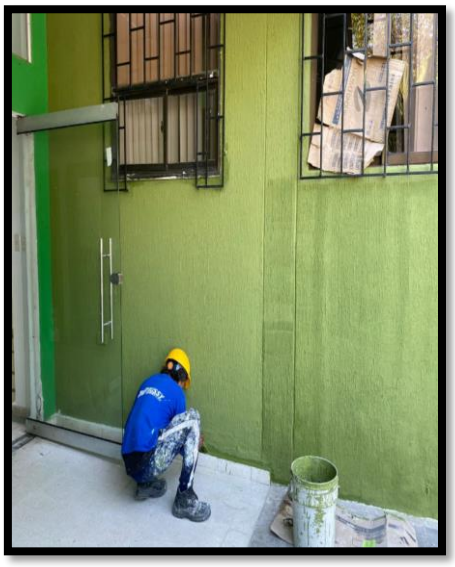


ILUSTRACIÓN 8. ACTIVIDADES DE PINTURA EXTERIOR

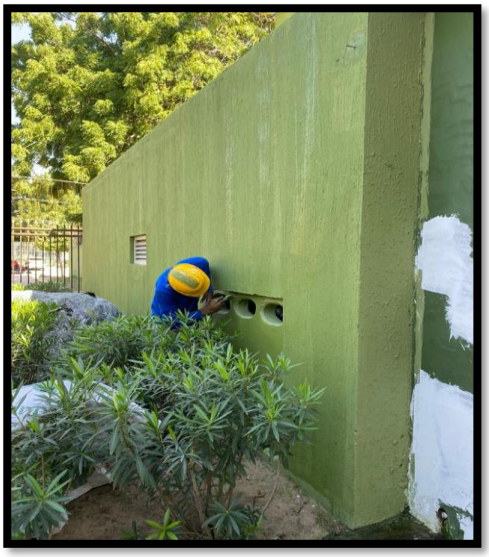


ILUSTRACIÓN 7. ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR

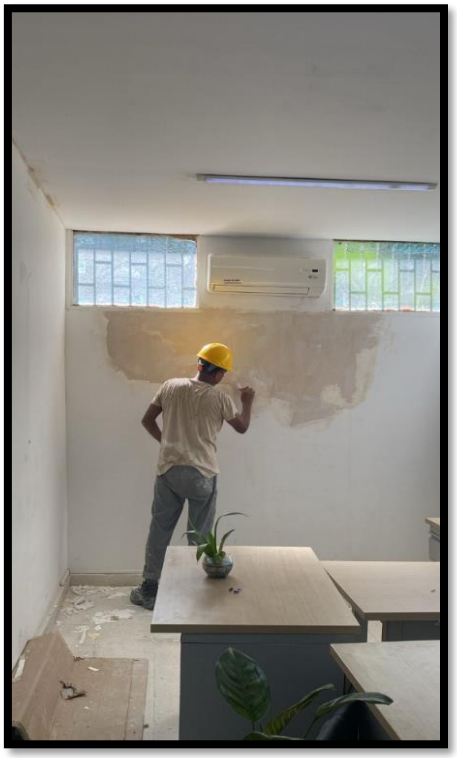


ILUSTRACIÓN 8. ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR



ILUSTRACIÓN 9. ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR



ILUSTRACIÓN 10. ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR



ILUSTRACIÓN 11. ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR

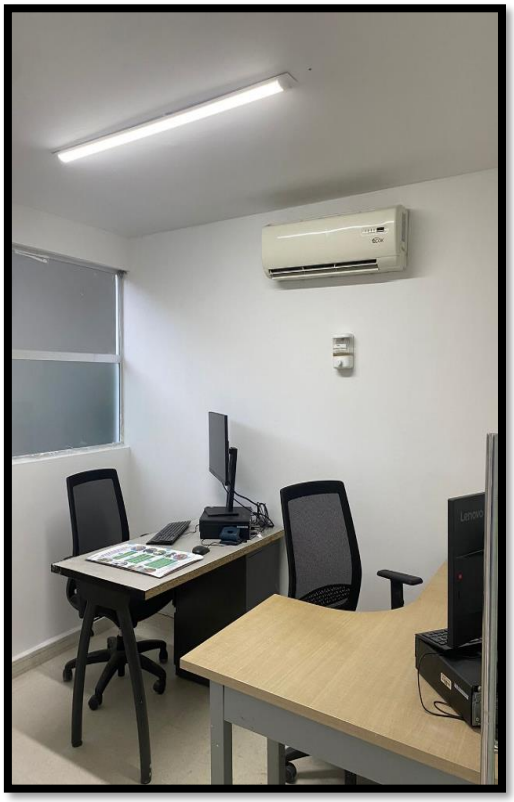


ILUSTRACIÓN 12. ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR



ILUSTRACIÓN 13. INICIO PINTURA EXTERIOR



ILUSTRACIÓN 14. INICIO PINTURA EXTERIOR

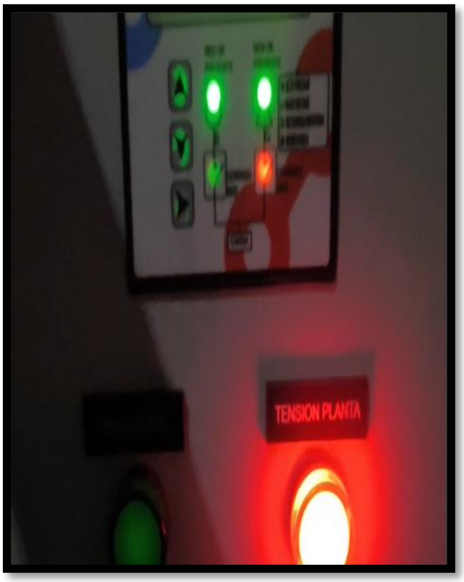


ILUSTRACIÓN 15. ENCENDIDO PLANTA ELÉCTRICA




ILUSTRACIÓN 16. ENCENDIDO PLANTA ELÉCTRICA



9. Gestión de los Trámites Contractuales:

- Durante el periodo del informe se encuentra tramitado el corte de obra No. 1, el cual tiene un valor de $ 98.942.894,25
- Durante el periodo del informe se encuentra en tramite el corte de obra No. 2, el cual tiene un valor de $158.308.630,80
- En el periodo del informe se encuentra en actualziacion el balance de obra.



Firma del Responsable:
Nombre: Ing. Abner David Pérez Turizo
Cargo:Residente de obra
Fecha: 04/12/2024
