INFORME QUINCENAL No. 6

Contrato de obra No. GGC-078-2024

Objeto: "ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD"

GGC-078-2024

INFORME QUINCENAL No. 6

PERIODO DE EJECUCIÓN

03 DE ENERO DE 2025– 17 DE ENERO DE 2025

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-

ORIGINAL

1. INFORME QUINCENAL:

- **Fecha:** 17 DE ENERO DE 2025
- **No. de Informe:** 0006
- **Periodo:** 03 DE ENERO DE 2025– 17 DE ENERO DE 2025

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:


- **Objeto del Proyecto:** “ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECCIONAL ATLANTICO" Y "MANTENIMIENTO PUESTO DE CONTROL EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ, SOLEDAD”

- **Supervisor:** Paula Alejandra Vargas Niño

- **Plazo Contrato:** tres (3) meses + 22 dias

- **Plazo Restante del Contrato:** 3 dias

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN:

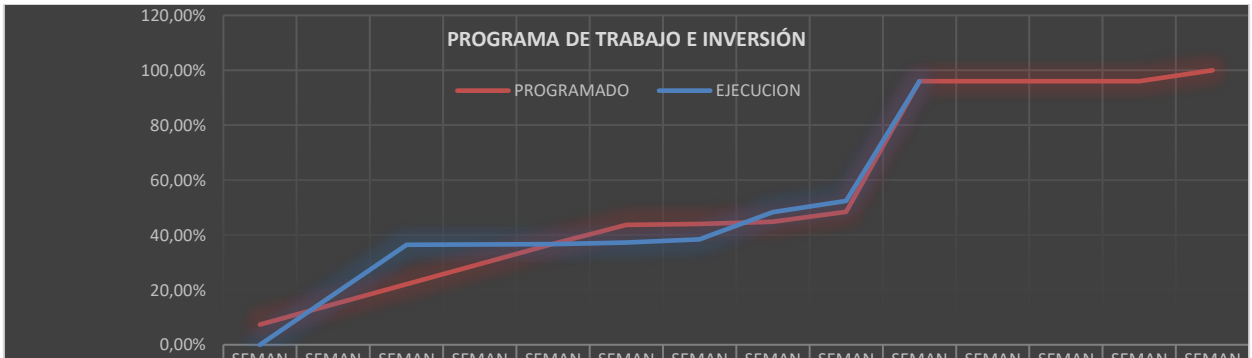

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
PROGRAMADO	7,35%	14,71%	22,06%	29,42%	36,77%	43,61%	43,96%	44,77%	48,49%	95,97%	95,97%	95,97%	95,97%	100,00%
EJECUCION	0%	18,2%	36,4%	36,5%	36,6%	37%	38%	48%	52%	96%				

- **% Programado en la quincena:** 47.00%
- **Valor programado en la Quincena:** $ 146.524.333,094 (COSTO TOTAL)
- **% Ejecutado en la quincena:** 48.00%
- **Valor Ejecutado en la Quincena:** $ 149.641.872,096 (COSTO DIRECTO)
- **% programado Acumulado:** 95,97%
- **Valor programado Acumulado:** $ 299.190.218,02 (COSTO DIRECTO)
- **% Ejecutado Acumulado:** 96%
- **Valor Ejecutado Acumulado:** $ 299.283.744,19 (COSTO DIRECTO)
- **% de Atraso o Adelanto:** + 0.03%
- **Valor del Atraso o Adelanto:** $ 93.526,17 (COSTO DIRECTO)

4. DATOS CONTRACTUALES:

- **Contratista:** WRUSSY INGENIEROS SAS
- **No. Contrato:** GGC-078-2024
- **Valor Inicial:** $395.771.577,00
- **Valor Actualizado:** $395.771.577,00
- **Fecha de Inicio:** 21 de octubre 2024
- **Fecha de Vencimiento:** 29 de diciembre 2025
- **Fecha de Vencimiento actualizada:** 20 de enero 2025
- **Prórrogas :**
    - Durante el periodo del informe se tramito prórroga del contrato por 22 dias dando como fecha de terminacion el dia 20 de enero de 2025.
- **Suspensiones:**
    - Durante el periodo del informe no se tramitaron suspensiones del contrato.

5. Actividades Realizadas en la quincena:

- Pañete de muros
- Mantenimiento de cajas de inspeccion
- Alistado de pisos
- Alistado de paredes
- Instalacion de enchapes

6. Resumen Ejecutivo del Contrato:

- Durante el periodo del informe, se llevó a cabo la culminacion de la instalacion de la planta electrica del proyecto, asi como la continuacion de pintura interna de pared, techo y fachada

7. Personal y Equipo en Obra:

- **Personal a cargo:**
    - Residente de obra: Ing. Abner David Pérez Turizo
    - Residente SISOMA: Silene de avila Barragan
    - Ayudante de Obra: Alfredo de Jesús García
    - Ayudante de Obra: Eduardo Luis Cárdenas
    - Ayudante de Obra: Fredy Molinares
    - Ayudante de Obra: Iván Jesús Coronado
    - Ayudante de Obra: Jose Luis Jaraba
    - Ayudante de Obra: Juan Jose Perozo
    - Ayudante de Obra: Roque Arturo Cárdenas
    - Maestro de Obra: Alexander Enrique Vargas
- **Equipo utilizado:**
    - Durante el periodo del informe se urtilizaron herramientas de pintura (rodillos, espatura, boriochas, etc.)
    - Herramientas electricas para la instalacion de la planta electrica.

8. Registro Fotográfico del Antes y el Después:



Ilustración 1. PAÑETE DE MUROS



Ilustración 2. MANTENIMIENTO CAJAS INSPECCION



ILUSTRACIÓN 3. ALISTADO DE PAREDES



ILUSTRACIÓN 4. ALISTADOS DE PISOS



ILUSTRACIÓN 5. INSTALACION DE ENCHAPE

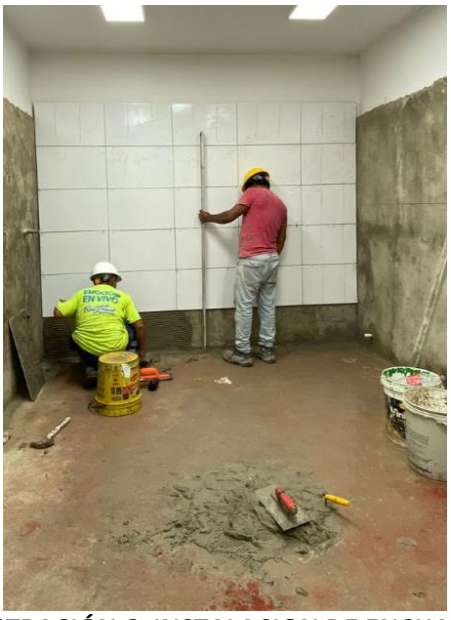


ILUSTRACIÓN 6. INSTALACION DE ENCHAPE




ILUSTRACIÓN 7. INSTALACION DE ENCHAPES

9. Gestión de los Trámites Contractuales:

- Durante el periodo del informe se encuentra tramitado el corte de obra No. 1, el cual tiene un valor de $ 98.942.894,25
- Durante el periodo del informe se encuentra en tramite el corte de obra No. 2, el cual tiene un valor de $158.308.630,80
- En el periodo del informe se encuentra en actualziacion el balance de obra.

- Durante el periodo del informe se encuentra en tramite la solicitud de modificion No. 1 al contrato de obra, en el que se modifican la clausula cuarta, novena y la prorroga al contrato de obra.



Firma del Responsable:
Nombre: Ing. Abner David Pérez Turizo
Cargo:Residente de obra
Fecha: 04/12/2024
