Turbaco, Bolívar, 28 de abril de 2025

CONSECUTIVO: VIC-MC-GAV-003-2025

Señores
ALCALDIA DE TURBACO
Sr. SADIEL DAVID GÁMEZ MENDOZA
Secretario de Infraestructura Municipal

Ciudad.

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA Y REVISION CUADRO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CONTRATO MC-005-2025

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con el fin de solicitar ampliación del tiempo del contrato MC-005-2025 cuyo objeto es la "Construcción de muro de contención en gaviones en un tramo del arroyo Cucuman, ubicado en el Barrio Paraíso sector Paloquemao del municipio de Turbaco, Bolívar", por término de quince (15) días con fecha final del 17 de mayo de 2025, esto con el fin de dar cumplimiento a las actividades contratadas, teniendo en cuenta que los siguientes motivos que afectaron el rendimiento y desarrollo de las obras.

1. Solicitud de suspensión de las obras del contrato MC-005-2025 por parte de ediles, veeduría y comunidad.



Visita y suspensión por parte de la comunidad	Comité técnico con diseñador, secretaria y ediles.


2. Persistencia de las condiciones climáticas adversas presentes con lluvias afectando los trabajos de excavación, compactación e instalación de gaviones.

	
Lluvias	Lluvias

3. Interferencia por cruce de tubería de gas de diámetro 1” paralelo al tramo del arroyo Cucuman.

	
Cruce de tubería de gas	Cruce de tubería de gas

Adicionalmente, luego de la revisión técnica en obra se confirma la necesidad de ampliar la longitud de estabilización en gaviones en el tramo del Arroyo Cucuman para abarcar la totalidad de 37 metros lineales de zona inestable y erosionada. Por lo cual, para mejorar las condiciones actuales del tramo y garantizar la estabilidad de la vía, se hace necesario modificar las cantidades del contrato de obra MC-005-2025 para lo cual adjuntamos el formulario de mayores y menores cantidades para su estudio y aprobación.

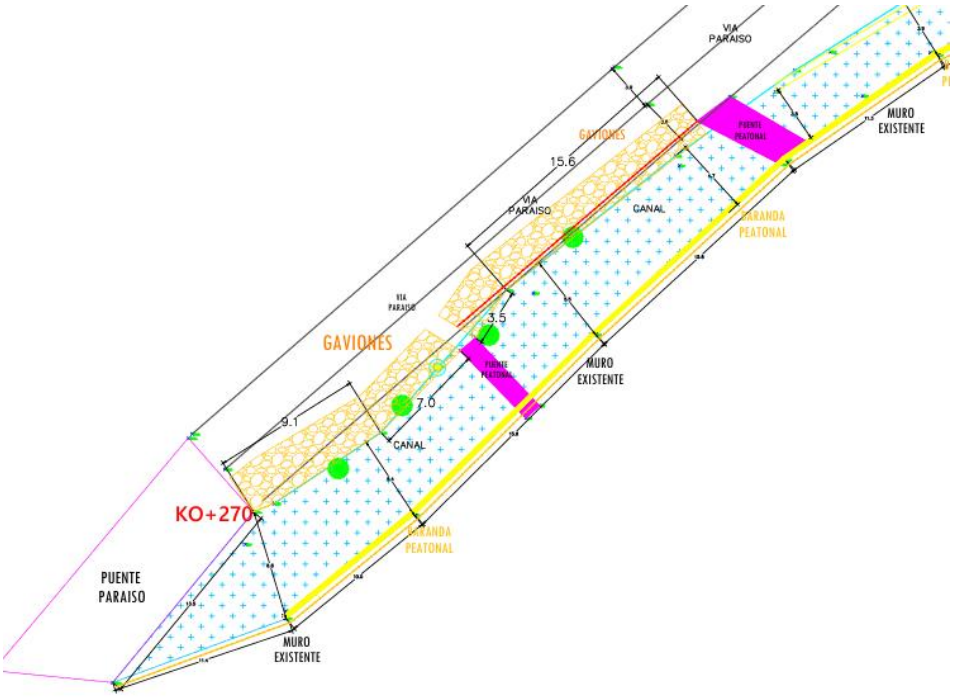

Cordialmente,



ALEJANDRA MARIA RUIZ RESTREPO
Representante legal
VIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.
