CONSORCIO INTER – GASTAMARA 2024



Yopal, 23 de abril de 2025

OFICIO T - 013

Ingeniero
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder supervisor e interventoría
Oficina Jurídica
prof3.juridica@enerca.com.co

Asunto: Entrega de informes semanales 9 y 10.

Ref.: Contrato de consultoría 001 de 2025 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras actividades contractuales, muy respetuosamente realizamos la entrega de los informes semanales del contrato en referencia, de la siguiente manera:

N° INFORME SEMANAL	PERIODO	FOLIOS
9	Del 01/04/2025 al 05/04/2025	4
10	Del 06/04/2025 al 12/04/2025	4

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA
Contrato de consultoría No 001 de 2025

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		7	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.						
CONTRATO No	001 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127	No. C.D.P.	6525	No R.P.	6525
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 628.563.058,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	N/A						
CONTRATO No	N/A	NOMBRE DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RUBRO	N/A	RUBRO		No. C.D.P.		No R.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		7	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850127

INTERVENTORIA [X] **APOYO SUPERVISION** [ ]

FECHA DE INCIO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúan excavaciones manuales en las veredas Llano de Perez, Chitacote, Chaparral y Teislandia con posterior relleno de las mismas
Se inician excavaciones mecanicas en la vereda El tablón y posterior relleno de las mismas.
Se continúa con la instalación de tuberia de 3/4", 1/2" y de 1" en las veredas El tablón, Chitacote, llano de perez, Chaparral y Teislandia.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Instalación de tubería



Descripción: Excavación manual e instalación de tuberia.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		7	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850127


INTERVENTORIA [X] **APOYO SUPERVISION** [ ]

Se proyecta continuar con las excavaciones manuales en las veredas Llano de Perez, Chitacote, Chaparral y Teislandia con posterior relleno de las mismas
Continuar con las excavaciones mecanicas en la vereda El tablón y posterior relleno de las mismas.
Continuar con la instalación de tuberia de 3/4", 1/2" y de 1" en las veredas El tablón, Chitacote, llano de perez, Chaparral y Teislandia.

OBSERVACIONES

Al corte del presente informe semanal, se tiene un atraso del 17,24%.

PROGRAMADO VS EJECUTADO SEMANAL

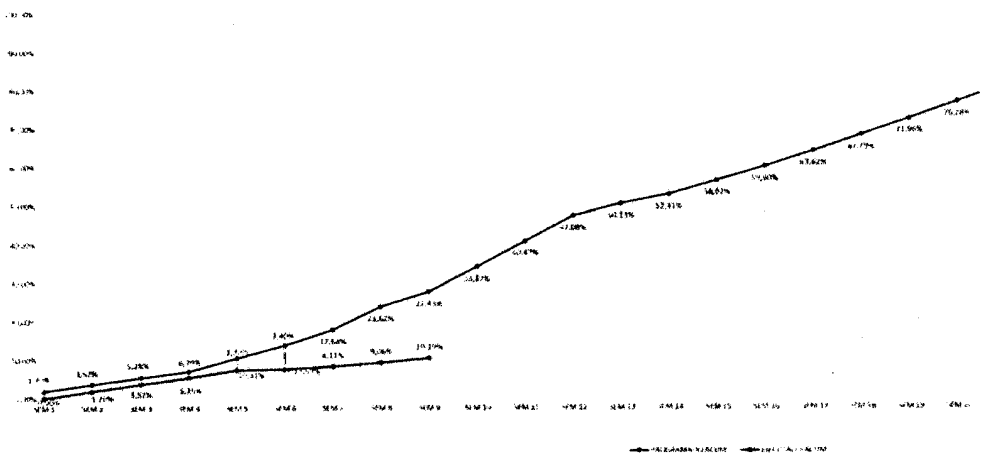

En constancia se firma.

Elaboró
CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Recibió
RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

VoBo:
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		14	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

Semana Número:	10	Del:	6/04/2025	Al:	12/04/2025	No:	10

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 2 Meses y 11 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO CAFETERA
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE						
CONTRATO No	004 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO CAFETERA				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127	No. C.D.P.	6825	No R.P.	6825
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.317.074.940,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 2.926.829.976	40%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 2.926.829.976	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	6,44%	33,87%	OBRA EJECUTADA (%)	1,29%	11,48%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 470.928.151,60	$ 2.478.040.065,37	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 94.502.193,23	$ 840.286.177,23

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		14	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.						
CONTRATO No	001 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127	No. C.D.P.	6525	No R.P.	6525
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 628.563.058,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	N/A						
CONTRATO No	N/A	NOMBRE DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RUBRO	N/A	RUBRO		No. C.D.P.		No R.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		14	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

FECHA DE INCIO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúan excavaciones manuales en las veredas Llano de Perez, Chitacote, Chaparral y Teislandia con posterior relleno de las mismas
Se continúan excavaciones mecanicas en la vereda El tablón y posterior relleno de las mismas.
Se continúa con la instalación de tuberia de 3/4", 1/2" y de 1" en las veredas El tablón, Chitacote, llano de perez, Chaparral y Teislandia.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Acompañamiento de la interventoria en la instalacion de tuberia



Descripción: Excavación mecánica

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		14	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850127

INTERVENTORIA [X] **APOYO SUPERVISION** [ ]


ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar con las excavaciones manuales en las veredas Llano de Perez, Chitacote, Chaparral y Teislandia con posterior relleno de las mismas
Continuar con las excavaciones mecanicas en la vereda El tablón y posterior relleno de las mismas.
Continuar con la instalación de tuberia de 3/4", 1/2" y de 1" en las veredas El tablón, Chitacote, llano de perez, Chaparral y Teislandia.

OBSERVACIONES

Al corte del presente informe semanal, se tiene un atraso del 22,38%.

PROGRAMADO VS EJECUTADO SEMANAL

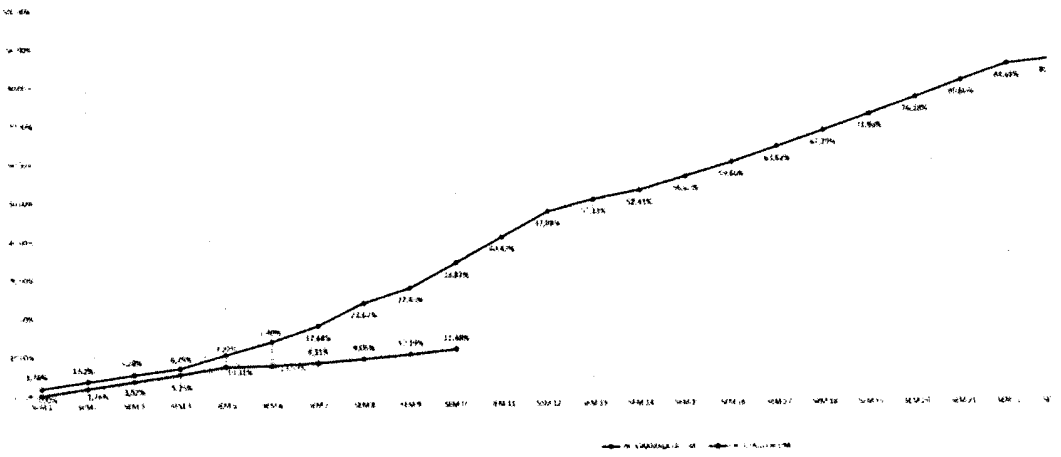

En constancia se firma.

Elaboró
CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Recibió
RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

VoBo:
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA
