ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		22	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

Semana Numero	1 y 2	Del	8/04/2025	Al	21/04/2025	No	1

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 0 Meses y 15 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Nombre del Interventor: N.A
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Nombre Apoyo a la Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	186 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		22	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,0387%	0,1161%	OBRA EJECUTADA (%)	0,0387%	0,1161%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 129.479,49	$ 388.438,47	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 129.479,49	$ 388.438,47

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		22	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

CONTRATO No.:	157 de 2025		DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	22	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142


INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo correspondiente del 8 al 21 de abril se realizaron actividades como la formalización de los contratos, así como la revisión de la información cargada en la plataforma secop 2 del contrato de interventoria (Contrato de Consultoria No. 188 de 2025). El contratista de interventoria ha realizado actividades de oficina y administrativas. Así mismo se ha enviado información solicitada para Gesproy para dejar formalizado los inicios de los contratos derivados tanto de obra como de interventoria. Se ha iniciado actividad de ingreso de personal requerido y de replanteo en campo y otras actividades administrativas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

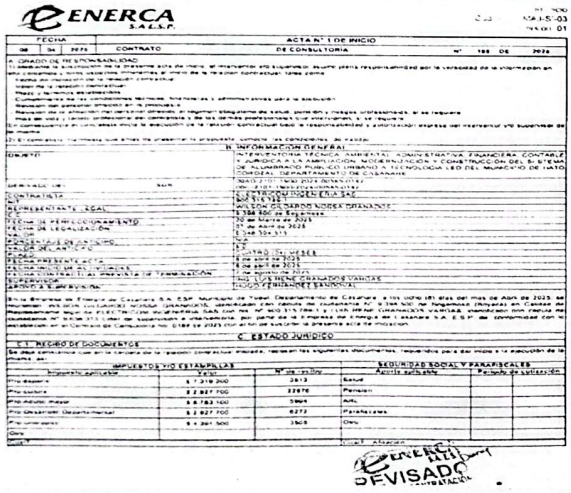

ENERCA S.A.E.S.P.

ACTA N° 1 DE INICIO

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 188 DE 2025

REVISADO

Descripción: Acta de inicio contrato de interventoria 188 de 2025

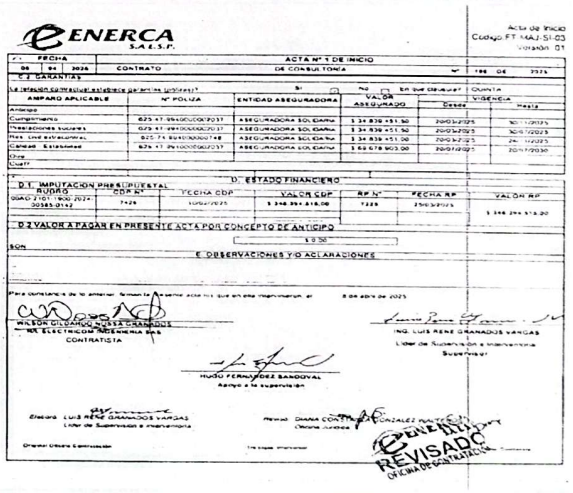
ENERCA S.A.E.S.P.


ACTA N° 1 DE INICIO

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 188 DE 2025

REVISADO

Descripción: Acta de inicio contrato de interventoria 188 de 2025



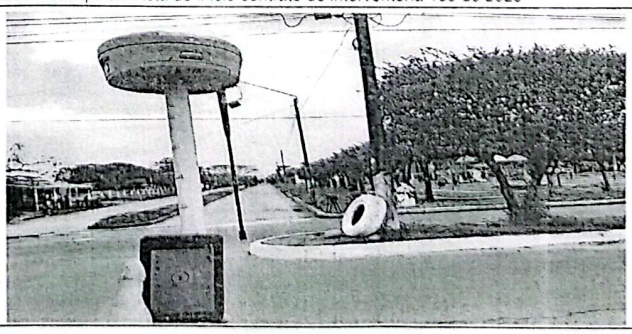

Descripción: Actividades de replanteo del contrato de obra 186 de 2025

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Se programa primer comité de obra para la siguiente quincena.

Powered by CamScanner

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		22	4	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

OBSERVACIONES

En constancia se firma.

Elaboro
HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Recibio
N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISION

Powered by CamScanner

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		8	5	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

Semana Número:	3 y 4	Del:	22/04/2025	Al:	07/05/2025	No	2

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 1 Meses y 0 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Nombre del Interventor: N.A.
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Nombre Apoyo a la Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	186 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	ORDEN DE PAGO "COMPROBANTE"	194871525 - 194869925	$ 1.338.396.727	40%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			**$ 1.338.396.727**	**40%**

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		8	5	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

INTERVENTORIA [ ]

CODIGO BPIN: 2024005850142

APOYO SUPERVISION [X]

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	0,02175%	0,1667%	OBRA EJECUTADA (%)	0,00204%	0,01574%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 727.677,43	$ 5.578.860,32	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 68.365,17	$ 524.132,97

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		8	5	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo correspondiente del 22 de abril al 7 de mayo se continúa con la actividad de replanteo y se realizó visita por parte de los profesionales de interventoría junto con apoyo a supervisión con el fin de verificar algunas de las zonas a intervenir donde se evidencian condiciones técnicas que complican el cumplimiento de los niveles de iluminación como pide el RETILAP, así como postes existentes en la cercanía de las redes a las zonas a intervenir. Así mismo se tuvo reunión con el secretario de planeación del Municipio de Hato Corozal donde dió a conocer varios de los derechos de petición de la comunidad así como oficios por parte de los patrulleros de la policía con las correspondientes solicitudes por mejoramiento del alumbrado. El día viernes 2 de mayo de 2025 se realizó un comité de obra donde asistieron la supervisión, la interventoría, el secretario de planeación de Hato Corozal con el fin de revisar los alcances finales del proyecto y organizar la socialización del mismo que se llevó a cabo el día 7 de mayo de 2025 con presencia de las partes interesadas.

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		8	5	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION


PROYECTO SGR


INTERVENTORIA [ ]

CODIGO BPIN: 2024005850142

APOYO SUPERVISION [X]


REGISTRO FOTOGRAFICO

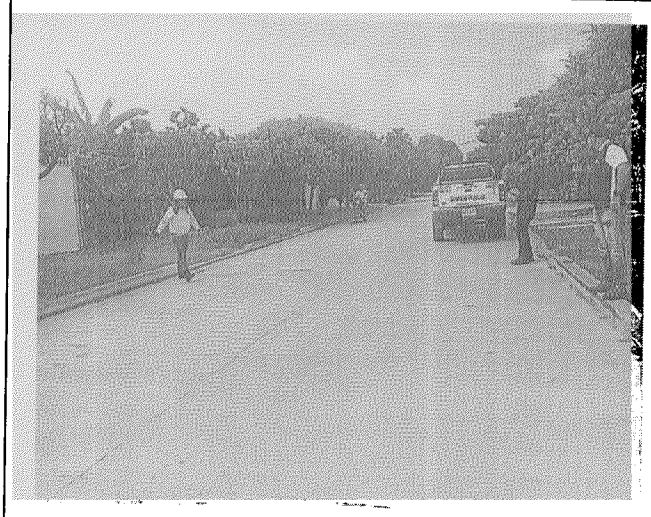

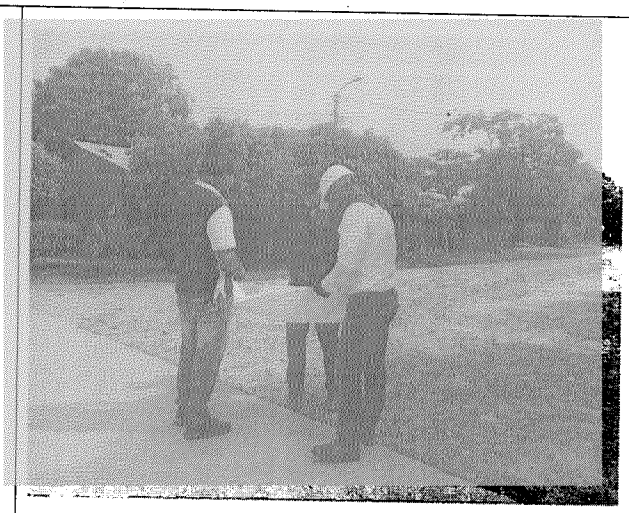

Descripción: Revisión de uno de los perfiles viales

Descripción: Verificación en campo de acuerdo con el plano

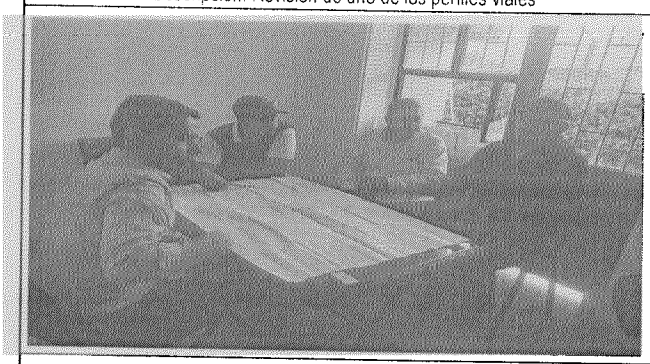



Descripción: Actividades de reunión con el secretario de planeación de HatoCorozal y de comité de obra.

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Se programa iniciar obra para la siguiente quincena.

OBSERVACIONES

En constancia se firma.

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		8	5	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

Elaboró

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Recibió

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó: Luis René Granados V.

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISION
