MINISTERIO DEL INTERIOR

Al contestar cite Radicado 2022-3-003122-021443 Id: 4717
Folios: 1 Fecha: 2022-08-24 14:21:09
Anexos: 22 Documentos físicos
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 24 agosto de 2022

PARA: Ronald Cuello Gómez , Subdirector De Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: INFORME MAYO Y JUNIO CONVENIO No.1896-2021,PAMPLONA–NORTE DE SANTANDER.

En mi condición de supervisor del Convenio No.1896 - 2021 Sacúdete del Municipio de Pamplona–Norte de Santander, me permito allegar a su despacho el informe correspondiente al mes de mayo y junio del 2022.

Cordialmente,

Remberto Alejandro Martinez Polo
Subdirector De Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Subdirección De Seguridad y Convivencia Ciudadana

MEMORANDO

MEM2022-18874-SIN-4020
Bogotá D.C. sábado, 16 de julio de 2022

PARA: Yolima Mora Salinas, Subdirectora Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

ASUNTO: INFORME MAYO CONVENIO No. 1896-2021, PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER.

En mi condición de supervisor del Convenio No.1896 - 2021 Sacúdete del Municipio de Pamplona – Norte de Santander, me permito allegar a su despacho el informe correspondiente al mes de mayo del 2022.

Cordialmente,

REMBERTO MARTÍNEZ POLO
Supervisor Convenio 1896-2021

Documento emitido por el Ministerio del Interior. Verifique su autenticidad en:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?ID=Kt6w4k5zqOD8u93Y3QhSug==

Elaboró: Diana Paola Alarcón – Apoyo supervisión Contratista SIN
Revisó: Ing. Harry Manrique – Líder de grupo SIN
Aprobó: Ing. Remberto Martínez Polo

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 1896 de 2021 PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2022

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)."*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Urbano		
BENEFICIARIO:	PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.596.832.800
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$718.574.760
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$1.996.041.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	10/11/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2022		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. REMBERTO MARTINEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	10/11/2021	22/11/2021
	LUIS FERNANDO PINZÓN GALINDO	23/11/2021	31/01/2022
	JUAN CARLOS MONTAÑA PARRA	01/02/2022	31/03/2022
	REMBERTO MARTINEZ	01/04/2022	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	CLAUDIA XIMENA BEDOYA	DD/MM/AAAA	31/03/2022
	DIANA PAOLA ALARCÓN	01/04/2022	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 109821 No. 8322	10/11/2021 16/01/2022	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 460-47-994000048907	17/11/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17/11/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$1.796.437.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 199.604.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR ADICIONAL DE OBRA			

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS M/L ($878.258.040) contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. E. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. F. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente de los proyectos de pliegos de condiciones anteriormente descritos.	NO APLICA	22/12/2021	$ 878.258.040
SEGUNDO DESEMBOLSO	UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($359.287.380), contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO	UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($359.287.380), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 878.258.040
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
460-47-994000048907	Cumplimiento	$ 399.208.200,00	05/11/2021	31/01/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato 200-2022	Estudio, diseño y construcción del proyecto SACUDETE al parque tipo 2 opción 6 del municipio de Pamplona del departamento de Norte de Santander.		$ 1.796.437.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL SACUDETE PAMPLONA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.796.437.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Interventoría técnica, administrativa y financiera a los estudios, diseño y construcción del proyecto SACUDETE al parque tipo 2 opción 6 del Municipio de Pamplona Norte de Santander.		$199.604.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL INTER SACUDETE PAMPLONA 2022		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$199.604.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA			

PÓLIZA No.	**49-44-101028004**
FECHA DE LA PÓLIZA	**27/04/2022**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: Mayo 2022	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N/A	
INFORME FINANCIERO		30-05-2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	878.782.060	Corte: Mayo 2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**N/A**
% EJECUTADO DE OBRA	**N/A**

ESTADO MENSUAL DEL CONVENIO: ABRIL 2022

ESTADO CONVENIO	VIGENTE.
ESTADO OBRA	N/A
EJECUCIÓN FINANCIERA	44% DESEMBOLSADO.
TRÁMITES JURÍDICOS	NINGUNA
OBSERVACIONES	El contrato derivado para obra se encuentra adjudicado: ✓ Licitación LP-AP-001-2022- Estudio diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 2 opción 6 del municipio de Pamplona del departamento de Norte de Santander, adjudicado a: Unión Temporal Sacúdete Pamplona RL- Susana Patricia Uribe Uribe. El contrato derivado se encuentra en proceso de adjudicación: ✓ Concurso de méritos AP-CMA-001-2022 - Interventoría técnica, administrativa y financiera a los estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 2 - opción 6 del municipio de Pamplona del departamento de Norte de Santander.


SEGUIMIENTO

17 DE MAYO DE 2022:

El 17 de mayo se realizó el acto de adjudicación del contrato de interventoría. El contratista fue Unión temporal Intersacúdete pamplona 2022 R/L. Jhon Francisco Rojas Garavito. Se adjunta acta de resolución.

25 DE MAYO DE 2022:

Se realizo la presentación del proyecto sacúdete al parque. La ing. Diana Paola Alarcón hizo la presentación de los requerimientos, distribución y las áreas mínimas que integran y conforma el proyecto. Se dio a conocer a la supervisión del municipio, contratista e interventoría los componentes de los estudios y diseños su contenido mínimo y la lista de documentos entregables que deben adjuntar.

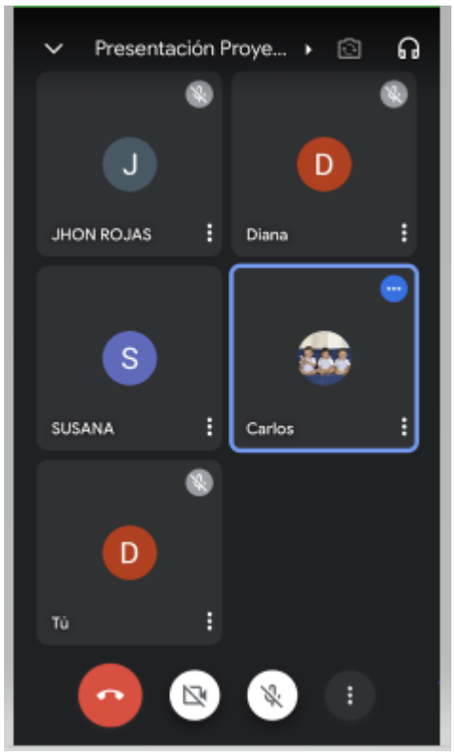

31 DE MAYO DE 2022:

Se realiza reunión presentencial en las instalaciones del Ministerio con la presencia de: por parte de la administración del Municipio, Arq. Carlos Parada supervisor del convenio y Ricardo Barco, por parte del Ministerio el Ing. Remberto Martínez supervisor del convenio y la ing. Diana Paola Alarcón apoyo a la supervisión, con el propósito de revisar las inquietudes que tiene la supervisión del Municipio, frente al desarrollo del proyecto. Los temas tratados: adecuación terreno, pista de trote y graderías.

El Municipio allega el informe mensual y financiero del mes de mayo de 2022.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. REMBERTO MARTINEZ POLO Supervisor del Convenio 1896-2021 Subdirección de Infraestructura – Ministerio del Interior	**ING. DIANA PAOLA ALARCÓN SEVILLANO** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Subdirección de Infraestructura – Ministerio del Interior

El futuro es de todos · Mininterior	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON** **ANEXO 3**	**Código: BS-P3-F3** **Versión: 5** **Vigente Desde: 17/12/2018**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1896 de 2021**, MUNICIPIO DE **PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MAYO DE 2022**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Calle 0 No. 3-13 - Barrio Juan XXIII		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 1.596.832.800
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 399.208.200
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.996.041.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	10-11-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-07-2022	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ARQ. CARLOS ARTURO PARADA GELVEZ	**DESDE:** 10-11-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. JOSÉ A. GUERRERO	10-11-2021	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 00 051201 DE FECHA 12-05-2021		
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO			
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 45221 DE FECHA 07-09-2021		
RADICADO VIGENCIAS FUTURAS ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2-2021-009386 DE FECHA 25-02-2021		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL			
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	10-11-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (CUMPLIMIENTO)	**No.** 460-47-994000048907		
	VIGENCIA DESDE: 05/11/2021		
	VIGENCIA HASTA: 31/01/2023		
VALOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN			$ 1.796.437.000,00
VALOR INTERVENTORÍA			$ 199.604.000,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA			$ 0,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. E. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. F. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente de los proyectos de pliegos de condiciones anteriormente descritos.	NO APLICA	22/12/2021	$ 878.258.040
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%		
TERCER DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%		
APORTE MUNICIPIO				$ 399.208.200
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.277.466.240,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
460-47-994000048907	Cumplimiento	$ 399.208.200	05/11/2021	31/01/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	200 de 2022	**$ 1.796.437.000,00**
Link de Consulta:	Ver (1)	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	UNIÓN TEMPOPRAL SECUDETE PAMPLONA R.L. SUSANA PATRICIA URIBE URIBE	NIT. 901.591.641-4 C.C. 60.397.778 de Cúcuta

Fecha de Acta de inicio del contrato			Duración 07 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	DD/MM/AAAA	
	REINICIO 1	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato		**Fecha Actual de terminación del contrato**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.796.437.000,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. 49-44-101028174 **Aprobada:** 01/06/2022	
TIPO DE GARANTÍA	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	12/05/2022	12/06/2023
SALARIOS, PRESTACIONES E IND.	12/05/2022	12/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12/12/2022	12/12/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	12/12/2022	12/12/2027
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.	No. 49-40-101008670 **Aprobada:** 01/06/2022	
TIPO DE GARANTÍA	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/05/2022	12/06/2023
FECHA DE LAS PÓLIZAS	27/05/2022	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	CI-AP-0207 DE 2022		$ 199.604.000,00
Link de Consulta:	Ver (2)		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 Representante Legal		NIT. 901.600.689-7 C.C. 88.224.016 de Cúcuta
Fecha de Acta de inicio del contrato			Duración 07 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato		**Fecha Actual de terminación del contrato**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 199.604.000,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	No. 49-44-101028245 **Aprobada:** 16/06/2022	
TIPO DE GARANTÍA	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	08/06/2022	08/05/2023
SALARIOS, PRESTACIONES E IND.	08/06/2022	08/01/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	08/01/2023	08/01/2028
FECHA DE LAS PÓLIZAS	16/06/2022	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO **Enviado:**

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		
INFORME FINANCIERO	Mayo-2022	30-05-2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 1.277.990.260,00	**Corte:** Mayo-2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	x	x

OTROS	x	x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. CARLOS ARTURO PARADA GELVEZ Supervisor del Convenio Secretario de Planeación Municipal	**ING. JOSÉ ALEXANDER GUERRERO CASTILLA** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaría de Planeación Municipal

Se Anexan ( ) Folios

(1) https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.2919254&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fcreateDateFrom%3d07%2f01%2f2022+19%3a56%3a18%26createDateTo%3d07%2f07%2f2022+19%3a56%3a18%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.2829635%26selectedRequest%3dCO1.REQ.2919254%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal

(2) https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.2985930&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fcreateDateFrom%3d07%2f01%2f2022+19%3a50%3a39%26createDateTo%3d07%2f07%2f2022+19%3a50%3a39%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.2883686%26selectedRequest%3dCO1.REQ.2985930%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1896

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER)

INFORME FINANCIERO DEL 30 DE MAYO 2022
MUNICIPIO DE PAMPLONA

PROYECTO (S): SACUDETE TIPO 2

CUENTA (AHORROS) No.001303240200393149 **DEL BANCO:** **BBVA**

VALOR CONVENIO **$ 1.996.041.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 878.258.040,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 399.208.200,00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	2021-12-22	GIRO 1	$ 878.258.040,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 878.258.040,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 878.258.040,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
2021-12-30	$ 55.747,00
2022-01-31	$ 212.707,00
2022-02-28	$ 63.887,00
2022-03-31	$ 63.890,00
2022-04-29	$ 63.893,00
2022-05-31	$ 63.896,00
TOTAL (6)	**$ 524.020,00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (0) **$ 878.258.040,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (0) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (6) $ 524.020,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (0) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 524.020,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 878.782.060,00**

OBSERVACIONES **Solo rendimientos financieros en el Mes de Mayo**

FIRMA

YAMILE RODRIGUEZ VILLAMIZAR
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ...

Re: Reunión 31 mayo

SP

Secretaria de Planeacion <secretariadeplaneacion@pamplona-nortedesantander.gov.co>

Para: Diana Paola Alarcon Sevillano

Vie 27/05/2022 17:20

Buenas tardes
Cordial saludo

Acuso recibo.

El vie, 27 may 2022 a las 16:38, Diana Paola Alarcon Sevillano (<diana.alarcon@mininterior.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo, arquitecto parada de acuerdo a la reunión realizada el 25 de mayo de 2022, donde se hizo la presentación del proyecto sacúdete al parque, y surgieron ciertas dudas frente al desarrollo de las actividades para adecuación del terreno y al ajuste técnico que se debería realizar al circuito de trote, me permito confirmar que el día martes 31 de mayo podemos desarrollar mesa de trabajo presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior ubicado en la carrera 8 #12B-31 piso 10, en la ciudad de Bogota.
>
> Cordialmente,
>
> Diana Paola Alarcón S
> Apoyo a la supervisión
> Convenio Pamplona
> Obtener Outlook para iOS

Responder | Reenviar

RESOLUCIÓN No. 0205
(17 DE MAYO DE 2022)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA UN PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-001-2022

El suscrito Alcalde Municipal de PAMPLONA (NS), en uso de atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 11, literal b de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO

Que, la Alcaldía Municipal de PAMPLONA (NS) inició el proceso de contratación directa cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCION 6 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".**

Que, dentro del trámite normal del proceso se recibió la siguiente propuesta:

- **PROPONENTE: UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 R/L JHON FRANCISCO ROJAS GARAVITO**

El proponente allego con su propuesta en la plataforma Secop II, con garantía de seriedad póliza No. 49-44-101026004 de fecha 27 de Abril del 2022 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, por el 10% de la cuantía solicitada; dentro del plazo estipulado en el cronograma del proceso.

Que, conforme a lo establecido en el numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Pamplona, elaboró el pliego de condiciones del **PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-001-2022**, con el objeto de contratar la **"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCION 6 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".**

De acuerdo con lo anterior, se dio cumplimiento a los documentos y requisitos previos establecidos para tal efecto, como son: Estudios y documentos previos, certificado de disponibilidad presupuestal No. No. VF 0002 del 05 de ENERO de 2022, por valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($199.604.000,00). Con cargo al rubro 2.3.2.01.01.001.03.19 Otras obras de ingeniería civil. 55.0-1.2.4.3.03 SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN.

Que el Municipio de Pamplona, procede a iniciar el **PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-001-2022**, previa publicación del proyecto de pliego de condiciones y los estudios previos, el 30/03/2022 5:00:00 PM, sin la limitación de convocatoria a Mypes ó Mipymes.

Que, de conformidad con lo anterior, el Municipio de Pamplona en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto1082 de 2015, el 23/12/2021, ordenó la publicación del acto administrativo de apertura, el pliego de condiciones definitivo, en el Portal Único de Contratación SECOP.

Que, el día 2/05/2022 5:00:00 PM, se efectuó el cierre del **PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-001-2022**, presentándose un (01) proponente.: **PROPONENTE: UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 R/L JHON FRANCISCO ROJAS GARAVITO**.

Que, el día 11/05/2022 4:00:00 PM, como consta en el Informe de Evaluación y la verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes, se realizó la evaluación preliminar jurídica, técnica y financiera por parte de los miembros del Comité Evaluador en Contratación, donde se determinó que el oferente 1. **PROPONENTE: UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 R/L JHON FRANCISCO ROJAS GARAVITO** estaba habilitado por cumplir con todos los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.

Que, el día 11/05/2022 4:00:00 PM, fue puesto a disposición de los proponentes el informe preliminar de verificación de los requisitos habilitantes, con el fin de que se presentaran las observaciones que se consideraran pertinentes, el cual fue publicado en el Portal Único de Contratación-SECOP, de acuerdo con lo establecido en artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, al cual no se hicieron observaciones.

Que, surtido el trámite de evaluación de requisitos habilitantes y establecido que el proponente cumple según evaluación dada por el Comité Evaluador del **PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-001-2022**, el día 17/05/2022 se procedió a verificar la oferta económica donde el comité evaluador verificó la propuesta económica del proponente: **PROPONENTE: UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 R/L JHON FRANCISCO ROJAS GARAVITO.**

UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022			
FACTORES DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN			
PARAMETRO	**VERIFICACION**	**EVALUACION**	**PUNTAJE**
Evaluación jurídica	Habilitante	Habilitado	
Capacidad financiera	Habilitante	Habilitado	
Capacidad Organizacional	Habilitante	Habilitado	
Experiencia	Habilitante	Habilitado	
Personal profesional técnico mínimo que debe ofrecer el proponente	Habilitante	Habilitado	
EVALUACIÓN TECNICA		**Ponderable**	
Factor Técnico – Experiencia específica del equipo del Proponente		Ponderable	**398 Puntos**
Factor Técnico – Experiencia adicional del oferente		Ponderable	**400 puntos**
Vinculación de personas con discapacidad		Ponderable	**100 Puntos**
Apoyo a la Industria Nacional		Ponderable	**100 puntos**
EVALUACIÓN ECONÓMICA			**$199.604.000.00**
		TOTAL:	**998 PUNTOS**

Que, según la normatividad vigente de conformidad al numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.3.2. del decreto 1082 del 2015, encontrándose que la oferta económica se adecua dentro del rango del valor estimado consignado y presupuestado en coherencia y consistencia adecuada al presente proceso, por consiguiente, a lo anterior la recomendación del comité evaluador es la adjudicación del contrato al proponente **UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 R/L JHON FRANCISCO ROJAS GARAVITO**, ya que se encuentra habilitada y la propuesta económica dentro del rango ofertado por la entidad territorial Municipal de Pamplona.

Que, de conformidad con la evaluación de fecha 17 de Mayo de 2022, que da cuenta del resultado de la verificación y evaluación realizada por el Comité Evaluador designado y teniendo en cuenta los requisitos exigidos por el Municipio de Pamplona en el pliego de condiciones del **PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-001-2022** y una vez analizada y estudiada la propuesta presentada dentro de dicho proceso de selección, los informes de verificación y evaluación, a que si se presentaron observaciones por los oferentes, a la cual se les dio respuesta a las mismas por los integrantes del Comité Evaluador en cada ramo técnico, jurídico y financiero, y que el Comité de Evaluación recomendó al Ordenador del

Gasto acoger por su ilustración, análisis serio y juicioso y que no admite duda en informe presentado y en consecuencia adjudicar el proceso de selección al proponente.

Que, el Alcalde de Pamplona, acoge la recomendación que por unanimidad le formulan los miembros del Comité de Evaluador, decidiendo adjudicar el **PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-001-2022**, teniendo en cuenta que la propuesta presentada por el oferente **UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 R/L JHON FRANCISCO ROJAS GARAVITO**, por la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($199.604.000.00)**, cumple con lo exigido.

QUE, por lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar a **UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 R/L JHON FRANCISCO ROJAS GARAVITO**, el **PROCESO CONCURSO DE MERITOS CM-001-2022** cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 OPCION 6 DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"** por un valor de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($199.604.000.00),** en las condiciones y términos expuestos en el texto de la oferta presentada, la cual se entiende hace parte integral del contrato adjudicado, conforme a los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO: comuníquese personalmente el presente acto administrativo a **UNION TEMPORAL INTERSACUDETE PAMPLONA 2022 R/L JHON FRANCISCO ROJAS GARAVITO**, en los términos de la Ley 1437 de 2011, acorde al artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y si no fuere posible, se notificará por aviso de conformidad con el artículo 69.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso alguno por la vía gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, se actuará de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la ley 80 de 1993.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en PAMPLONA (NS), a los **17 - Mayo - 2022**

HUMBERTO PISCIOTTI QUINTERO
Alcalde de PAMPLONA (NS)

nombres y Apellidos		Cargo	Firma
aprobó:	LUIS EDUARDO JAIMES SUARE	Asesor Jurídico	
Elaboró	ANDREA ESTEFANIA CASTILLO L	Apoyo contratación	
Los arriba firmantes hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, se recomienda para la firma del Remitente.			

El futuro es de todos Mininterior	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL** **ANEXO 7**	**Código: GC-P3-F7** **Versión: 2** **Vigente desde: 17/12/2018**

ACTA No.	001
FECHA	31-05-2022
CIUDAD	Bogotá
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1896-2021
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER).
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	0%
MOTIVO:	REUNION DE SEGUIMIENTO CONVENIO 1896-2021 PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.

PARTES

Ministerio del Interior	**Municipio**
Nombre: Remberto Martínez Polo C.C./ NIT: N/A Cargo: Supervisor del convenio – Subdirección de Infraestructura	Nombre: Carlos Parada C.C./ NIT: N/A Cargo: Supervisor Municipio Planeación Pamplona Email: secretariadeplaneacion@pamplona-nortedesantander.gov.co
Nombre: Diana Paola Alarcón C.C./ NIT: N/A Cargo: Apoyo a la Supervisión – Subdirección de Infraestructura	

DESARROLLO DE LA REUNION

El día de hoy 31 de mayo de 2022 se realiza reunión presencial de seguimiento del proyecto sacúdete al parque cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2 EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONA (NORTE DE SANTANDER).”

La presente reunión se desarrolla en las instalaciones del Ministerio con la presencia de: por parte de la administración del Municipio, Arq. Carlos Parada supervisor del convenio Planeación Municipio, por parte del Ministerio el Ing. Remberto Martínez supervisor del convenio y la ing. Diana Paola Alarcón apoyo a la supervisión, con el propósito de revisar las inquietudes que tiene la supervisión del Municipio, frente al desarrollo del proyecto.

Para contextualizar, el Arq. Parada indica las condiciones actuales del terreno donde se desarrollará el proyecto sacúdete, se trata de un terreno en terrazas, donde existe una construcción antigua, situación que obliga a realizar actividades de demolición; también se requieren desarrollar obras de contención debido a la proyección de la distribución de áreas y conformación del proyecto sacúdete.

Los puntos tratados en la reunión, fueron los siguientes:

1. En la construcción actual existen unas graderías, las cuales el Municipio propone que se puedan utilizar en el proyecto sacúdete. Por parte del Ministerio se aclara que se necesita un informe técnico que determine las condiciones de la estructura para validar si esta cumple con las especificaciones solicitadas y si es posible integrarlas al proyecto.

2. Debido a la disposición del terreno en terrazas, el Municipio propone hacer un ajuste técnico al proyecto, reemplazar la pista de trote por unas rampas, para mitigar las diferencias de nivel del terreno. El Ing. Remberto manifiesta que para aprobación de este ajuste es necesario que en la etapa de estudios y diseños que van a iniciar presente el planteamiento para revisión y determinar la viabilidad técnica.

3. El Arq. Parada también manifiesta que cuentan con los recursos para realizar las adecuaciones al terreno, y adelantar estas actividades paralelamente a los estudios y diseños. El objetivo es que se adicione el contrato de estudios, diseños y obra para que ellos adelanten las adecuaciones del terreno (demoliciones, estructuras de contención, rellenos, etc.). Se le manifiesta al arquitecto que es procedente que se adicione el contrato de estudios, diseños y obra para reducir tiempos y no es necesario generar un contrato adicional para adecuación del terreno.


En términos generales, el Arq. Parada confirma la adición de recursos para adecuación del terreno y manifiesta que se darán inicio a dichas actividades paulatinamente con el avance de los estudios y diseños.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior, firman el presente documento

Firma



REMBERTO MARTINEZ POLO
Supervisor Convenio SIN

Firma



DIANA PAOLA ALARCÓN SEVILLANO
Apoyo a la Supervisión SIN

Firma



CARLOS PARADA
Supervisor convenio Municipio
