
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	ITEM		17,1
CHAPARRAL - TOLIMA	HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	29	MM	5	AA	2020	LOCALIZACIÓN	CHAPARRAL	ELABORÓ	Ing, celso roman gonzalez

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS	ITEM	ESTUCO ACRILICO Y PINTURA ACRILICA TIPO ACRILTEX INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	UNID.	m2	UBICACIÓN	CHAPARRAL



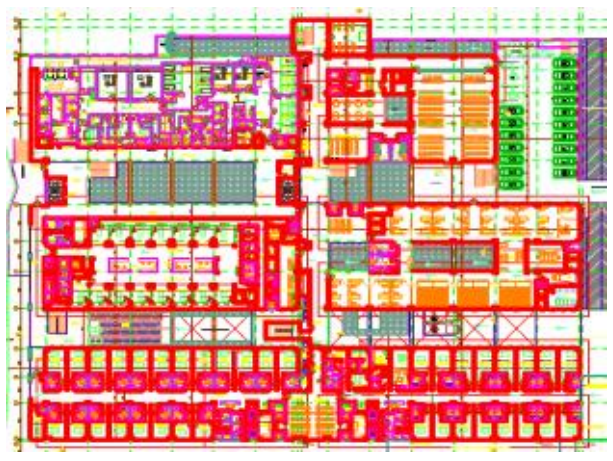

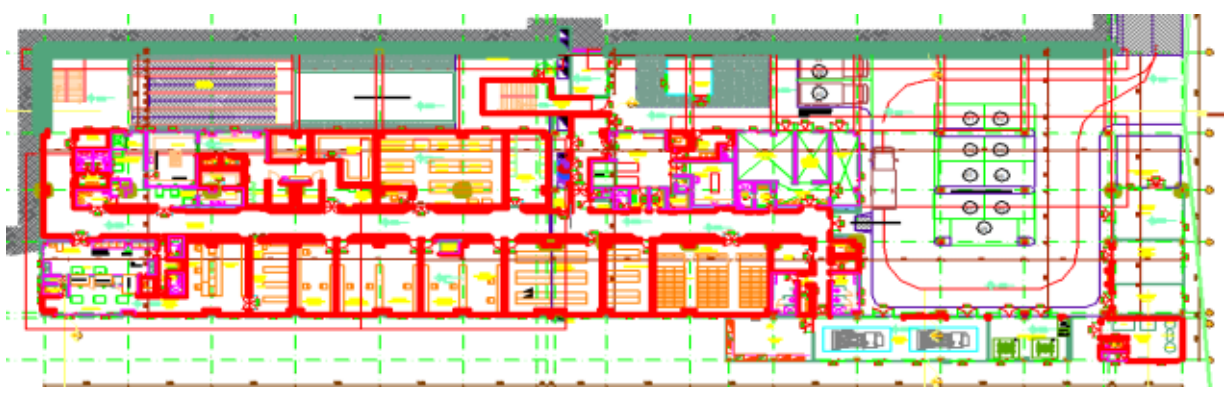

Localización	Dimensiones				Longitud(M)	Medida Total
	UND	Ancho (m)	Alto(m)			
PLANTA 1			2,75		3277,853775	9014,097881
PLANTA BAJA 1			2,90		2753,740815	7985,848364
PLANTA BAJA 2			2,55		781,16031	1991,958791
MURO BAJO			1,10		52,8223	58,10453
SOBRE CERAMICA			0,90		2094,44865	1885,003785
menos vanos ventanas						0
V 0	-11,00	0,45	0,8			-3,96
V 1	-14,00	0,67	1,4			-13,132
V 1	-10,00	0,67	1,4			-9,38
V 2	-6,00	0,60	1,4			-5,04
V 2	-4,00	0,60	1,4			-3,36
V 5	-2,00	0,69	1,4			-1,932
V 5	-2,00	0,69	1,4			-1,932
V 6	-2,00	0,71	1,4			-1,988
V 7	-2,00	0,75	1,4			-2,1
V 10	-23,00	0,80	1,4			-25,76
V 10	-10,00	0,80	1,4			-11,2
V 11	-24,00	0,85	0,8			-16,32
V 11	-3,00	0,85	0,8			-2,04
V 12	-12,00	0,85	0,8			-8,16
V 12	-5,00	0,85	0,8			-3,4
V 14	-58,00	0,92	1,4			-74,704
V 16	-5,00	1,00	1,4			-7
V 16	-3,00	1,00	1,4			-4,2
V 17	-10,00	1,00	0,8			-8
V 17	-4,00	1,00	0,8			-3,2
V 19	-11,00	1,08	0,8			-9,504
V 19	-2,00	1,08	0,8			-1,728
V 20	-8,00	1,08	1,4			-12,096
V 21	-7,00	1,10	1,4			-10,78
V 22	-30,00	1,15	1,4			-48,3
V 22	-5,00	1,15	1,4			-8,05
V 23	-16,00	1,19	1,4			-26,656
V 23	-11,00	1,19	1,4			-18,326
V 24	-47,00	0,80	0,8			-30,08
V 24	-13,00	0,80	0,8			-8,32
V 25	-2,00	1,25	1,4			-3,5
V 26	-38,00	1,28	0,8			-38,912
V 26	-1,00	1,28	0,8			-1,024
V 27	-108,00	1,28	1,4			-193,536
V 27	-22,00	1,28	1,4			-39,424
V 28	-6,00	0,80	1,75			-8,4
V 29	-10,00	1,30	1,4			-18,2
V 29	-2,00	1,30	1,4			-3,64
V 33	-5,00	1,60	1,4			-11,2
V 34	-26,00	1,70	0,8			-35,36
V 34	-7,00	1,70	0,8			-9,52
V 35	-15,00	1,70	1,4			-35,7
V 38	-70,00	1,93	1,4			-189,14
V 38	-8,00	1,93	1,4			-21,616
V 39	-3,00	2,07	1,4			-8,694
V 39	-2,00	2,07	1,4			-5,796
V 41	-40,00	2,19	1,4			-122,64
V 41	-5,00	2,19	1,4			-15,33
V 42	-1,00	2,40	1,4			-3,36
V 43	-1,00	2,45	2,5			-6,125
V 45	-5,00	2,50	1,4			-17,5
V 45	2,00	2,50	1,4			7
V 49	-1,00	6,40	0,8			-5,12
V 50	-15,00	6,40	1,4			-134,4
V 50	-1,00	6,40	1,4			-8,96
V 56	-4,00	0,90	0,6			-2,16
V 57	-1,00	0,60	0,85			-0,51
Subtotal						19.621,60
Vienen						
TOTAL						**19.621,60**

OBSERVACIONES: MEDIDAS TOMADAS DE AUTOCAD

UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021
NIT, 901548201-5


REPRESENTANTE LEGAL CELSO ROMAN GONZALEZ
MAT PROF 25202-23283 CND

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	ITEM		17,3
CHAPARRAL - TOLIMA	HOJA	1		DE 1

FECHA	DD	29	MM	5	AA	2020	LOCALIZACIÓN	CHAPARRAL	ELABORÓ	Ing. celso roman gonzalez

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS	ITEM	ESTUCO ACRILICO Y KORAZA SOBRE SUPERFICIE LISA INCLUYE SELLOMAX EXTERIOR , FILOS Y DILATACIONES	UNID.	m2	UBICACIÓN	CHAPARRAL

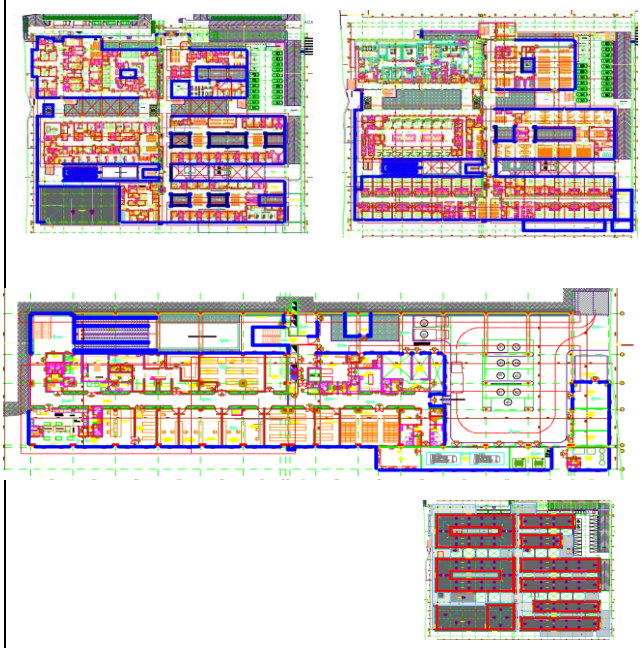

Localización	Dimensiones UND	Ancho (m)	Alto(m)		Longitud(M)	Medida Total
PLANTA 1			3,80		1015,483875	3858,838725
PLANTA BAJA 1			3,90		989,224425	3857,975258
PLANTA BAJA 2			3,90		387,800595	1512,422321
PLANTA 1 superior vanos			1,50		276,3576	414,5364
PLANTA BAJA 1 superior vanos			1,50		80,4105	120,61575
restos vanos ventanas						
V 0	-5,00	0,45	0,8			-1,8
V 1	-4,00	0,67	1,4			-3,752
V 2	-1,00	0,60	1,4			-0,84
V 5	-2,00	0,69	1,4			-1,932
V 6	-2,00	0,71	1,4			-1,988
V 9	-2,00	0,80	2,4			-3,84
V 10	-2,00	0,80	1,4			-2,24
V 11	-3,00	0,85	0,8			-2,04
V 12	-11,00	0,85	0,8			-7,48
V 14	-56,00	0,92	1,4			-72,128
V 16	-2,00	1,00	1,4			-2,8
V 17	-7,00	1,00	0,8			-5,6
V 20	-8,00	1,08	1,4			-12,096
V 21	-7,00	1,10	1,4			-10,78
V 22	-25,00	1,15	1,4			-40,25
V 24	-10,00	0,80	0,8			-6,4
V 26	-29,00	1,28	0,8			-29,696
V 27	-107,00	1,28	1,4			-191,744
V 30	-3,00	1,35	1,4			-5,67
V 33	-5,00	1,60	1,4			-11,2
V 34	-25,00	1,70	0,8			-34
V 35	-17,00	1,70	1,4			-40,46
V 38	-67,00	1,93	1,4			-181,034
V 41	-47,00	2,19	1,4			-144,102
V 42	-1,00	2,40	1,4			-3,36
V 44	-1,00	2,50	0,8			-2
V 45	-5,00	2,50	1,4			-17,5
V 49	-1,00	6,40	0,8			-5,12
V 50	-14,00	6,40	1,4			-125,44
muro antepechos cubierta			1,05		1116,0757	1171,879485

OBSERVACIONES: MEDIDAS TOMADAS DE AUTOCAD

Subtotal	9.968,98
Vienen	
TOTAL	9.968,98

UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021
NIT, 901548201-5








REPRESENTANTE LEGAL CELSO ROMAN GONZALEZ
MAT PROF 25202-23283 CND

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	ITEM	17,5
CHAPARRAL - TOLIMA	HOJA 1	DE	1

FECHA	DD	29	MM	5	AA	2020	LOCALIZACIÓN	CHAPARRAL	ELABORÓ	Ing, celso roman gonzalez

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS	ITEM	IMPERMEABILIZACION MANTO EDIL 3MM	UNID.	m2	UBICACIÓN	CHAPARRAL

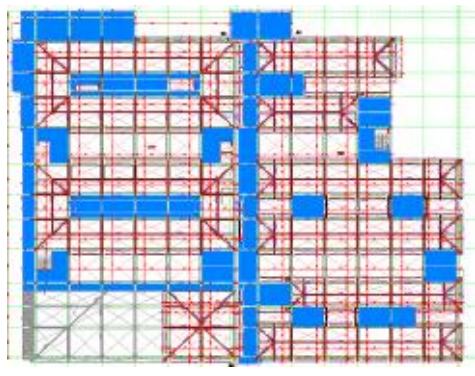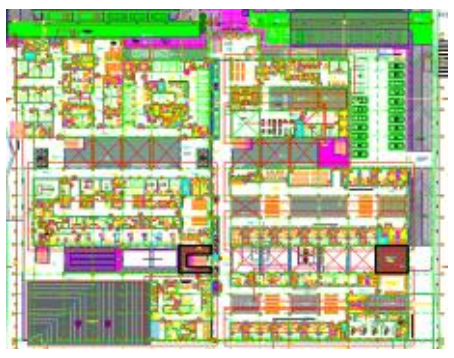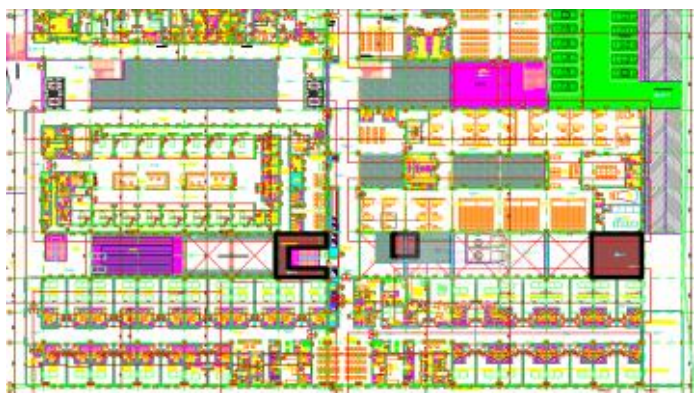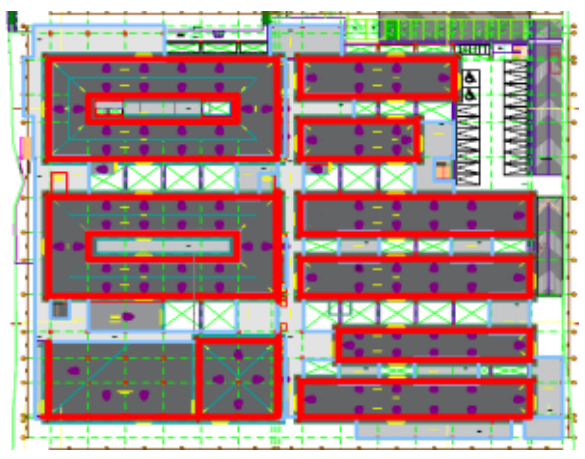	Dimensiones			Area (m2)	Medida Total
	UND	Ancho (m)	Alto (m)		
				2.002,964	2002,96
planta 1				101,106	101,11
planta baja 1				117,0752	117,08
media caña sobre cubierta		1116,08	0,15		167,411355
Subtotal					2.388,56
Vienen					
TOTAL					2.388,56

OBSERVACIONES: MEDIDAS TOMADAS DE AUTOCAD

UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021
NIT, 901548201-5

REPRESENTANTE LEGAL CELSO ROMAN GONZALEZ
MAT PROF 25202-23283 CND

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	ITEM	17,4
CHAPARRAL - TOLIMA	HOJA 1	DE 1	
FECHA DD 29 MM 5 AA 2020 LOCALIZACIÓN CHAPARRAL	ELABORÓ	Ing, celso roman gonzalez	

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA

CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS	ITEM	PINTURA EPOXICA (incluye estuco acrilico)	UNID.	m2	UBICACIÓN	CHAPARRAL



Localización	Dimensiones UND	Ancho (m)	Alto(m)		Longitud(M)	Medida Total
PLANTA			2,90		642,840135	1864,236392
SOBRE CERAMICA			0,90		198,941505	
menos vanos ventanas						
V 2	-7,00	0,60	1,4			-5,88
V 2	-3,00	0,60	1,4			-2,52
V 3	-3,00	0,75	1,4			-3,15
V 3	-3,00	0,75	1,4			-3,15
V 10	-18,00	0,80	1,4			-20,16
V 10	-9,00	0,80	1,4			-10,08
V 22	-8,00	1,15	1,4			-12,88
V 22	-5,00	1,15	1,4			-8,05
V 24	-8,00	0,80	0,8			-5,12
V 24	-4,00	0,80	0,8			-2,56
V 26	-7,00	1,28	0,8			-7,168
V 28	-1,00	0,80	1,75			-1,4
V 29	-10,00	1,30	1,4			-18,2
V 29	-5,00	1,30	1,4			-9,1
V 30	-5,00	1,35	1,4			-9,45
V 34	-4,00	1,70	0,8			-5,44
V 34	-4,00	1,70	0,8			-5,44
V 37	-2,00	1,85	1,4			-5,18
V 41	-2,00	2,19	1,4			-6,132
V 41	-1,00	2,19	1,4			-3,066
V 56	-5,00	0,90	0,6			-2,7
Subtotal						1.717,41
Vienen						
TOTAL						1.717,41

OBSERVACIONES: MEDIDAS TOMADAS DE AUTOCAD

UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021
NIT, 901548201-5

REPRESENTANTE LEGAL CELSO ROMAN GONZALEZ
MAT PROF 25202-23283 CND


HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S.E.	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	ITEM	17,5


CHAPARRAL - TOLIMA		HOJA	1		DE	1
FECHA	DD 29 MM 5 AA 2020	LOCALIZACIÓN	CHAPARRAL	ELABORÓ	Ing, celso roman gonzalez	


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA


CAPÍTULO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURAS	ITEM	IMPERMEABILIZACION SIKAPLAN 12 PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	UNID.	m2	UBICACIÓN	CHAPARRAL














	ÁREA		
PLANTA TANQUE A			
MURO A	18,77	m2	
MURO B	11,50	m2	
MURO C	9,71	m2	
MURO D	18,77	m2	
PLACA SUPERIOR 1	23,08	m2	
PLACA INFERIOR 2	22,57	m2	
PLACA INFERIOR 3	1,82	m2	
PLACA INFERIOR 4	1,42	m2	
TOTAL	107,64		
PLANTA TANQUE B			
MURO A	18,77	m2	
MURO B	10,47	m2	
MURO C	12,39	m2	
MURO D	18,77	m2	
PLACA SUPERIOR 1	24,97	m2	
PLACA INFERIOR 2	24,33	m2	
PLACA INFERIOR 3	1,96	m2	
PLACA INFERIOR 4	1,54	m2	
TOTAL	113,20		
PLANTA TANQUE DE			
MURO A	18,36	m2	
MURO B	12,57	m2	
MURO C	10,68	m2	
MURO D	18,36	m2	
PLACA SUPERIOR 1	18,69	m2	
PLACA INFERIOR 2	18,25	m2	
PLACA INFERIOR 3	1,74	m2	
PLACA INFERIOR 4	1,37	m2	
TOTAL	100,02		
CUARTO DE BOMBA DE			
MURO A	12,60	m2	
MURO B	11,81	m2	
MURO C	14,38	m2	
MURO D	15,16	m2	
PLACA SUPERIOR 1	8,36	m2	
PLACA INFERIOR 2	12,44	m2	
MURO 3	2,56	m2	
MURO 4	2,56	m2	
PLACA INFERIOR 5	12,44	m2	
TOTAL	92,31		
PLANTA DE TANQUE DE			
MURO A	7,56	m2	
MURO B	7,92	m2	
MURO C	7,92	m2	
MURO D	9,07	m2	
PLACA SUPERIOR 1	8,51	m2	
PLACA INFERIOR 2	7,65	m2	
PLACA INFERIOR 3	1,53	m2	
PLACA INFERIOR 4	1,20	m2	
TOTAL	51,36		
DESARENADOR			
MURO A	0,70	m2	
MURO B	5,91	m2	
MURO C	5,91	m2	
MURO D	0,37	m2	
PLACA SUPERIOR 1	0,99	m2	
PLACA SUPERIOR 2	1,09	m2	
PLACA SUPERIOR 3	0,74	m2	
PLACA INFERIOR 4	0,40	m2	
MURO 5	0,10	m2	
MURO 6	1,50	m2	
PLACA INFERIOR 7	2,03	m2	
PLACA INFERIOR 8	1,07	m2	
MURO 9	1,60	m2	
MURO 10	0,60	m2	
PLACA INFERIOR	0,40	m2	
MURO E	0,95	m2	
MURO F	0,95	m2	
MURO G	0,15	m2	
MURO H	0,95	m2	
MURO I	1,15	m2	
MURO J	0,15	m12	
TOTAL	27,71		
TOTAL GENERAL	492,24		

OBSERVACIONES: IMÁGENES TOMADAS DE AUTOCAD.

UNION TEMPORAL DISEÑOS CHAPARRAL 2021
NIT, 901548201-5



REPRESENTANTE LEGAL CELSO ROMAN GONZALEZ
MAT PROF 25202-23283 CND
