

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completad
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**126 días**	**lun 14/02/22**	**mié 13/07/22**	**$608.272.178,72**	**58%**
2	**1.1**	**FIRMA DE ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 14/02/22**	**lun 14/02/22**	**$0,00**	**100%**
3	**1.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**55 días**	**lun 14/02/22**	**mié 20/04/22**	**$9.040.112,43**	**100%**
4	1.2.1	Revisión de diseños iniciales	35 días	lun 14/02/22	vie 25/03/22	$0,00	100%
5	1.2.2	Radicación de requisitos para PMT	23 días	mar 22/03/22	mié 20/04/22	$0,00	100%
6	1.2.4	Apropiación de diseños	1 día	vie 25/03/22	sáb 26/03/22	$0,00	100%
7	1.2.5	Elaboración de diagnósticos	30 días	lun 14/02/22	vie 18/03/22	$9.040.112,43	100%
8	**1.3**	**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**mié 20/04/22**	**mié 20/04/22**	**$0,00**	**100%**
9	**1.4**	**CIV'S MALLA VIAL**	**52,25 días**	**mar 10/05/22**	**mar 12/07/22**	**$248.415.585,81**	**31%**
10	**1.4.1**	**CIV 14000567**	**45 días**	**mar 17/05/22**	**lun 11/07/22**	**$140.192.390,93**	**12%**
11	1.4.1.1	Socialización y preliminares de componentes	2 días	mar 17/05/22	mié 18/05/22	$0,00	100%
12	1.4.1.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	$1.029.659,68	0%
13	1.4.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	2 días	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$7.062.274,09	0%
14	1.4.1.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	$60.237,58	0%
15	1.4.1.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	2 días	vie 10/06/22	lun 13/06/22	$3.051.293,75	0%
16	1.4.1.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	3 días	vie 10/06/22	mar 14/06/22	$114.876.711,72	0%
17	1.4.1.10	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	2 días	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$10.120.083,75	0%
18	1.4.1.12	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	1 día	sáb 9/07/22	lun 11/07/22	$145.316,29	0%
19	1.4.1.13	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	1 día	sáb 9/07/22	lun 11/07/22	$115.485,66	0%
20	1.4.1.14	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	1 día	sáb 9/07/22	lun 11/07/22	$2.515.252,98	0%
21	1.4.1.15	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M	1 día	sáb 9/07/22	lun 11/07/22	$1.216.075,43	0%
22	**1.4.3**	**CIV 14001505**	**52 días**	**mar 10/05/22**	**mar 12/07/22**	**$56.210.171,89**	**50%**
23	1.4.3.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 10/05/22	mar 10/05/22	$0,00	100%
24	1.4.3.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22	$344.993,60	100%
25	1.4.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	1 día	mié 11/05/22	jue 12/05/22	$2.839.508,34	100%
26	1.4.3.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mar 10/05/22	mié 11/05/22	$60.237,58	100%
27	1.4.3.16	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$0,00	0%
28	1.4.3.17	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$0,00	0%
29	1.4.3.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mié 11/05/22	jue 12/05/22	$1.022.354,12	100%
30	1.4.3.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	1 día	mié 11/05/22	jue 12/05/22	$46.188.150,86	100%

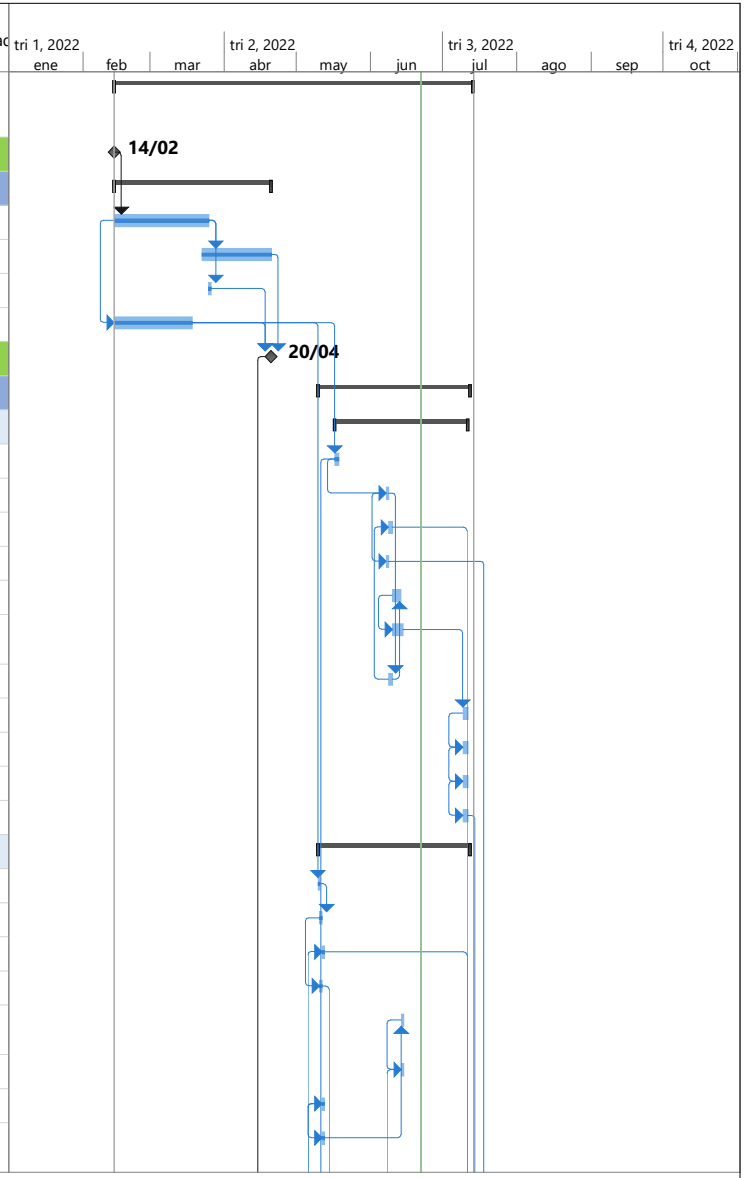

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: mié 22/06/22

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completad
31	1.4.3.18	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) fallo.	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$0,00	0%
32	1.4.3.10	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	1 día	mié 11/05/22	jue 12/05/22	$4.068.953,12	100%
33	1.4.3.12	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$290.632,58	0%
34	1.4.3.13	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$230.971,31	0%
35	1.4.3.14	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$784.890,99	0%
36	1.4.3.15	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$379.479,39	0%
37	**1.4.6**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**46 días**	**mar 17/05/22**	**mar 12/07/22**	**$52.013.022,99**	**32%**
38	**1.5**	**CIV'S CICLORUTAS**	**45 días**	**jue 19/05/22**	**mié 13/07/22**	**$235.798.986,97**	**15%**
39	**1.5.1**	**CIV 14000009**	**37 días**	**jue 19/05/22**	**mar 5/07/22**	**$37.342.806,25**	**40%**
40	1.5.1.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	jue 19/05/22	vie 20/05/22	$0,00	100%
41	1.5.1.2	REPLANTEO GENERAL	3 días	mié 1/06/22	vie 3/06/22	$263.989,37	71%
42	1.5.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	jue 2/06/22	jue 2/06/22	$1.267.463,14	100%
43	1.5.1.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	$0,00	100%
44	1.5.1.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	jue 2/06/22	jue 2/06/22	$439.462,82	100%
45	1.5.1.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	$782.306,16	0%
46	1.5.1.10	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	$29.252.072,88	0%
47	1.5.1.11	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	jue 2/06/22	vie 3/06/22	$1.816.246,86	56%
48	1.5.1.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	2 días	vie 1/07/22	mar 5/07/22	$290.632,58	0%
49	1.5.1.14	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	2 días	vie 1/07/22	mar 5/07/22	$230.971,31	0%
50	1.5.1.15	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	2 días	vie 1/07/22	mar 5/07/22	$2.003.498,05	0%
51	1.5.1.16	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	2 días	jue 2/06/22	vie 3/06/22	$27.511,11	56%
52	1.5.1.18	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	2 días	vie 1/07/22	mar 5/07/22	$968.651,97	0%
53	**1.5.2**	**CIV 14000018**	**27 días**	**mié 8/06/22**	**mar 12/07/22**	**$8.657.821,49**	**0%**
54	1.5.2.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$0,00	0%
55	1.5.2.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$58.818,22	0%
56	1.5.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$282.397,46	0%
57	1.5.2.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$97.914,63	0%
58	1.5.2.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$174.301,93	0%
59	1.5.2.10	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$6.517.515,82	0%
60	1.5.2.11	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$404.669,36	0%
61	1.5.2.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$290.632,58	0%
62	1.5.2.14	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$230.971,31	0%

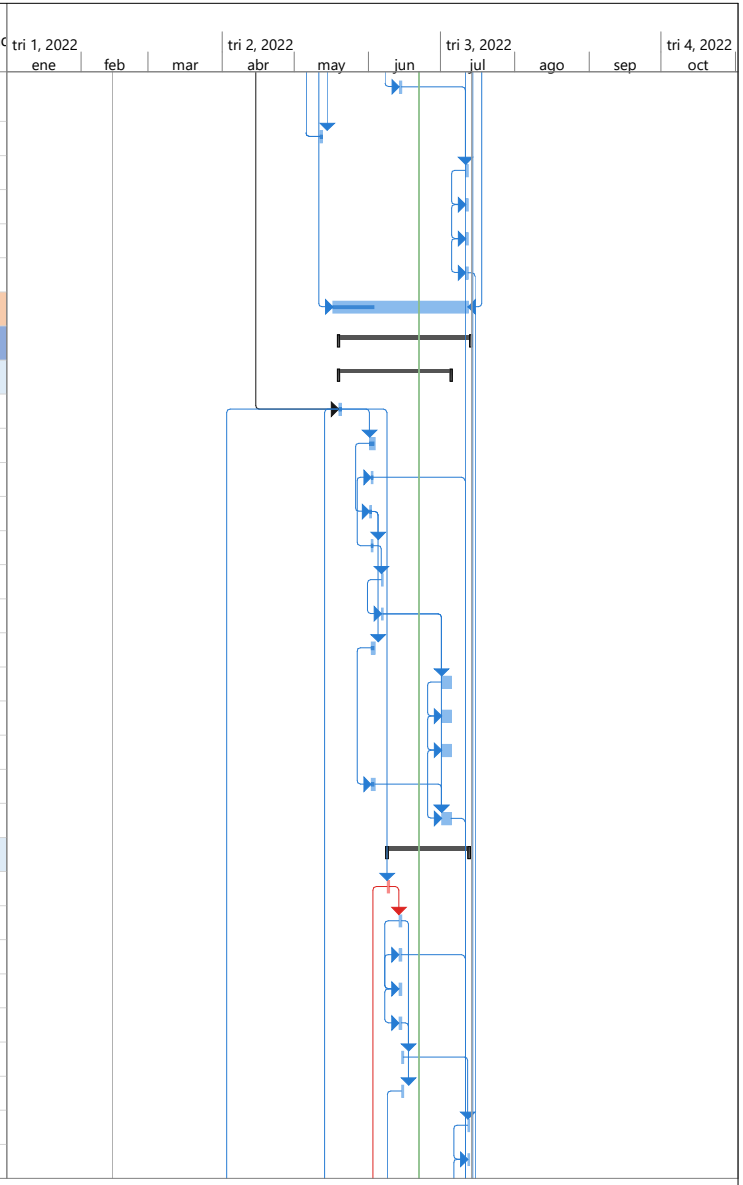

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: mié 22/06/22

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completad
63	1.5.2.15	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$375.186,90	0%
64	1.5.2.16	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$44.017,78	0%
65	1.5.2.18	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$181.395,50	0%
66	**1.5.3**	**CIV 14000025**	**26 días**	**mié 8/06/22**	**mar 12/07/22**	**$14.562.420,36**	**0%**
67	1.5.3.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$0,00	0%
68	1.5.3.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$127.311,21	0%
69	1.5.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$611.245,34	0%
70	1.5.3.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$377.274,08	0%
71	1.5.3.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$211.934,84	0%
72	1.5.3.10	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$10.430.618,35	0%
73	1.5.3.11	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$875.901,16	0%
74	1.5.3.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$290.632,58	0%
75	1.5.3.14	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$230.971,31	0%
76	1.5.3.15	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$918.457,53	0%
77	1.5.3.16	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$44.017,78	0%
78	1.5.3.18	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$444.056,18	0%
79	**1.5.4**	**CIV 14000048**	**26 días**	**mié 8/06/22**	**mar 12/07/22**	**$15.508.781,94**	**0%**
80	1.5.4.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$0,00	0%
81	1.5.4.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$123.353,35	0%
82	1.5.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$592.242,90	0%
83	1.5.4.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$205.346,20	0%
84	1.5.4.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$365.545,36	0%
85	1.5.4.10	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$10.106.350,42	0%
86	1.5.4.11	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$848.671,07	0%
87	1.5.4.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$290.632,58	0%
88	1.5.4.14	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$230.971,31	0%
89	1.5.4.15	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$1.821.157,21	0%
90	1.5.4.16	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$44.017,78	0%
91	1.5.4.18	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$880.493,76	0%
92	**1.5.5**	**CIV 14000067**	**26 días**	**mié 8/06/22**	**mar 12/07/22**	**$21.213.326,60**	**0%**
93	1.5.5.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	$0,00	0%
94	1.5.5.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$183.842,67	0%
95	1.5.5.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$882.663,61	0%

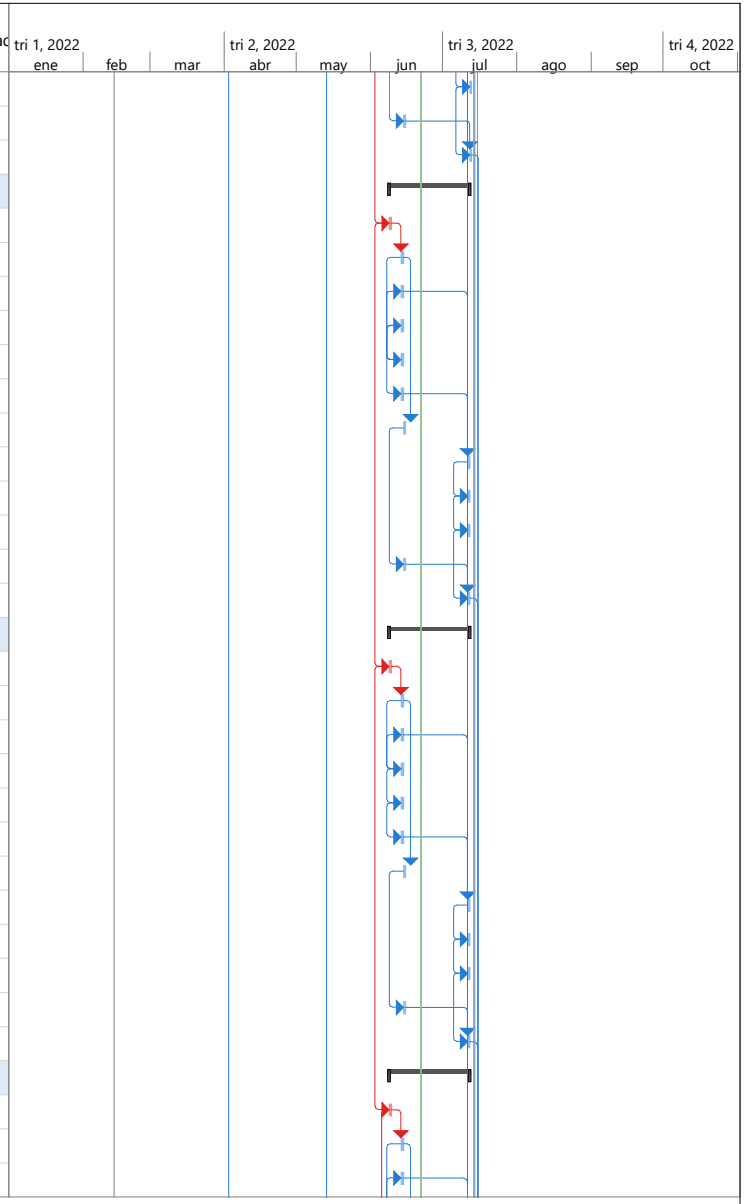

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: mié 22/06/22

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completad
96	1.5.5.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$306.042,70	0%
97	1.5.5.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$544.799,42	0%
98	1.5.5.10	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	$14.357.626,43	0%
99	1.5.5.11	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$1.264.837,58	0%
100	1.5.5.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$290.632,58	0%
101	1.5.5.14	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$230.971,31	0%
102	1.5.5.15	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$2.091.291,78	0%
103	1.5.5.16	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	$49.520,00	0%
104	1.5.5.18	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	1 día	lun 11/07/22	mar 12/07/22	$1.011.098,52	0%
105	**1.5.6**	**CIV 14000102**	**21 días**	**mié 15/06/22**	**mar 12/07/22**	**$38.914.328,52**	**0%**
106	1.5.6.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 15/06/22	jue 16/06/22	$0,00	0%
107	1.5.6.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 21/06/22	mié 22/06/22	$252.995,31	0%
108	1.5.6.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	mar 21/06/22	mié 22/06/22	$1.735.255,10	0%
109	1.5.6.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mar 21/06/22	mié 22/06/22	$0,00	0%
110	1.5.6.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mar 21/06/22	mié 22/06/22	$421.161,02	0%
111	1.5.6.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mar 21/06/22	mié 22/06/22	$749.726,36	0%
112	1.5.6.10	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 21/06/22	mié 22/06/22	$28.226.092,19	0%
113	1.5.6.11	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	$2.486.582,46	0%
114	1.5.6.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$290.632,58	0%
115	1.5.6.14	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$230.971,31	0%
116	1.5.6.15	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$3.002.995,95	0%
117	1.5.6.16	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	$66.026,66	0%
118	1.5.6.18	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	1 día	mar 12/07/22	mar 12/07/22	$1.451.889,58	0%
119	**1.5.7**	**CIV 14000118**	**22 días**	**mié 15/06/22**	**mié 13/07/22**	**$58.862.298,73**	**0%**
120	1.5.7.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mié 15/06/22	jue 16/06/22	$0,00	0%
121	1.5.7.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	$401.525,06	0%
122	1.5.7.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	$2.753.997,33	0%
123	1.5.7.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	$0,00	0%
124	1.5.7.7	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	$668.418,34	0%
125	1.5.7.9	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	$1.189.879,46	0%
126	1.5.7.10	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mié 22/06/22	jue 23/06/22	$44.797.207,50	0%
127	1.5.7.11	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	jue 23/06/22	vie 24/06/22	$3.946.417,73	0%
128	1.5.7.13	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA"	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	$290.632,58	0%

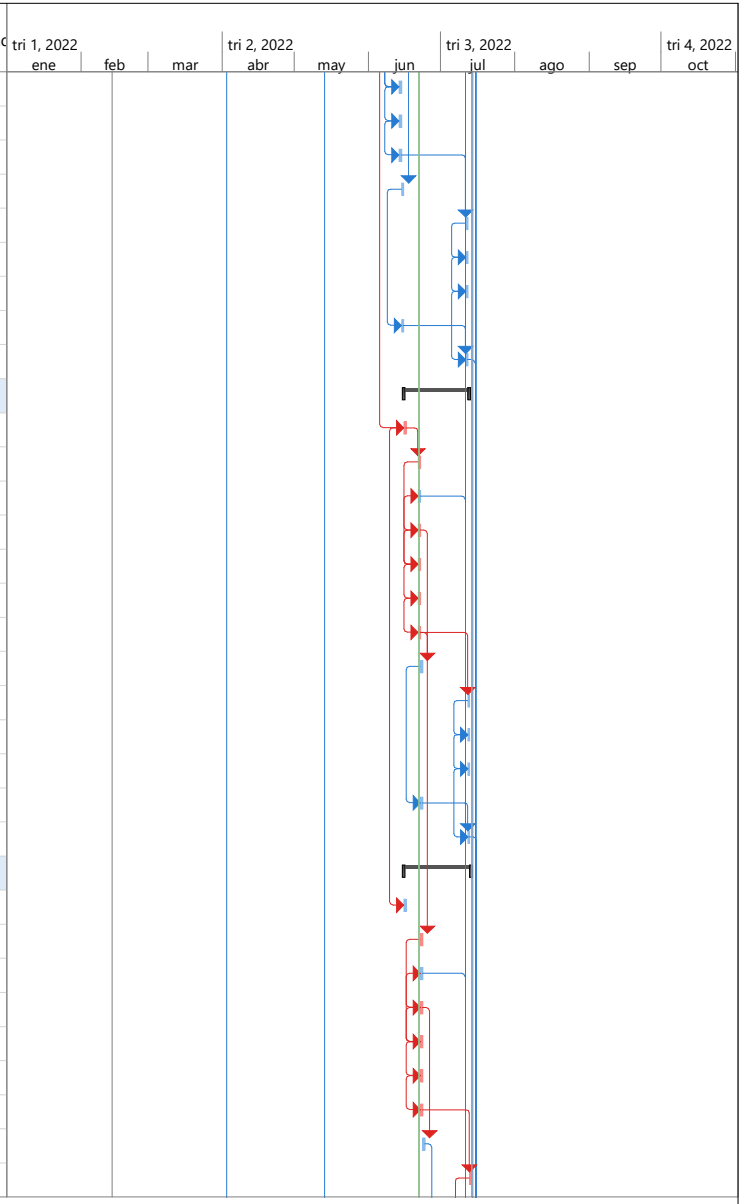

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: mié 22/06/22

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completad
129	1.5.7.14	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE"	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	$230.971,31	0%
130	1.5.7.15	PINTURA EN ESMALTE URETANO GRIS	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	$3.045.016,88	0%
131	1.5.7.16	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO	1 día	vie 24/06/22	sáb 25/06/22	$66.026,66	0%
132	1.5.7.18	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	$1.472.205,88	0%
133	**1.5.8**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**45 días**	**jue 19/05/22**	**mié 13/07/22**	**$40.737.203,08**	**27%**
134	**1.6**	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**57 días**	**vie 8/04/22**	**jue 16/06/22**	**$115.017.493,51**	**75%**
135	**1.6.1**	**CIV 14001393**	**57 días**	**vie 8/04/22**	**jue 16/06/22**	**$96.065.205,49**	**74%**
136	1.6.1.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	vie 8/04/22	lun 11/04/22	$0,00	100%
137	1.6.1.2	REPLANTEO GENERAL	4 días	lun 18/04/22	vie 22/04/22	$448.559,28	100%
138	1.6.1.3	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	10 días	vie 22/04/22	mar 3/05/22	$4.604.202,48	100%
139	1.6.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	vie 22/04/22	sáb 14/05/22	$3.076.586,26	100%
140	1.6.1.5	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE	10 días	vie 22/04/22	mar 3/05/22	$806.505,35	100%
141	1.6.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	10 días	mié 4/05/22	sáb 14/05/22	$1.000.437,22	100%
142	1.6.1.7	PROTECCION A SUMIDEROS	4 días	vie 22/04/22	mié 27/04/22	$75.297,00	100%
143	1.6.1.8	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	6 días	sáb 14/05/22	sáb 21/05/22	$746.713,44	100%
144	1.6.1.11	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI	20 días	mar 24/05/22	jue 16/06/22	$175.002,85	41%
145	1.6.1.12	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)	6 días	sáb 14/05/22	sáb 21/05/22	$4.272.048,25	100%
146	1.6.1.13	LOSETA ACHURADO TIPO A20	10 días	mar 24/05/22	lun 6/06/22	$16.715.856,22	81%
147	1.6.1.14	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS	10 días	mar 24/05/22	lun 6/06/22	$12.721.204,57	81%
148	1.6.1.15	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA ANDENES	15 días	sáb 21/05/22	mié 8/06/22	$27.677.209,20	68%
149	1.6.1.17	SARDINEL TIPO A10	20 días	mar 24/05/22	jue 16/06/22	$0,00	41%
150	1.6.1.18	CANECA TIPO M120	4 días	vie 10/06/22	mié 15/06/22	$1.469.864,28	0%
151	1.6.1.19	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	20 días	mar 24/05/22	jue 16/06/22	$1.184.508,00	41%
152	1.6.1.20	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	20 días	vie 29/04/22	lun 23/05/22	$948.087,84	100%
153	1.6.1.22	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR	4 días	mar 7/06/22	vie 10/06/22	$5.418.036,26	0%
154	1.6.1.23	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2"	6 días	jue 26/05/22	jue 2/06/22	$8.052.249,48	100%
155	1.6.1.24	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO	6 días	jue 26/05/22	jue 2/06/22	$199.327,35	100%
156	1.6.1.25	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	3 días	jue 2/06/22	lun 6/06/22	$6.473.510,16	4%
157	**1.6.2**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**57 días**	**vie 8/04/22**	**jue 16/06/22**	**$18.952.288,02**	**79%**
158	**1.7**	**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**mié 13/07/22**	**mié 13/07/22**	**$0,00**	**0%**

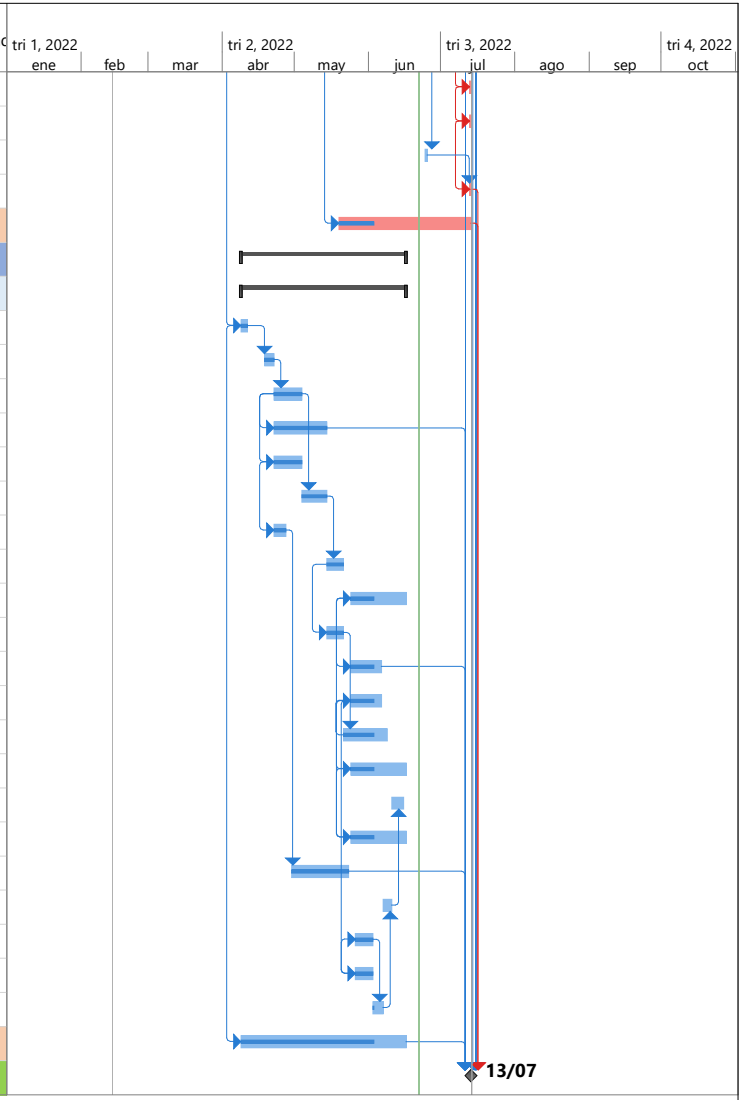

Proyecto: PROGRAMACION MA
Fecha: mié 22/06/22

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	
