
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**20,13 días**	**vie 4/11/22**	**mar 29/11/22**		**30%**
2	**1.1**	**ACTIVIDADES CONTRALORIA**	**20,13 días**	**vie 4/11/22**	**mar 29/11/22**		**30%**
3	1.1.1	**RECORRIDO**	0 días	vie 4/11/22	vie 4/11/22		100%
4	**1.1.2**	**INICIO DE OBRA**	**20,13 días**	**vie 4/11/22**	**mar 29/11/22**		**27%**
5	**1.1.2.1**	**CIV'S MALLA VIAL**	**19 días**	**vie 4/11/22**	**lun 28/11/22**		**49%**
6	**1.1.2.1.1**	**CIV 14000567**	**19 días**	**vie 4/11/22**	**lun 28/11/22**		**48%**
7	1.1.2.1.1.1	RADICACION DE DISEÑOS	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22		100%
8	1.1.2.1.1.2	REMATES DE VIA	2 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22	7FC+4 días	69%
9	1.1.2.1.1.3	DEMARCACION DE VIA	2 días	vie 25/11/22	lun 28/11/22	8FC+10 días	0%
10	**1.1.2.1.2**	**CIV 14001505**	**18 días**	**vie 4/11/22**	**sáb 26/11/22**		**50%**
11	1.1.2.1.2.1	RADICACION DE DISEÑOS	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	7CC	100%
12	1.1.2.1.2.2	SELLO DE FISURAS	1 día	jue 10/11/22	vie 11/11/22	8CC	100%
13	1.1.2.1.2.3	DEMARCACION DE VIA	2 días	jue 24/11/22	sáb 26/11/22	12FC+10 días	0%
14	**1.1.2.2**	**CIV'S CICLORUTAS**	**17,13 días**	**mié 9/11/22**	**mar 29/11/22**		**19%**
15	**1.1.2.2.1**	**CIV 14000009**	**16 días**	**mié 9/11/22**	**lun 28/11/22**		**20%**
16	1.1.2.2.1.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	12CC-2 días	50%
17	1.1.2.2.1.2	REMATES FINALES	2 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	16	0%
18	1.1.2.2.1.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	17FC+7 días	0%
19	**1.1.2.2.2**	**CIV 14000018**	**16 días**	**mié 9/11/22**	**lun 28/11/22**		**18%**
20	1.1.2.2.2.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	16CC	44%
21	1.1.2.2.2.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	vie 18/11/22	20	0%
22	1.1.2.2.2.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	21FC+7 días	0%
23	**1.1.2.2.3**	**CIV 14000025**	**16 días**	**mié 9/11/22**	**lun 28/11/22**		**18%**
24	1.1.2.2.3.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	20CC	44%
25	1.1.2.2.3.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	vie 18/11/22	24	0%
26	1.1.2.2.3.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	25FC+7 días	0%
27	**1.1.2.2.4**	**CIV 14000048**	**16 días**	**mié 9/11/22**	**lun 28/11/22**		**18%**
28	1.1.2.2.4.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	24CC	44%
29	1.1.2.2.4.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	vie 18/11/22	28	0%
30	1.1.2.2.4.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	29FC+7 días	0%
31	**1.1.2.2.5**	**CIV 14000091**	**16 días**	**jue 10/11/22**	**mar 29/11/22**		**20%**
32	1.1.2.2.5.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22	28CC+1 día	50%
33	1.1.2.2.5.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	32	0%
34	1.1.2.2.5.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	33FC+7 días	0%
35	**1.1.2.2.6**	**CIV 14000102**	**16 días**	**jue 10/11/22**	**mar 29/11/22**		**20%**
36	1.1.2.2.6.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22	32CC	50%
37	1.1.2.2.6.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	36	0%
38	1.1.2.2.6.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	37FC+7 días	0%
39	**1.1.2.2.7**	**CIV 14000118**	**16 días**	**jue 10/11/22**	**mar 29/11/22**		**20%**
40	1.1.2.2.7.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22	36CC	50%
41	1.1.2.2.7.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	40	0%
42	1.1.2.2.7.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	41FC+7 días	0%
43	**1.1.2.2.8**	**CIV 14000145**	**16 días**	**jue 10/11/22**	**mar 29/11/22**		**20%**
44	1.1.2.2.8.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22	40CC	50%
45	1.1.2.2.8.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	44	0%
46	1.1.2.2.8.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	45FC+7 días	0%
47	**1.1.2.3**	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**6 días**	**mié 9/11/22**	**mié 16/11/22**		**48%**
48	**1.1.2.3.1**	**CIV 14001393**	**6 días**	**mié 9/11/22**	**mié 16/11/22**		**48%**
49	1.1.2.3.1.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO ESTAMPAD	6 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	8CC-2 días	56%
50	1.1.2.3.1.2	REMPLAZO DE TAPAS EAAB	1 día	mié 16/11/22	mié 16/11/22	49FC-1 día	0%
51	**1.1.3**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**16,5 días**	**vie 4/11/22**	**jue 24/11/22**		**39%**
52	**1.1.4**	**FIN ACTIVIDADES**	**0 días**	**mar 29/11/22**	**mar 29/11/22**	**13;42;38;30;2**	**0%**

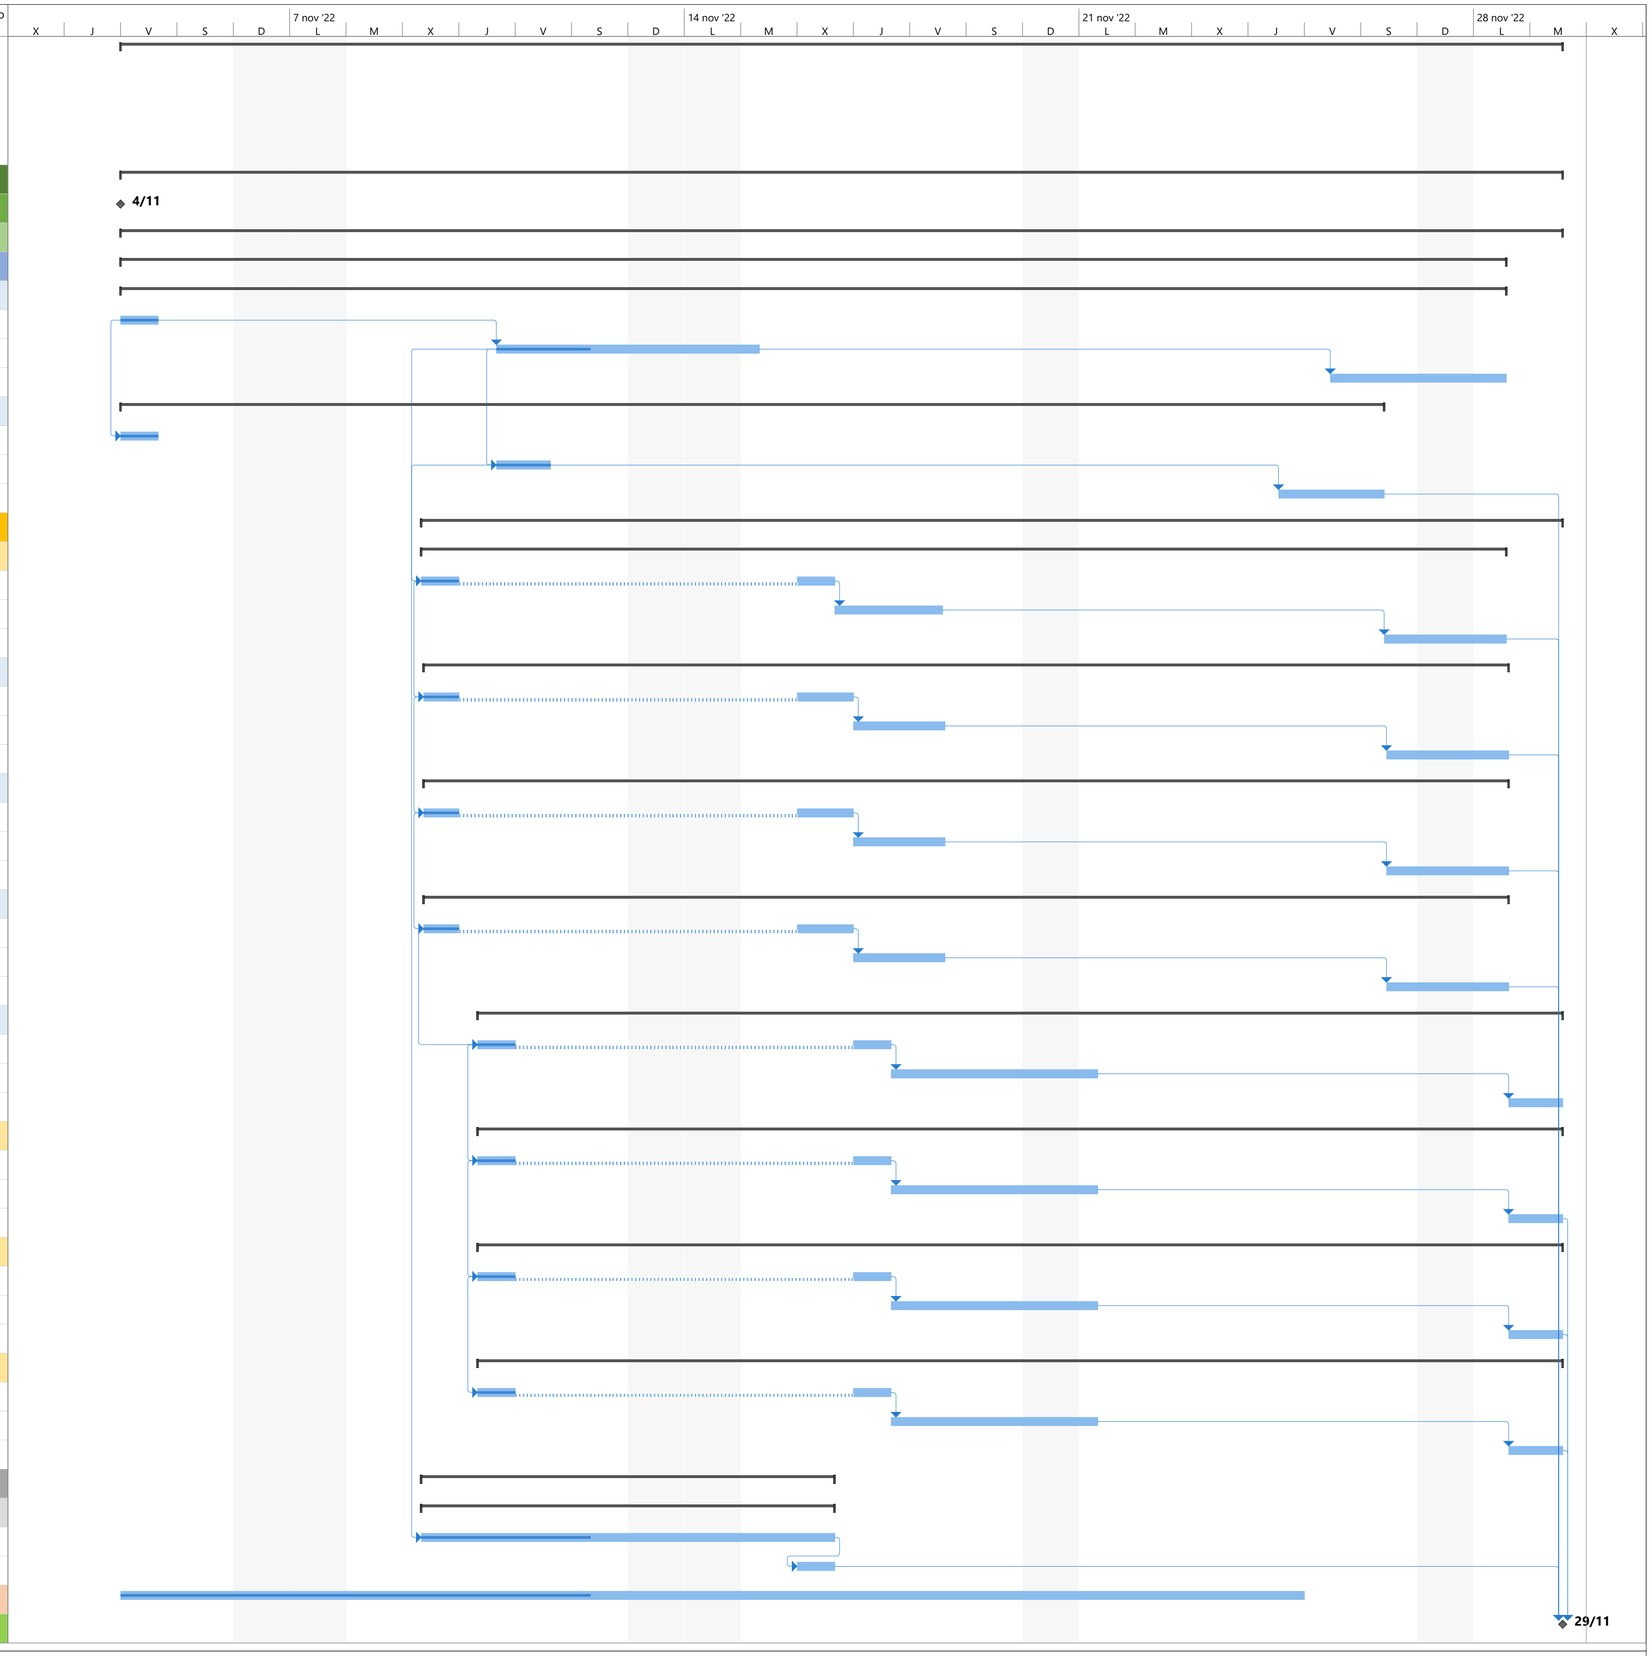

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mar 12/03/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
