
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo	% completado
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS**	**167 días?**	**lun 14/02/22**	**jue 29/12/22**		**$1.029.316.337,84**	**81%**
2	**1.1**	**FIRMA DE ACTA DE INICIO**	**0 días**	**lun 14/02/22**	**lun 14/02/22**		**$0,00**	**100%**
3	**1.2**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**52 días**	**lun 14/02/22**	**lun 18/04/22**		**$9.040.112,43**	**100%**
4	1.2.1	Revisión de diseños iniciales	35 días	lun 14/02/22	sáb 26/03/22	2CC+1 día	$0,00	100%
5	1.2.2	Radicación de requisitos para PMT	20 días	mié 23/03/22	lun 18/04/22	4FC-3 días	$0,00	100%
6	1.2.3	Apropiación de diseños	1 día	sáb 26/03/22	lun 28/03/22	4	$0,00	100%
7	1.2.4	Elaboración de diagnósticos	30 días	lun 14/02/22	sáb 19/03/22	4CC	$9.040.112,43	100%
8	**1.3**	**INICIO DE OBRA**	**114 días?**	**lun 18/04/22**	**jue 29/12/22**	**6;7;5;4**	**$529.784.655,96**	**69%**
9	**1.3.1**	**CIV'S MALLA VIAL**	**114 días?**	**lun 18/04/22**	**jue 29/12/22**		**$260.177.095,76**	**52%**
10	**1.3.1.1**	**CIV 14000567**	**88 días**	**mar 17/05/22**	**jue 29/12/22**		**$134.555.059,97**	**0%**
11	1.3.1.1.1	Socialización y preliminares de componentes	2 días	mar 17/05/22	jue 19/05/22	7FC+48 días	$0,00	0%
12	1.3.1.1.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	11CC+18 días	$1.860.993,30	0%
13	1.3.1.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	3 días	mar 7/06/22	jue 9/06/22	17CC	$6.701.319,96	0%
14	1.3.1.1.4	PROTECCION A SUMIDEROS	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	12CC	$60.237,64	0%
15	1.3.1.1.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	2 días	vie 17/06/22	mar 21/06/22	17	$2.409.015,57	0%
16	1.3.1.1.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100)	3 días	vie 17/06/22	mié 22/06/22	15CC	$108.834.571,17	0%
17	1.3.1.1.7	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE)	3 días	jue 9/06/22	lun 13/06/22	12	$12.254.765,85	0%
18	1.3.1.1.8	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	3 días	lun 26/12/22	jue 29/12/22	19FC+9 días	$637.288,15	0%
19	1.3.1.1.9	ACTIVIDADES CONTRALORIA	7 días	vie 4/11/22	mar 15/11/22	16FC+19 días	$0,00	100%
20	**1.3.1.2**	**CIV 14001505**	**54 días?**	**lun 18/04/22**	**sáb 18/06/22**		**$73.609.012,80**	**0%**
21	1.3.1.2.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 18/05/22	jue 19/05/22	7FC+42 días	$60.237,64	0%
22	1.3.1.2.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	jue 19/05/22	vie 20/05/22	21	$1.451.430,09	0%
23	1.3.1.2.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	1 día	jue 19/05/22	vie 20/05/22	30CC	$60.274.211,96	0%
24	1.3.1.2.3	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	2 días	jue 19/05/22	sáb 21/05/22	22CC	$5.298.717,06	0%
25	1.3.1.2.5	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE CON RETROEXCAVADORA	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	28FC+27 días	$0,00	100%
26	1.3.1.2.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	25CC	$0,00	100%
27	1.3.1.2.3	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	1 día	mié 4/05/22	vie 6/05/22	30CC	$242.329,97	0%
28	1.3.2	CIV'S CICLORUTAS	79 días	jue 12/05/22	vie 13/05/22	27CC	$269.607.560,20	76%
29	1.3.9	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO M	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	26CC	$0,00	100%
30	**1.1**	**CIV 14000009**	**68 días**	**jue 12/05/22**	**vie 13/05/22**	**24**	**$290.632,58**	**0%**
31	1.1.1	Socialización y preliminares de componentes	2 días	jue 24/11/22	sáb 26/11/22	32FC+10 días	$290.632,58	0%
32	1.1.12	ACTIVIDADES CONTRALORIA	5 días	vie 4/11/22	vie 11/11/22	29FC+18 días	$0,00	100%
33	**1.3**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**66 días**	**mar 10/05/22**	**sáb 26/11/22**	**21CC**	**$375.183.443,36**	**0%**
34	**1.3.8**	**FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO**	**79 días**	**jue 19/05/22**	**mié 21/12/22**		**$323.170.420,37**	**37%**
35	**1.3.8.9**	**DEMARCACION Y SEÑALIZACION**	**68 días**	**mar 31/05/22**	**lun 19/12/22**		**$34.343.145,12**	**54%**
36	1.3.8.9.1	ACTIVIDADES CONTRALORIA	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	7FC+59 días	$230.971,31	88%
37	1.3.8.2	CIV 14000018	69 días	mié 22/06/22	sáb 25/06/22	36FC+18 días	$7.826.250,00	9%
38	1.3.8.3	CIV 14000025	69 días	jue 23/06/22	vie 24/06/22	40CC	$12.924.917,56	8%
39	**1.3.8.4**	**CIV 14000048**	**69 días**	**mié 22/06/22**	**jue 23/06/22**	**37CC**	**$32.811.692,61**	**0%**
40	1.3.8.4.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	jue 23/06/22	vie 24/06/22	39	$439.462,82	100%
41	1.3.8.4.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	1 día	mar 28/06/22	mié 29/06/22	40FC+2 días	$782.306,16	100%
42	1.3.8.4.7	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 28/06/22	mié 29/06/22	41CC	$29.252.072,88	100%
43	1.3.8.4.8	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	2 días	jue 23/06/22	sáb 25/06/22	39	$1.816.246,86	100%
44	1.3.8.4.7	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	lun 19/12/22	lun 19/12/22	45FC+13 días	$290.632,58	0%
45	1.3.8.4.1	Socialización y preliminares de componentes	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	42FC+10 días	$230.971,31	31%
46	**1.3.8.2**	**CIV 14000018**	**69 días**	**mar 31/05/22**	**mar 20/12/22**		**$7.826.250,00**	**0%**
47	1.3.8.2.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	36CC	$0,00	100%
48	1.3.8.2.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	47FC+48 días	$58.818,22	0%
49	1.3.8.2.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	sáb 26/11/22	mar 29/11/22	50CC	$282.397,46	0%
50	1.3.8.2.4	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	48CC	$97.914,63	0%
51	1.3.8.2.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	50	$174.301,93	0%
52	1.3.8.2.6	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 29/11/22	mié 30/11/22	51	$6.517.515,82	0%
53	1.3.8.2.7	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	lun 28/11/22	mié 30/11/22	48	$404.669,36	0%
54	1.3.8.2.8	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22	52FC+15 días	$290.632,58	0%
55	**1.3.8.3**	**CIV 14000025**	**69 días**	**mar 31/05/22**	**mar 20/12/22**		**$12.924.917,56**	**0%**
56	1.3.8.3.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	36CC	$0,00	100%
57	1.3.8.3.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	56FC+49 días	$127.311,21	0%
58	1.3.8.3.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	lun 28/11/22	mié 30/11/22	60CC	$611.245,34	0%
59	1.3.8.3.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	60CC	$377.274,08	0%
60	1.3.8.3.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	2 días	lun 28/11/22	mié 30/11/22	57CC	$211.934,84	0%
61	1.3.8.3.6	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	lun 28/11/22	mié 30/11/22	59CC	$10.430.618,35	0%
62	1.3.8.3.7	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mar 29/11/22	mié 30/11/22	57	$875.901,16	0%
63	1.3.8.3.8	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22	61FC+15 días	$290.632,58	0%
64	**1.3.8.4**	**CIV 14000048**	**69 días**	**mar 31/05/22**	**mar 20/12/22**		**$12.763.113,19**	**0%**
65	1.3.8.4.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	mar 31/05/22	mié 1/06/22	56CC	$0,00	100%
66	1.3.8.4.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	65FC+3 días	$123.353,35	100%
67	1.3.8.4.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	71CC	$592.242,90	100%
68	1.3.8.4.4	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22	71	$205.346,20	100%
69	1.3.8.4.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	mar 7/06/22	mar 7/06/22	68CC	$365.545,36	100%
70	1.3.8.4.6	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 7/06/22	mié 8/06/22	69	$10.106.350,42	100%
71	1.3.8.4.7	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	lun 6/06/22	lun 6/06/22	66	$848.671,07	100%
72	1.3.8.4.8	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	lun 19/12/22	mar 20/12/22	73FC+13 días	$290.632,58	0%
73	1.3.8.4.9	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 9/11/22	vie 2/12/22	70FC+26 días	$230.971,31	31%
74	**1.3.8.5**	**CIV 14000091**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$18.061.416,30**	**0%**
75	1.3.8.5.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	65CC-6 días	$0,00	100%
76	1.3.8.5.2	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	75FC+8 días	$0,00	100%
77	1.3.8.5.3	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	76	$183.842,67	100%
78	1.3.8.5.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	79CC	$882.663,61	100%
79	1.3.8.5.5	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	77CC	$306.042,70	100%
80	1.3.8.5.6	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	79CC	$544.799,42	100%
81	1.3.8.5.7	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	vie 3/06/22	lun 6/06/22	80CC	$14.357.626,43	100%
82	1.3.8.5.8	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	2 días	vie 3/06/22	lun 6/06/22	77CC	$1.264.837,58	100%
83	1.3.8.5.9	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	84FC+13 días	$290.632,58	0%
84	1.3.8.5.1	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	81FC+30 días	$230.971,31	26%
85	**1.3.8.6**	**CIV 14000102**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$34.393.416,33**	**0%**
86	1.3.8.6.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	75CC	$0,00	100%
87	1.3.8.6.2	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	86FC+8 días	$0,00	100%
88	1.3.8.6.3	REPLANTEO GENERAL	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	87FC+4 días	$252.995,31	100%
89	1.3.8.6.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	91CC	$1.735.255,10	100%
90	1.3.8.6.5	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	88CC	$0,00	100%
91	1.3.8.6.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	90CC	$421.161,02	100%
92	1.3.8.6.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	91CC	$749.726,36	100%
93	1.3.8.6.8	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	92CC	$28.226.092,19	100%
94	1.3.8.6.9	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	mié 8/06/22	jue 9/06/22	90CC	$2.486.582,46	100%
95	1.3.8.6.1	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	96FC+13 días	$290.632,58	0%
96	1.3.8.6.1	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	94FC+26 días	$230.971,31	26%
97	**1.3.8.7**	**CIV 14000118**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$54.279.049,31**	**0%**
98	1.3.8.7.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	86CC	$0,00	100%
99	1.3.8.7.2	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	98FC+8 días	$0,00	100%
100	1.3.8.7.3	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	99FC+6 días	$401.525,06	100%
101	1.3.8.7.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	106CC	$2.753.997,33	100%
102	1.3.8.7.5	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	100CC	$0,00	100%
103	1.3.8.7.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	106	$668.418,34	100%
104	1.3.8.7.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	1 día	lun 13/06/22	mar 14/06/22	103CC	$1.189.879,46	100%
105	1.3.8.7.8	MEZCLA ASFÁLTICA	1 día	mar 14/06/22	mié 15/06/22	104	$44.797.207,50	100%
106	1.3.8.7.9	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	102	$3.946.417,73	100%
107	1.3.8.7.1	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	108FC+13 días	$290.632,58	0%
108	1.3.8.7.1	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	105FC+21 días	$230.971,31	26%
109	**1.3.8.8**	**CIV 14000145**	**76 días**	**lun 23/05/22**	**mié 21/12/22**		**$54.279.049,31**	**0%**
110	1.3.8.8.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	lun 23/05/22	mar 24/05/22	98CC	$0,00	100%
111	1.3.8.8.2	Semaforización	1 día	jue 2/06/22	vie 3/06/22	110FC+8 días	$0,00	100%
112	1.3.8.8.3	REPLANTEO GENERAL	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	111FC+6 días	$401.525,06	100%
113	1.3.8.8.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	2 días	sáb 11/06/22	mar 14/06/22	118CC	$2.753.997,33	100%
114	1.3.8.8.5	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	vie 10/06/22	sáb 11/06/22	112CC	$0,00	100%
115	1.3.8.8.6	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANT	2 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	118	$668.418,34	100%
116	1.3.8.8.7	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	2 días	lun 13/06/22	mié 15/06/22	115CC	$1.189.879,46	100%
117	1.3.8.8.8	MEZCLA ASFÁLTICA	2 días	mié 15/06/22	vie 17/06/22	116	$44.797.207,50	100%
118	1.3.8.8.9	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO	1 día	sáb 11/06/22	lun 13/06/22	114	$3.946.417,73	100%
119	1.3.8.8.1	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	2 días	mar 20/12/22	mié 21/12/22	120FC+13 días	$290.632,58	0%
120	1.3.8.8.1	ACTIVIDADES CONTRALORIA	19 días	jue 10/11/22	sáb 3/12/22	117FC+20 días	$230.971,31	22%
121	**1.3.8.9**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**79 días**	**jue 19/05/22**	**mié 21/12/22**	**110CC**	**$40.737.203,08**	**19%**
122	**1.6**	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**101 días**	**vie 8/04/22**	**vie 9/12/22**		**$115.017.493,51**	**0%**
123	**1.6.1**	**CIV 14001393**	**92 días**	**vie 22/04/22**	**vie 9/12/22**		**$96.065.205,49**	**0%**
124	1.6.1.1	Socialización y preliminares de componentes	1 día	vie 22/04/22	sáb 23/04/22	36CC-33 días	$0,00	100%
125	1.6.1.2	REPLANTEO GENERAL	4 días	jue 28/04/22	mar 3/05/22	124FC+4 días	$448.559,28	100%
126	1.6.1.3	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO	10 días	mar 3/05/22	vie 13/05/22	125	$4.604.202,48	100%
127	1.6.1.4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	20 días	mar 3/05/22	mié 25/05/22	126CC	$3.076.586,26	100%
128	1.6.1.5	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE	10 días	mar 3/05/22	vie 13/05/22	126CC	$806.505,35	100%
129	1.6.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	10 días	vie 13/05/22	mié 25/05/22	126	$1.000.437,22	100%
130	1.6.1.7	PROTECCION A SUMIDEROS	4 días	mar 3/05/22	vie 6/05/22	128CC	$75.297,00	100%
131	1.6.1.8	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	6 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	129	$746.713,44	100%
132	1.6.1.11	SARDINEL H=0.20M, E=0.15M CONCRETO 3000 P	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	137CC	$175.002,85	100%
133	1.6.1.12	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B)	6 días	mié 25/05/22	mié 1/06/22	131CC	$4.272.048,25	100%
134	1.6.1.13	LOSETA ACHURADO TIPO A20	10 días	vie 3/06/22	mié 15/06/22	132CC	$16.715.856,22	100%
135	1.6.1.14	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS	10 días	vie 3/06/22	mié 15/06/22	136CC+2 días	$12.721.204,57	100%
136	1.6.1.15	CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA ANDENES	15 días	jue 2/06/22	sáb 18/06/22	133	$27.677.209,20	100%
137	1.6.1.17	SARDINEL TIPO A10	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	139CC	$0,00	100%
138	1.6.1.18	CANECA TIPO M120	4 días	mié 22/06/22	mar 28/06/22	141	$1.469.864,28	100%
139	1.6.1.19	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS	20 días	vie 3/06/22	mié 29/06/22	135CC	$1.184.508,00	100%
140	1.6.1.20	ACCESO TEMPORAL A VIVIENDA EN MADERA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN.	20 días	mar 10/05/22	jue 2/06/22	130FC+3 días	$948.087,84	100%
141	1.6.1.22	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR	4 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	144	$5.418.036,26	100%
142	1.6.1.23	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2"	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22	143CC	$8.052.249,48	100%
143	1.6.1.24	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO	6 días	mar 7/06/22	lun 13/06/22	135CC+2 días	$199.327,35	100%
144	1.6.1.25	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M	3 días	lun 13/06/22	jue 16/06/22	142	$6.473.510,16	100%
145	1.6.1.26	ACTIVIDADES CONTRALORIA	20 días	mié 16/11/22	vie 9/12/22	141FC+20 días	$0,00	6%
146	**1.6.2**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**101 días**	**vie 8/04/22**	**vie 9/12/22**	**124CC**	**$18.952.288,02**	**47%**
147	**1.8**	**PROGRAMACIÓN BOSA V1**	**0 días?**	**mié 9/11/22**	**mié 9/11/22**		**$0,00**	**0%**
148	**1.7**	**FIN DEL CONTRATO**	**0 días**	**mié 21/12/22**	**mié 21/12/22**	**33;121;146**	**$0,00**	**0%**

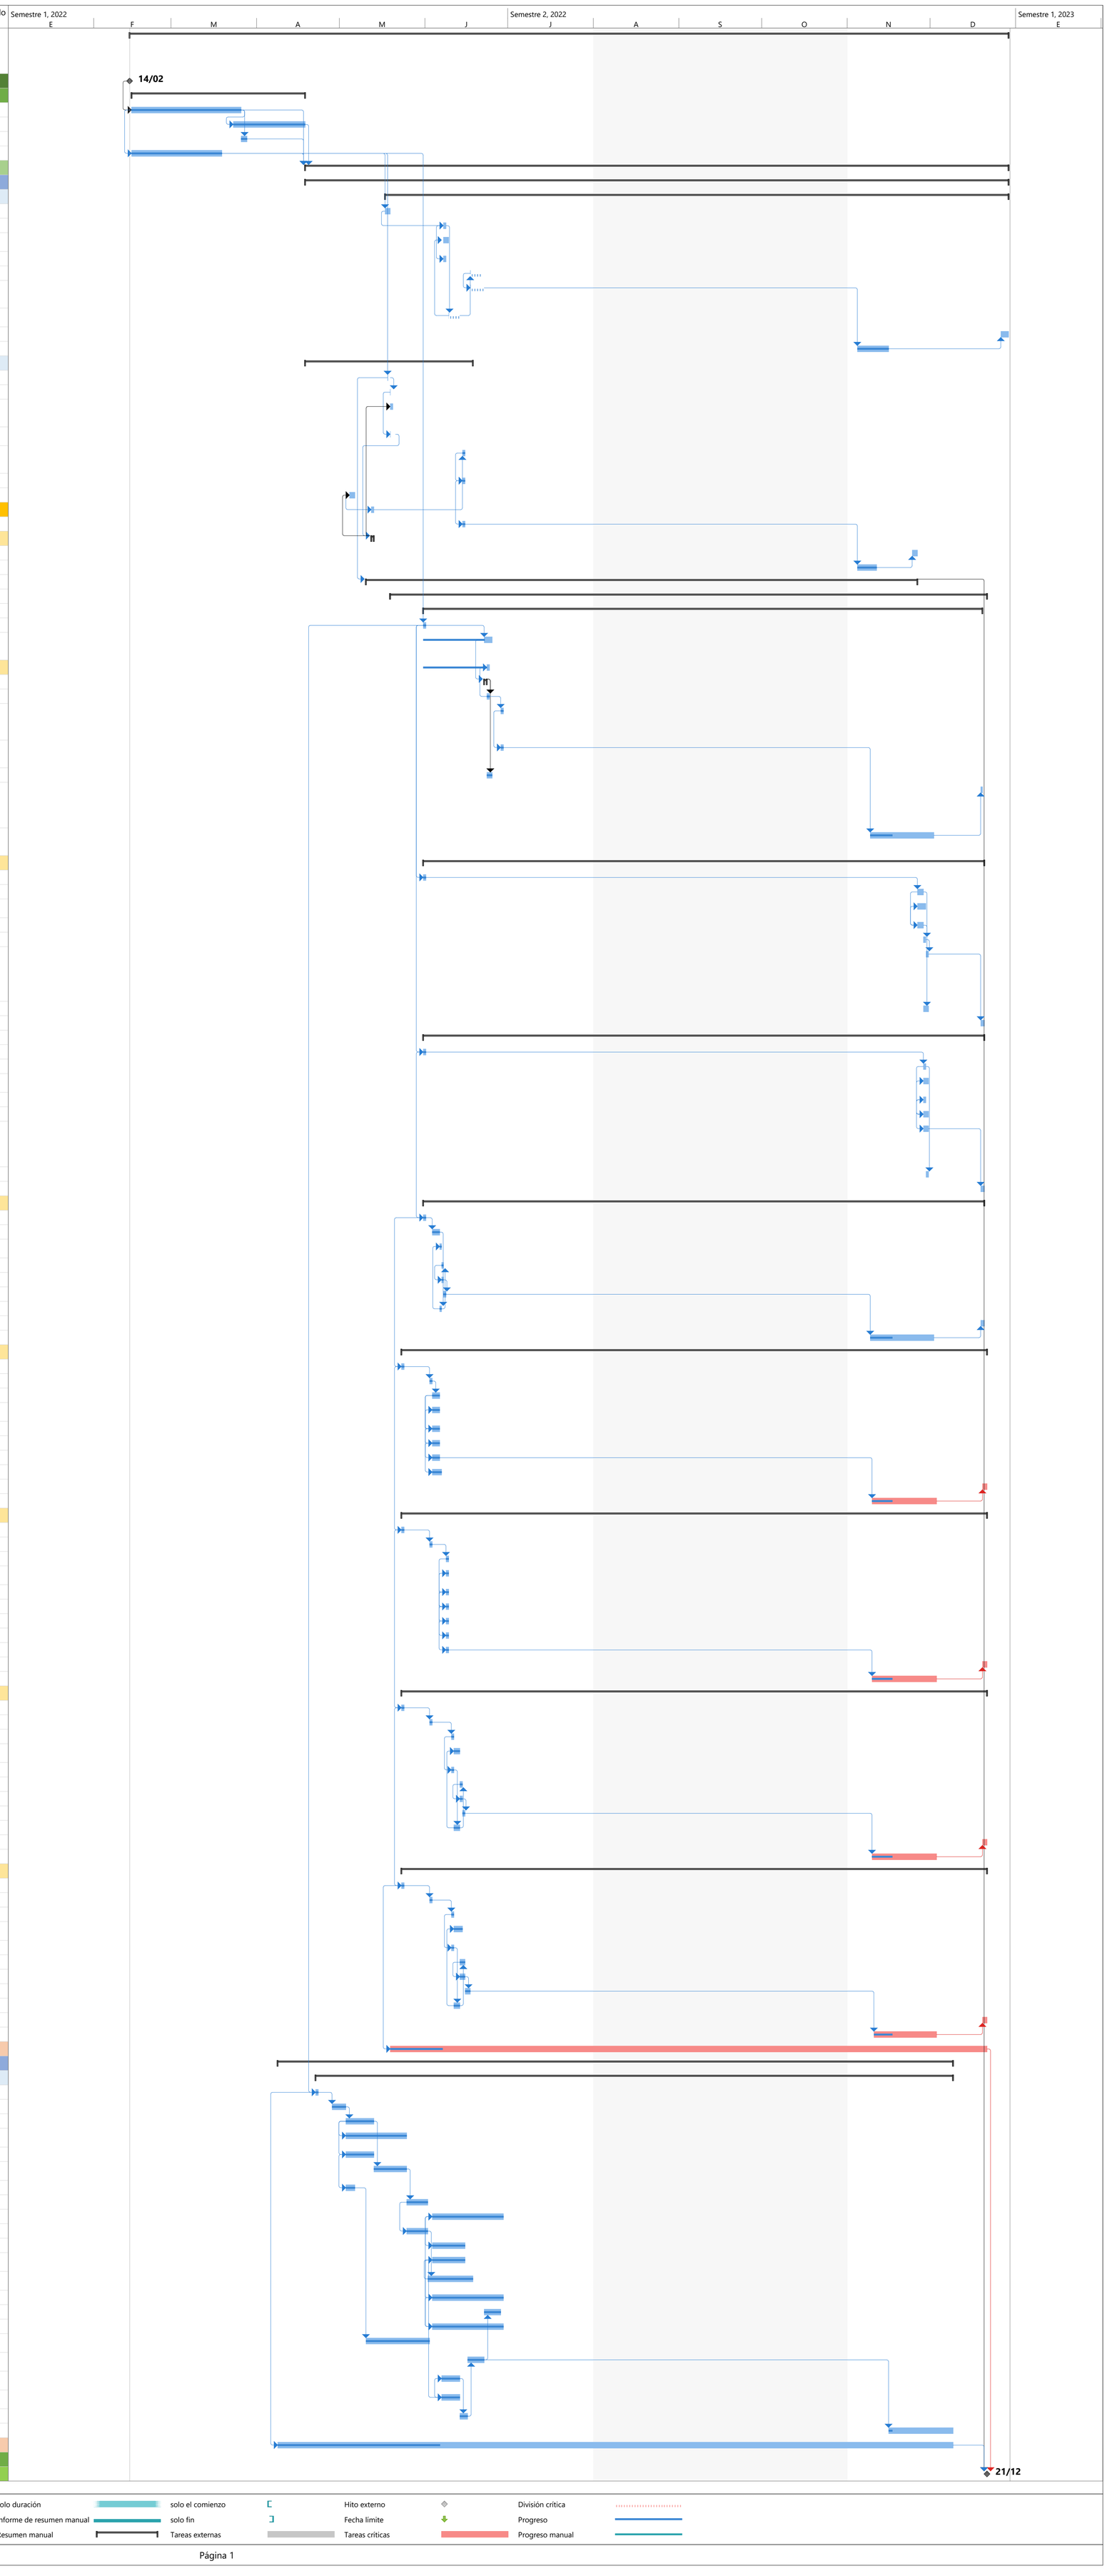

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mar 12/03/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual
