

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**52,5 días?**	**mar 27/09/22**	**lun 28/11/22**		**0%**
2	**1.1**	**ACTIVIDADES CONTRALORIA**	**0 días**	**mar 27/09/22**	**mar 27/09/22**		**100%**
3	1.2	**RECORRIDO**	0 días	mar 27/09/22	mar 27/09/22		100%
4	**1.3**	**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**mar 18/10/22**	**mar 18/10/22**		**0%**
5	**1.4**	**CIV'S MALLA VIAL**	**37,75 días?**	**jue 13/10/22**	**lun 28/11/22**		**0%**
6	**1.4.1**	**CIV 14000567**	**37,75 días**	**jue 13/10/22**	**lun 28/11/22**		**0%**
7	1.4.1.1	RADICACION DE DISEÑOS	1 día	jue 13/10/22	jue 13/10/22		0%
8	1.4.1.2	REMATES DE VIA	3 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22		0%
9	1.4.1.3	DEMARCACION DE VIA	2 días	vie 25/11/22	lun 28/11/22	8FC+10 días	0%
10	**1.4.2**	**CIV 14001505**	**16,5 días?**	**jue 13/10/22**	**mar 1/11/22**		**0%**
11	1.4.2.1	RADICACION DE DISEÑOS	1 día	jue 13/10/22	jue 13/10/22	7CC	0%
12	1.4.2.2	SELLO DE FISURAS	1 día	jue 10/11/22	jue 10/11/22	8CC	0%
13	1.4.2.3	DEMARCACION DE VIA	2 días	mié 23/11/22	vie 25/11/22	12FC+10 días	0%
14	**1.5**	**CIV'S CICLORUTAS**	**11,38 días**	**mié 19/10/22**	**lun 31/10/22**		**0%**
15	**1.5.1**	**CIV 14000009**	**10 días**	**mar 8/11/22**	**sáb 19/11/22**		**0%**
16	1.5.1.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	1 día	mar 8/11/22	mié 9/11/22	12CC-2 días	0%
17	1.5.1.2	REMATES FINALES	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	16	0%
18	1.5.1.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	vie 18/11/22	sáb 19/11/22	17FC+7 días	0%
19	**1.5.2**	**CIV 14000018**	**10 días**	**mar 8/11/22**	**sáb 19/11/22**		**0%**
20	1.5.2.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	1 día	mar 8/11/22	mié 9/11/22	16CC	0%
21	1.5.2.2	REMATES FINALES	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	20	0%
22	1.5.2.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	vie 18/11/22	sáb 19/11/22	21FC+7 días	0%
23	**1.5.3**	**CIV 14000025**	**10 días**	**mar 8/11/22**	**sáb 19/11/22**		**0%**
24	1.5.3.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	1 día	mar 8/11/22	mié 9/11/22	20CC	0%
25	1.5.3.2	REMATES FINALES	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	24	0%
26	1.5.3.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	vie 18/11/22	sáb 19/11/22	25FC+7 días	0%

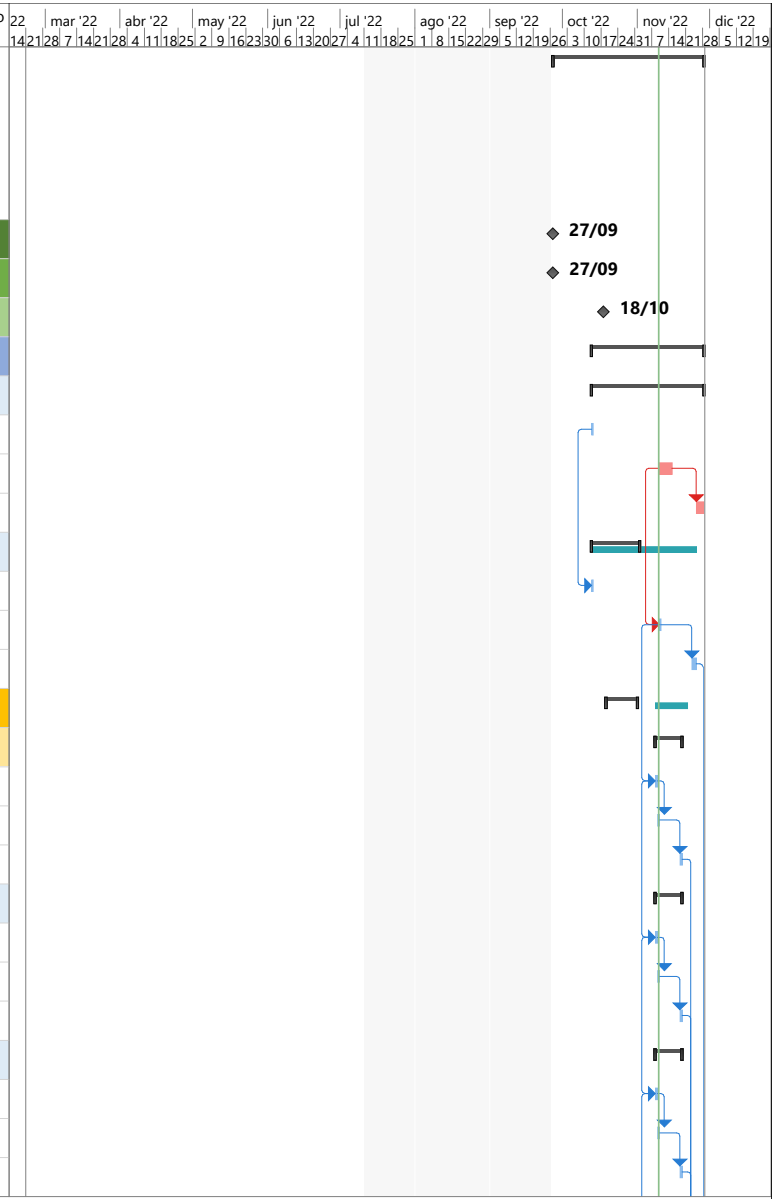

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: jue 10/11/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
27	**1.5.4**	**CIV 14000048**	**10 días**	**mar 8/11/22**	**sáb 19/11/22**		**0%**
28	1.5.4.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	1 día	mar 8/11/22	mié 9/11/22	24CC	0%
29	1.5.4.2	REMATES FINALES	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	28	0%
30	1.5.4.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	vie 18/11/22	sáb 19/11/22	29FC+7 días	0%
31	**1.5.5**	**CIV 14000091**	**10 días**	**mié 9/11/22**	**lun 21/11/22**		**0%**
32	1.5.5.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	28CC+1 día	0%
33	1.5.5.2	REMATES FINALES	1 día	jue 10/11/22	jue 10/11/22	32	0%
34	1.5.5.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 21/11/22	lun 21/11/22	33FC+7 días	0%
35	**1.5.6**	**CIV 14000102**	**10 días**	**mié 9/11/22**	**lun 21/11/22**		**0%**
36	1.5.6.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	32CC	0%
37	1.5.6.2	REMATES FINALES	1 día	jue 10/11/22	jue 10/11/22	36	0%
38	1.5.6.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 21/11/22	lun 21/11/22	37FC+7 días	0%
39	**1.5.7**	**CIV 14000118**	**10 días**	**mié 9/11/22**	**lun 21/11/22**		**0%**
40	1.5.7.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	36CC	0%
41	1.5.7.2	REMATES FINALES	1 día	jue 10/11/22	jue 10/11/22	40	0%
42	1.5.7.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 21/11/22	lun 21/11/22	41FC+7 días	0%
43	**1.5.8**	**CIV 14000145**	**10 días**	**mié 9/11/22**	**lun 21/11/22**		**0%**
44	1.5.8.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	1 día	mié 9/11/22	mié 9/11/22	40CC	0%
45	1.5.8.2	REMATES FINALES	1 día	jue 10/11/22	jue 10/11/22	44	0%
46	1.5.8.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 21/11/22	lun 21/11/22	45FC+7 días	0%
47	**1.6**	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**6 días**	**mar 8/11/22**	**mar 15/11/22**		**0%**
48	**1.6.1**	**CIV 14001393**	**6 días**	**mar 8/11/22**	**mar 15/11/22**		**0%**
49	1.6.1.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO ESTAMPADO	6 días	mar 8/11/22	mar 15/11/22	45CC-2 días	0%
50	1.6.1.2	REMPLAZO DE TAPAS EAAB	1 día	mar 15/11/22	mar 15/11/22	49FC-1 día	0%
51	**1.7**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**16,5 días**	**jue 13/10/22**	**mar 1/11/22**		**0%**
52	**1.8**	**FIN ACTIVIDADES**	**0 días**	**vie 25/11/22**	**vie 25/11/22**	**13;42;38;30;2**	**0%**

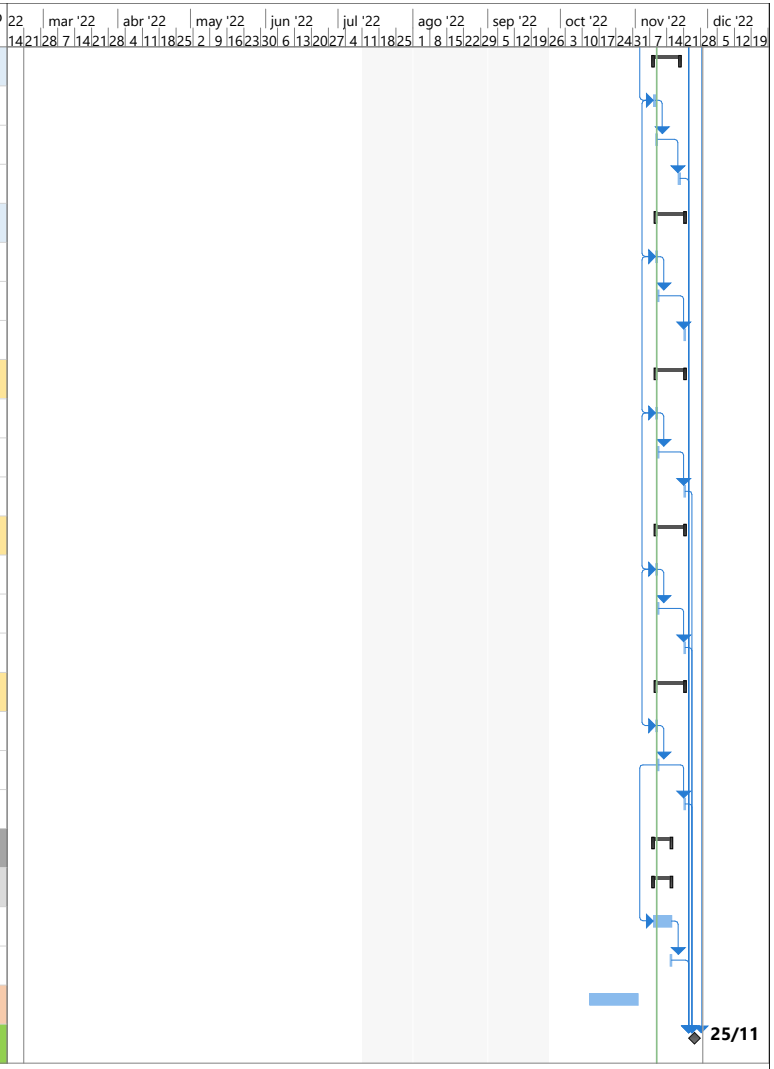

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: jue 10/11/22

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	
