

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**20,13 días**	**vie 4/11/22**	**mar 29/11/22**		**30%**
2	**1.1**	**ACTIVIDADES CONTRALORIA**	**20,13 días**	**vie 4/11/22**	**mar 29/11/22**		**30%**
3	1.1.1	**RECORRIDO**	0 días	vie 4/11/22	vie 4/11/22		100%
4	**1.1.2**	**INICIO DE OBRA**	**20,13 días**	**vie 4/11/22**	**mar 29/11/22**		**27%**
5	**1.1.2.1**	**CIV'S MALLA VIAL**	**19 días**	**vie 4/11/22**	**lun 28/11/22**		**49%**
6	**1.1.2.1.1**	**CIV 14000567**	**19 días**	**vie 4/11/22**	**lun 28/11/22**		**48%**
7	1.1.2.1.1.1	RADICACION DE DISEÑOS	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22		100%
8	1.1.2.1.1.2	REMATES DE VIA	2 días	jue 10/11/22	mar 15/11/22	7FC+4 días	69%
9	1.1.2.1.1.3	DEMARCACION DE VIA	2 días	vie 25/11/22	lun 28/11/22	8FC+10 días	0%
10	**1.1.2.1.2**	**CIV 14001505**	**18 días**	**vie 4/11/22**	**sáb 26/11/22**		**50%**
11	1.1.2.1.2.1	RADICACION DE DISEÑOS	1 día	vie 4/11/22	vie 4/11/22	7CC	100%
12	1.1.2.1.2.2	SELLO DE FISURAS	1 día	jue 10/11/22	vie 11/11/22	8CC	100%
13	1.1.2.1.2.3	DEMARCACION DE VIA	2 días	jue 24/11/22	sáb 26/11/22	12FC+10 días	0%
14	**1.1.2.2**	**CIV'S CICLORUTAS**	**17,13 días**	**mié 9/11/22**	**mar 29/11/22**		**19%**
15	**1.1.2.2.1**	**CIV 14000009**	**16 días**	**mié 9/11/22**	**lun 28/11/22**		**20%**
16	1.1.2.2.1.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	12CC-2 días	50%
17	1.1.2.2.1.2	REMATES FINALES	2 días	mié 16/11/22	vie 18/11/22	16	0%
18	1.1.2.2.1.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	17FC+7 días	0%
19	**1.1.2.2.2**	**CIV 14000018**	**16 días**	**mié 9/11/22**	**lun 28/11/22**		**18%**
20	1.1.2.2.2.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	16CC	44%
21	1.1.2.2.2.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	vie 18/11/22	20	0%
22	1.1.2.2.2.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	21FC+7 días	0%
23	**1.1.2.2.3**	**CIV 14000025**	**16 días**	**mié 9/11/22**	**lun 28/11/22**		**18%**
24	1.1.2.2.3.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	20CC	44%
25	1.1.2.2.3.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	vie 18/11/22	24	0%
26	1.1.2.2.3.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	25FC+7 días	0%

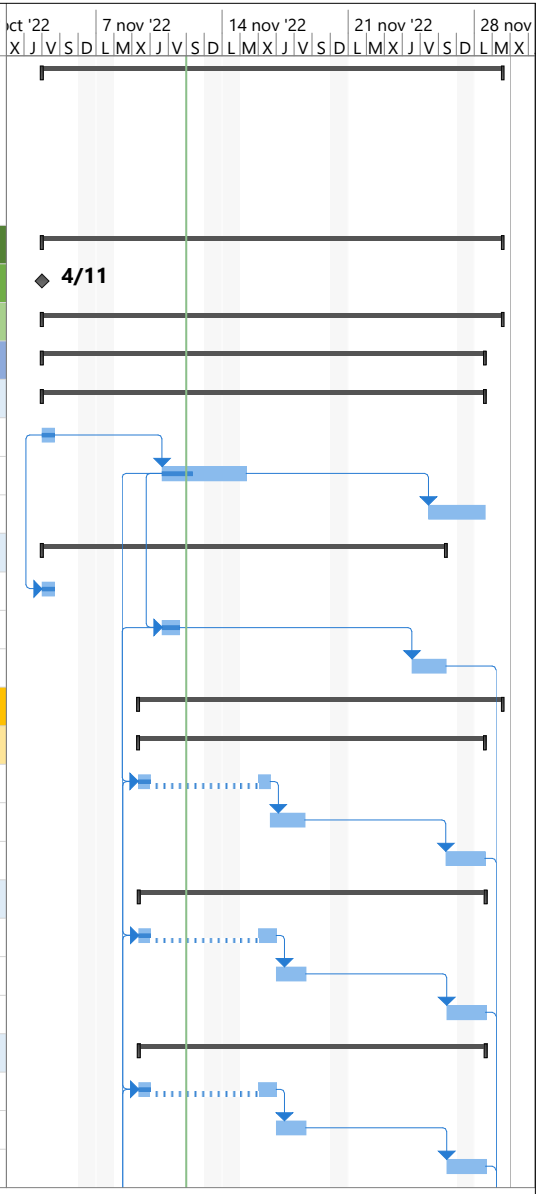

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: sáb 12/11/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
27	**1.1.2.2.4**	**CIV 14000048**	**16 días**	**mié 9/11/22**	**lun 28/11/22**		**18%**
28	1.1.2.2.4.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	24CC	44%
29	1.1.2.2.4.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	vie 18/11/22	28	0%
30	1.1.2.2.4.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	sáb 26/11/22	lun 28/11/22	29FC+7 días	0%
31	**1.1.2.2.5**	**CIV 14000091**	**16 días**	**jue 10/11/22**	**mar 29/11/22**		**20%**
32	1.1.2.2.5.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22	28CC+1 día	50%
33	1.1.2.2.5.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	32	0%
34	1.1.2.2.5.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	33FC+7 días	0%
35	**1.1.2.2.6**	**CIV 14000102**	**16 días**	**jue 10/11/22**	**mar 29/11/22**		**20%**
36	1.1.2.2.6.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22	32CC	50%
37	1.1.2.2.6.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	36	0%
38	1.1.2.2.6.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	37FC+7 días	0%
39	**1.1.2.2.7**	**CIV 14000118**	**16 días**	**jue 10/11/22**	**mar 29/11/22**		**20%**
40	1.1.2.2.7.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22	36CC	50%
41	1.1.2.2.7.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	40	0%
42	1.1.2.2.7.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	41FC+7 días	0%
43	**1.1.2.2.8**	**CIV 14000145**	**16 días**	**jue 10/11/22**	**mar 29/11/22**		**20%**
44	1.1.2.2.8.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO	2 días	jue 10/11/22	jue 17/11/22	40CC	50%
45	1.1.2.2.8.2	REMATES FINALES	2 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	44	0%
46	1.1.2.2.8.3	DEMARCACION APROBADA SDM	1 día	lun 28/11/22	mar 29/11/22	45FC+7 días	0%
47	**1.1.2.3**	**CIV'S ESPACIO PÚBLICO**	**6 días**	**mié 9/11/22**	**mié 16/11/22**		**48%**
48	**1.1.2.3.1**	**CIV 14001393**	**6 días**	**mié 9/11/22**	**mié 16/11/22**		**48%**
49	1.1.2.3.1.1	MEJORAMIENTO DE ACABADO ESTAMPAD	6 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	48CC-2 días	56%
50	1.1.2.3.1.2	REMPLAZO DE TAPAS EAAB	1 día	mié 16/11/22	mié 16/11/22	49FC-1 día	0%
51	**1.1.3**	**Componentes (SST, Ambiental, PMT)**	**16,5 días**	**vie 4/11/22**	**jue 24/11/22**		**39%**
52	**1.1.4**	**FIN ACTIVIDADES**	**0 días**	**mar 29/11/22**	**mar 29/11/22**	**13;42;38;30;2**	**0%**

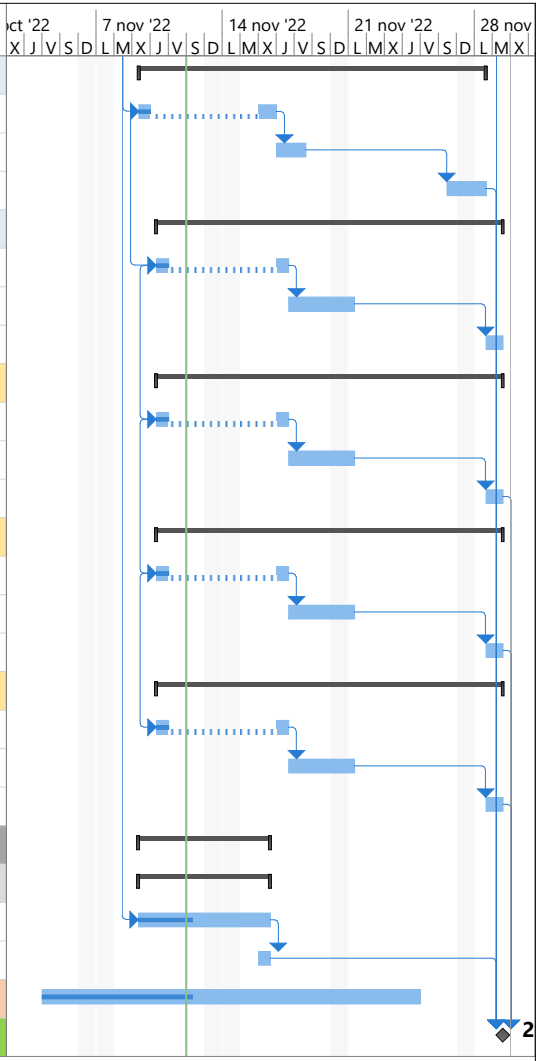

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: sáb 12/11/22

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	
