
Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado
1	**1**	**CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES**	**35 días**	**mié 9/11/22**	**mar 20/12/22**		**45%**
2	**1.1**	**FIRMA DE ADICION Y PRORROGA**	**35 días**	**mié 9/11/22**	**mar 20/12/22**		**45%**
3	**1.1.1**	**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**8 días**	**mié 9/11/22**	**vie 18/11/22**		**78%**
4	1.1.1.1	Revisión de diseños iniciales	8 días	mié 9/11/22	vie 18/11/22		78%
5	1.1.1.2	Radicación de requisitos para PMT	8 días	mié 9/11/22	vie 18/11/22		78%
6	1.1.1.3	Elaboración de diagnósticos	8 días	mié 9/11/22	vie 18/11/22		78%
7	**1.1.2**	**CIV'S MALLA VIAL**	**28 días**	**jue 17/11/22**	**mar 20/12/22**		**0%**
8	**1.1.2.1**	**CIV 14001416**	**28 días**	**jue 17/11/22**	**mar 20/12/22**		**0%**
9	1.1.2.1.1	Socialización y preliminares de componentes	3 días	jue 17/11/22	lun 21/11/22	5CC+7 días	0%
10	1.1.2.1.2	REPLANTEO GENERAL	1 día	lun 21/11/22	mar 22/11/22	9	0%
11	1.1.2.1.3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOM	2 días	mar 22/11/22	jue 24/11/22	15CC	0%
12	1.1.2.1.4	PROTECCION A SUMIDEROS.	1 día	lun 21/11/22	mar 22/11/22	10CC	0%
13	1.1.2.1.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CR	2 días	jue 24/11/22	sáb 26/11/22	15	0%
14	1.1.2.1.6	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (CEMENTO ASFÁLTICO 80-100).	2 días	jue 24/11/22	sáb 26/11/22	13CC	0%
15	1.1.2.1.7	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE).	2 días	mar 22/11/22	jue 24/11/22	10	0%
16	1.1.2.1.8	DEMARCACION Y SEÑALIZACION	5 días	mié 14/12/22	mar 20/12/22	14FC+15 días	0%
17	**1.1.2.2**	**FIN DE ACTIVIDADES DE OBRA**	**0 días**	**mar 20/12/22**	**mar 20/12/22**	**16**	**0%**

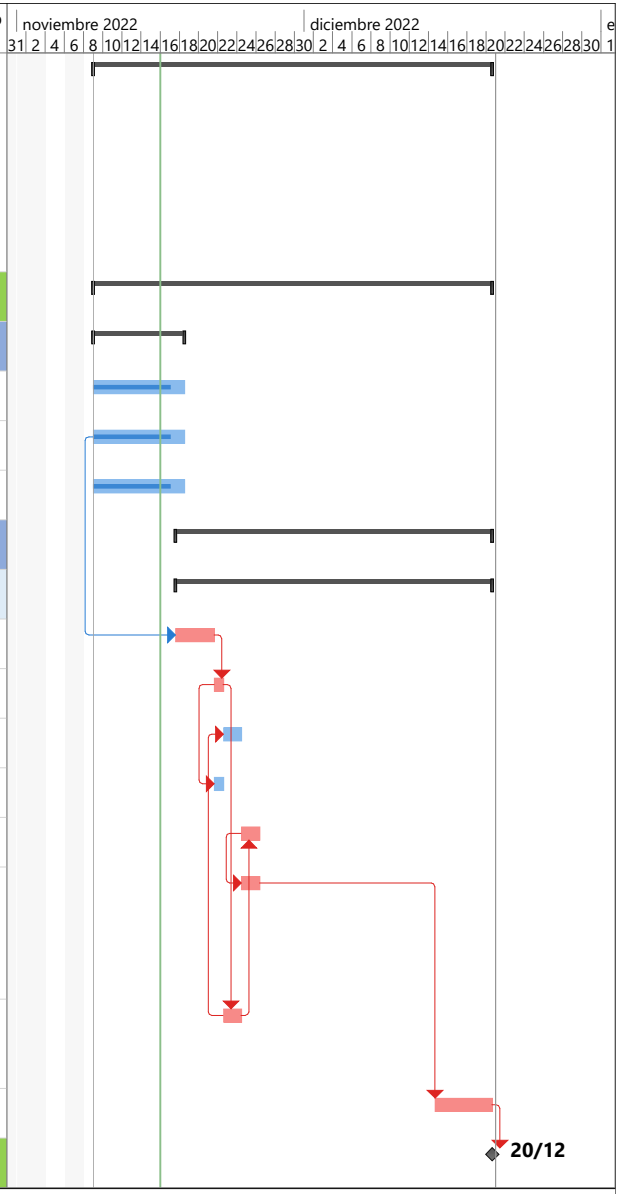

Proyecto: PROGRAMACIÓN BO
Fecha: mié 16/11/22

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			
